

674/2019

CFDI Factura Electrónica (CFDI)

Folio: A 321

No. de serie de certificado del CSD: 0000100000409585936

Información del cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
RFC: MJJ850101KP8
Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO JOCOTEPEC 45800 JOCOTEPEC JALISCO MEX

Fecha: 27-08-2019 11:44:46
Uso CFDI: 101-Construcciones

Información del emisor:

Razón social: OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
RFC: GOTO750322EC5
Dirección: TIERRA DEL TRIUNFO 178 TERRALTA SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45594 JALISCO MÉXICO

Lugar de expedición: 45594
Régimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Información del pago:

Método: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN
Tipo de cambio

Condiciones:

Table with columns: Código, Clave producto o servicio, Cantidad, Unidad, Clave unidad, Descripción, Precio unitario, Descuento, Importe. Row 1: INST, 24111810, 1, No Aplica, H87-Pieza, Pago de Estimacion No. 3 (TRES), relativo a la obra; CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 486.94 MONTO EFECTIVO PARA PAGO; \$ 101,313.85, \$86,897.23, \$0.00, \$86,897.23

Observaciones:
Cantidad con letra: CIEN MIL OCHOCIENTOS PESOS 79/100 M.N.

Código QR:



Folio fiscal: c78353d9-05cb-4c33-b74b-f7f9ef5c6157
Número de serie del certificado SAT: 0000100000408254801
Fecha de certificación: 27-08-2019 11:49:55

Subtotal: \$86,897.23
002-IVA Trasladado 0.160000 %: \$13,903.5568
Total: \$100,800.79

Sello CFDI:

YDj4dBROEAMyUGBtS1qIS4WVEQWm3eet7e5XOWWno6CXC039BakCEK
JTFoyQBRPNHtARdZAA+LT454ZaPbDZCaalBwwD33Pfc9BdDSEgJ008H
YUlm3AqoY5E9r91V55+QcaH42aFh8zY881SNN55NarsaCOObU1V5BzYgL2
8yY54m4grUW7BwKqORKN7LbAs8HclGdWPN9MEUDT+H4H5gkTmQZ
AF5C9pNhwV15pCgWm2L8Q2H9YeD82dHBRV18PQKD8QNH9R4T+pDQumTQ
44zDeYwW0a32wqFTw==

Sello SAT:


nW/CIBUe/aciHSTGqfvtUXSvXREa3vAnyWkePuvVhZab3S02K3aTnAskjpld
lUo3KXCXUG8GA7qM+8TGM06C+qPfmHhlgqwyX15F8vX4n8RUPVmcpgL
eBUJDCERCVWwWCV8U7QWANKG8BdDgRvYEMNNSUHAHRRR8ozv7A9e8Ll
YQsha+8NlJ/Ac88Cq8A8v7FR5VYem83BG7Cfql8Bac98hgTzCOPONVU+
DRUVNmsLVp8xLIB2GUAsUQA8vWTPAvq8TLDLurEg1IKm9BzVrFwW2Pxt89
Xp3Rk0h0w0zpg==

Cadena original SAT:

[1]-1678353d9-05cb-4c33-b74b-f7f9ef5c6157|2019-08-27T11:49:55|601306189R5Y
DJ4dBROEAMyUGBtS1qIS4WVEQWm3eet7e5XOWWno6CXC039BakCEKJ
TFoyQBRPNHtARdZAA+LT454ZaPbDZCaalBwwD33Pfc9BdDSEgJ008H
YUlm3AqoY5E9r91V55+QcaH42aFh8zY881SNN55NarsaCOObU1V5BzYgL2
8yY54m4grUW7BwKqORKN7LbAs8HclGdWPN9MEUDT+H4H5gkTmQZ
AF5C9pNhwV15pCgWm2L8Q2H9YeD82dHBRV18PQKD8QNH9R4T+pDQumTQ
44zDeYwW0a32wqFTw==|0000100000408254801|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Respondemos de inmediato
A TU TIMBRADO



SW SMARTER WEB

Handwritten signature

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL
 TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.
 R.F.C. GOTO750322 EC5 REGISTRO SIOP JALISCO 3428

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 008C-OP/2019
 CONTRATISTA: ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
 OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 UBICACIÓN: HUEJOTITAN

HOJA DE RELACIÓN ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)
 PERÍODO DE TRABAJO:
 DEL: 1° AL 27 DE JULIO 2019
 FECHA: 30 DE JULIO DE 2019

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

| PARTIDAS | | IMPORTE | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|
| ALBAÑILERIA | | \$ | 96,045.58 |
| COMPLEMENTARIOS | | \$ | 1,342.99 |
| MONTO DE ESTIMACIÓN | | \$ | 97,388.57 |
| MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO % | | \$ | 10,491.34 |
| SUBTOTAL | | \$ | 86,897.23 |
| I. V. A. 16% | | \$ | 13,903.56 |
| SUMA | | \$ | 100,800.79 |
| MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) | | \$ | - |
| MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) | | \$ | 486.94 |
| NETO A PAGAR | | \$ | 100,313.85 |

| ESTADO CONTABLE | IMPORTE | I. V. A. | TOTAL |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| ASIGNACIÓN | \$ 554,773.64 | \$ 88,763.78 | \$ 643,537.42 |
| CONVENIO ADICIONAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| IMPORTE DE ESTIMACIÓN | \$ 97,388.57 | \$ 15,582.17 | \$ 112,970.74 |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ 512,808.26 | \$ 82,049.32 | \$ 594,857.58 |
| ACUMULADO A LA FECHA | \$ 610,196.83 | \$ 97,631.49 | \$ 707,828.33 |
| SALDO EXCEDENTE | \$ -55,423.19 | \$ 8,867.71 | \$ 64,290.90 |

| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ANTICIPO % | \$ 138,693.41 | \$ 22,190.95 | \$ 160,884.36 |
| AMORTIZACIÓN | \$ 10,491.34 | \$ 1,678.61 | \$ 12,169.95 |
| AMORTIZACIÓN ACUM. ANT. | \$ 128,202.07 | \$ 20,512.33 | \$ 148,714.40 |
| AMORTIZACIÓN A LA FECHA | \$ 138,693.41 | \$ 22,190.95 | \$ 160,884.36 |
| FALTANTE POR AMORTIZAR | \$ - | \$ - | \$ - |

EL CONTRATISTA

V7

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL
 TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.
 R.F.C. GOTO750322 EC5

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

REGISTRO SIOP JALISCO 3428
 ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) y *Leñiguito*
 PERÍODO: 1° AL 27 DE JULIO 2019
 OBRA : CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : HUEJOTITAN
 CONTRATISTA : ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
 FECHA : 30 DE JULIO DE 2019



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

| No. | CONCEPTO | U | CANTIDADES | | | | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | | | | |
|--------------------|---|----|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| | | | PRESUPUESTO BASE | ACUMULADA ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL | SALDO | | PRESUPUESTO BASE | ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL | SALDO |
| | | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1 | TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 96.0000 | 96.0000 | 0.0000 | 96.0000 | 0.0000 | \$12.29 | \$1,179.84 | \$1,179.84 | \$0.00 | \$1,179.84 | \$0.00 |
| 2 | EXCAVACION PARA ALOJAR ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00M; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION | M3 | 153.6000 | 153.6000 | 0.0000 | 153.6000 | 0.0000 | \$116.53 | \$17,899.01 | \$17,899.01 | \$0.00 | \$17,899.01 | \$0.00 |
| 3 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION | M3 | 57.6000 | 57.6000 | 0.0000 | 57.6000 | 0.0000 | \$805.67 | \$46,406.59 | \$46,406.59 | \$0.00 | \$46,406.59 | \$0.00 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| ALBANILERIA | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 15CM DE ESPESOR, F'C=200KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (2KG IMPERMEABILIZANTE POR 50 KG DE CEMENTO) Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, TERMINADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2 | 60.0000 | 78.0000 | 0.0000 | 78.0000 | -18.0000 | \$626.85 | \$37,611.00 | \$48,894.30 | \$0.00 | \$48,894.30 | -\$11,283.30 |
| 6 | MAMPOSTEO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (2KG IMPERMEABILIZANTE POR 50 KG DE CEMENTO), ROSTRO LIMPIO EN CARA EXTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M3 | 88.2000 | 94.4972 | 0.0000 | 94.4972 | -6.2972 | \$2,115.30 | \$186,569.46 | \$199,889.92 | \$0.00 | \$199,889.92 | -\$13,320.46 |
| 7 | FABRICACION DE CASTILLOS DE 30X30CM CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (2KG IMPERMEABILIZANTE POR 50 KG DE CEMENTO), ARMADO CON 8 VAR N°3 Y ESTRIBOS N°2 @ 15CM INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 28.0000 | 28.0000 | 0.0000 | 28.0000 | 0.0000 | \$1,076.81 | \$30,150.68 | \$30,150.68 | \$0.00 | \$30,150.68 | \$0.00 |
| 8 | FABRICACION DE DALA DE 30X20CM CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (2KG IMPERMEABILIZANTE POR 50 KG DE CEMENTO), ARMADO CON 6 VAR N°3 Y ESTRIBOS N°2 @ 15CM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 33.2000 | 33.2000 | 0.0000 | 33.2000 | 0.0000 | \$877.60 | \$29,136.32 | \$29,136.32 | \$0.00 | \$29,136.32 | \$0.00 |
| 9 | FABRICACION DE APLANADOS EN MURO O ESCALON CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (2KG IMPERMEABILIZANTE POR 50 KG DE CEMENTO), TERMINADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2 | 107.2000 | 107.2000 | 0.0000 | 107.2000 | 0.0000 | \$180.20 | \$19,317.44 | \$19,317.44 | \$0.00 | \$19,317.44 | \$0.00 |

47



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

PERÍODO: 1° AL 27 DE JULIO 2019

OBRA : CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

UBICACIÓN : HUEJOTITAN

CONTRATISTA : ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

FECHA: 30 DE JULIO DE 2019

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA


| No. | CONCEPTO | U | CANTIDADES | | | | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | | | | | |
|------------------------|--|-------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | | PRESUPUESTO BASE | ACUMULADA ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL | SALDO | | PRESUPUESTO BASE | ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL | SALDO | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CONSTRUCCION DE BOVEDA CATALANA CON TABIQUE 5.5X11X22 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 75.5200 | 0.0000 | 75.5200 | 75.5200 | 0.0000 | \$442.33 | \$33,404.76 | \$0.00 | \$33,404.76 | \$33,404.76 | \$0.00 | |
| 11 | FABRICACION DE LOZA DE HORMIGON CALHIDRA-JAL-ARENA, DE 10CM PROMEDIO PARA NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHADEO CEMENTO-ARENA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION | M2 | 75.5200 | 0.0000 | 75.5200 | 75.5200 | 0.0000 | \$565.73 | \$42,723.93 | \$0.00 | \$42,723.93 | \$42,723.93 | \$0.00 | |
| 12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE BARRO DE 17X17CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 75.5200 | 0.0000 | 75.5200 | 75.5200 | 0.0000 | \$263.73 | \$19,916.89 | \$0.00 | \$19,916.89 | \$19,916.89 | \$0.00 | |
| VIGUERIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR DE 12"X6.5" 44.64KG/ML, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU EJECUCION | KG | 142.1200 | 383.9040 | 0.0000 | 383.9040 | -241.7840 | \$129.40 | \$18,390.33 | \$49,677.18 | \$0.00 | \$49,677.18 | -\$31,286.85 | |
| 14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR DE 6"X4" 13.39KG/ML, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU EJECUCION | KG | 1199.7440 | 1199.7440 | 0.0000 | 1,199.7440 | 0.0000 | \$58.56 | \$70,257.01 | \$70,257.01 | \$0.00 | \$70,257.01 | \$0.00 | |
| COMPLEMENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 96.0000 | 0.0000 | 117.6000 | 117.6000 | -21.6000 | \$11.42 | \$1,096.32 | \$0.00 | \$1,342.99 | \$1,342.99 | -\$246.67 | |
| 16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA ALGIBE DE 80X80CM CON MARCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION | PIEZA | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | \$714.06 | \$714.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$714.06 | |
| | | | | | | | | | SUMA | \$ 554,773.64 | | \$ 97,388.57 | \$ 610,196.86 | -\$ 55,423.21 |
| | | | | | | | | | IVA | \$ 88,763.78 | | \$ 15,582.17 | \$ 97,631.50 | -\$ 8,867.71 |
| | | | | | | | | | TOTAL | \$ 643,537.42 | | \$ 112,970.74 | \$ 707,828.35 | -\$ 64,290.93 |

V7

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RIGOBERTO OMEDO RAMOS
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL

TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.

R.F.C. GOTO750322 EC5

REGISTRO SIOP JALISCO 3428

EMPRESA: ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

FECHA: 30 DE JULIO DE 2019

OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: 1° AL 27 DE JULIO 2019

NUMEROS GENERADORES

10 CONSTRUCCION DE BOVEDA CATALANA CON TABIQUE 5.5X11X22 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES


| UNIDAD | CADENAMIENTO | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA | TOTAL |
|--------|--------------|---------|---------|--------|------------------------------|-------|
| M2 | DEPOSITO | 11.0000 | 8.60000 | 1.0000 | 1.0000 | 94.60 |
| | TAPA | 0.8000 | 0.8000 | 1.0000 | -1.0000 | -0.64 |
| | | | | | SUMA | 93.96 |
| | | | | | | |
| | | | | | PAGAR SOLO VOL PRESUPUESTADO | 75.52 |

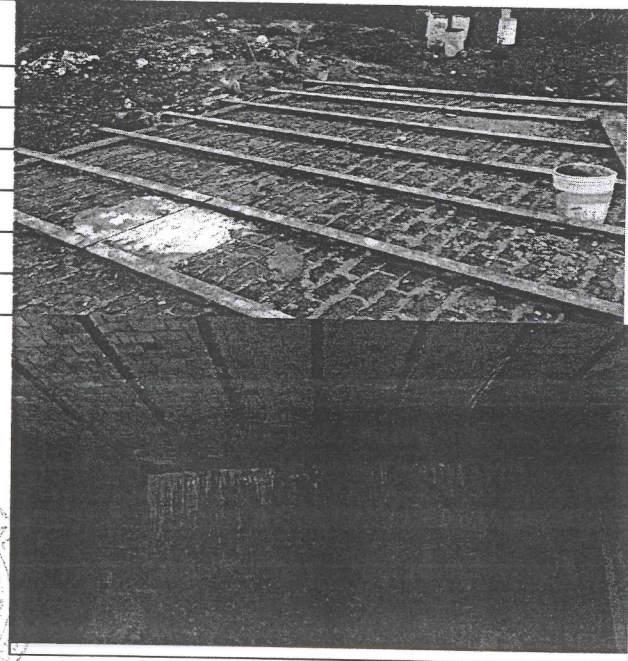


V7

OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
EL CONTRATISTA


[Signature]
ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




[Signature]

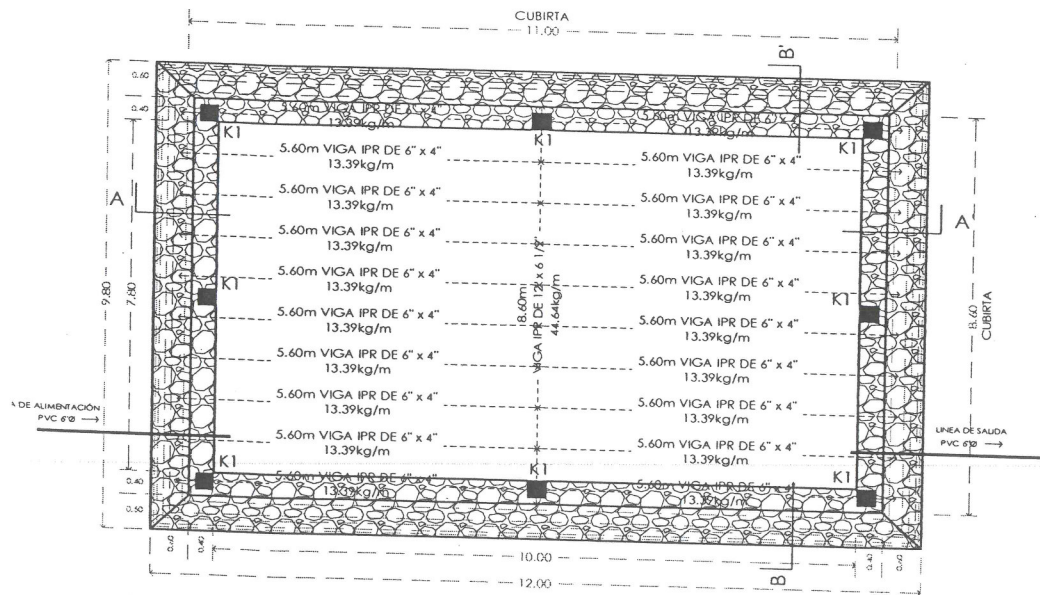



PLANTA DEL DEPOSITO

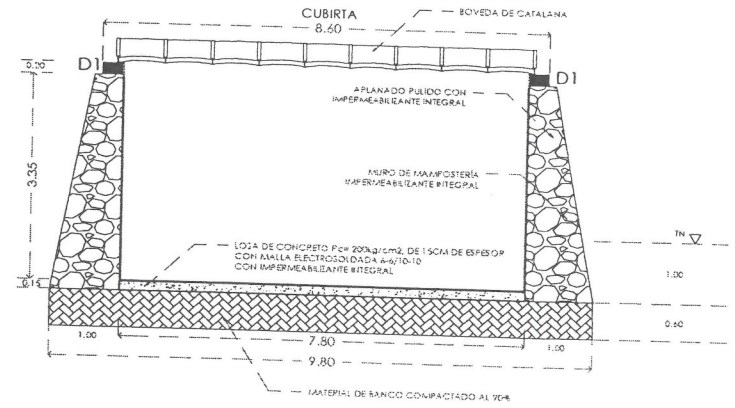

SECCION B, B'

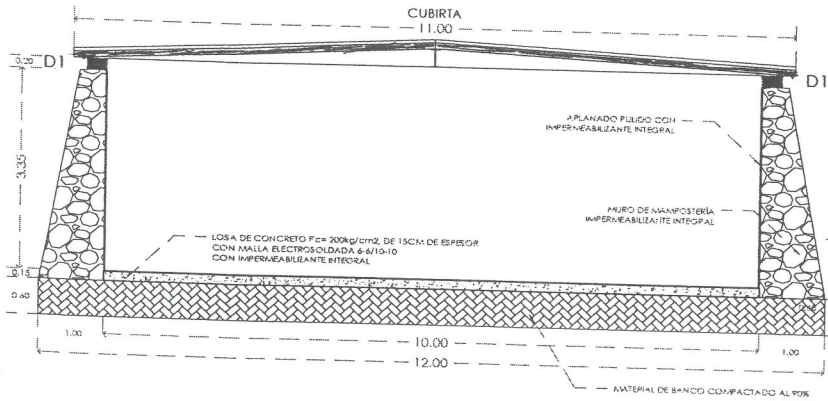

SECCION A, A'

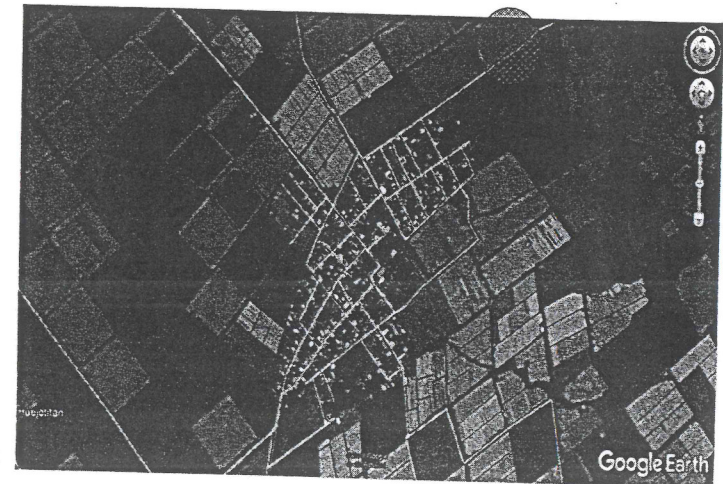

COMISION DE OBRAS PUBLICAS

V7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL

TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.

R.F.C. GOTO750322 EC5

REGISTRO SIOP JALISCO 3428

EMPRESA: ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FECHA: 30 DE JULIO DE 2019

OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 1° AL 27 DE JULIO 2019

NUMEROS GENERADORES

11 FABRICACION DE LOZA DE HORMIGON CALHIDRA-JAL-ARENA, DE 10CM PROMEDIO PARA NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHADEO CEMENTO-ARENA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES


| UNIDAD | CADENAMIENTO | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA | TOTAL |
|--------|--------------|---------|---------|--------|------------------------------|-------|
| M2 | DEPOSITO | 11.0000 | 8.60000 | 1.0000 | 1.0000 | 94.60 |
| | TAPA | 0.8000 | 0.8000 | 1.0000 | -1.0000 | -0.64 |
| | | | | | | |
| | | | | | SUMA | 93.96 |
| | | | | | PAGAR SOLO VOL PRESUPUESTADO | 75.52 |




V7

OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
EL CONTRATISTA


ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

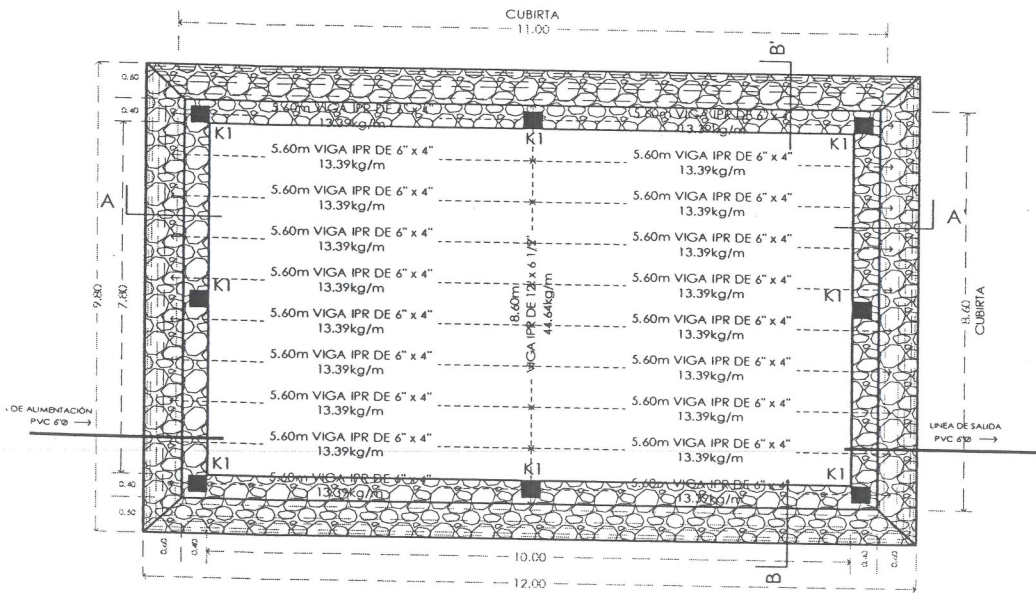

PLANTA DEL DEPOSITO

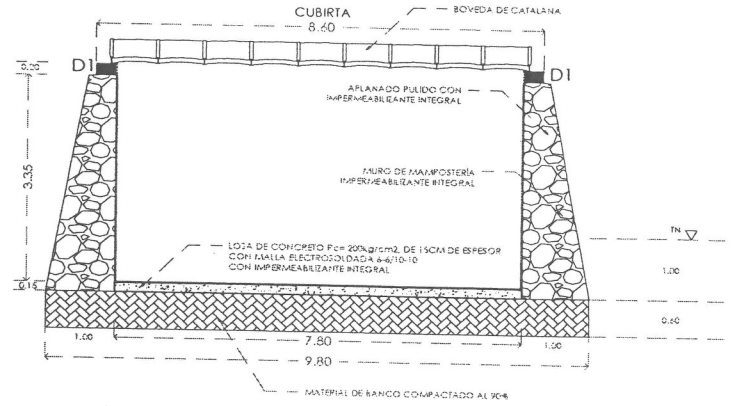



SECCIÓN B, B'

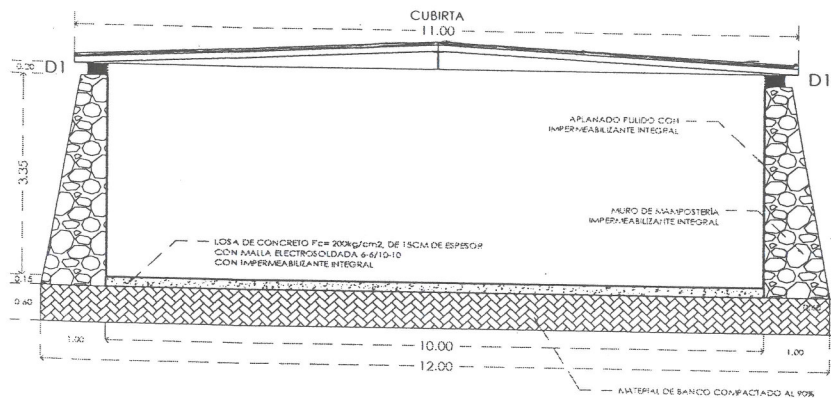

SECCIÓN A, A'

47

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

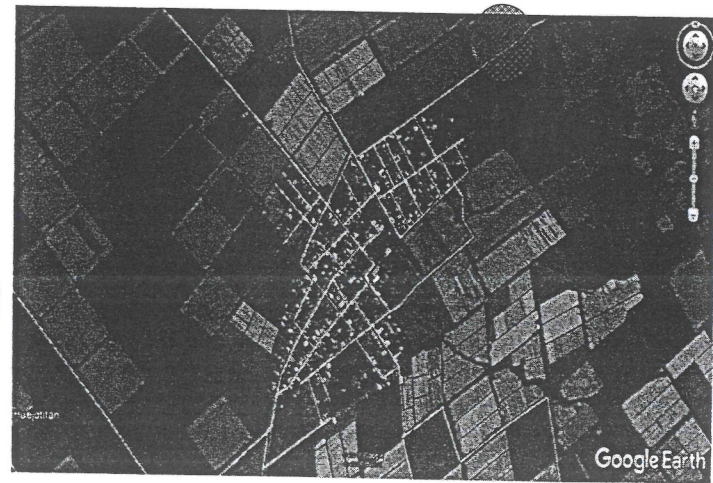

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL

TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.

R.F.C. GOTO750322 EC5

REGISTRO SIOP JALISCO 3428

EMPRESA: ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FECHA: 30 DE JULIO DE 2019

OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: 1° AL 27 DE JULIO 2019

NUMEROS GENERADORES

12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE BARRO DE 17X17CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES


| UNIDAD | CADENAMIENTO | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA | TOTAL |
|--------|--------------|---------|---------|--------|------------------------------|-------|
| M2 | DEPOSITO | 11.0000 | 8.60000 | 1.0000 | 1.0000 | 94.60 |
| | TAPA | 0.8000 | 0.8000 | 1.0000 | -1.0000 | -0.64 |
| | | | | | SUMA | 93.96 |
| | | | | | | |
| | | | | | PAGAR SOLO VOL PRESUPUESTADO | 75.52 |

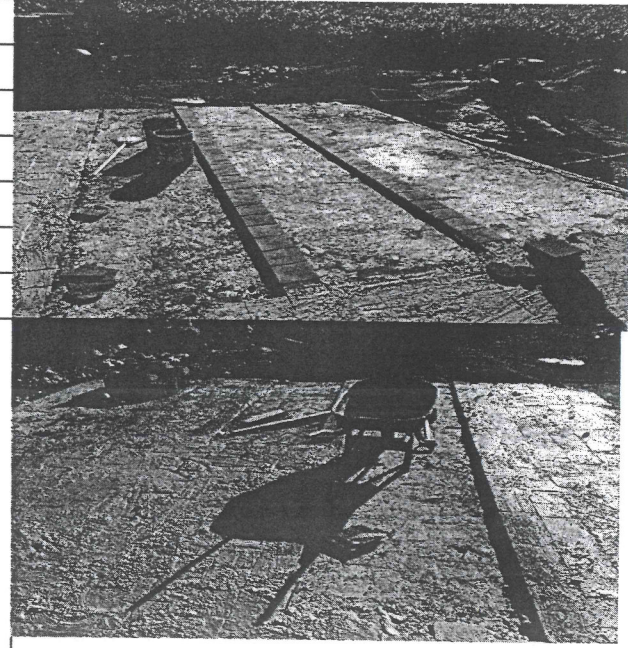


OT

OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
EL CONTRATISTA


ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

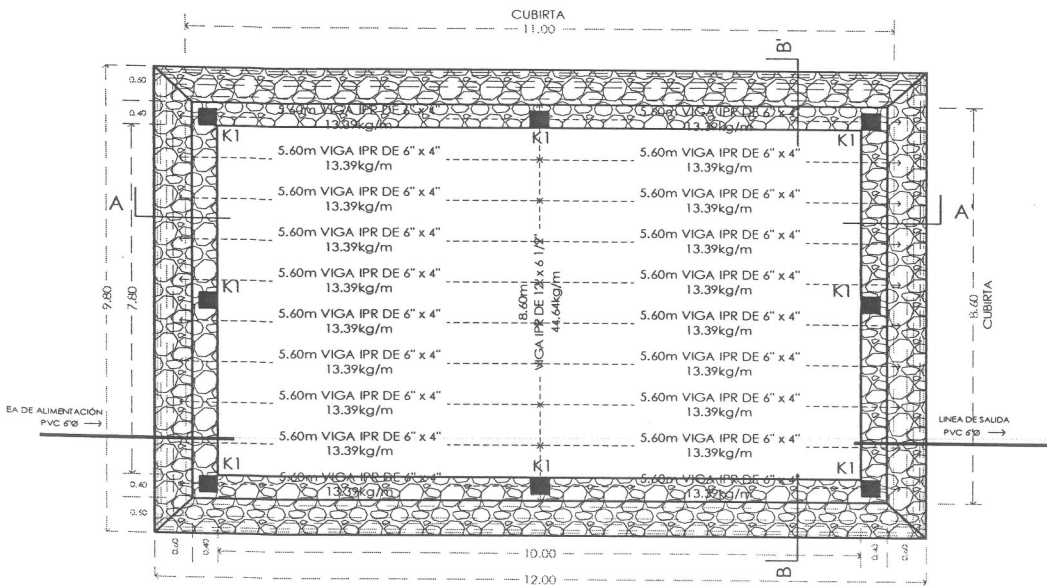

PLANTA DEL DEPOSITO

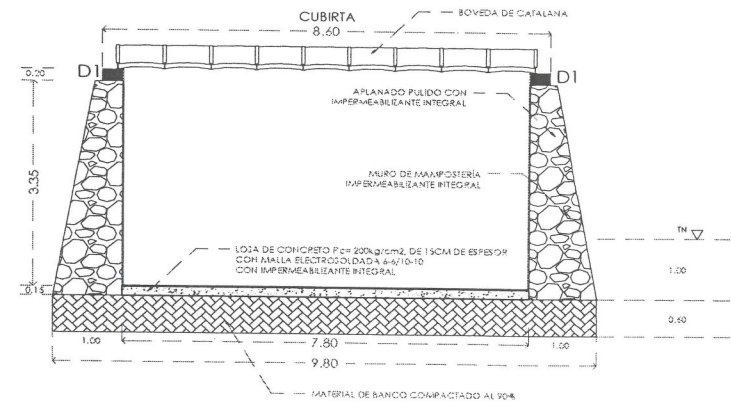


SECCIÓN B, B'

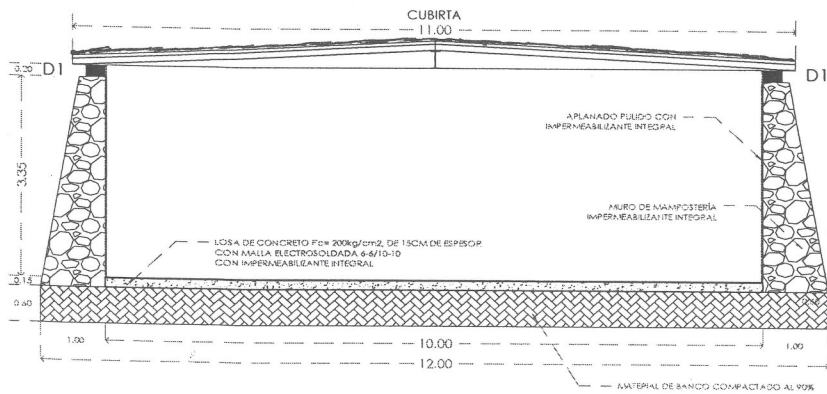

SECCIÓN A, A'

V7

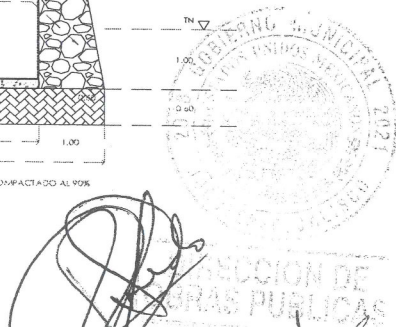

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL
 TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.

R.F.C. GOTO750322 EC5

REGISTRO SIOP JALISCO 3428

EMPRESA: ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FECHA: 30 DE JULIO DE 2019

OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO



PERIODO: 1° AL 27 DE JULIO 2019

NUMEROS GENERADORES

15 LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES


| UNIDAD | CADENAMIENTO | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA | TOTAL |
|--------|--------------|---------|---------|--------|------------------------------|--------|
| M2 | DEPOSITO | 12.0000 | 9.80000 | 1.0000 | 1.0000 | 117.60 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | SUMA | 117.60 |
| | | | | | PAGAR SOLO VOL PRESUPUESTADO | 96.00 |

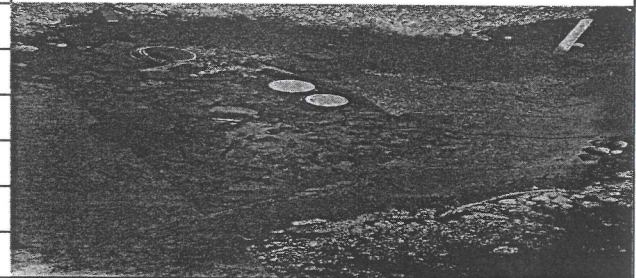


V7


ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
 EL CONTRATISTA


 ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



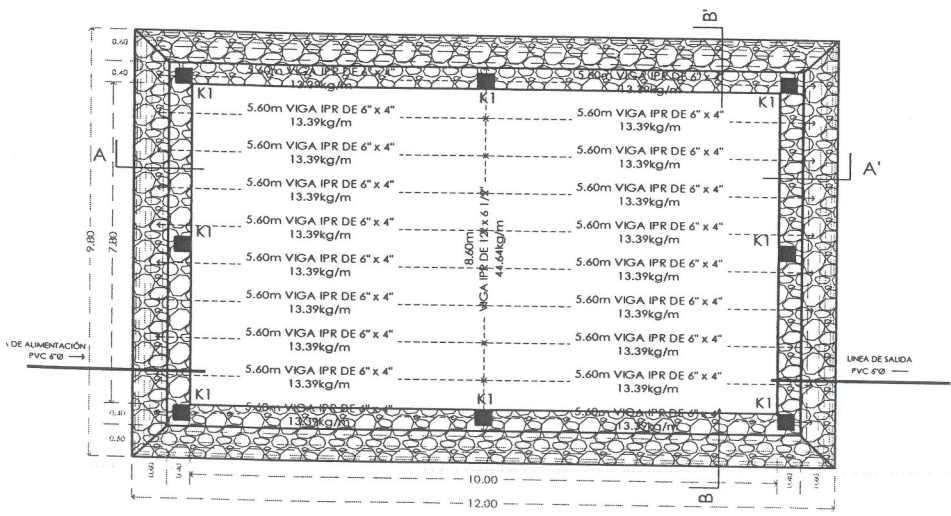

PLANTA DEL DEPOSITO

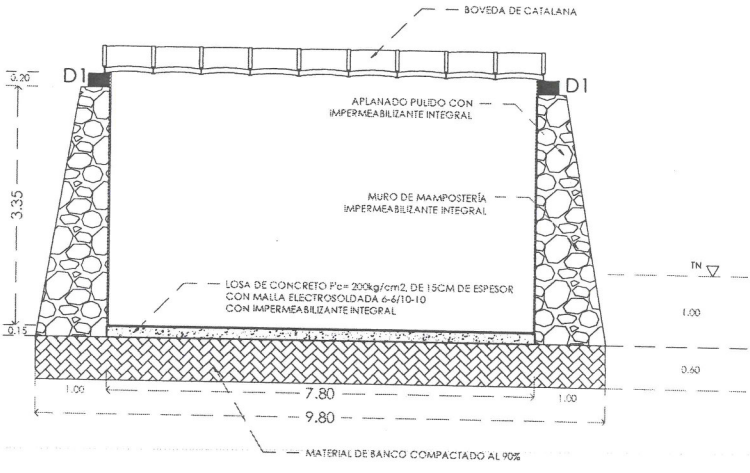


SECCIÓN B, B'



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



DIRECCION DE
