

Jocotepec
Gobierno Municipal

Jocotepec, Jal., a 14 de noviembre de 2019.

Vo. de

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Pago de estimación No. 03 (finiquito)


POR ESTE CONDUCTO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA REALICE LOS TRÁMITES DE PAGO A NOMBRE DE; CONSTRUCTORA **PIMONT S.A. DE C.V.**, POR LA CANTIDAD DE **\$207,236.91** (DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN "NO.3 (FINIQUITO)", LA CUAL CORRESPONDE AL PROYECTO QUE DESCRIBO:

NOMBRE DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. NO. CONTRATO: GMJ010PO/2019
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
PROGRAMA:	CUENTA CORRIENTE /2019
CODIFICACIÓN CONTABLE:	6231-211-050-170
SE REALIZÓ EN:	EN UN BIEN DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Anexo:



1. Factura y verificación de la misma
2. Estimación No. 03 (finiquito)



Jocotepec
Gobierno Municipal

Administración-2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO NUMERO: 899/2019

3. Minuta de terminación de obra
4. Acta de entrega-recepción
5. Acta de extinción de derechos y obligaciones
6. Fianza de y vicios ocultos

Número de factura	Fecha de factura	Monto total de factura	Sub-total de factura	Retención del 5 al millar para la contraloría	Neto a pagar
1914	13/11/2019	\$208,134.04	\$179,425.90	\$897.13	\$207,236.91

Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido enviándole un saludo.

ATENTAMENTE


“AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC LO HACE SU GENTE”

ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

c.p. Archivo

D.O.P./s.c.o.



CONSTRUCTORA PIMONT SA DE CV

RFC: CPI1705153K5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45050
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 1914
Fecha: 13/11/2019 16:06:14
Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: Palacio Municipal No. 5/N, Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México
Uso CFDI: I01 - Construcciones

Table with 8 columns: Cant, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción PAGO DE ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. " NO. CONTRATO GMJ010CGP/2019 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$897.13, NETO A PAGAR \$207,236.91 -%

Importe con letra:
DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100
M.N.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Subtotal: 179,425.90; I.V.A.: 28,708.14; Total: 208,134.04

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000411623368
Folio fiscal: 21E44F6D-EE2F-4683-8D96-A867BABEBF32
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 13 2019 - 16:06:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GScpZpWaik2p8n51hYcXoLMbt8jhs5Ovlpccy68fsmOccawdsUrxpbQqK4UEjWS0Wjuh7kuxsv5pFFj8WS59A
tdhtzQrWqPBOVxjijGhQqZlJ0PKz/KbH0WcMwDf1sDaOibCSKtolP6yCrCk8kOZyRa4w+0WfDvH/3BHqudmod
kP0gMQ6jPKRuXc06+EaO3rmVgLR02lrCDht/yeKJzlvqwnYBvtCg51sNRgpAGzvi48X/SJtmpk/boFfqiQmmy
+xZw3REa6bcAvjOPbWoDGMY1XyXfBBWBlfEK1Z1Hlfe0m35cqf25srD/5rqqBam4Xiq4gaL8XNjh95sIIRMG==

Sello del SAT

ZTc5WMHjo1IWWi2fQVP5d7ydWoRodNRCBxBb100/v8S5NTob0Pp3YiKk2bAQ/WJcmXbw4fCVDOP3ZF
Z61f0Cr79vFYHLe/NKXUgA486ZMuWewRQTuOV7OhHF7bZqWfuX4QxhW9ecN1JCw0clqriecl7vsXBXX
u/xq/05NHEGDtlbsgsRcmn2pSYGgHzAm5IQZdhrZ45G8nlLncn6PQnf+Alxv8JnlBa+JCc73okmiOcyo
Qk03uJwntgYs0yZyHkcal0n4RP7DchmMyhVAusZBouLXWPLjhMxbWGs7s12BL64buWYheZi025KcZKz5
qQNNScwIMfj+x2rxqKjbcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1|21E44F6D-EE2F-4683-8D96-A867BABEBF32|2019-11-13T16:06:21|MAS0810247C0|GScp
ZpWaik2p8n51hYcXoLMbt8jhs5Ovlpccy68fsmOccawdsUrxpbQqK4UEjWS0Wjuh7kuxsv5pFFj8WS5
9AtdhtzQrWqPBOVxjijGhQqZlJ0PKz/KbH0WcMwDf1sDaOibCSKtolP6yCrCk8kOZyRa4w+0WfDvH/3B
HqudmodskP0gMQ6jPKRuXc06+EaO3rmVgLR02lrCDht/yeKJzlvqwnYBvtCg51sNRgpAGzvi48X/Sit
mpk/boFfqiQmmy+xZw3REa6bcAvjOPbWoDGMY1XyXfBBWBlfEK1Z1Hlfe0m35cqf25srD/5rqqBam4X
iq4gaL8XNjh95sIIRMG==|00001000000404486074||

Handwritten signature of the issuer

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPI1705153K5	CONSTRUCTORA PIMONT SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
21E44F6D-EE2F-4683-8D96-A867BABEBF32	2019-11-13T16:06:14	2019-11-13T16:06:21	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$208,134.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





H. AYUNTAMIENTO DE JUCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 010C-0P/2019

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCOTEPEC JALISCO

UBICACIÓN: ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCOTEPEC JALISCO

ESTIMACIÓN No. 3 (FINIQUITO)

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019



CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE CV

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

PARTIDAS

IMPORTES

1	PRELIMINARES		\$	-
2	FORMACION DE LOSA DE PISO		\$	-
3	MURO DE CONCRETO		\$	-
4	COLUMNAS		\$	-
5	TRABES		\$	21,147.18
6	LOSA DE TAPA		\$	158,278.72

MONTO DE ESTIMACIÓN	\$	179,425.90
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$	-
SUBTOTAL.	\$	179,425.90
I.V.A. 16%	\$	28,708.14
SUMA	\$	208,134.04
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$	-
MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$	897.13
NETO A PAGAR	\$	207,236.91

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL:
ASIGNACIÓN	\$ 1,421,725.44	\$ 227,476.07	\$ 1,649,201.51
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 179,425.90	\$ 28,708.14	\$ 208,134.04
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,252,727.21	\$ 200,436.35	\$ 1,453,163.56
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,432,153.11	\$ 229,144.50	\$ 1,661,297.61
SALDO EXCEDENTE	-\$ 10,427.67	1,668.43	-\$ 12,096.10

SIN ANTICIPO

ANTICIPO %	\$	-	\$	-
AMORTIZACIÓN	\$	-	\$	-
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$	-	\$	-
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$	-	\$	-
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$	-	\$	-

RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUADALUPE IBARRA R.

ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO



PERIODO DE TRABAJO: DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019
 OBRA : OBRA CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO
 UBICACIÓN : UBICACIÓN: ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.
 FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

No.	CONCEPTO	CANTIDADES					IMPORTE					
		u	PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PRELIMINARES												
1	DREN DE TUBO DE P.V.C. DE 6" BARRENADO. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	80.00	80.0000	0.00	80.00	0.00	\$297.00	\$ 23,760.00	\$ -	\$ 23,760.00	\$ -
2	PLANTILLA DE 10 CMS DE JALCRETO PREMEZCLADO FC=79KG/M2 INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	306.25	306.2500	0.00	306.25	0.00	\$357.98	\$ 109,631.38	\$ -	\$ 109,631.38	\$ -
3	RELLENO CON GRAVA DE 3/4" EN CAPAS DE 20 CM. CON BARRERINA. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	200.00	200.0000	0.00	200.00	0.00	\$647.65	\$ 129,570.00	\$ -	\$ 129,570.00	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES												
FORMACION DE LOSA DE PISO												
4	CIMBRA ACABADO COMUN EN ZAPATAS Y/O TIRAS DE CORTE. A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESSCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	18.32	18.3200	0.00	18.32	0.00	\$213.99	\$ 3,920.30	\$ -	\$ 3,920.30	\$ -
5	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRÉS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	1788.10	1788.1000	0.00	1,788.10	0.00	\$43.08	\$ 77,031.95	\$ -	\$ 77,031.95	\$ -
6	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 5, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRÉS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	160.99	160.9900	0.00	160.99	0.00	\$43.08	\$ 6,935.45	\$ -	\$ 6,935.45	\$ -
7	CONCRETO PREMEZCLADO EN ELEMENTOS LLENOS DE FC=2500 KG/CM2, INCLUYE ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	47.38	47.3800	0.00	47.38	0.00	\$2,523.53	\$ 119,564.85	\$ -	\$ 119,564.85	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE LOSA DE PISO												
MURO DE CONCRETO												
8	CIMBRA EN MUROS DE CIMENTACION CON CIMBRAPLAY DOS CAPAS. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO/DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	521.50	521.50	0.00	521.50	0.00	\$317.31	\$ 165,477.17	\$ -	\$ 165,477.17	\$ -
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA PVC OJILLADA DE 6" FLEXIBLE EN MUROS DE CONCRETO. INCLUYE SUMINISTROS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	\$213.04	\$ 14,689.76	\$ -	\$ 14,689.76	\$ -
10	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRÉS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	2048.10	2048.10	0.00	2,048.10	0.00	\$43.08	\$ 88,232.15	\$ -	\$ 88,232.15	\$ -
11	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRÉS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	1006.06	1006.06	0.00	1,006.06	0.00	\$43.08	\$ 43,341.06	\$ -	\$ 43,341.06	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE LOSA DE PISO												
SUBTOTAL ESTIMACION DE LOSA DE PISO												
SUBTOTAL ESTIMACION DE LOSA DE PISO												


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

12	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 5, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	1578.33	1578.3300	0.00	1,578.33	0.00	\$43.08	\$ 67,984.46	\$ -	\$ 67,984.46	\$ -
13	CONCRETO PREMEZCLADO EN ELEMENTOS LLENOS DE FC=2500 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	65.62	65.6200	0.00	65.62	0.00	\$2,523.53	\$ 165,594.04	\$ -	\$ 165,594.04	\$ -
14	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO "PROCON L" DE LA MARCA PROCONSA Y/O SIMILAR A RAZON DE 3 LTS. POR M3 DE CONCRETO.	M3	65.62	65.6200	0.00	65.62	0.00	\$134.77	\$ 8,843.61	\$ -	\$ 8,843.61	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE MURO DE CONCRETO												\$ 654,182.25
COLUMNAS												
15	CIMBRA EN COLUMNAS C-1 CON CIMBRAPLAY, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.76	17.7600	0.00	17.76	0.00	\$305.87	\$ 5,432.25	\$ -	\$ 5,432.25	\$ -
16	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	58.82	58.8200	0.00	58.82	0.00	\$43.08	\$ 2,533.97	\$ -	\$ 2,533.97	\$ -
17	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 5, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	242.11	242.1100	0.00	242.11	0.00	\$43.08	\$ 10,430.10	\$ -	\$ 10,430.10	\$ -
18	CONCRETO PREMEZCLADO EN ELEMENTOS LLENOS DE FC=2500 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.33	1.3300	0.00	1.33	0.00	\$2,523.53	\$ 3,356.29	\$ -	\$ 3,356.29	\$ -
19	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO "PROCON L" DE LA MARCA PROCONSA Y/O SIMILAR A RAZON DE 3 LTS. POR M3 DE CONCRETO.	M3	1.33	1.3300	0.00	1.33	0.00	\$134.77	\$ 179.24	\$ -	\$ 179.24	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COLUMNAS												\$ 21,931.85
TRABES												
20	CIMBRA EN TRABES T-1 CON CIMBRAPLAY, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	49.75	51.7500	0.00	51.75	-2.00	\$380.55	\$ 18,932.36	\$ -	\$ 19,683.46	\$ 761.10
21	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	223.91	213.89	0.00	213.89	10.02	\$43.08	\$ 9,646.04	\$ -	\$ 9,214.36	\$ 431.66
22	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	129.88	127.4900	0.00	127.49	2.39	\$43.08	\$ 5,595.23	\$ -	\$ 5,482.27	\$ 102.96
23	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 5, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	621.50	612.7700	0.00	612.77	8.73	\$43.08	\$ 26,774.22	\$ -	\$ 26,396.13	\$ 376.09
24	CONCRETO PREMEZCLADO EN ELEMENTOS LLENOS DE FC=2500KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.19	0.0000	8.38	8.38	-4.19	\$2,523.53	\$ 10,573.69	\$ 21,147.18	\$ -	\$ 10,573.69
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE TRABES												\$ 21,147.18
LOSAS DE TAPA												
25	CIMBRA ACABADO COMUN EN ZAPATAS Y/O TIRAS DE CORTE, A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00	\$213.99	\$ 4,087.21	\$ -	\$ 4,087.21	\$ -

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

26	CIMBRA DE LAMINA EN LOSAS DE 0.00 A 3.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	272.25	272.25	0.00	272.25	0.00	272.25	\$187.06	\$	50,927.09	\$	50,927.09	\$	-	
27	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	178.01	178.00	0.00	178.00	0.00	178.00	\$43.08	\$	7,668.67	\$	7,668.67	\$	0.43	
28	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	1911.28	1911.2800	0.00	1911.2800	0.00	1,911.28	\$43.08	\$	82,337.94	\$	82,337.94	\$	-	
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETÓN DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 20X 20X 40 CM. DE PERALTE PARA LOSA ALIGERADA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	35.01	0.0000	35.01	0.0000	35.01	35.01	\$827.11	\$	28,957.12	\$	28,957.12	\$	-	
30	MALLA ELECTROSOLDADA 6X68-8, EN ESTRUCTURA. INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	306.25	0.0000	306.25	0.0000	306.25	306.25	\$46.28	\$	14,173.25	\$	14,173.25	\$	-	
31	CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA ALIGERADA DE F'C=250 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	41.55	0.0000	41.55	0.0000	41.55	41.55	\$2,771.32	\$	115,148.35	\$	115,148.35	\$	-	
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA ALUSIVA AL PROGRAMA Y OBRA, MEDIDAS 1.20 X .90 INCLUYE: SUMINISTROS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.0000	0.00	1.0000	0.00	1.00	\$377.03	\$	377.03	\$	377.03	\$	-	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE LOSA DE TAPA										TOTAL	\$ 1,421,725.53	\$ 158,278.72	\$ 179,435.90	\$ 145,397.51	\$ 1,252,723.18	\$ 0.43

CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.
CONTRATISTA

ING. GUADALUPE IBARRA R.
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 4

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN: 3 TRES (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES


CONCRETO PREMEZCLADO EN ELEMENTOS LLENOS DE FC=250KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CONCEPTO:

UBICACIÓN	UBICACIÓN A EJES	ALTURA	BASE	LARGO	ELEMENTOS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
TRABES	T-1	0.50	0.25	17.00	2.00	4.25	M3	
TRABES	T-2	0.50	0.25	16.50	2.00	4.13	M3	



TRABE T-1
h=50
b=25
E430-40
(RESTO)

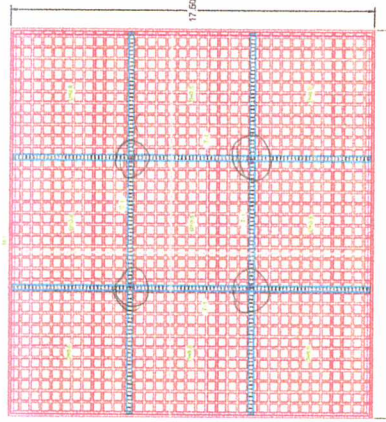

PLANTA DE ESTRUCTURACION
Escala: 1:100

TOTAL: 8.38 M3

CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.

ING. GUADALUPE IBARRA R.

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 4

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN: 3 TRES (FINIQUITO)


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETÓN DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 20X 20X 40 CM. DE PERALTE PARA LOSA ALIGERADA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

UBICACIÓN	PIEZAS	a	b	h	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
POLIESTILENO	2188.00	0.40	0.20	0.20	35.01	M3	

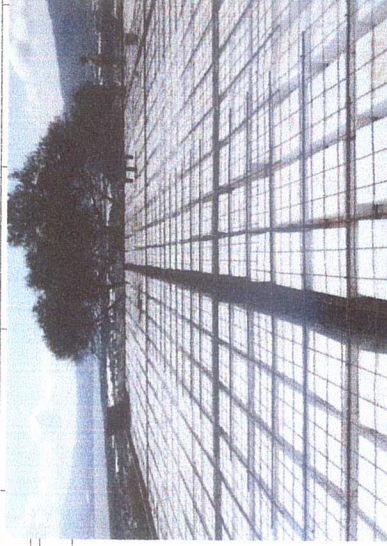

DETALLE DE LOSA EN DOS SENTIDOS



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	ING. GUADALUPE IBARRA R.	TOTAL	35.01	M3
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
		RESIDENTE DE OBRA		

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 4

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN: 3 TRES (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES

Malla electrosoldada 6x6/8-8, en estructura, incluye: acarreo, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

CONCEPTO:

UBICACIÓN	LADO	LADO	LADO	AREA	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
LOSA DE TAPA	17.50	17.50	17.50	306.25	306.25	M2	

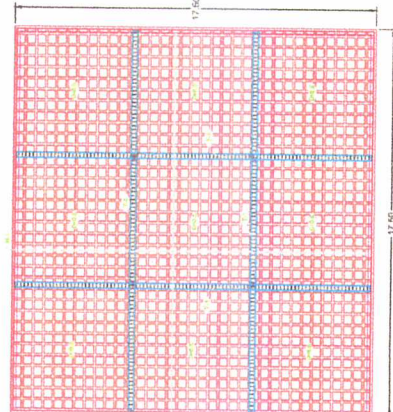

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

ING. GUADALUPE IBARRA R.

TOTAL 306.25

M2

CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.

[Signature]
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

OPRAs PÚBLICAS

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 4

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN: 3 TRES (FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.




PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

NUMEROS GENERADORES

Concepto premezclado en elementos llenos de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreo, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

CONCEPTO:

UBICACIÓN	H	B	L	VOLUMEN	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
N-1	0.25	17.50	17.50	76.56	76.56	M3	
MENOS V. CASETON				35.01	41.55	M3	

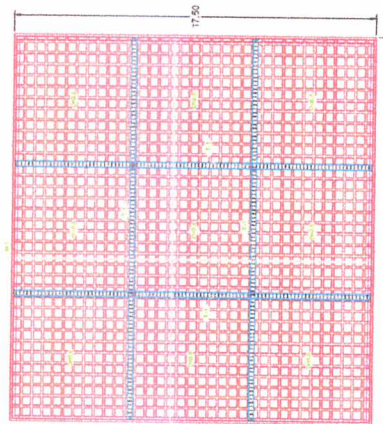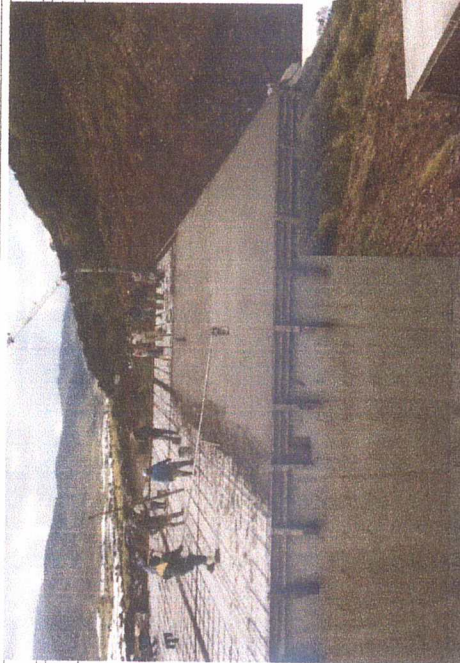

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	ING. GUADALUPE IBARRA R.	TOTAL	41.55	M3
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
		RESIDENTE DE OBRA		
