



CONSTRUCTORA PIMONT SA DE CV

RFC: CPI1705153K5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45050
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 1462
Fecha: 13/6/2019 10:53:56
Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: Palacio Municipal No. S/N, Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México
Uso CFDI: 101 - Construcciones

Table with 8 columns: Cant, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción, PAGO -DE ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHEMOC DELEGACION DEL CHANTE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" NO. CONTRATO GMJ04COP/2019 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$243.40 NETO A PAGAR \$56,224.47

Importe con letra: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, I.V.A., Total) and Amount (48,679.20, 7,788.67, 56,467.87)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000411623368
Folio fiscal: 2DDB3F68-6295-4C66-9013-ACEBC061E31E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 13 2019 - 10:54:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI


Z8FD9aanIO/JsUUA2xkQuoI5HjyxITlajfXagPr+O5gbJ2M4e4ott2xxzZOFu84GhioXVxy1CHdVIA12Z4dWA TSN7qBr7Z/d4owhMEH4JieEuvyGaURw855Fp868I3bGgXk2p1OgSALwG3VfVbKqK5Ftr+WlrETIMdag94M6L JBWijki4s2kBwCAtit0hBwEtPIZwX+cTuHHh2NScog1aSTG6LAlqsBrmU9mzVj+I2ixdcN3kx75ydkhWEGcCwB 9PjRkbaL5rJxg82OasifiDP2Ormhy6DcLhIAy+JkYCHK9TDy9UYugNwAI9pkFHuxMHijFVu+nNQu2owdDI7A==

Sello del SAT

VH9wVb3eOA9tNT16mZn9RXNTSsusiv3FVG1dQZvS4vN7E1gFntIiljClayHcTO7NKVohWMEZwvKp8OD y/k57qt85mKvXU/dqmbMJ/zS2j8bdRXE/FKE7PZCx0D1+X4X7IYKunNmVzJT1sJh8OvPOIjxhHfER6G 584Z2eQzq18wcm4PRU/i6osFTMy2I3Hk9qbM4EbsWWqaVQXTI2aSJigr3VmwouUgf7TsHSBdQ3ChdKOR gOEdMvKvfeAEurzaYwokZwtNQWoFo7nywxpsfDhx3VZ2mcYdnzk8yea+Wtms6WFLTLUXhZQfGBOvjBx 7hvisUBygMQEuj8yeT9Zg==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|2DDB3F68-6295-4C66-9013-ACEBC061E31E|2019-06-13T10:54:01|MAS0810247C0|Z8FD 9aanIO/JsUUA2xkQuoI5HjyxITlajfXagPr+O5gbJ2M4e4ott2xxzZOFu84GhioXVxy1CHdVIA12Z4d WATSN7qBr7Z/d4owhMEH4JieEuvyGaURw855Fp868I3bGgXk2p1OgSALwG3VfVbKqK5Ftr+WlrETIM dag94M6LJBWijki4s2kBwCAtit0hBwEtPIZwX+cTuHHh2NScog1aSTG6LAlqsBrmU9mzVj+I2ixdcN3k x75ydkhWEGcCwB9PjRkbaL5rJxg82OasifiDP2Ormhy6DcLhIAy+JkYCHK9TDy9UYugNwAI9pkFHuxMH ijFVu+nNQu2owdDI7A==|00001000000404486074||



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CPI1705153K5	CONSTRUCTORA PIMONT SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2DDB3F68-6295-4C66-9013-ACEBC061E31E	2019-06-13T10:53:56	2019-06-13T10:54:01	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$56,467.87	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Handwritten signature and official stamp of the Tax Authority of Jalisco.

Imprimir



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 004C OP/2019

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.

OBRA: "CONTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC DELEGACION DEL CHANTE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

UBICACIÓN: CALLE CUAUHTÉMOC DELEGACION DEL CHANTE

ESTIMACIÓN No. 2 (finiquito)  
BANQUETA



FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 03 AL 10 DE JUNIO DEL 2019

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS			IMPORTES	
1	PRELIMINARES			\$	-
2	FORMACIO DE BASES			\$	-
3	PAVIMENTOS			\$	46,560.00
4	COMPLEMENTARIOS			\$	2,119.20
				MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 48,679.20
				MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$ -
				SUBTOTAL	\$ 48,679.20
				I. V. A. 16%	\$ 7,788.67
				SUMA	\$ 56,467.87
				MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
				MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 243.40
				NETO A PAGAR	\$ 56,224.47
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:	
ASIGNACIÓN	\$	127,912.80	\$ 20,466.05	\$	148,378.85
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$	48,679.20	\$ 7,788.67	\$	56,467.87
ACUMULADO ANTERIOR	\$	79,233.60	\$ 12,677.38	\$	91,910.98
ACUMULADO A LA FECHA	\$	127,912.80	\$ 20,466.05	\$	148,378.85
SALDO POR EJERCER	\$	-	\$ -	\$	-
<b>SIN ANTICIPO</b>					
ANTICIPO %		\$ -	\$ -		
AMORTIZACIÓN		\$ -	\$ -		
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$	-	\$ -	\$	-
AMORTIZACIÓN A LA FECHA		\$ -	\$ -		
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$	-	\$ -	\$	-
				RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
				<i>Ram</i>	<i>[Signature]</i>
				C. RAFAEL ASCENCIO	CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.
				SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
				<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
				LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN	ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN: 2 (finiquito) No. DE CONTRATO: GMJ 004C 0P/2019  
 BANQUETA  
 PERÍODO DE TRABAJO: DEL 03 AL 10 DE JUNIO DEL 2019  
 OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC DELEGACION DEL CHANTE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"  
 UBICACIÓN: UBICACIÓN: CALLE CUAUHTÉMOC DELEGACION DEL CHANTE  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.  
 FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
<b>PRELIMINARES</b>												
1	TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	240.00	240.0000	0.00	240.00	0.00	\$9.70	\$ 2,328.00	\$ -	\$ 2,328.00	\$ -
<b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES</b>									\$ -			
<b>FORMACION DE BASES</b>												
2	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	24.00	24.0000	0.00	24.00	0.00	\$505.58	\$ 12,133.92	\$ -	\$ 12,133.92	\$ -
3	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	24.00	24.0000	0.00	24.00	0.00	\$758.82	\$ 18,211.68	\$ -	\$ 18,211.68	\$ -
<b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE FORMACION DE BASES</b>									\$ -			
<b>PAVIMENTOS</b>												
4	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM FC=150KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó	M2	240.00	120.0000	120.00	240.00	0.00	\$388.00	\$ 93,120.00	\$ 46,560.00	\$ 46,560.00	\$ -
<b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE FORMACION DE PAVIMENTOS</b>									\$ 46,560.00			
<b>COMPLEMENTARIOS</b>												
5	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	240.00	0.0000	240.0000	240.00	0.00	\$ 8.83	\$ 2,119.20	\$ 2,119.20	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS</b>									\$ 2,119.20			
<b>TOTAL</b>									\$ 127,912.80	\$ 48,679.20	\$ 79,233.60	\$ -
 CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV. CONTRATISTA			 LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN SUPERVISOR DEL MUNICIPIO					 ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				



FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019 HOJA 2 / 5

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC DELEGACION DEL CHANTE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"


LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL ESTIMACIÓN: 2 (finiquito)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 03 AL 10 DE JUNIO DEL 2019

**NUMEROS GENERADORES**

**CONCEPTO:** FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM F'C=150KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES

	LARGO	ANCHO	TOTAL
CADENAMIENTO 0+80.00 AL 0+150.00	70.00	1.5000	105.00
CADENAMIENTO 0+150.00 AL 0+160.00	10.00	1.5000	15.00

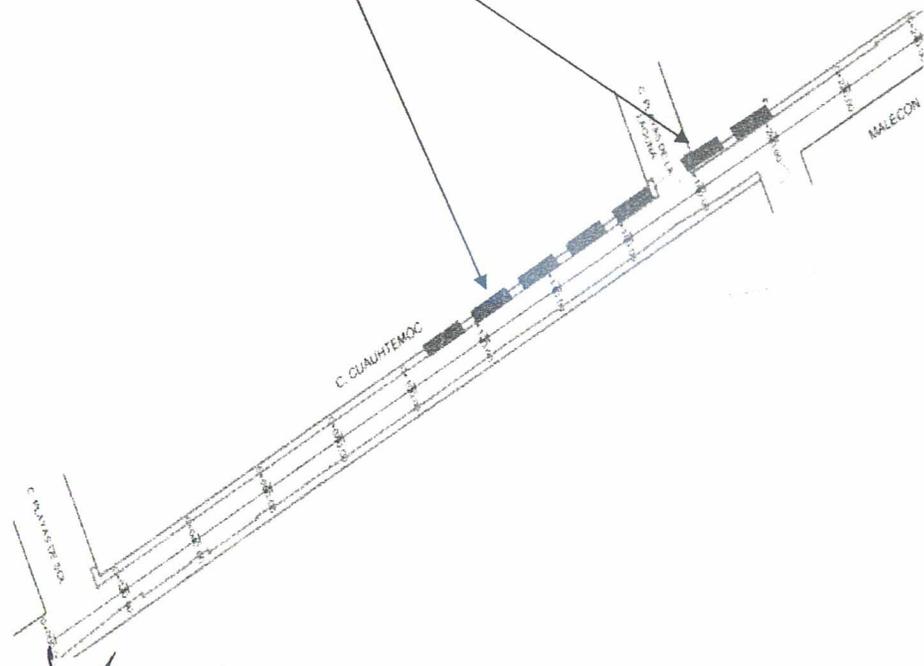

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO 	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN 	C. RAFAEL ASCENCIO 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

**TOTAL M2: 120.00**

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019

HOJA 2/5

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC DELEGACION DEL CHANTE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN: 2 (finiquito)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 03 AL 10 DE JUNIO DEL 2019

ARCHIVO FOTOGRAFICO

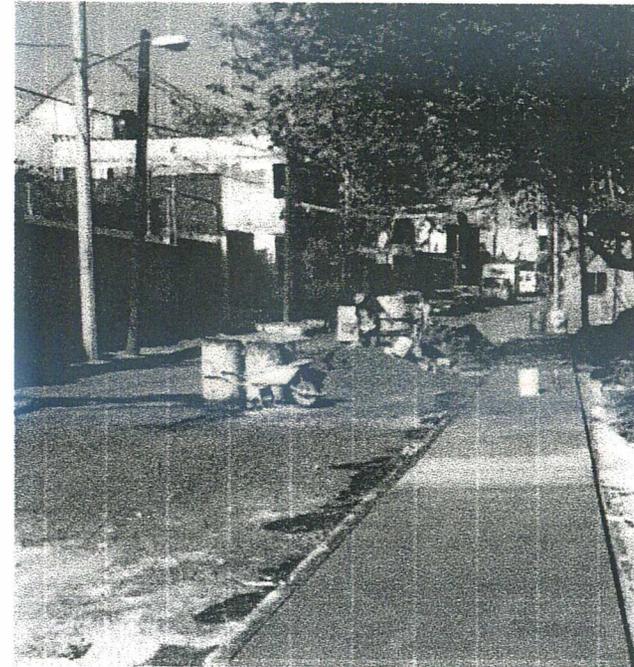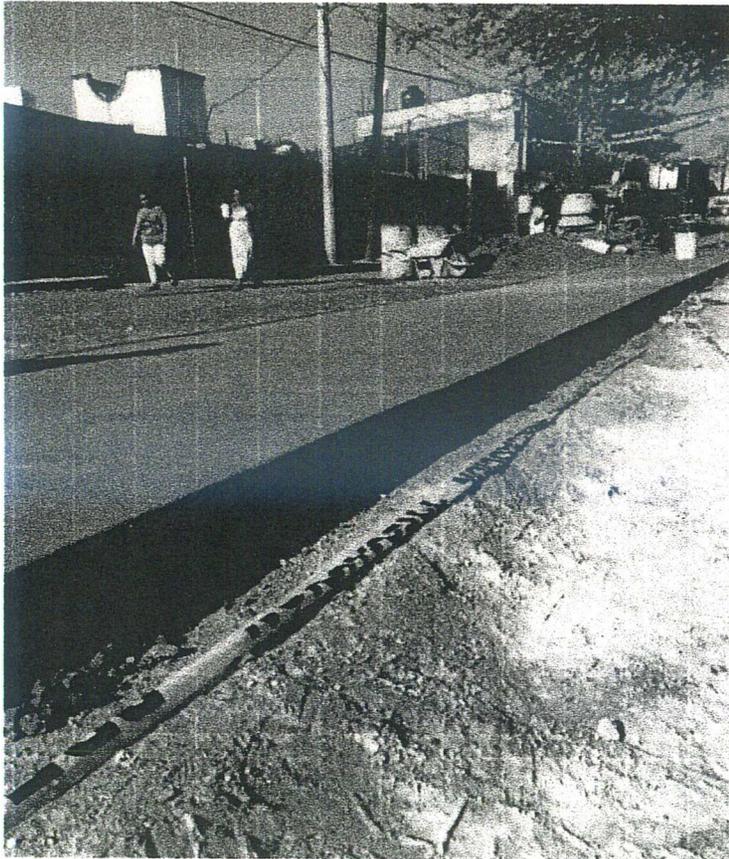

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

SUPERVISOR DE OBRA

C. RAFAEL ASCENCIO

RESIDENTE DE OBRA






FECHA:	13 DE JUNIO DEL 2019	HOJA 2 / 5
OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC DELEGACION DEL CHANTE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"	

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN: 2 (finiquito)
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 03 AL 10 DE JUNIO DEL 2019

**NUMEROS GENERADORES**

CONCEPTO: LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA

	LARGO	ANCHO	TOTAL
CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+160.00	160.00	1.5000	240.00

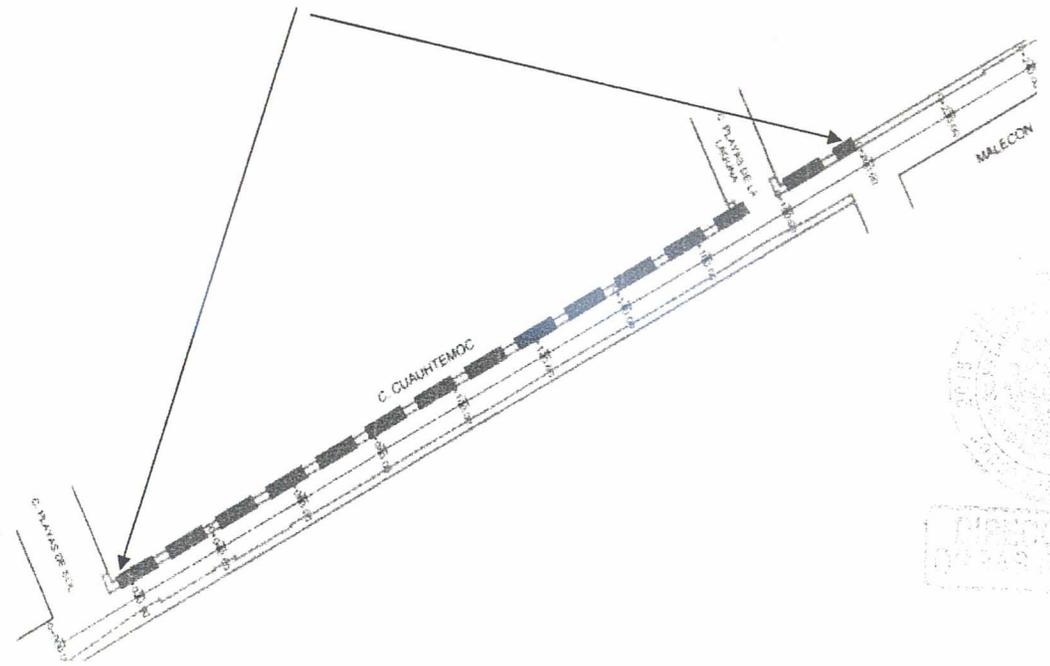

TOTAL M3: 240.00

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN	C. RAFAEL ASCENCIO
<i>Juan Manuel Garcia Escoto</i>	<i>Salvador Contreras Olguin</i>	<i>Rafael Ascencio</i>
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019

HOJA 2/5

OBRA: OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC DELEGACION DEL CHANTE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN: 2 (finiquito)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 03 AL 10 DE JUNIO DEL 2019

ARCHIVO FOTOGRAFICO

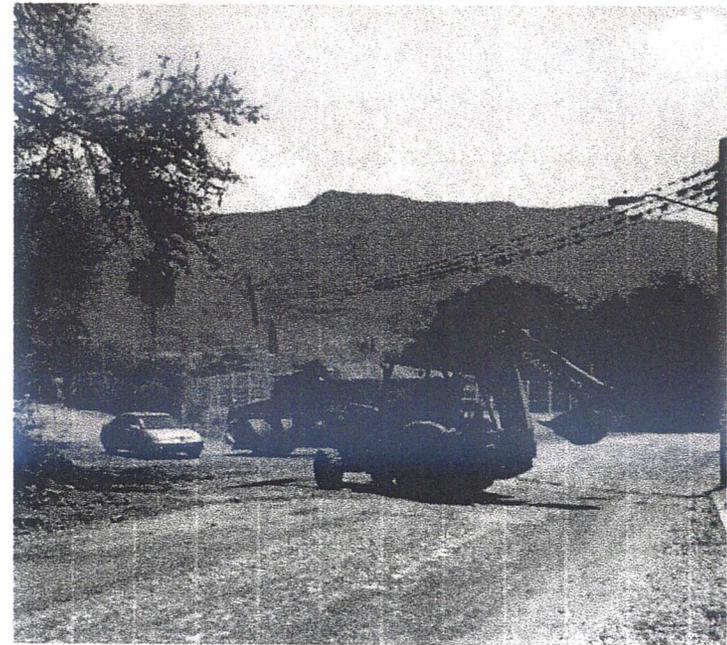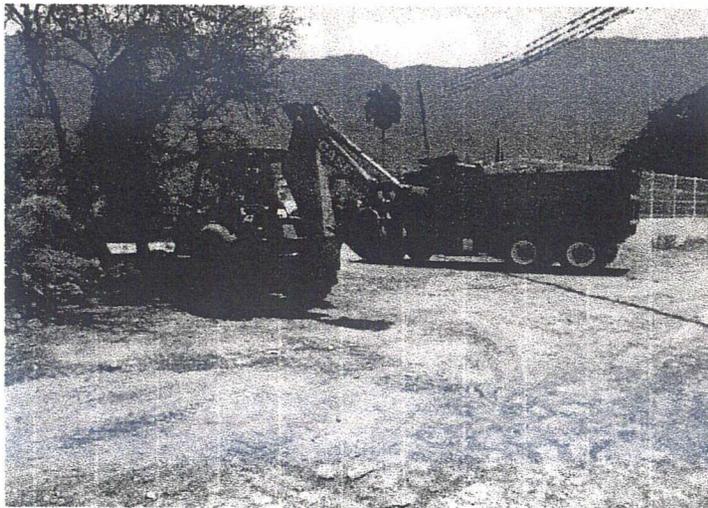

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

SUPERVISOR DE OBRA

C. RAFAEL ASCENCIO

RESIDENTE DE OBRA

