



CONSTRUCTORA PIMONT SA DE CV
 RFC: CPI1705153K5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45050
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
 Método de pago
 Moneda:

03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fecha
 Uso de
 CFDI:

- 1937
 20/11/2019 12:33:12
 I01 - Construcciones

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 R.F.C.: MJJ850101KPB
 Domicilio: Palacio Municipal No. S/N, Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Cant	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	PAGO DE ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS, DELEGACION DE CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" NO. CONTRATO GMJ031COP/2019 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$484.60 NETO A PAGAR \$111,942.38 -%	96,919.81	002 - IVA - 15,507.17	96,919.81

Importe con letra:

CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.

Subtotal	96,919.81
I.V.A.	15,507.17
Total	112,426.98

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000411623368
 Folio fiscal: 1107CB12-8B23-45C4-9872-230E42983B32
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2019 - 12:33:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hkdvjuvS1sg4OKwV5SPmVbtdTQfS8RERn34FDYVV592uVSiHLyrwL9ibSfaWQWrT9EnfJUIInrTVI4IVR2dj5so1f3i92JQewEAarxxcfesI10HgZxqLrAOyMAJeB2rcVxv4Y7DNks+1IXxGckAenVnRawvIB15DZRy89tvqitbHXf7PC/Ztftu30q3kHIB1/DTib893bYjCHRvMz5qsWxUk1gnc107cj9OD1YmArPh9GclMO9HmyEsYoy4G1pXlqCjmsOYtVq9AL7xHkFN9IYe4PJQyx3T6OSyN+QvYKInn0wyhsuhJwhT8HdmN11QuYWK5qjap8v1gmk/dXw==

Sello del SAT

XUyVskDGTNLWn3kdhOEem7iUnjhHWLIXzl6OG3cPHBJDW8XBnv6jD3HWjC6tesdg12KSvmQcUg0fxOs1BTvBNyJ8aBeHJgpSpQh6gfWCX1/4jHf0x+hxuk0hEI2f+IF0vNQSSJpDYVAm8IU6LoigFo7b1PCoYOsNEm/IdmsnSs5UPS494/HT8AIWRcyl8INz4bueCvWm9AeWcymuol/Xnj1fH+gwf8/xuAdeJ4dm5vnCaSvqAmwjeVJZP+faIUEVnJvRmNd/G1bw5g8aAow9GTUMsthrPpcrpUb5oJv9H3Aqe54dpfen1dKK4o06dfwGdW6stMq4PpxUY8hryB2DA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1107CB12-8B23-45C4-9872-230E42983B32|2019-11-20T12:33:15|MAS0810247C0|hkdvjuvS1sg4OKwV5SPmVbtdTQfS8RERn34FDYVV592uVSiHLyrwL9ibSfaWQWrT9EnfJUIInrTVI4IVR2dj5so1f3i92JQewEAarxxcfesI10HgZxqLrAOyMAJeB2rcVxv4Y7DNks+1IXxGckAenVnRawvIB15DZRy89tvqitbHXf7PC/Ztftu30q3kHIB1/DTib893bYjCHRvMz5qsWxUk1gnc107cj9OD1YmArPh9GclMO9HmyEsYoy4G1pXlqCjmsOYtVq9AL7xHkFN9IYe4PJQyx3T6OSyN+QvYKInn0wyhsuhJwhT8HdmN11QuYWK5qjap8v1gmk/dXw==|00001000000404486074||

[Handwritten Signature]
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 2 (DOS FINIQUITO)

No. DE CONTRATO: GMJ 031C 0P/2019

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 04 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC.

UBICACIÓN : UBICACIÓN: DELEGACIÓN DE CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

CONTRATISTA : CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.


FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES




ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
PRELIMINARES													
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.	M2	71.27	71.27	0.00	71.27	0.00	10.85	773.28	0.00	773.28	0.00	
2	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	632.02	7,584.24	0.00	7,584.24	0.00	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES										0.00			
CIMENTACION													
3	RENCRIDO (PEGADO PIEDRA POR PIEDRA) CON PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP 1:4 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	12.00	12.00	0.00	87.71	0.00	2,018.77	24,225.24	0.00	24,225.24	0.00	
SUBTOTAL ESTA DE CIMENTACION										0.00			
ALBAÑILERIA													
4	MAMPOSTEO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4 CON ROSTRO EN UNA CARA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	2,256.00	14,438.40	0.00	14,438.40	0.00	
5	MAMPOSTEO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4 CON ROSTRO EN DOS CARAS INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	2,322.95	7,433.44	0.00	7,433.44	0.00	
6	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON TABIQUE 5.5X11X22 CM PEGADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA Y LECHADEO CON CEMENTO-ARENA INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	743.56	33,460.20	0.00	33,460.20	0.00	
7	FABRICACION DE LOZA DE HORMIGON DE 5 CM PARA NIVELACION DE ENTREPISO CON LECHADEO CEMENTO-ARENA INCLUYE: REPELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	216.53	9,743.85	0.00	9,743.85	0.00	
8	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	12.88	0.00	12.88	12.88	0.00	577.29	7,435.50	7,435.50	0.00	0.00	



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

9	FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10CM F'c=200KG/CM2 TERMINADO ESTAMPADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	121.27	0.00	0.00	0.00	121.27	574.16	69,628.38	0.00	0.00	69,628.38
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE ALBAÑILERIA										7,435.50		
VIGUERIA												
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPS 8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	ML	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	1,317.27	79,036.20	0.00	79,036.20	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE VIGUERIA										0.00		
EQUIPAMIENTO												
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL METALICO DE 15MTS Y 90CM DE ALTURA CON TUBULAR DE 1.5"X1.5", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6,795.99	13,591.98	0.00	0.00	13,591.98
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EQUIPAMIENTO										0.00		
COMPLEMENTARIOS												
12	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	71.27	0.00	71.27	0.00	0.00	12.57	895.66	895.66	0.00	0.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA 120x90 CMS, INCLUYE: SUMINISTROS, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	598.30	598.30	0.00	0.00	598.30
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS										895.88		
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO												
14	FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO APALILLADO, ESCOBIADO DE 10CM F'c=150KG/CM2 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	0.00	0.00	121.27	121.27	0.00	398.70	0.00	48,350.35	0.00	0.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL METALICO DE 15MTS Y 90CM DE ALTURA CON TUBULAR DE 2.0"X2.0", CED. 30 INCLUYE: PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	PZA	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	12,379.50	0.00	24,759.00	0.00	0.00
16	EXCAVACION CON MAQUINA PARA DESAZOLVE DE ARROYO PLUVIAL EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DEPOSITADO AL 1ER. KM., HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION.	M3	0.00	0.00	81.90	81.90	0.00	189.00	0.00	15,479.10	0.00	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO										88,588.45		
								TOTAL:	# 268,844.87	96,919.81	176,694.85	83,818.66
 CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV. CONTRATISTA			 LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN SUPERVISOR DEL MUNICIPIO					 ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC.
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 031C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 04 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019		2 (DOS FINIQUITO)
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 8-13


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
8	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION									
			RAMPAS		9	2.55	0.30		6.885	
			BANQUETAS		50	1.20	0.10		6	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									12.89	M3

CROQUIS:



FOTOGRAFIAS:

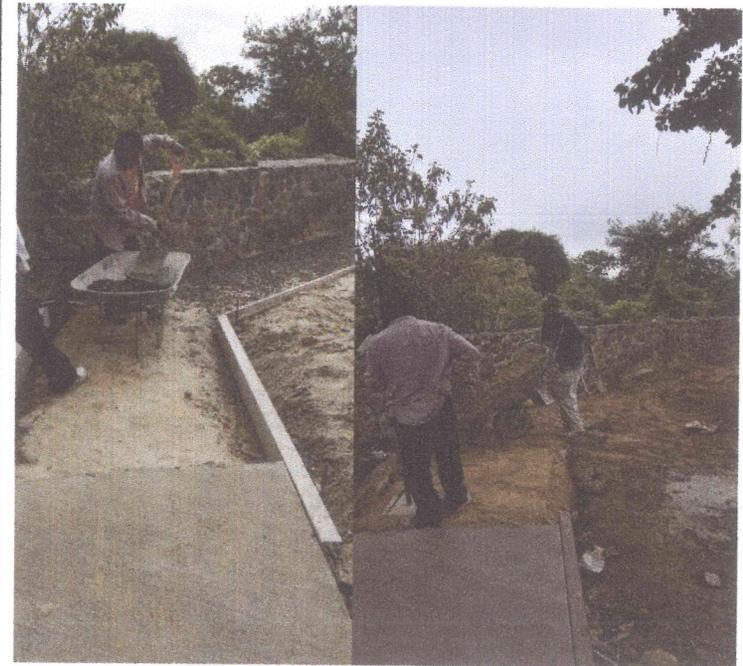

RESIDENETE DE OBRA:

RAFAEL ASENCIO.

R.

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

S. Olguin




MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC.	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 031C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 04 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019		2 (DOS FINIQUITO)
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 12-16

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
12	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	BANQUETA DE 3.00 MTS			15	3			45	
		RAMPA			8.757	3			26.271	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:								71.271	M2	

CROQUIS:

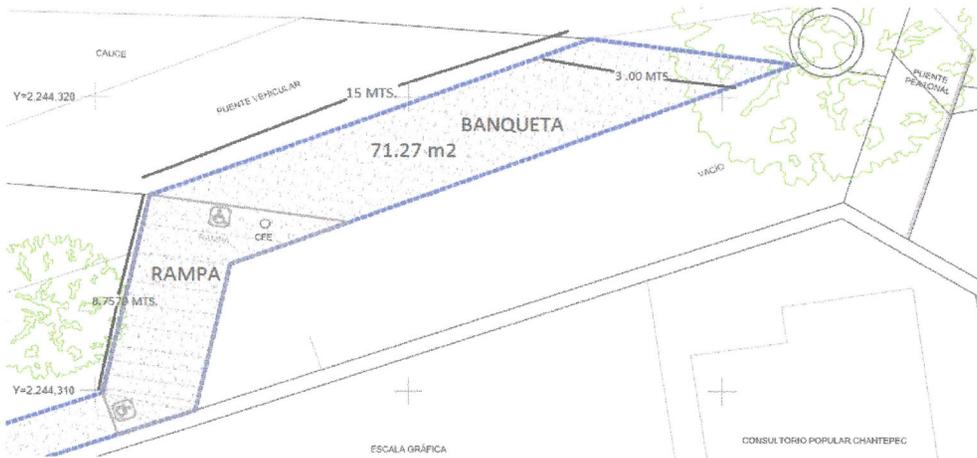

FOTOGRAFÍAS:



RESIDENTE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN






MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC.	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 031C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 04 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019		2 (DOS FINIQUITO)
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 14-16


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
14	FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO APALILLADO, ESCOBIADO DE 10CM F'C=150KG/CM2 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	BANQUETA DE 3.00 MTS			15	3.00		1	45	
		BANQUETA DE 1.20 MTS			50	1.20			60	
		RAMPAS			7	2.32			16.24	
							TOTAL DE ESTE CONCEPTO:		121.24	

CROQUIS:

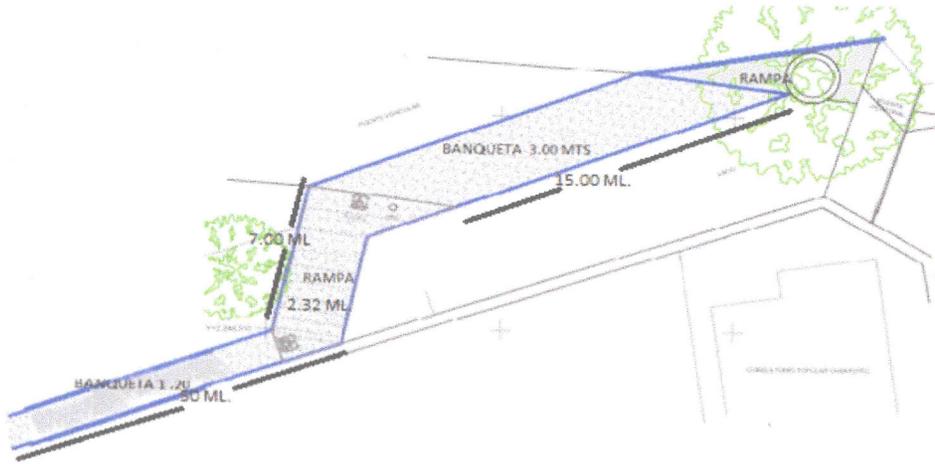

FOTOGRAFIAS:

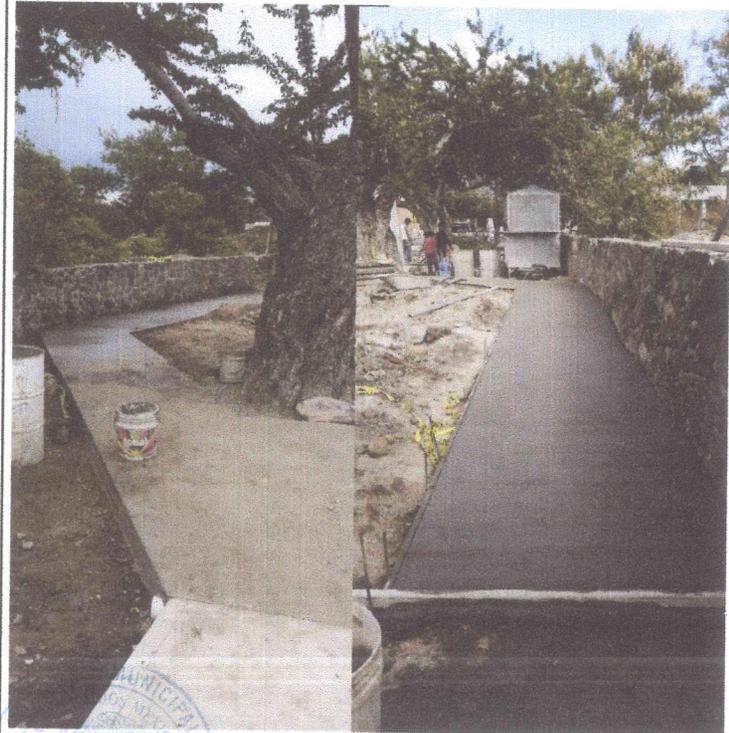

RESIDENETE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN




MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC.
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 031C 0P/2019

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.	No. DE ESTIMACION:
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	2 (DOS FINIQUITO)
DEL 04 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGINA: 15-16
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL METALICO DE 15MTS Y 90CM DE ALTURA CON TUBULAR DE 2.0"X2.0", CED. 30 INCLUYE: PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SUPERVISION.			BARANDAL	15			2	0	
									0	
									0	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									2.00	PZA

CROQUIS:

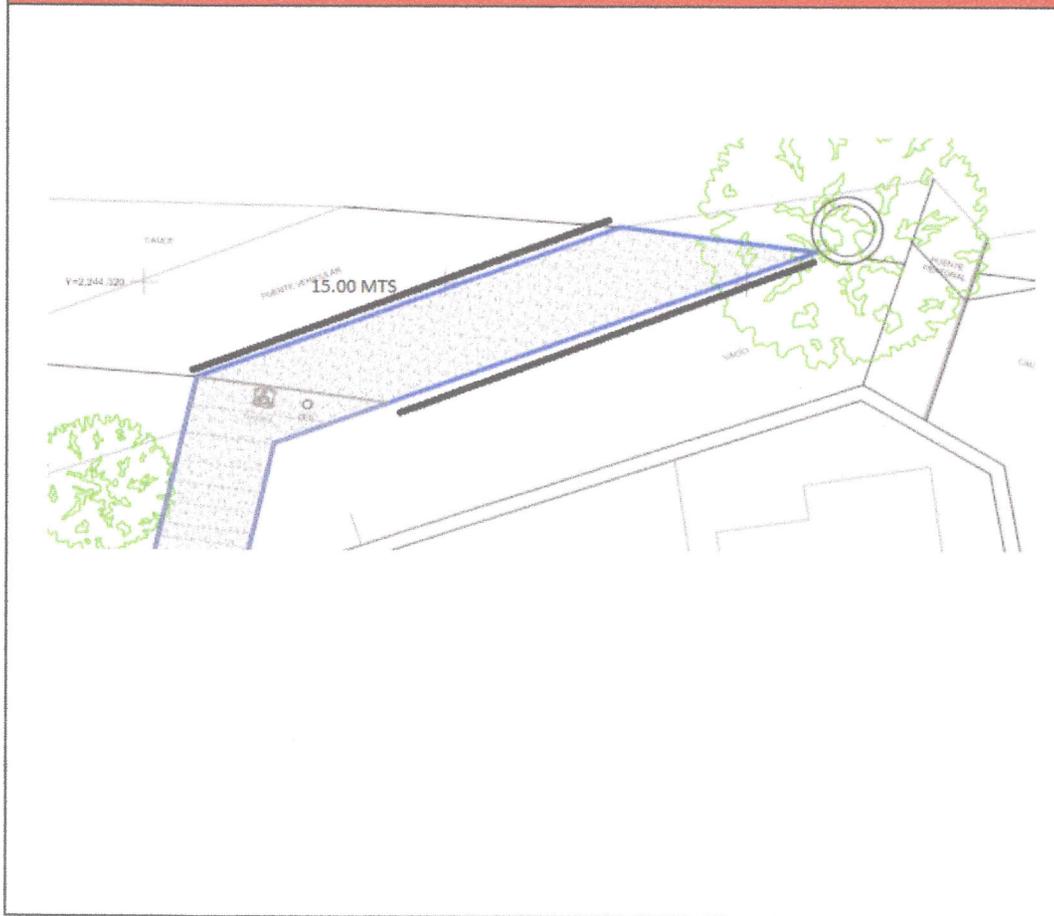

FOTOGRAFIAS:



RESIDENETE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO .

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN





	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.	NÚMEROS GENERADORES No. DE ESTIMACION: 2 (DOS FINIQUITO)
	LOCALIDAD:	SAN JUAN COSALA		
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 04 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC.		FECHA:	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 031C 0P/2019		PAGINA: 16-16	


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	1.3 ABUN	TOTAL	ONSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						
16	EXCAVACION CON MAQUINA PARA DESAZOLVE DE ARROYO PLUVIAL EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DEPOSITADO AL 1ER, KM., HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION.								0	
			BARANDAL		6	15.00	0.70	1.3	81.90	
										0
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									81.90	M3

CROQUIS:

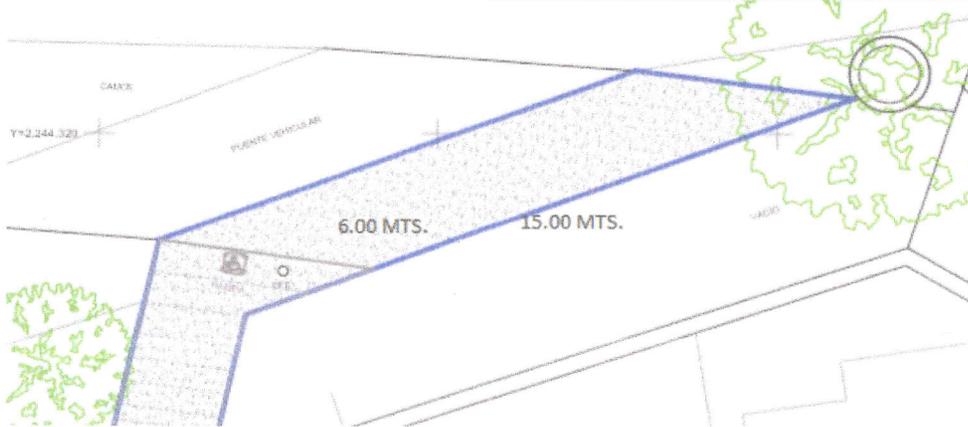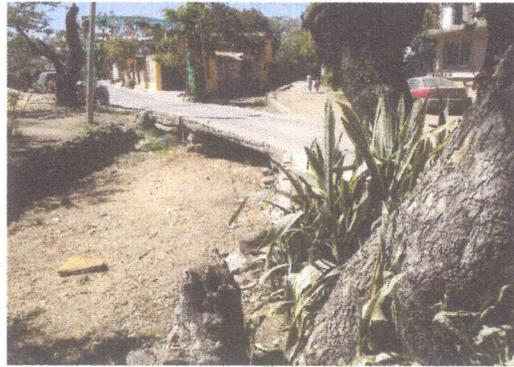

FOTOGRAFIAS:

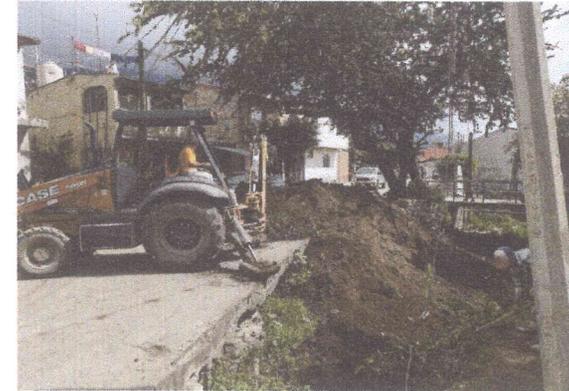

RESIDENTE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN

