

RFC emisor: MAG150311Q80
Nombre emisor: MAGUCE SA DE CV
Folio: 174
RFC receptor: MJJ850101KP8
Nombre receptor: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Uso CFDI: Construcciones

Folio fiscal: 23C5CC82-6FA7-4F3D-847E-68C250E3BE83
No. de serie del CSD: 00001000000307110458
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 45402 2018-08-22 18:39:26
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72153900		1	E48	PAGO	169702.45	169702.45				
Descripción	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO DEL CONTRATO No. GMJ 06C OP/2018 REFERENTE A LA OBRA DE: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETE RA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA , DEL MUNICIPIO DE JOCOTEP EC, JALISCO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	169702.45	Tasa	16.0000%	27152.39

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: EFECTIVO

Subtotal \$ 169,702.45
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 27,152.39
Total \$ 196,854.84

Legenda fiscal

Legenda fiscal: NETO A FACTURAR \$ 196,854.84 MENOS RETENCION DEL 5 AL MILLAR \$ 848.51; NETO A PAGAR \$ 196,006.33

Sello digital del CFDI:

TGeC7wLRLrsGgkwFg/1Lyjzk5ILrJYZv308nx2R9vQKGldFHw4OaaK5QDsMqPobQsQdewgSa+ISgY3WAZCJ0NbVT0zfLih8fRUA0TxM1Agk7icDW5qVheQZC93aHhigpwjnybZwdNttgzEog5uVuU2AnTYPkDsK5fq8M9+P0s=

Sello digital del SAT:

A5gcmQ7EnaDJ1qS1PQlrRZvSISBTTbK4b4mTF5uDSnVLhxmRtiDVo00FLFOYFUGT7YN2fpektKVmMc7MuP/0SrGnM5aJYxxJPYcsaHZtqQQwgGFlc51djYBdQPQJFyvQQdXPM6j+rGqMNSITVF0qkgpbkl0ICG1nL926+8yFodY2IP04NPCLmhGdb0FR3k3KS0jsBNuaQ9Refmh1nrigA5E2z7WQPTIYs8jpl8e+HeqlaWkkRqrXabrAVHjt8rDrmZGYIZgU5IPvtlpABwzCdiEIN3cbMkITSBvUSvwdqjRAzW4EnYkGCqF89YDnHU3HySlkZxXQvmC6llw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23C5CC82-6FA7-4F3D-847E-68C250E3BE83|2018-08-22T18:45:50|SAT970701NN3|TGeC7wLRLrsGgkwFg/1Lyjzk5ILrJYZv308nx2R9vQKGldFHw4OaaK5QDsMqPobQsQdewgSa+ISgY3WAZCJ0NbVT0zfLih8fRUA0TxM1Agk7icDW5qVheQZC93aHhigpwjnybZwdNttgzEog5uVuU2AnTYPkDsK5fq8M9+P0s=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-08-22 18:45:50


No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAG150311Q80	MAGUCE SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
23C5CC82-6FA7-4F3D-847E-68C250E3BE83	2018-08-22T18:39:26	2018-08-22T18:45:50	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$196,854.84	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO		No. DE CONTRATO:		GMJ 06C OP/2018		HOJA DE RELACIÓN		HOJA No. 1 DE 1	
CONTRATISTA:		MAGUCE S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN No.		2 (DOS Y FINIQUITO)		PERÍODO DE TRABAJO:	
OBRA:		"REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"		UBICACIÓN:		CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO.		MAGUCE	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		DEL:		03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018		FECHA:		03 DE AGOSTO DEL 2018	

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN	
P A R T I D A S	
I M P O R T E S	

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	892.68	
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	3,716.84	
INSTALACION DE TUBERIA	21,314.86	
REPOSICION DE EMPEDADO	140,648.52	
COMPLEMENTARIOS	3,129.55	
	\$ 169,702.45	

ESTIMACION No. 2 (DOS Y FINIQUITO)		\$ 169,702.45
MONTOS DE ESTIMACIÓN		
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %		\$ 169,702.45
SUBTOTAL.		\$ 27,152.39
I. V. A. 16%		\$ 196,854.84
SUMA		\$ 848.51
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)		\$ 196,006.33
MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)		
NETO A PAGAR		

EL REPRESENTANTE LEGAL			
ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ		EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO			
ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ		ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO

ESTIMACION No.

2 (Y FINIQUITO) No. DE CONTRATO: GMJ 06C OP/2018

PERIODO:
OBRA :

03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018



MAGUCE

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

"REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JUCOTEPEC, JALISCO"


UBICACION: CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA, JUCOTEPEC, JALISCO.

CONTRATISTA: MAGUCE S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL		SALDO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL, EN SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC.											
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES											
1	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B"	M3	69.43	69.430	5.88	75.31	\$34.27	\$2,379.37	\$201.51	\$2,379.37	-\$201.51
2	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	98.39	98.392	0.00	98.39	\$11.46	\$1,127.57	\$0.00	\$1,127.57	\$0.00
3	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	M3	90.26	90.259	7.64	97.90	\$90.42	\$8,161.24	\$691.17	\$8,161.24	-\$691.17
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES											
4	TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	ML	140.56	140.56	12.00	152.56	\$10.97	\$1,541.94	\$131.64	\$1,541.94	-\$131.64
5	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	98.39	98.39	8.40	106.79	\$55.41	\$5,451.90	\$465.44	\$5,451.90	-\$465.44
6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	140.56	140.56	12.00	152.56	\$85.68	\$12,043.18	\$1,028.16	\$12,043.18	-\$1,023.16
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	39.91	39.91	4.20	44.11	\$498.00	\$19,876.47	\$2,091.60	\$19,876.47	-\$2,091.60
INSTALACION DE TUBERIA											
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	140.56	140.56	12.00	152.56	\$136.72	\$19,217.36	\$1,640.64	\$19,217.36	-\$1,640.64
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	13.00	13.00	1.00	14.00	\$1,375.00	\$17,875.00	\$1,375.00	\$17,875.00	-\$1,375.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	2.00	2.00	2.00	\$3,219.44	\$6,438.88	\$6,438.88	\$0.00	\$0.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No.
PERÍODO:
OBRA:

2 (DOS Y FINIQUITO) No. DE CONTRATO: GMJ 06C OP/2018
01 JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018
"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEÓN, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

MAGLUCÉ

UBICACIÓN:
CONTRATISTA:
FECHA:

CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO.
MAGLUCÉ S.A. DE C.V.
03 DE AGOSTO DEL 2018

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				IMPORTES					
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
11	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. PZA		2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	\$5,870.64	\$11,741.28	\$5,870.64	\$0.00	\$5,870.64
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FoFo PARA CAJA DE VALVULAS INC. PZA		2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$2,994.85	\$5,989.70	\$5,989.70	\$0.00	\$0.00
REPOSICION DE EMPEDRADO												
13	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION.	M3	98.39	98.39	0.000	98.39	0.00	\$224.11	\$22,051.02	\$0.00	\$22,051.02	\$0.00
14	EXCAVACION EN CAJON DE 0.00 CMS A 0.80 CMS PROFUNDIDAD MINIMA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN ANCHOR VARIABLE, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, EQUIPO Y MAQUINARIA.	M3	98.39	98.39	0.000	98.39	0.00	\$171.46	\$16,870.59	\$0.00	\$16,870.59	\$0.00
15	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR	M3	98.39	0.00	98.38	98.38	0.01	\$514.91	\$50,663.91	\$50,666.33	\$0.00	\$7.58
16	FABRICACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA Y TEPETATE, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	491.97	0.00	491.90	491.90	0.07	\$182.95	\$90,005.65	\$89,992.19	\$0.00	\$13.46
COMPLEMENTARIOS												
17	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	491.97	0.00	316.60	316.60	175.37	\$9.88	\$4,863.04	\$3,129.55	\$0.00	\$1,733.49
						SUBTOT.			\$ 296,298.10	\$ 169,702.45	\$ 126,595.65	\$ 0.00
						IVA			\$ 47,407.70	\$ 27,152.39	\$ 20,255.30	\$ 0.00
						TOTAL			\$ 343,705.80	\$ 196,854.84	\$ 146,850.96	\$ 0.00



ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: MAGUCE S.A. DE C.V.	FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2018
OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"	
LOCALIDAD: CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA. JOCOTEPEC, JALISCO.	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018

NUMEROS GENERADORES

1 EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B"

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO PROM.	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	LINEA PRIV. CARDENAL	12.0000	0.7000	0.7000	1.0000	5.88
					SUMA	5.88

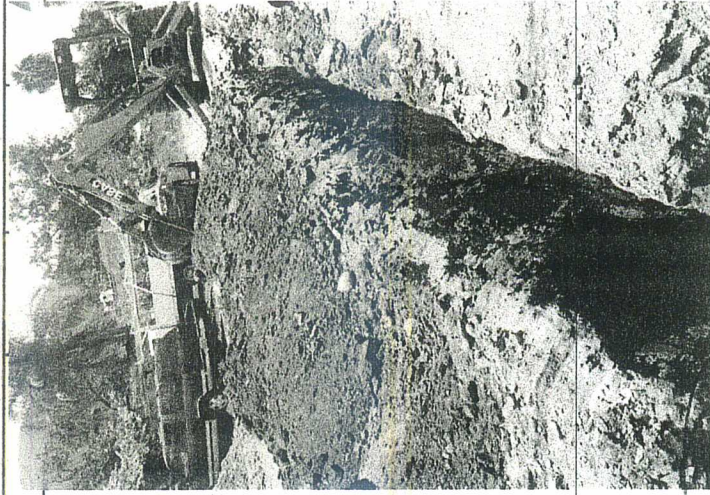

EXCAVACIÓN

CALLE PRIV.

12.00

$$\begin{array}{l} H=0.70 \\ A=0.70 \end{array}$$

PANTEON

C. CARDENAL



ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ
EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: MAGUCE S.A. DE C.V.

FECHA:

03 DE AGOSTO DEL 2018

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018



MAGUCE

NUMEROS GENERADORES

3 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO PROM.	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	LINEA PRIV. CARDENAL	12.0000	0.7000	0.7000	1.0000	5.88
					ABUNDAMIENTO 30%	1.76
		ABUNDAMIENTO 30% VOL=5.88 X 1.3= 7.64 M3				SUMA 7.64



ACARREO

CALLE PRIV.

PANTEON

C. CARDENAL

H=0.70
A=0.70



ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: MAGUCE S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2018

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018




NUMEROS GENERADORES

4 TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO PROM.	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
ML	LINEA PRIV. CARDENAL	12.0000			1.0000	12.00
					SUMA	12.00




TRAZO Y NIVELACIÓN

PANTEON

CALLE PRIV.

12.00

C. CARDENAL

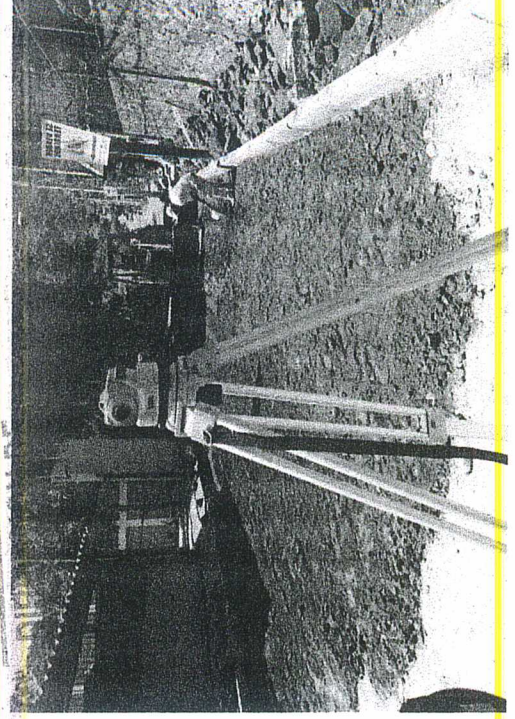

ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

EMPRESA: MAGUCE S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2018

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA. JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018




MAGUCE

NUMEROS GENERADORES

5 PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

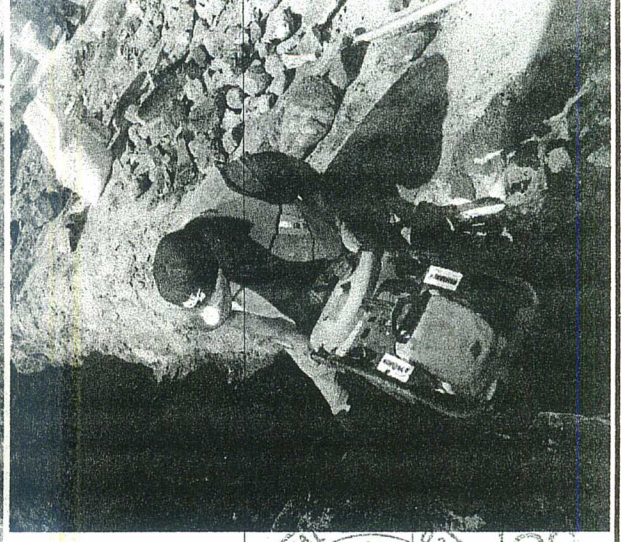

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO PROM.	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M2	LINEA PRIV. CARDENAL	12.00	0.70	0.00	1.00	8.40
					SUMA	8.40

ACOSTILLADO

CALLE PRIV.



PANTEON

C. CARDENAL



ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ
EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



EMPRESA: MAGUCE S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2018

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRAMENTO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA. JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018




NUMEROS GENERADORES

6 ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO PROM.	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
ML	LINEA PRIV. CARDENAL	12.00	0.20	0.00	1.00	12.00
					SUMA	12.00

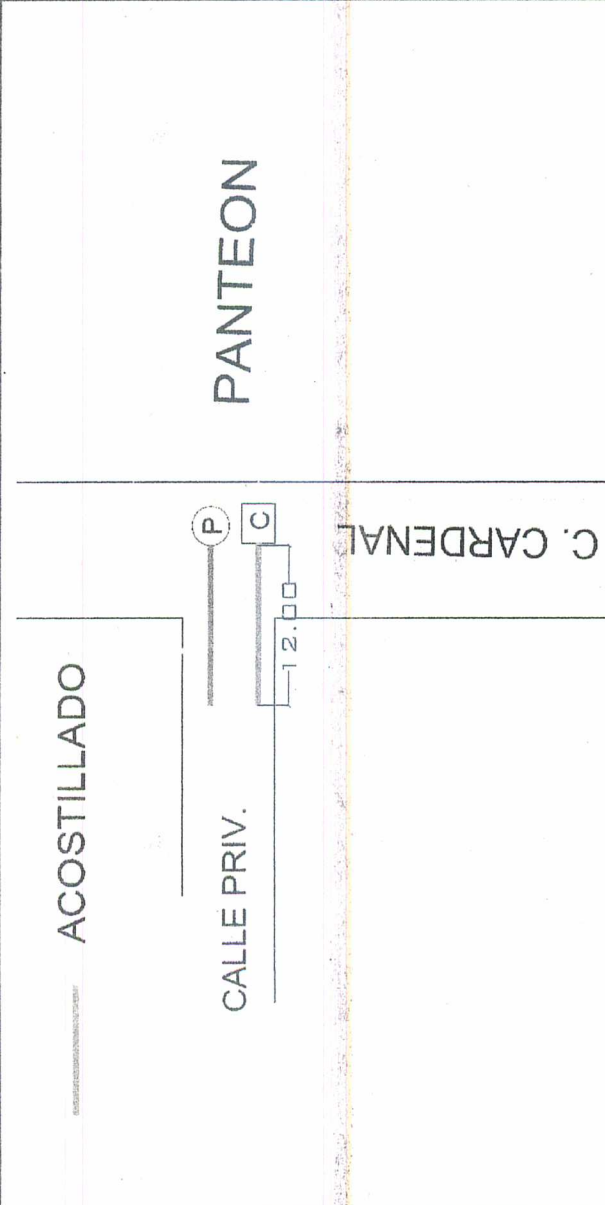

ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ
EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: MAGUCE S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2018

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018



NUMEROS GENERADORES

7 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO PROM.	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	LINEA PRIV. CARDENAL	12.0000	0.7000	0.5000	1.0000	4.20
					SUMA	4.20

RELLENO

CALLE PRIV.

P

C


12.00

H=0.50

A=0.70

PANTEON

C. CARDENAL

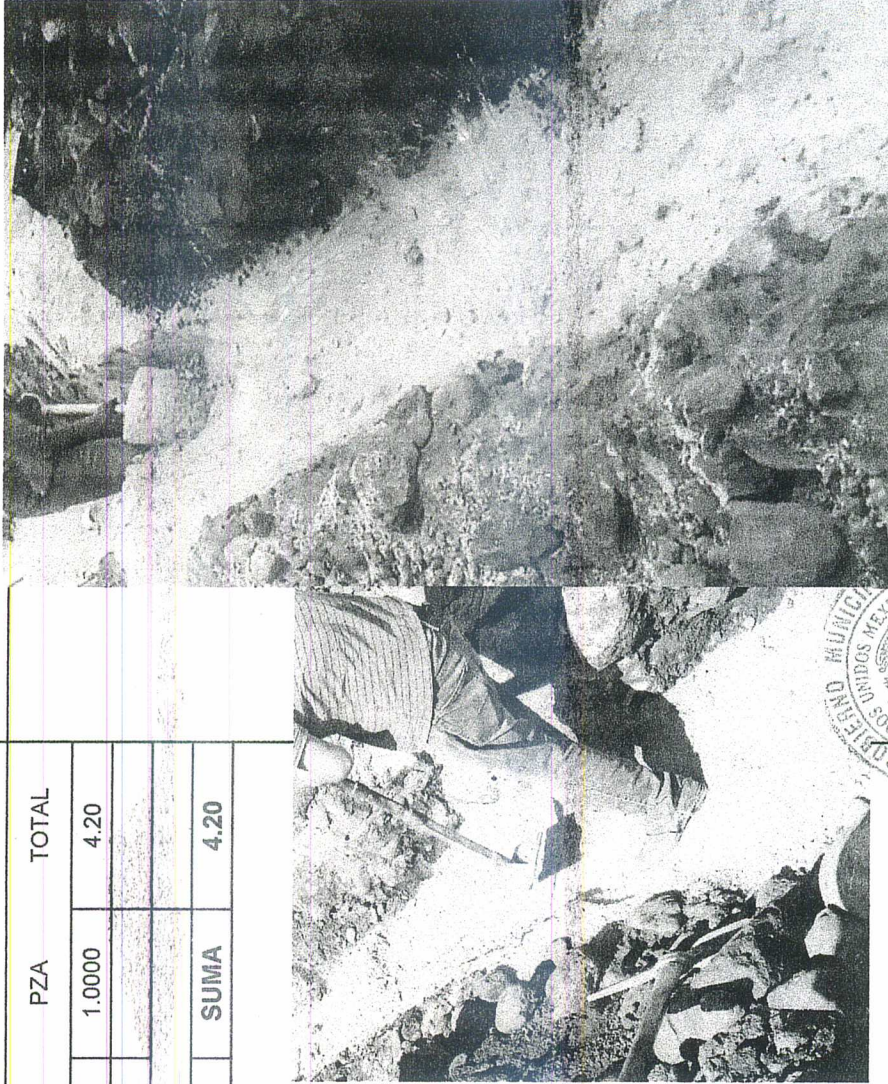

ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: MAGUCE S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2018

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA. JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018

MAGUCE

NUMEROS GENERADORES

8

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD

CADENAMIENTO

LARGO
PROM.

ANCHO

ALTO

PZA

TOTAL

ML

LINEA PRIV. CARDENAL

12.0000

0.0000

0.0000

1.0000

12.00

SUMA


12.00

TUBO PVC
RD-26 DE 3"

PANTEON

CALLE PRIV.

C. CARDENAL

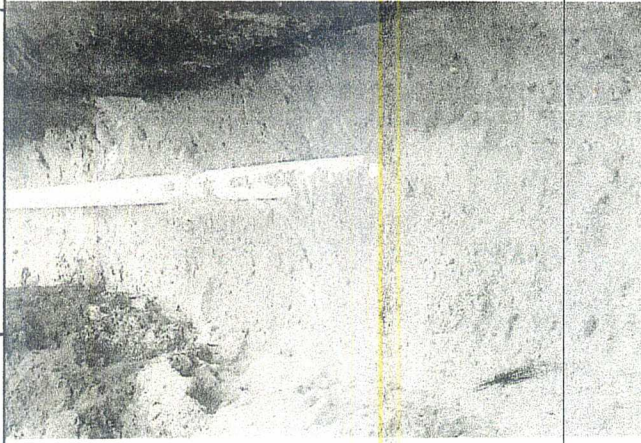

ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

EMPRESA: MAGUCE S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2018

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA. JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018



MAGUCE

NUMEROS GENERADORES

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
PZA	LINEA DE AGUA POTABLE				1.0000	1.00
					SUMA	1.00

TOMA

DOMICILIARIA

1 PZA

CALLE PRIV.

PANTEON

TOTAL 14 PZAS

C. CARDENAL



ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: MAGUCE S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2018

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA. JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018




MAGUCE

NUMEROS GENERADORES

10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" INC.
HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
PZA	LINEA DE AGUA POTABLE				2.0000	2.00
					SUMA	2.00

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

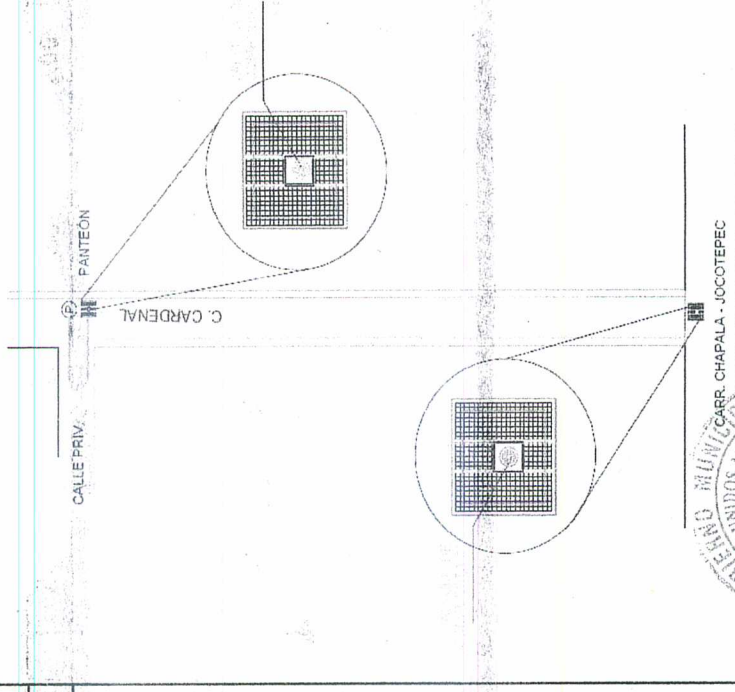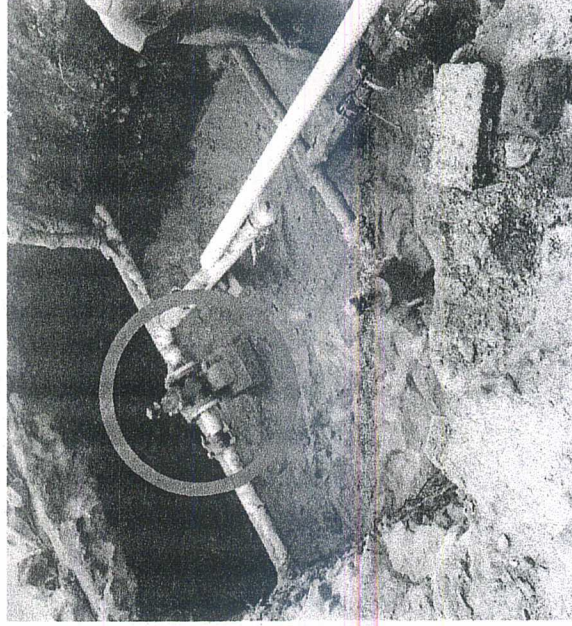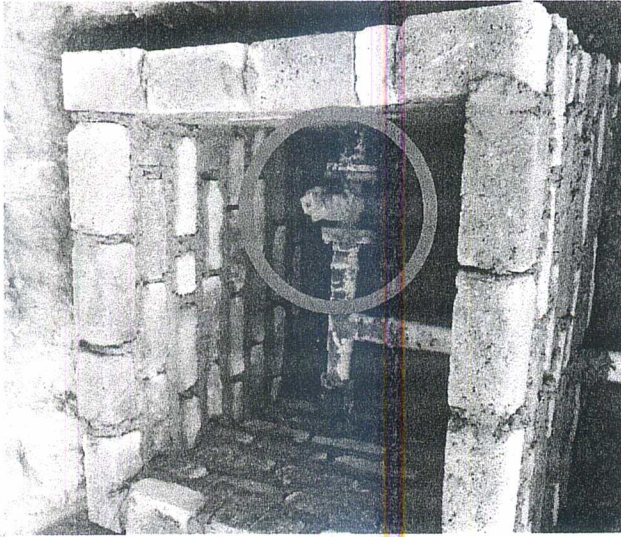VALVULA EN CAJA EXISTENTE SOBRE CARRETERA
VALVULA EN CAJA NUEVA EN DISPARO DE PRIVADA.

ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: MAGUCE S.A. DE C.V.

FECHA:

03 DE AGOSTO DEL 2018

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA. JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018



MAGUCE

NUMEROS GENERADORES

UNIDAD	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA				
	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
PZA	LINEA DE AGUA POTABLE				1.0000
					SUMA 1.00

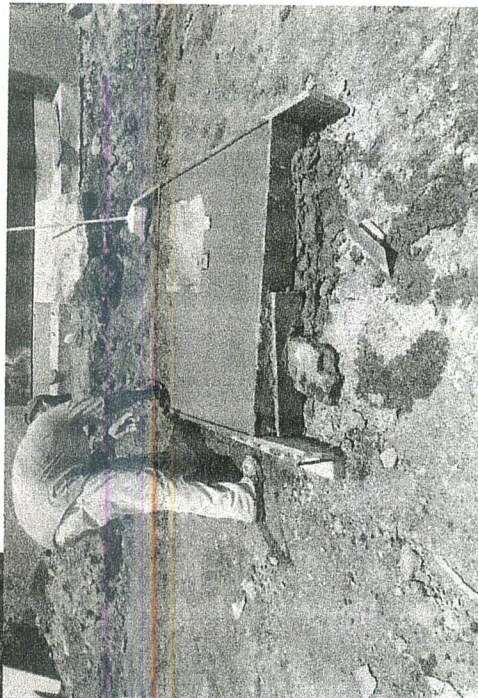

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

VALVULA EN CAJA NUEVA EN DISPARO DE PRIVADA.

CALLE PRIV.

PANTEÓN

C. CARDENAL

CAJA DE VALVULA
1 PZA

ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ

EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: **MAGUCE S.A. DE C.V.**

FECHA: **03 DE AGOSTO DEL 2018**

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: **CALLE CARDENAL NORTE, SAN JUAN COSALA. JOCOTEPEC, JALISCO.**

MUNICIPIO: **JOCOTEPEC, JALISCO**

ESTIMACIÓN No. **2 (DOS Y FINIQUITO)**

PERIODO: **03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018**




MAGUCE

NUMEROS GENERADORES

17 LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M2	CALLE CARDENAL SUR	76.5000	6.4300	1.00	1.00	491.90
					SUMA	491.90
	POR AJUSTE DE CONTRATO SE COBRAN:					316.60

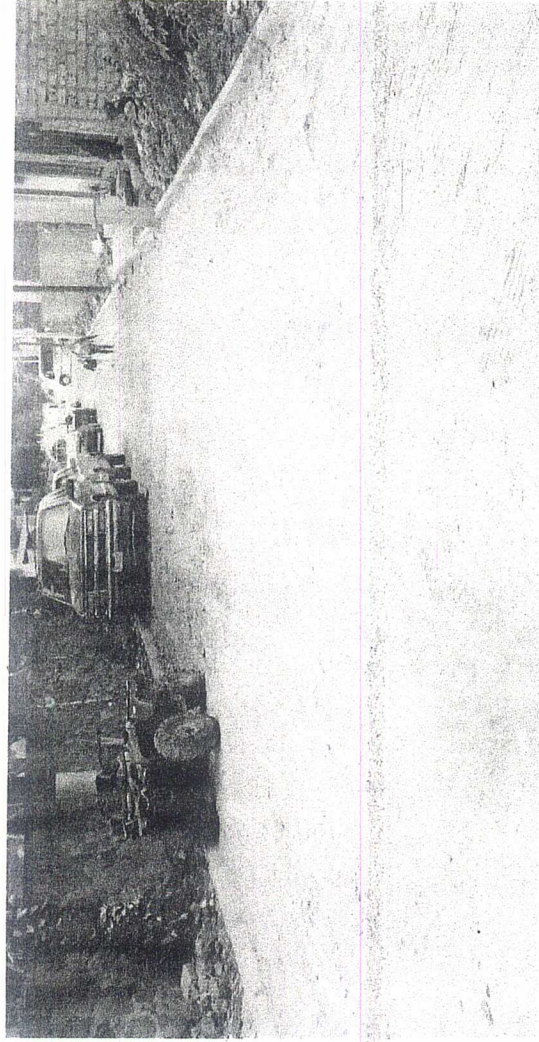

CALLE PRIV.

PANTEÓN

C. CARDENAL

6.30 M ANCHO
76.00 MTS

6.40 M ANCHO
76.00 MTS

6.57 M ANCHO
76.00 MTS

6.55 M ANCHO
76.00 MTS

6.50 M ANCHO
76.00 MTS

6.56 M ANCHO
76.00 MTS

LIMPIEZA

76.50

6.43

CARR. CHAPALA - JOCOTEPEC

ING. MACIEL MOQUEDA GONZALEZ
EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
