



NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO

JOSE GARCIA 5
 Colonia: LAS PINTAS C.P.:45690
 EL SALTO, JALISCO. MEXICO
 R.F.C.: DOCN880311AK3
 Tels.:

El Salto, Jalisco a 5 de septiembre de 2018 Hora : 08:37:54 am
 Regimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Metodo de Pago:
 PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago:
 99 Por definir
 Folio Fiscal SAT:
 D8EC8262-1409-49FD-801C-ECDC87D7123B
 Condiciones de pago:

Factura No.
D107
No. de Certificado Emisor
00001000000307045355
No. de Certificado del SAT
00001000000405607284
Fecha Hora de Certificación
2018-09-05T10:15:54

Tipo de Comprobante: Ingreso
 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

R.F.C.: MJJ850101KP8
 PALACIO MUNICIPAL Interior: S/N
 COL. CENTRO C.P.:45800
 JOCOTEPEC JALISCO. MEXICO
 Uso CFDi: I01 Construcciones

ClaveProdServ	Cantidad	U. SAT	Unidad	Descripción	Precio	Importe
72141121	1.00	E48		ESTIMACION N°: 1 (UNICA) Y FINIQUITO	355,458.59	355,458.59
				Impuesto: 002 IVA		
				Base: 355,458.59 Tipo factor: Tasa Tasa: 0.160000		Importe: 56,873.37
				PERIODO: 10 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018		
				OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE		
				CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION		
				DE EMPEDRADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA		
				DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		
				NUMERO DE CONTRATO: GMJ 31 COP/2018 PROGRAMA RAMO-33/2018		
				UBICACION: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		
				CONTRATISTA: NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO		

Importe con Letra

(CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 96/100 M.N.)

Sub-Total:	355,458.59
I.V.A.:	56,873.37
TOTAL:	412,331.96



Sello Digital del Emisor

BnQfHI3AMd9zaPxRKNWbbA7DZEJtdMGMZbNHh/UWfZxsibVJa5OOMh3TBNLuCyoLXNs70t/BGOpn65en+LiFw1At
 nPkSpYoLyMYZKSCjSvsF0+Qe51EsZ0d2xfCSLQ8czl3VskUoE4Bg5ZdR9UA6Fvqbl+cYx5Qlo2pKRRHr8=

Sello Digital del SAT

cM4ZCkC51TCBEPQILp6AFqKwytrzihvSDJP2yTsO1VWrt3Cc8QJq7KO8KO4Lio677mAgKrZYyTe8kQgxtqUrEXciV
 p5Yt1OzDEXJRK0kjbTIAWjoRbnxYiyJ7gaUcMhUTlrxcYxglOSIWm39Yu5i7LPQqGH2QeaRTJ72xdHKepOwB46cXKXOaqA5KyNcCFKY
 7Dj6yjkadBR2yfUSXUCzl2mBFQDzTAiUdJmR3ev/X0U4LhvtGunqPjxSViO3gSLu6FNrNmDA/LhpULbVdlwaC2mq/cfXOnGqXjwTXyGWni
 i5EtIhriB+IXHlu6fJ2iOow9VgngIJW6S4D8Yyeg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|D8EC8262-1409-49FD-801C-ECDC87D7123B|2018-09-05T10:15:54|FCG840618N51|BnQfHI3AMd9zaPxRKNWbbA7DZEJtdMGMZbNHh/UWfZxsibVJa5OOMh3TBNLuCyoL
 Ns70t/BGOpn65en+LiFw1AtnPkSpYoLyMYZKSCjSvsF0+Qe51EsZ0d2xfCSLQ8czl3VskUoE4Bg5ZdR9UA6Fvqbl+cYx5Qlo2pKRRHr8=|00001000000405607284||

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

[Firma manuscrita]

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
JOSE GARCIA #5, COLONIA LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
RFC: DOCN880311AK3

Jocotepec, Jalisco a 12 de Agosto de 2018

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE:

Por medio de la presente le hago de su conocimiento que el C. **Saúl Heriberto Ávila López** será el residente de la obra: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. Bajo el número de contrato GMJ 31 COP/2018 PROGRAMA RAMO 33/2018.

Sin más por el momento me despido y quedo de usted.



Norma Gorety Domínguez Calvario

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO
JOSE GARCIA #5, COLONIA LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO
RFC: DOCN880311AK3

Jocotepec, Jalisco a 12 de Agosto de 2018

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
PRESENTE

Por medio de la presente le hago de su conocimiento que el día 10 de Agosto del 2018 daremos inicio a la obra: REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. Bajo el número de contrato GMJ 31 COP/2018 PROGRAMA RAMO-33/2018.

Sin más por el momento me despido y quedo de usted.



Norma Gorety Domínguez Calvario



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JAL.
2015-2018

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN N°: 1 (UNICA) Y FINICUITO

PERIODO: 10 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NUMERO DE CONTRATO: GMJ 31 COP /2018

UBICACIÓN LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
CONTRATISTA NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO

HOJA 1 DE 1

CONCEPTOS

TOTAL HOJA 1	\$	222,332.21
TOTAL HOJA 2	\$	50,809.41
TOTAL HOJA 3	\$	42,316.97

SUBTOTAL \$ 355,458.59

IMPORTE

SUB TOTAL:	\$355,458.59
IVA:	\$56,873.37
TOTAL:	\$412,331.96
- AMORT. DE ANTICIPO:	\$0.00
DESC. 5 AL MILLAR	\$1,777.29
TOTAL A FACTURAR	\$412,331.96
TOTAL A PAGAR	\$410,554.67

FIRMAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

ESTADO CONTABLE

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
ASIGNACION	\$ 356,203.22	\$ 56,992.52	\$ 413,195.74
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$355,458.59	\$56,873.37	\$412,331.96
ACUMULADO ANTERIOR	-	-	-
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 355,458.59	\$ 56,873.37	\$ 412,331.97
SALDO POR EJERCER	\$744.54	\$119.14	\$ 863.77
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
ANTICIPO 25%	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACION	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACION A LA FECHA	\$ -	\$ -	\$ -
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO



2015-2018

DIRECCION GENERAL
DE OBRAS PUBLICAS
GENERADOR DE ESTIMACION

ESTIMACION N°: T1001CA Y FINIQUITO

PERIODO: 10 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUSCO ENTRE CAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO
EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

HOJA 1 DE 3

NUMERO DE CONTRATO: GMJ 31 COP 12018

UBICACION: LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

PROGRAMA RAMO-33/2018

CONTRATISTA NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO

No.	CONCEPTO	U.	VOLUMEN					PRECIO UNITARIO	IMPORTE																
			PRESUPUESTO SITIO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADO	TOTAL EJECUTADO		SALDO	PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO										
CONCEPTOS DENTRO DE CATALOGO																									
1	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS DE AGUA Y DRENALJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEMARCA BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRAZO DE LA OBRA	m	264.40	0.00	264.40	264.40	264.40	0.00	11.52	\$	3,045.89	\$	-	\$	3,045.89	\$	3,045.89	0.00							
2	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEREA CIELO ABIERTO EN ZONA B EN MATERIAL TIPO III, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA EL CONCEPTO INCLUYE COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUCES Y SEÑALAMIENTO NECESARIOS	m3	193.25	0.00	193.25	193.25	193.25	0.00	504.00	\$	97,398.00	\$	-	\$	97,398.00	\$	97,398.00	0.00							
3	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEREA CIELO ABIERTO EN ZONA B EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA EL CONCEPTO INCLUYE COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO, TALUCES Y SEÑALAMIENTO NECESARIOS	m3	45.67	0.00	45.67	45.67	45.67	-	60.00	\$	2,740.20	\$	-	\$	2,740.20	\$	2,740.20	0.00							
4	PLANTILLA DE 20CM ESPESOR PROMEDIADO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	m3	31.73	0.00	31.73	31.73	31.73	-	436.42	\$	13,847.61	\$	-	\$	13,847.61	\$	13,847.61	0.00							
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RO-28 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	m	264.40	0.00	264.40	264.40	264.40	-	120.31	\$	31,809.96	\$	-	\$	31,809.96	\$	31,809.96	0.00							
6	ADICIONADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR MINIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	m3	29.59	0.00	29.59	29.59	29.59	-	467.36	\$	13,829.18	\$	-	\$	13,829.18	\$	13,829.18	0.00							
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	m3	130.32	0.00	130.32	130.32	130.32	-	452.33	\$	58,947.65	\$	-	\$	58,947.65	\$	58,947.65	0.00							
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 GRADOS X 3" DE DIAMETRO, INCLUYE ATRAQUE DE CONCRETO 36x24x10 CMS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TOBILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	pza	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	-	356.86	\$	713.72	\$	-	\$	713.72	\$	713.72	0.00							
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS															TOTAL DE HOJA 1	\$	222,332.21	\$	-	\$	222,332.21	\$	222,332.21	\$	-

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

CONTRATISTA
NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO

2025-21119

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION : 1 (UNICA) Y FINIQUITO

NUMERO DE CONTRATO GMJ 31 COP /2018 PROGRAMA RAMO-33/2018



PROGRAMA RAMO-33/2018	ANEXO
-----------------------	-------

PROMEDIO 0.90 MTS.

1.10

0.60

1.10

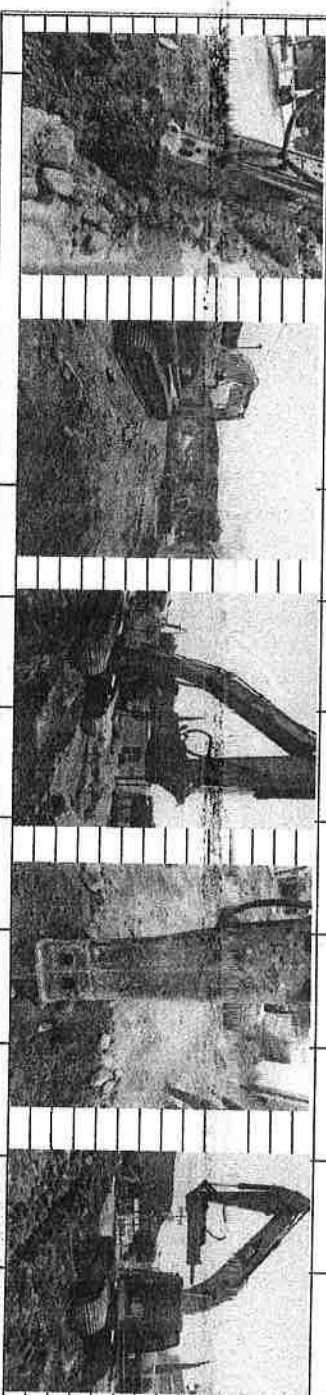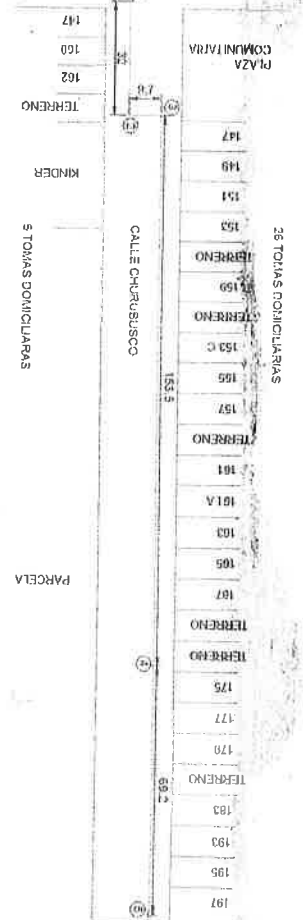

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALV
CONTRAT

1000000000

NUMEROS GENERADORES

100-111111-100

100-111111-100

An aerial photograph showing a rural landscape. A road or path runs horizontally across the middle of the image. To the left of the road, there are several rectangular fields, some of which appear to be planted with crops. To the right of the road, there is a larger, more irregularly shaped field or area. The terrain is mostly flat, with some variations in vegetation color suggesting different types of land use or crops.

Página 3 de 15

CONTRA!


© 2004 by Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION DE LA UNICA Y FINICUITO

CONTRATISTA: NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO

NUMERO DE CONTRATO GMJ 31 COP /2018 PROGRAMA RAMO-33/2018



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Pagina 4 de 15

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALV
CONTRA


H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO
EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA: NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARI
ESTIMACION : 1 (UNICA) Y FINQUITO
PERIODO : 10 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2018
PROGRAMA RAMO-33/2018

No.	CONCEPTO	TRAMO	LARGO	ANCHO	ANCHO PROM	ALTURA	PZA.	UNID.	CANT.
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC	1-2	32.00					ML	32.00
	HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE	2-3	9.70					ML	9.70
	HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	3-4	153.50					ML	153.50
		4-5	69.20					ML	69.20
							TOTAL	ML	264.40

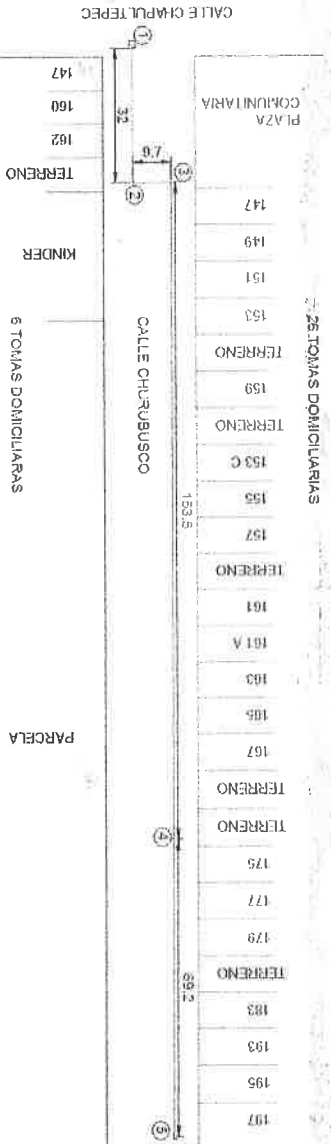

--	--	--	--	--

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Página 5 de 15

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALV
CONTRATISTA



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO
EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACION: 1 (UNICA) Y FINIQUITO PERIODO 10 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018
CONTRATISTA: NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO NUMERO DE CONTRATO: GMJ 31 COP /2018 PROGRAMA RAMO-33/2018

No.	CONCEPTO	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROM	ALTURA	PZA.	UNID.	CANT.
6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR MINIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVACION	1-2 2-3 3-4 4-5	32.00 9.70 153.50 69.20		0.60 0.60 0.60 0.60	0.20 0.20 0.20 0.20		M3 M3 M3 M3	3.84 1.16 18.42 8.30
	DESCONTAR VOLUMEN DE TUBO DE 3" = 0.0081		264.40					M3	-2.14
							TOTAL	M3	29.59

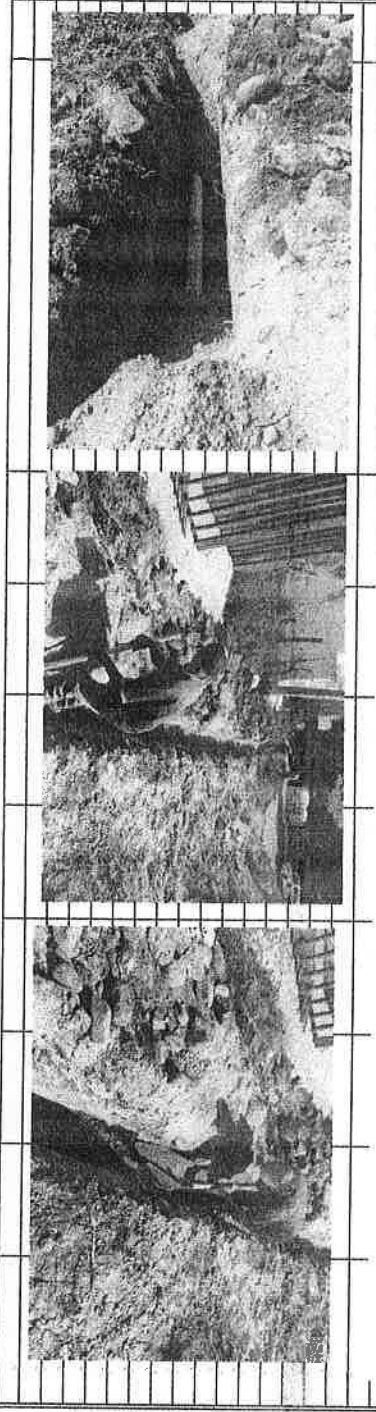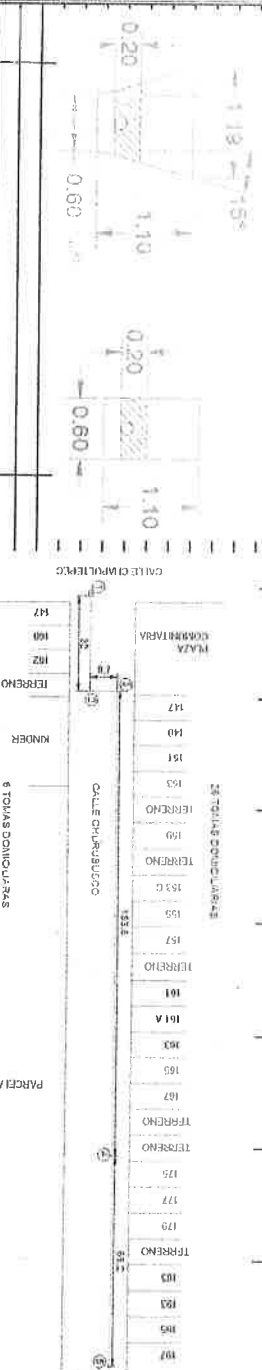

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Página 6 de 15

NORMA GORETY DOMINGUEZ CAL
CONTRA

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

2018-2019



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO
EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA: NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO ESTIMACION: 1 (UNICA) Y FINICUTO PERIODO: 10 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018
PROGRAMA RAMO-33/2018

No.	CONCEPTO	TRAMO	LARGO	ANCHO	PROM	ALTURA	PZA.	UNID.	CANT.
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISION	1-2	32.00		0.90	0.60		M3	17.28
		2-3	9.70		0.90	0.60		M3	5.24
		3-4	133.50		0.90	0.60		M3	82.89
		4-5	69.20		0.60	0.60		M3	24.91
							TOTAL	M3	130.32

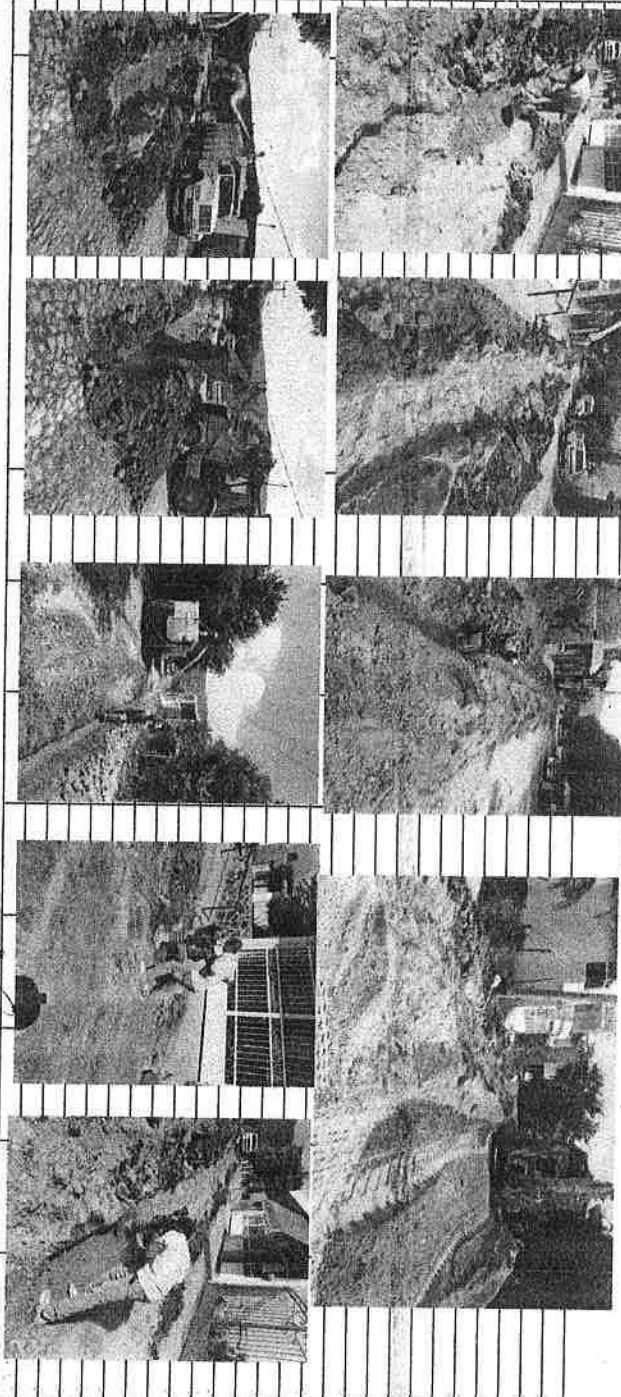

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Página 7 de 15

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALV
CONTRA

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

2015-2018




DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO
EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA: NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO ESTIMACION: 1 (UNICA) Y FINIQUITO PERIODO: 10 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018
NUMERO DE CONTRATO GML 31 COP 2018 PROGRAMA RAMO-33/2018



No.	CONCEPTO	TRAMO	LARGO	ANCHO	ANCHO PROM	ALTURA	PZA.	UNID.	CANT.
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 GRADOS X 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ATRIQUE DE CONCRETO 35x50x10 CMS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACION DE TORNILLOS Y EMPAQUES, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION								
			CRUCERO 1						
			CRUCERO 2					PZA	1.00
			CRUCERO 3					PZA	1.00
			CRUCERO 4						
			CRUCERO 5						
			TOTAL					PZA	2.00

DISEÑO DE CRUCEROS

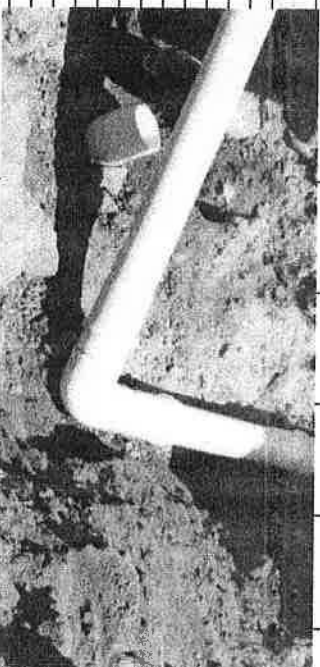

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Página 8 de 15

NORMA GORETY DOMINGUEZ CAL
CONTRA

~~0103 0103~~

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO




2018-2018

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO
EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA: NORMA GORETTY DOMINGUEZ CALVARIO ESTIMACION : 1 (UNICA) Y FINICUITO PERIODO 10 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018
NUMERO DE CONTRATO GMJ 31 COP /2018 PROGRAMA RAMO-33/2018

No.	CONCEPTO	TRAMO	LARGO	ANCHO	ANCHO PROM	ALTURA	PZA.	UNID.	CANT.
11	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPJA A CIELO ABIERTO EN ZONA B EN MATERIAL TIPO III, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA EL CONCEPTO INCLUYE COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPJA, AFINE DE PISO, TALUDES Y SEÑALAMIENTO NECESARIOS		4.00		0.60	0.7	33	M3	56.44
							TOTAL	M3	56.44

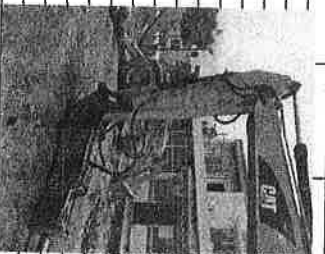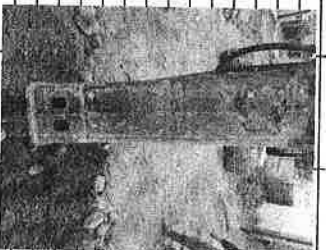

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Página 12 de 15

NORMA GORETTY DOMINGUEZ
CC


H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO
EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

CONTRATISTA: NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO ESTIMACION: 1 (UNICA) Y FINQUITO PERIODO: 10 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018 PROGRAMA RAMO-33/2018

No.	CONCEPTO	TRAMO	LARGO	ANCHO	ANCHO PROM	ALTURA	PZA.	UNID.	CANT.
16	REPOSICION DE EMPEDRADO TIPO ASENTADO EN UNA CAMA DE IAL. DE UN ESP. DE 20 CMS. INCLUYE: VENEADO, NIVELACION, TENDIDO DE PIEDRA, AGUJADO, COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA	1-2	32.00	9.70	1.00			ML	32.00
		2-3		153.50	1.00			ML	153.50
		3-4		69.20	1.00			ML	69.20
		4-5					TOTAL	ML	264.40
17	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE BANQUETA DE 8 CMS. DE ESP. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION		1.10	0.20		0.10		M3	0.31
							TOTAL	M3	0.31
18	REPOSICION DE BANQUETA DE 8 CMS. DE ESP. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C.- 180 KG/CM2 TMA 3/4 R.N. INCLUYE: COLADO, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO, APLICANDO DOBLADOR EN SUS ORILLAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION		1.10	0.20				M2	3.08
							TOTAL	M3	3.08
19	CORTE DE 7 CM DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO MECANICO Y DISCO DE DIAMANTE DE LOSA DE CONCRETO. INCLUYE AGUA PARA EQUIPO, MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCION Y MANO DE OBRA		1.10					ML	15.40
			1.10					ML	15.40
							TOTAL	ML	30.80



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Página 15 de 15

NORMA GORETY DOMINGUEZ CALV
CONTRA
