



CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

CFDI versión 3.3

R.F.C.: PECC921214N63
Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: 45800

Tipo de Comprobante: Ingreso
Factura: REN 000183

Receptor: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 45800
Teléfono: JOCOTEPEC, JALISCO
Email: a2_j-0225@hotmail.com
R.F.C.: MJJ850101KP8
Fecha y Hora de Emisión: 26-06-2018T09:57:03
Fecha y Hora de Timbrado: 26-06-2018T09:59:30
Número de Certificado: 00001000000405374711

Uso de CFDI: G03 Gastos en general
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Moneda y Tipo de Cambio: MXN 1.000000

Table with columns: Código Clave SAT, Unidad Descripción, Cantidad Valor U. SubTotal Descuento, IVA Traslado, Base Tasa Impuesto, Total. Row 1: OP-INST 72141120 E48 Unidad de serv ESTIMACION #1 FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA CONFORME AL CONTRATO No GMJ 010C OP/2018 DE LA OBRA DENOMINADA 'REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO' RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA \$763.72 CANTIDAD NETA A PAGAR \$176,418.39

Importe con Letra: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 11/100 MXN
UUID: 9DAD7C0D-ACC3-43C3-8AF8-F32CF771DA08
Número de Certificado del SAT: 00001000000403155917
RFC Proveedor Certificación: GRE100910KEA

SubTotal: 152,743.20
Descuento: 0.00
IVA Traslado: 24,438.91
Total: 177,182.11

Cadena Original: j118DAD7C0D-ACC3-43C3-8AF8-F32CF771DA082018-06-26T09:59:30CRE100910KEAYC5LPrD62AZy4e4hXce8kuAuoUhmDenIL39QLFZgyM7vU7DgKaDRi05EPzKcGh9p5hSnhD2bPqZg45u0p0QXGVmoy9W5VxXpTKL7KF77BKHx9WY5iOUycjPhoD3R6oQDthKk-m2C4OH5P67UDCpsan6VemZy6h0mLEkDeUNjph5veGx11TUJQHhHrsWVCeE+EN9ua1KEM3d3ED7uuu8d4JF9z2ZOU2Tud6ycJyXpAkyCfByW2RjP59kAC8erSG5JyUtrrvP4L8Hukqgsp0246zuJm6c07N4TxcRyZ7EvKd8YpA=
Sello Digital del Emisor: YG5LPrD62AZy4e4hXce8kuAuoUhmDenIL39QLFZgyM7vU7DgKaDRi05EPzKcGh9p5hSnhD2bPqZg45u0p0QXGVmoy9W5VxXpTKL7KF77BKHx9WY5iOUycjPhoD3R6oQDthKk-m2C4OH5P67UDCpsan6VemZy6h0mLEkDeUNjph5veGx11TUJQHhHrsWVCeE+EN9ua1KEM3d3ED7uuu8d4JF9z2ZOU2Tud6ycJyXpAkyCfByW2RjP59kAC8erSG5JyUtrrvP4L8Hukqgsp0246zuJm6c07N4TxcRyZ7EvKd8YpA=
Sello Digital del SAT: Su27TxAl5V8PTrL9MhntQNbJx56CpNzQFwYnR X+IqJxulic7mI04eAXz58thW7TW2za4XqAwjkoYbTJOpDg4CFapricL2JhzX0Dvq8D+bdBM+C4EBGWwK1nyfTeaP68C7CzIQ4ZcAbW+uIW7LEBNmpGY8STpn67KSpOHGbV8D EU9Wv/SEX+og2u5yS2ePBERV71yhfJkhvs4TRLzr3co5UWwHjmmrWknQZSPW5ITtJH+Rtxhcbe5Rjh7JES6GJXGFP2P6B6K90S7ZfR5yRrmEgObFh8Zd86au5w1BmWmRLxy==



CFDI Relacionados:
Tipo de Relación
UUID Relacionado

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PECC921214N63	CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DAD7C0D-ACC3-43C3-8AF8-F32CF771DA08	2018-06-26T09:57:03	2018-06-26T09:59:30	GRE100910KEA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$177,182.11	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMU 010C OP/2018

CONTRATISTA: CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACION: ZAPOTTAN DE HIDALGO

HOJA DE RELACION HOJA No. 1 DE 1

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINQUITO



DEL: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2018

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

PARTIDAS

IMPORTE

DEMOLICION Y EXCAVACION
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES
INSTALACION DE TUBERIA
COMPLEMENTARIOS

\$ 19,918.96
\$ 74,394.22
\$ 56,176.42
\$ 2,253.60

MONTO DE ESTIMACION \$ 152,743.20
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 0% \$ -
SUBTOTAL \$ 152,743.20
I. V. A. 16% \$ 24,438.91
SUMA \$ 177,182.11
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) \$ -
MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 763.72
NETO A PAGAR \$ 176,418.39

ESTADO CONTABLE IMPORTE I. V. A. TOTAL

ASIGNACION \$ 152,998.94 \$ 24,479.83 \$ 177,478.77

IMPORTE DE ESTIMACION \$ 152,743.20 \$ 24,438.91 \$ 177,182.11

ACUMULADO ANTERIOR \$ - \$ - \$ -

ACUMULADO A LA FECHA \$ 152,743.20 \$ 24,438.91 \$ 177,182.11

SALDO POR EJERCER \$ 255.74 \$ 40.93 \$ 296.67

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

SUPERVISOR DE OBRAS (MUNICIPIO)

EL CONTRATISTA

NO HUBO ANTICIPO

AMORTIZACION
AMORTIZACION ACUM. ANT.
AMORTIZACION A LA FECHA
FALTANTE POR AMORTIZAR

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO





DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PERIODO: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
 UBICACION: ZAPOTTAN DE HIDALGO
 CONTRATISTA: CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
 FECHA: 18 DE JUNIO DE 2018



No.	CONCEPTO	U	ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA						PRECIO UNITARIO	IMPORTE													
			PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRESUPUESTO BASE		ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO										
														ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO						
DEMOLICION Y EXCAVACION																							
1	EXCAVACION EN ZANJA DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B".	M3	134.40	0.00	134.75	134.75	-0.35	\$34.27	\$	4 605.89	\$	-	\$	4 617.88	\$	4 617.88	\$	-	11.99				
2	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.	M2	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	\$9.65	\$	810.60	\$	-	\$	810.60	\$	810.60	\$	-	-				
3	ACARRIO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	M3	174.72	0.00	175.18	175.18	-0.45	\$82.72	\$	14 452.84	\$	-	\$	14 490.48	\$	14 490.48	\$	-	37.64				
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES																							
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DEMOLICION Y EXCAVACION													\$	19 869.33	\$	-	\$	19 918.96	\$	19 918.96	\$	-	49.63
4	TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DELANTO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	ML	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	\$10.10	\$	1 212.00	\$	-	\$	1 212.00	\$	1 212.00	\$	-	-				
5	PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M2	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	\$48.55	\$	4 078.20	\$	-	\$	4 078.20	\$	4 078.20	\$	-	-				
6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	ML	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	\$76.72	\$	9 206.65	\$	-	\$	9 206.65	\$	9 206.65	\$	-	-				
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	109.20	0.00	117.95	117.95	-8.75	\$507.82	\$	55 453.94	\$	-	\$	59 897.37	\$	59 897.37	\$	-	4 443.42				
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES													\$	69 990.79	\$	-	\$	74 394.22	\$	74 394.22	\$	-	4 443.42
INSTALACION DE TUBERIA																							
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	\$109.37	\$	13 124.40	\$	-	\$	13 124.40	\$	13 124.40	\$	-	-				
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	24.00	0.00	19.09	19.09	5.00	\$1 100.00	\$	26 400.00	\$	-	\$	20 900.00	\$	20 900.00	\$	-	5 500.00				
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUTERTA DE 3" INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$3 311.49	\$	6 622.98	\$	-	\$	6 622.98	\$	6 622.98	\$	-	-				
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 150X90X97 CM MEDIDAS INTERIORES INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$4 984.48	\$	9 968.96	\$	-	\$	9 968.96	\$	9 968.96	\$	-	-				
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARGO Y TAPA DE FOFO PARA CAJA DE VALVULAS INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$2 780.04	\$	5 560.08	\$	-	\$	5 560.08	\$	5 560.08	\$	-	-				
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION INSTALACION DE TUBERIA													\$	61 626.42	\$	-	\$	56 176.42	\$	56 176.42	\$	-	5 500.00



DIRECCION DE...

Handwritten signature



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PERIODO: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
 UBICACIÓN: ZAPOTTAN DE HIDALGO
 CONTRATISTA: CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
 FECHA: 18 DE JUNIO DE 2018



No.	CONCEPTO	U	ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA				PRECIO UNITARIO	IMPORTES								
			PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION ACUMULADA	SALDO					
13	CALLE EMILIANO ZAPATA COMPLEMENTARIOS	M2	240.00	0.00	360.00	360.00	-120.00	\$6.26	\$	1,502.40	\$	2,253.60	\$	2,253.60	\$	751.20
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION LIMPIEZA GENERAL DE OBRA								TOTAL	\$	152,998.94	\$	152,743.20	\$	152,743.20	\$	255.74

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
CONTRATISTA

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA:

DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018

FECHA DE ESTIMACION: 18 DE JUNIO DE 2018



OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

No. CONTRATO: GMI 010C OP/2018
PROGRAMA: RAMO 33

1 FINIQUITO

NO.	CONCEPTO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
-----	----------	-------	-------	-------	------	----------	---------	--------

1	EXCAVACION EN ZANJA DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B".	A	120.00	0.70	1.20	1.00	100.80	M3
						SUB TOTAL	100.80	M3

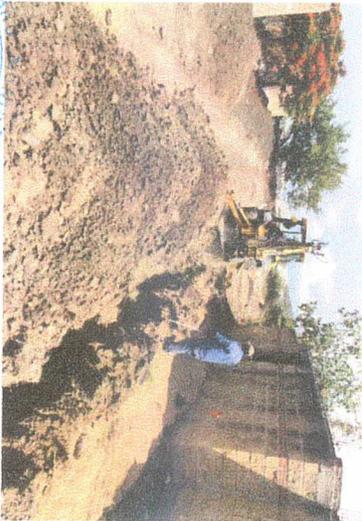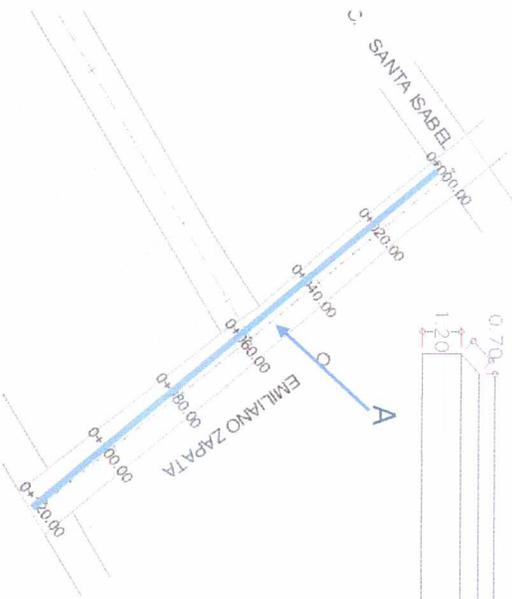

REVISOR

SUPERVISOR

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

REVISOR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

OBRAS PÚBLICAS

REVISOR

REPRESENTANTE LEGAL

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA





GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA:

DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018

OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

FECHA DE ESTIMACION: 18 DE JUNIO DE 2018


No. CONTRATO: GMI 010C OP/2018
PROGRAMA: RAMO 33

1 FINIQUITO

GENERADOR DE OBRA

NO.	CONCEPTO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
-----	----------	-------	-------	-------	------	----------	---------	--------

1	EXCAVACION EN ZANJA DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B".	B	7.00	0.70	0.50	10.00	24.50	M3
		C	3.00	0.70	0.50	9.00	9.45	M3
						SUB TOTAL 2	33.95	M3
						TOTAL	134.75	M3

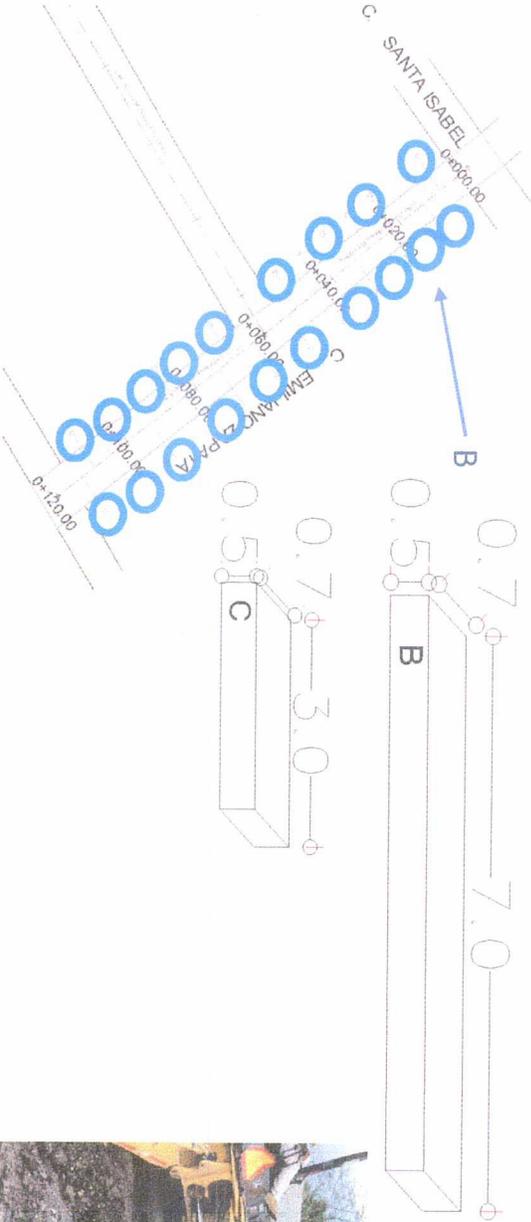

REVISO

SUPERVISOR

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

REVISO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOBITO

REVISO

REPRESENTANTE LEGAL

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA:

DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018

Tipo de Estimación

OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.



FECHA DE ESTIMACION: 18 DE JUNIO DE 2018
No. CONTRATO: GMJ 010C OP/2018
PROGRAMA: RAMO 33

1 FINIQUITO

GENERADOR DE OBRA

NO.	CONCEPTO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
2	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.	A	120.00	0.70	0.00	1.00	84.00	M2
						TOTAL	84.00	M2

DEMOLICION Y EXCAVACION

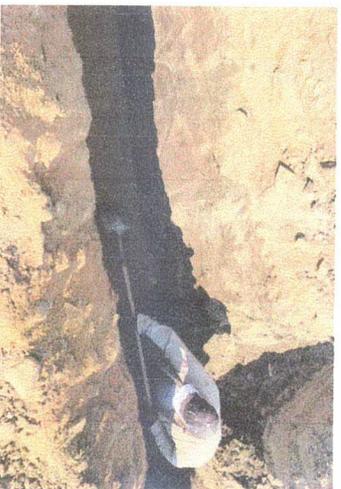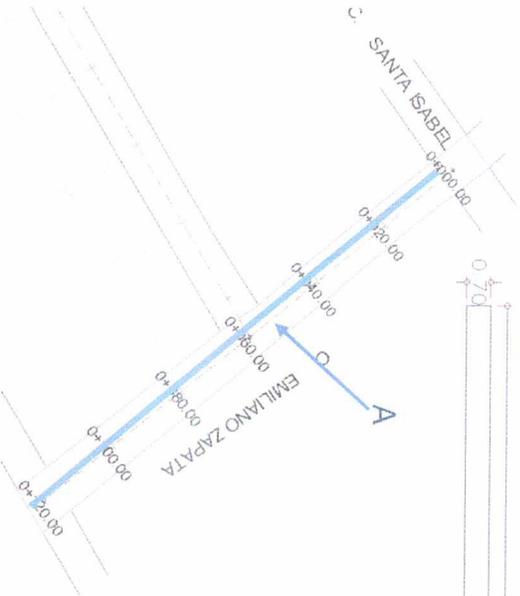

REVISO

SUPERVISOR

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

REVISO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOFO

REVISO

REPRESENTANTE LEGAL

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA:

DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018

NO. DE ESTIMACION:

OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

NO. CONTRATO: GMJ 010C OP/2018



FECHA DE ESTIMACION: 18 DE JUNIO DE 2018

PROGRAMA: RAMO 33

1 FINIQUITO

DEMOLICION Y EXCAVACION

NO.	CONCEPTO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
3	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 8M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	A	120	0.70	1.20	1.00	100.80	M3
						SUBTOTAL 1	100.80	M3
						CON ABUNDAMIENTO 30%	131.04	M3

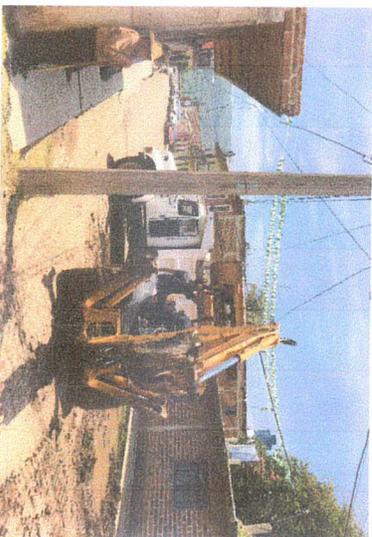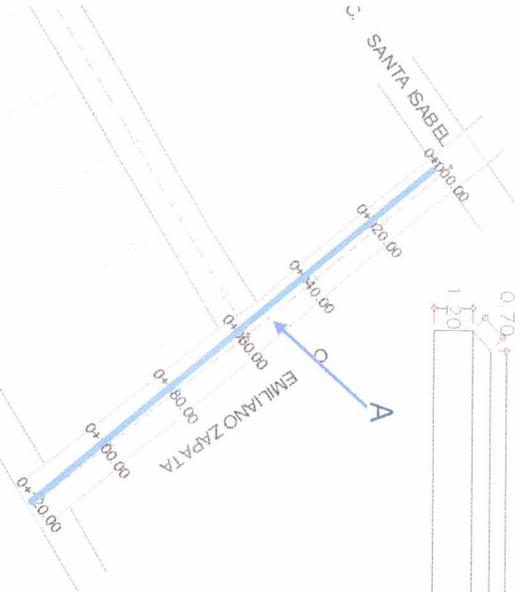

REVISO

SUPERVISOR

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

REVISO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

REVISO

REPRESENTANTE LEGAL

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA:

DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018

OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

FECHA DE ESTIMACION: 18 DE JUNIO DE 2018



No. CONTRATO: GMI 010C OP/2018
PROGRAMA: RAMO 33

1 FINIQUITO

GENERADOR DE OBRA

DEMOLICION Y EXCAVACION

NO.	CONCEPTO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
3	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	B	7.00	0.70	0.50	10.00	24.50	M3
		C	3.00	0.70	0.50	9.00	9.45	M3
						SUB TOTAL 2	33.95	M3
						CON ABUNDAMIENTO 30%	44.14	M3
						TOTAL CON ABUNDAMIENTO	175.18	M3

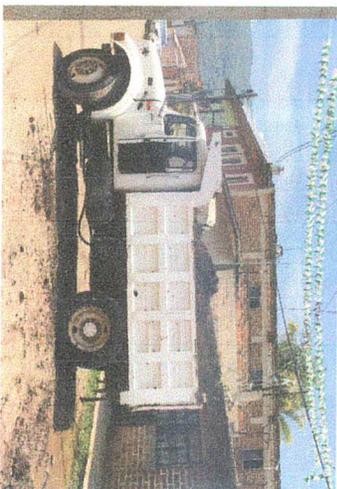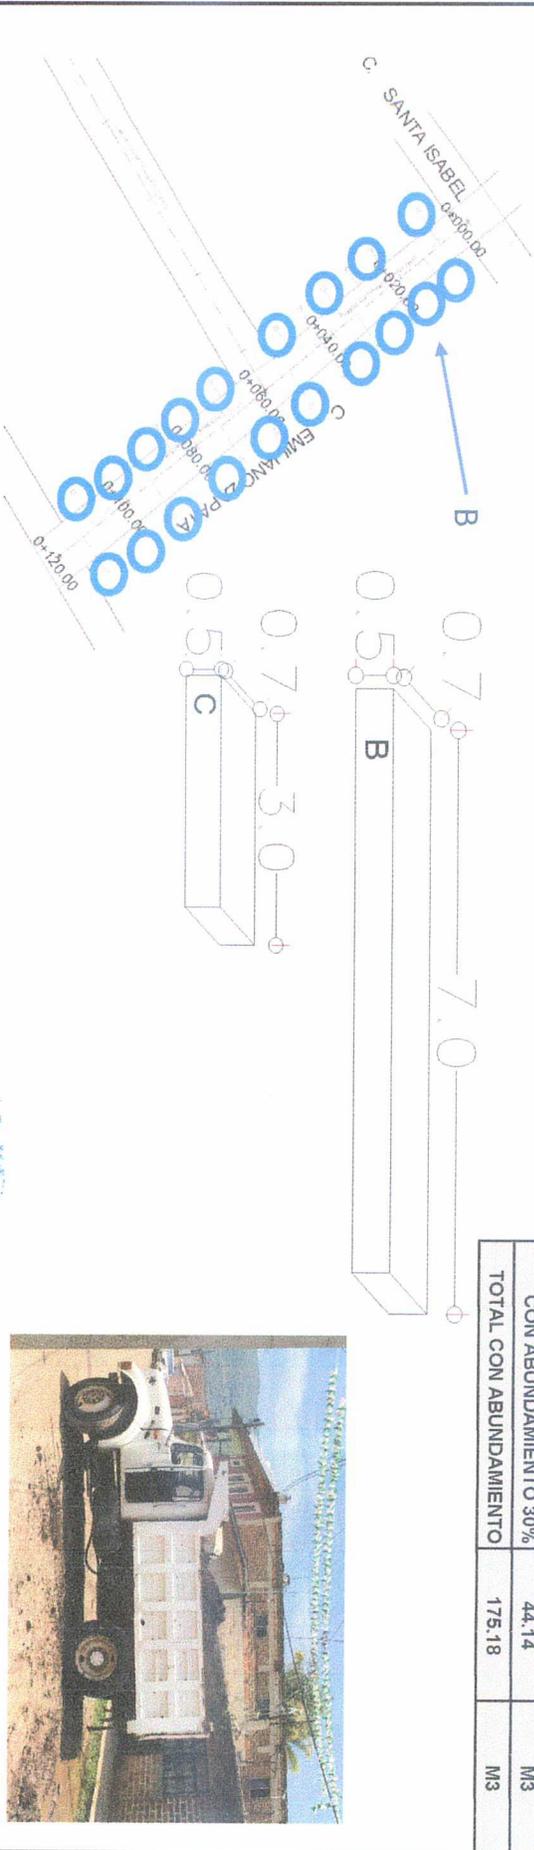

REVISO

SUPERVISOR

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

REVISO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO EC.

REVISO

REPRESENTANTE LEGAL

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA

DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018

OBRA:



REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

FECHA DE ESTIMACION: 18 DE JUNIO DE 2018
No. CONTRATO: GMI 010C OP/2018
PROGRAMA: RAMO 33

1 FINIQUITO

NO.	CONCEPTO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
-----	----------	-------	-------	-------	------	----------	---------	--------

6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	A	120.00	-	-	1.00	120.00	ML
						TOTAL	120.00	ML

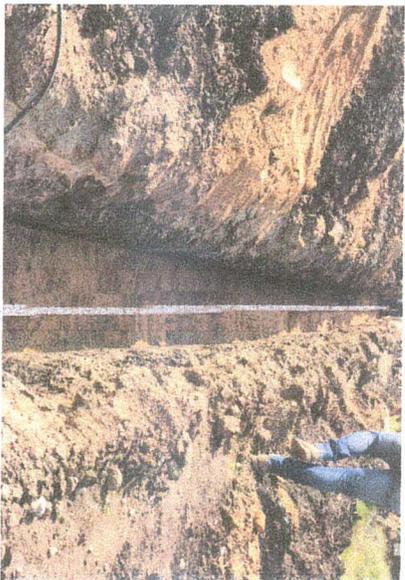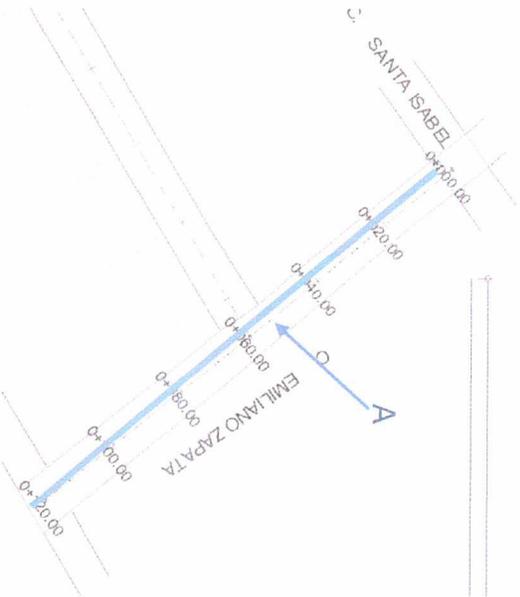

REVISO

SUPERVISOR

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

REVISO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

REVISO

REPRESENTANTE LEGAL

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA

DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018

NO. DE ESTIMACION

OBRA

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

FECHA DE ESTIMACION: 18 DE JUNIO DE 2018

NO. CONTRATO: GMI 010C OP/2018

PROGRAMA: RAMO 33

1 FINIQUITO

GENERADOR DE OBRA

NO.

CONCEPTO

PIEZA

LARGO

ANCHO

ALTO

CANTIDAD

VOLUMEN

UNIDAD

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

7

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.

A

120.00

0.70

1.00

1.00



84.00

M3

SUB TOTAL 1

84.00

M3

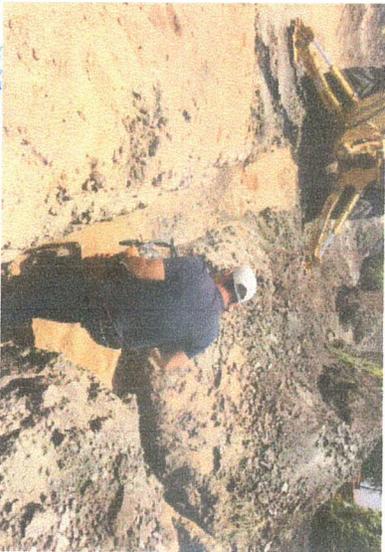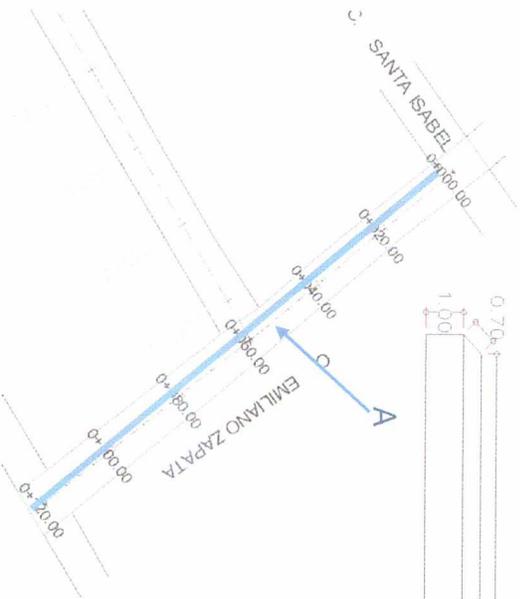

REVISO

SUPERVISOR

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

REVISO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

REVISO

REPRESENTANTE LEGAL

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA

DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018

NO DE ESTIMACION

FECHA DE ESTIMACION: 18 DE JUNIO DE 2018

1 FINIQUITO

OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

NO. CONTRATO: GMI 010C OP/2018

PROGRAMA: RAMO 33

GENERADOR DE OBRA

NO.

CONCEPTO

PIEZA

LARGO

ANCHO

ALTO

CANTIDAD




VOLUMEN

UNIDAD

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.

PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
B	7.00	0.70	0.50	10.00	24.50	M3
C	3.00	0.70	0.50	9.00	9.45	M3
				SUBTOTAL 2	33.95	M3
				TOTAL	117.95	M3

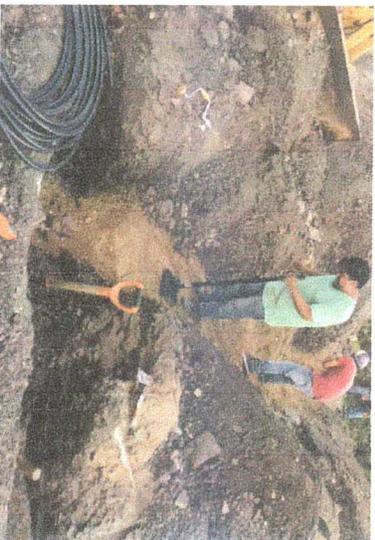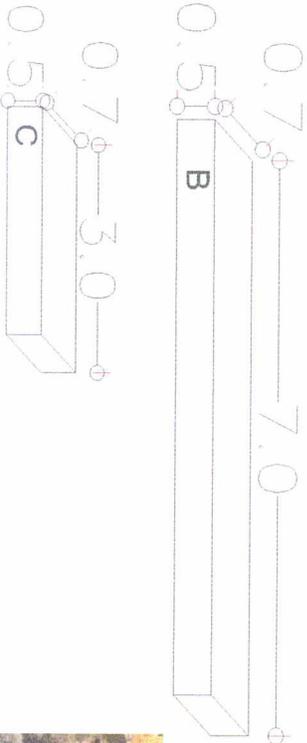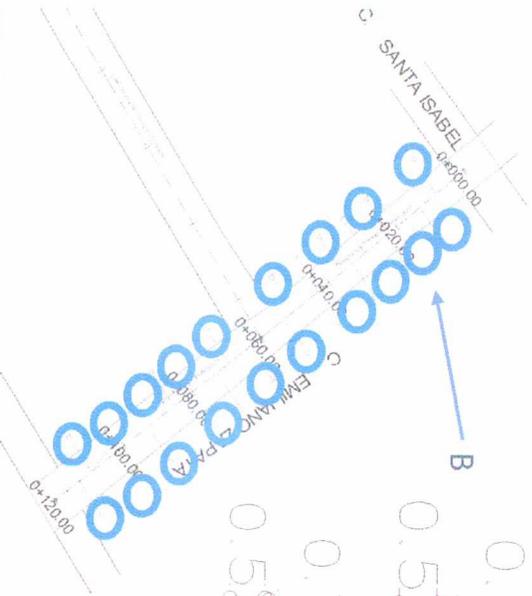

REVISO

SUPERVISOR

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

REVISO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

REVISO

REPRESENTANTE LEGAL

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA:

DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018

FECHA DE ESTIMACION: 18 DE JUNIO DE 2018

OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

No. CONTRATO: GMI 010C OP/2018

PROGRAMA: RAMO 33

1 FINIQUITO

GENERADOR DE OBRA

CONCEPTO

PIEZA

LARGO

ANCHO

ALTO

CANTIDAD

VOLUMEN

UNIDAD

NO.

INSTALACION DE TUBERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA

A

120.00

-


-

TOTAL

120.00

ML

120.0

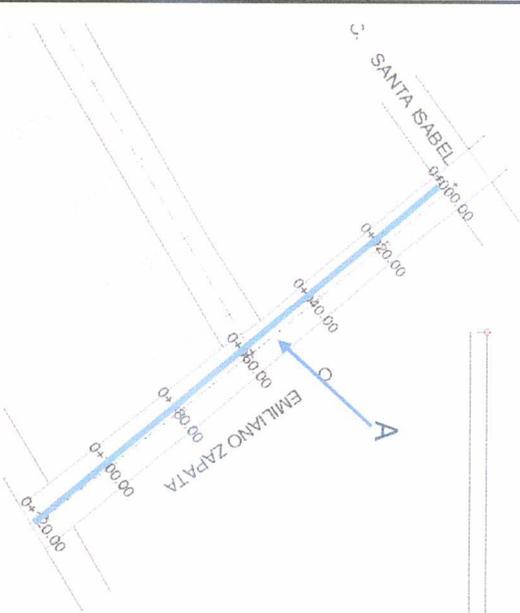

REVISO

SUPERVISOR

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

REVISO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

REVISO

REPRESENTANTE LEGAL

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS






GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA:	DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018	PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018	FECHA DE ESTIMACION:	18 DE JUNIO DE 2018	1 FINIQUITO
OBRA:	OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	No. CONTRATO:	GMJ 010C OP/2018	PROGRAMA:	RAMO 33	

NO.	CONCEPTO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
9	INSTALACION DE TUBERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	A	-	-	-	19.00	19.00	PZA
						TOTAL	19.00	PZA

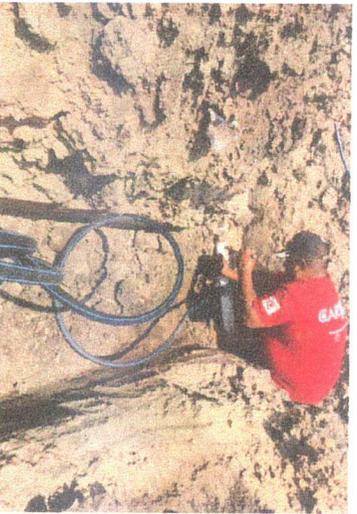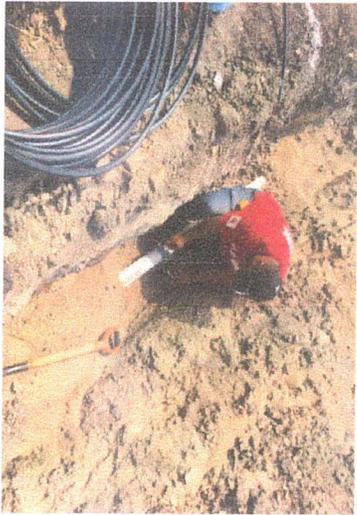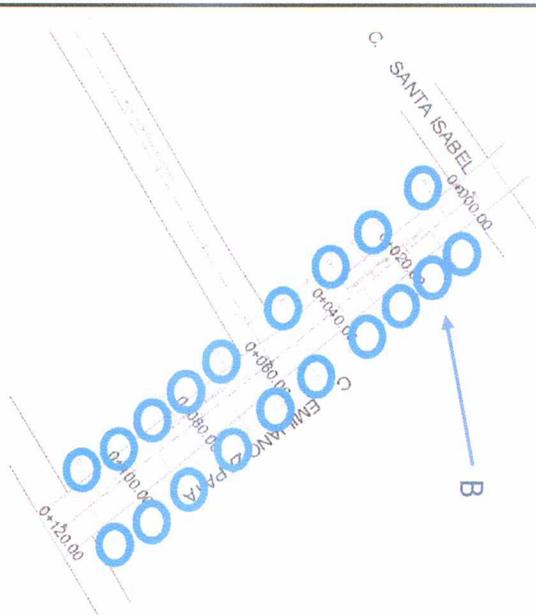

REVISOR	SUPERVISOR	REVISOR	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	REVISOR	REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ		ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO		C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA:	DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018	PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018	NO. DE ESTIMACION:	
OBRA:	OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	FECHA DE ESTIMACION:	18 DE JUNIO DE 2018	NO. CONTRATO:	GMI 010C OP/2018
		PROGRAMA:	RAMO 33		
					1 FINIQUITO

NO.	CONCEPTO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
11	INSTALACION DE TUBERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130X90X97 CM MEDIDAS INTERIORES) INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	A	-	-	-	2.00	2.00	PZA
						TOTAL	2.00	PZA

REVISOR	SUPERVISOR	REVISOR	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	REVISOR	REPRESENTANTE LEGAL
	ARO. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ		ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO		C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA





GENERADORES DE OBRA



PERIODO DE OBRA:

DEL 23 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2018

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 2018

OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

FECHA DE ESTIMACION: 18 DE JUNIO DE 2018


No. CONTRATO: GMJ 010C OP/2018

PROGRAMA: RAMO 33

1 FINIQUITO

NO.	CONCEPTO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
-----	----------	-------	-------	-------	------	----------	---------	--------

13	INSTALACION DE TUBERIA							
	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	A	120.00	3.00	-	1.00	360.00	M2
						TOTAL	360.00	M2

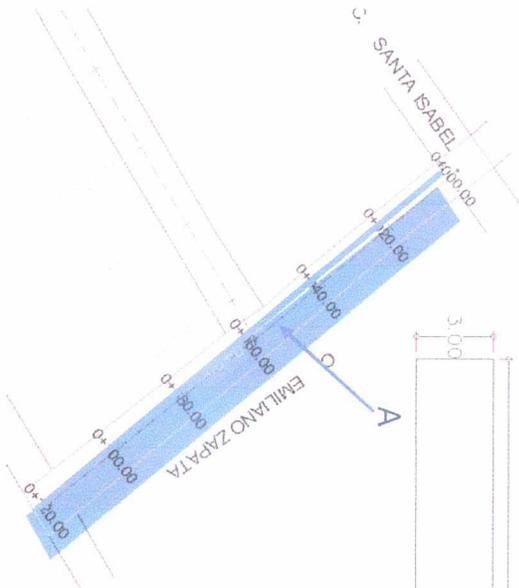

REVISOR SUPERVISOR

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

REVISOR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO, EC. JALISCO

REVISOR REPRESENTANTE LEGAL

C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Jocotepec, Jalisco a 7 de Junio de 2018

ASUNTO: Solicitud Volúmenes Extraordinarios

Ing. Juan Manuel García Escoto
Director de Obras Públicas
Municipio de Jocotepec, Jalisco

PRESENTE

At'n: Arq. Cesar Antonio Alonso Jiménez
Supervisor de obras

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y aprovecho para solicitarle que en la obra denominada "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.", se necesitan unos volúmenes extraordinarios en los siguientes conceptos:

No	Concepto	Unidad	Volumen	P.U.	IMPORTE
1	EXCAVACION EN ZANJA DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B".	M3	0.35	\$34.27	\$11.99
3	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DSITANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA.	M3	0.45	\$82.72	\$37.64
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	8.75	\$507.82	\$4,443.42
13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M2	120	\$6.26	\$751.20

Por esto solicitamos la autorización para la ejecución de estos trabajos con volúmenes excedentes ya que son necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Lic. Carlos Manuel Pelayo Cervera





Jocotepec, Jalisco a 15 de Junio de 2018

ASUNTO: NOTIFICACION DE TERMINO DE TRABAJOS

Ing. Juan Manuel García Escoto
Director de Obras Publicas

PRESENTE

At'n: Arq. Cesar Antonio Alonso Jiménez
Supervisor de obras


Por medio de la presente le envié un cordial saludo y aprovecho para notificarle que el día 18 de Junio del año en curso estaremos terminando la ejecución de los trabajos contratados en la obra denominada "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.", para dar recorrido en la obra y supervisar lo ejecutado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Carlos Manuel Pelayo Cervera





Jocotepec, Jalisco 8 de Junio de 2018

ASUNTO: ACEPTACION DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS
LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

En Respuesta a la Solicitud de Vólumenes Extraordinarios de la obra
**"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA,
EN LA LOCALIDAD DE ZOPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,
JALISCO"**. Se confirma la solicitud antes mencionada debido que la infraestructura
existente así lo requirió, esto con el propósito de que la obra sea apta y cumpla con las
normas de calidad.

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTO DE OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JAL.

