



CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

CFDI versión 3.3

R.F.C.: PECC921214N63
Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: 45800

Tipo de Comprobante: Ingreso
Factura: REN 000169

Receptor: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Fecha y Hora de Emisión: 12-06-2018T10:08:18

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 45800
Fecha y Hora de Timbrado: 12-06-2018T10:11:14

Teléfono: JOCOTEPEC, JALISCO
Email: a2_j-0225@hotmail.com
Número de Certificado: 00001000000405374711

Uso de CFDI: P01 Por definir
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 99 Por definir
Moneda y Tipo de Cambio: MXN 1.000000

Table with 6 columns: Código Clave SAT, Unidad Descripción, Cantidad Valor U. SubTotal Descuento, IVA Traslado, Base Tasa Impuesto, Total. Row 1: OP-INST 72141120, E48 Unidad de servi ESTIMACION #1 FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA CONFORME AL CONTRATO No GMJ 011C OP/2018 DE LA OBRA DENOMINADA 'REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO' RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA \$1,064.23 CANTIDAD NETA A PAGAR \$245,836.63.

Handwritten signature

Importe con Letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 86/100 MXN
UUID: C0713877-9801-4B14-8B21-E449D5B22E94
Número de Certificado del SAT: 00001000000403155917
RFC Proveedor Certificación: GRE100910KEA

SubTotal: 212,845.57
Descuento: 0.00
IVA Traslado: 34,055.29
Total: 246,900.86

Cadena Original: [Long alphanumeric string]
Sello Digital del Emisor: [Long alphanumeric string]
Sello Digital del SAT: [Long alphanumeric string]



CFDI Relacionados:
Tipo de Relación
UUID Relacionado

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PECC921214N63 | CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | MJJ850101KP8 | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C0713877-9801-4B14-8B21-E449D5B22E94 | 2018-06-12T10:08:18 | 2018-06-12T10:11:14 | GRE100910KEA |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$246,900.86 | Ingreso | Vigente | |

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)



| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|
| H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | | No. DE CONTRATO: GMJ 011C OP/2018 | | HOJA DE RELACION | | HOJA No. 1 DE 1 | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | CONTRATISTA: CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | | ESTIMACION No. | | 1 (UNO) | |
| | | OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA | | PERIODO DE TRABAJO: | | FINIQUITO | |
| | | UBICACION: ZAPOTTAN DE HIDALGO | | DEL: | | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 | |
| | | | | FECHA: | | 11 DE JUNIO DE 2018 | |



RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

| P A R T I D A S | | I M P O R T E S | |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------|
| DEMOLICION Y EXCAVACION | | \$ | 24,595.33 |
| CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES | | \$ | 115,235.63 |
| INSTALACION DE TUBERIA | | \$ | 70,385.40 |
| COMPLEMENTARIOS | | \$ | 2,629.20 |
| | | \$ | 212,845.57 |
| | | \$ | 212,845.57 |
| | | \$ | 34,055.29 |
| | | \$ | 246,900.86 |
| | | \$ | 1,064.23 |
| | | \$ | 245,836.63 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| ESTADO CONTABLE | IMPORTE | I . V . A . | TOTAL |
| ASIGNACION | \$ 212,972.72 | \$ 34,075.63 | \$ 247,048.35 |
| IMPORTE DE ESTIMACION | \$ 212,845.57 | \$ 34,055.29 | \$ 246,900.86 |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ - | \$ - | \$ - |
| ACUMULADO A LA FECHA | \$ 212,845.57 | \$ 34,055.29 | \$ 246,900.86 |
| SALDO POR EJERCER | \$ 127.15 | \$ 20.35 | \$ 147.50 |

| | |
|---|----------------|
| A M O R T I Z A C I O N D E L A N T I C I P O | |
| ANTICIPO 25% | |
| AMORTIZACION | |
| AMORTIZACION ACUM. ANT. | |
| AMORTIZACION A LA FECHA | |
| FALTANTE POR AMORTIZAR | |
| NO HUBO ANTICIPO | |
| SUPERVISOR DE OBRAS (MUNICIPIO) | EL CONTRATISTA |
| ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | |
|  C. CARLOS ANTONIO ALONSO JIMENEZ | |
|  C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | |

PERIODO: DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN: ZAPOTTAN DE HIDALGO

CONTRATISTA: CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

| No. | CONCEPTO | U | CANTIDADES | | | | IMPORTE | | | | ESTIMACION ACUMULADA | SALDO | | |
|---|---|-----|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------|
| | | | PRESUPUESTO BASE | ESTIMACION ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA | SALDO | PRECIO UNITARIO | PRESUPUESTO BASE | ESTIMACION ANTERIOR | | | ESTA ESTIMACION | |
| CALLE EMILIANO ZAPATA | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMOLICION Y EXCAVACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | EXCAVACION EN ZANJA DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B". | M3 | 201.60 | 0.00 | 201.64 | 201.64 | -0.04 | \$34.27 | \$ 6,908.83 | \$ - | \$ 6,910.20 | \$ 6,910.20 | \$ - | 1.37 |
| 2 | AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA. | M2 | 84.00 | 0.00 | 131.11 | 131.11 | -47.11 | \$9.65 | \$ 810.60 | \$ - | \$ 1,265.21 | \$ 1,265.21 | \$ - | 454.61 |
| 3 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA. | M3 | 262.08 | 0.00 | 198.50 | 198.50 | 63.58 | \$82.72 | \$ 21,679.28 | \$ - | \$ 16,419.92 | \$ 16,410.92 | \$ - | 5,259.34 |
| CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA. | ML | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | \$10.10 | \$ 1,212.00 | \$ - | \$ 1,212.00 | \$ 1,212.00 | \$ - | - |
| 5 | PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION. | M2 | 84.00 | 0.00 | 131.11 | 131.11 | -47.11 | \$48.56 | \$ 4,078.20 | \$ - | \$ 6,365.39 | \$ 6,365.39 | \$ - | 2,287.19 |
| 6 | ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUPERVISION. | ML | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | \$173.33 | \$ 20,799.60 | \$ - | \$ 20,799.60 | \$ 20,799.60 | \$ - | - |
| 7 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION. | M3 | 151.20 | 0.00 | 169.03 | 169.03 | -17.83 | \$513.87 | \$ 77,696.43 | \$ - | \$ 86,558.64 | \$ 86,558.64 | \$ - | 9,162.22 |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES | | | | | | | | | \$ 103,786.23 | \$ - | \$ 115,235.63 | \$ 115,235.63 | \$ - | 11,449.41 |
| INSTALACION DE TUBERIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | \$246.23 | \$ 29,547.60 | \$ - | \$ 29,547.60 | \$ 29,547.60 | \$ - | - |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 24.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 5.00 | \$1,580.00 | \$ 37,920.00 | \$ - | \$ 30,020.00 | \$ 30,020.00 | \$ - | 7,900.00 |
| 10 | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H= 180 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | \$5,069.90 | \$ 10,137.80 | \$ - | \$ 10,137.80 | \$ 10,137.80 | \$ - | - |
| 11 | CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE. | PZA | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | \$680.00 | \$ 680.00 | \$ - | \$ 680.00 | \$ 680.00 | \$ - | - |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION INSTALACION DE TUBERIA | | | | | | | | | \$ 78,285.40 | \$ - | \$ 70,385.40 | \$ 70,385.40 | \$ - | 7,900.00 |

PERIODO: DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018
OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


UBICACIÓN: ZAPOTTAN DE HIDALGO
CONTRATISTA: CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018



E S T I M A C I Ó N D E O B R A E J E C U T A D A

| No. | CONCEPTO | U | CANTIDADES | | | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | | | | SALDO | | | | | |
|---|--|----|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------|------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|----------|------------|----------|----------|
| | | | PRESUPUESTO BASE | ESTIMACION ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA | | SALDO | PRESUPUESTO BASE | ESTIMACION ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | | ESTIMACION ACUMULADA | | | | |
| 12 | CALLE EMILIANO ZAPATA COMPLEMENTARIOS LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | M2 | 240.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | \$6.26 | 1,502.40 | \$ | - | \$ | 2,629.20 | \$ | 2,629.20 | -\$ | 1,126.80 | |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | | | | | | | | \$ | 1,502.40 | \$ | - | \$ | 2,629.20 | \$ | 2,629.20 | -\$ | 1,126.80 |
| TOTAL | | | | | | | | \$ | 212,972.72 | \$ | - | \$ | 212,845.57 | \$ | 212,845.57 | \$ | 127.15 |


 C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA
 CONTRATISTA


 INC. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


GENERADORES DE OBRA



| | |
|---|--------------------------------------|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1 FINQUITO |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|
| NO. | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|-----|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|------|------|-----------|--------|----|
| 1 | EXCAVACION EN ZANJA DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B". | A | 120.00 | 0.65 | 1.70 | 1.00 | 132.60 | M3 |
| | | | | | | SUB TOTAL | 132.60 | M3 |

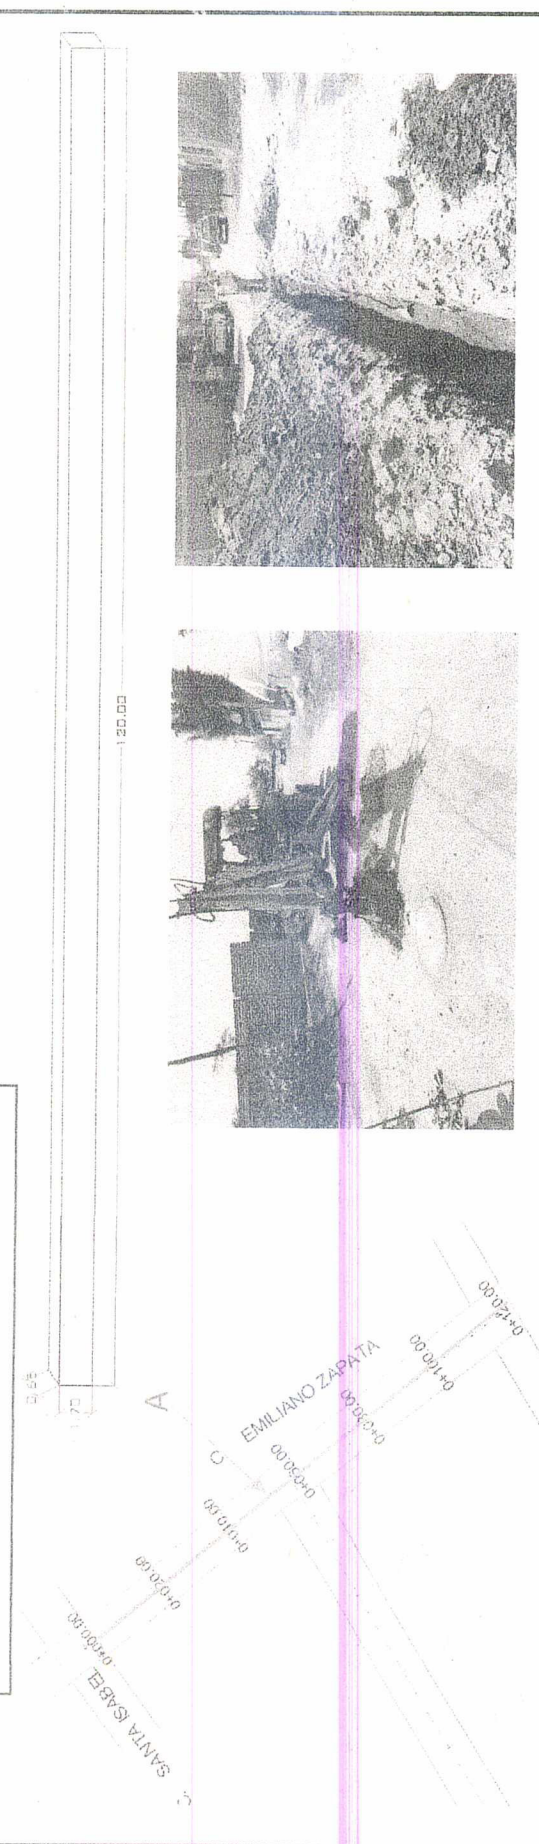

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| REVISOR | REVISOR |
| SUPERVISOR | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |
| REPRESENTANTE LEGAL | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |





GENERADORES DE OBRA



| | |
|---|--|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | |
| PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA | PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA |
| | 11 DE JUNIO DE 2018 |
| | 1 FISIQUITO |

| GENERADOR DE OBRA | | PIEZA | | LARGO | | ANCHO | | ALTO | | CANTIDAD | | VOLUMEN | | UNIDAD | |
|-------------------|----------|-------|--|-------|--|-------|--|------|--|----------|--|---------|--|--------|--|
| NO. | CONCEPTO | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|------|------|--|-------------|--|--------|--|----|
| 1 | EXCAVACION EN ZANJA DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B". | B | | 4.30 | 0.65 | 1.30 | | 19.00 | | 69.04 | | M3 |
| | | | | | | | | SUB TOTAL 2 | | 69.04 | | M3 |
| | | | | | | | | TOTAL | | 201.64 | | M3 |

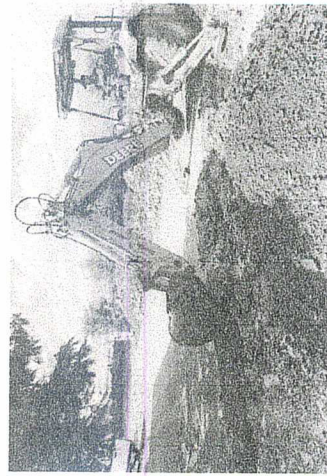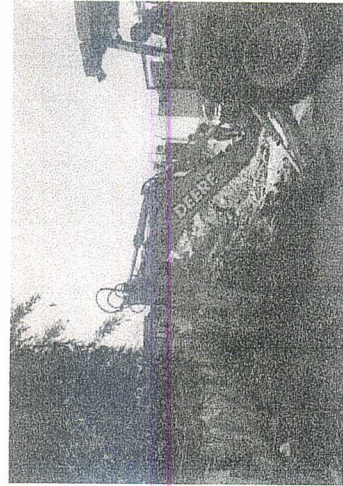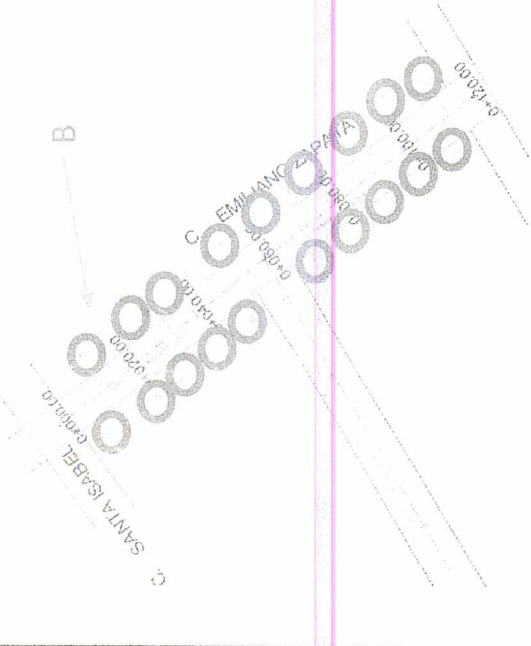

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| REVISOR | REVISOR |
| SUPERVISOR | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |
| REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |


GENERADORES DE OBRA



| | |
|---|--------------------------------------|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 11 DE JUNIO DE 2018 |
| | GMJ 011C OP/2018 RAMO 33 |

| NO | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|----|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|
|----|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|------|------|-------|-------|----|
| 2 | AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA. | A | 120.00 | 0.65 | 0.00 | 1.00 | 78.00 | M2 |
| | | | | | | TOTAL | 78.00 | M2 |

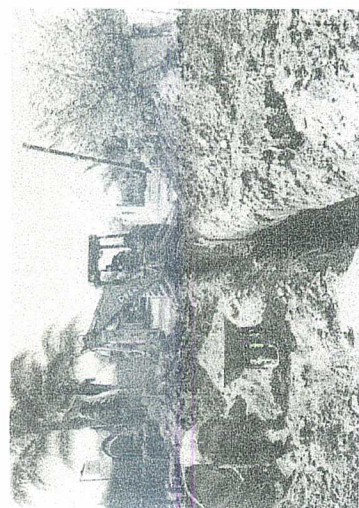




| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| REVISOR | REVISOR |
| SUPERVISOR | REPRESENTANTE LEGAL |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |
| | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |

GENERADORES DE OBRA

| | |
|---|--------------------------------------|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1 FINQUITO |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE | 11 DE JUNIO DE 2018 |
| PROYECTO: GMJ 011C OP/2018 | |
| PROYECTO: RAMO 33 | |

| NO. | GENERADOR DE OBRA | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|-----|-------------------|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|
|-----|-------------------|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|-------|-------------|--------|----|
| 2 | AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA. | B | 4.30 | 0.65 | 0.00 | 19.00 | 53.11 | M2 | |
| | | | | | | | SUB TOTAL 2 | 53.11 | M2 |
| | | | | | | | TOTAL | 131.11 | M2 |

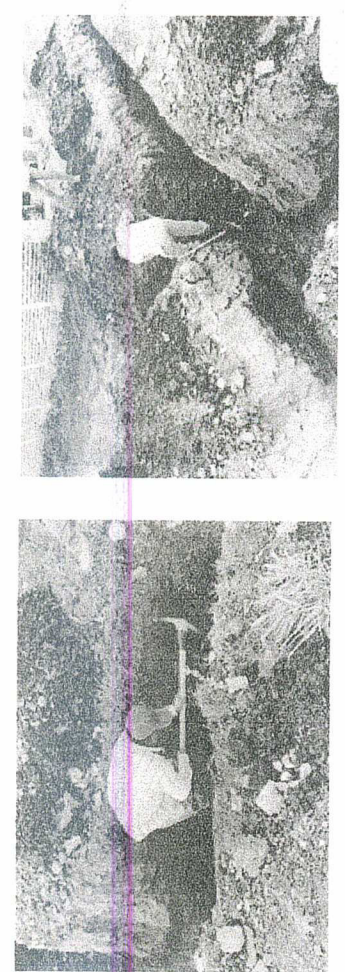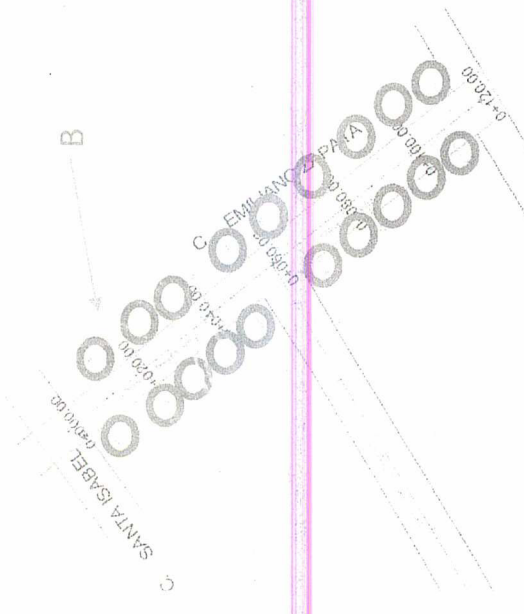



| REVISOR | REVISOR |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SUPERVISOR | REPRESENTANTE LEGAL |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |
| ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | |

GENERADORES DE OBRA



| | |
|---|--------------------------------------|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1 FINANCIADO |
| GENERADOR DE OBRA | 11 DE JUNIO DE 2018 |
| CONCEPTO | GMI 011C OP/2018 RAMO 33 |

| NO. | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|-----|--|-------|-------|-------|------|------------|---------|--------|
| 3 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA. | A | 120 | 0.65 | 1.70 | 1.00 | 132.60 | M3 |
| | | | | | | SUBTOTAL 1 | 132.60 | M3 |

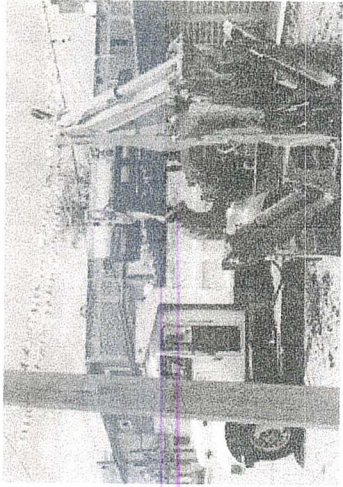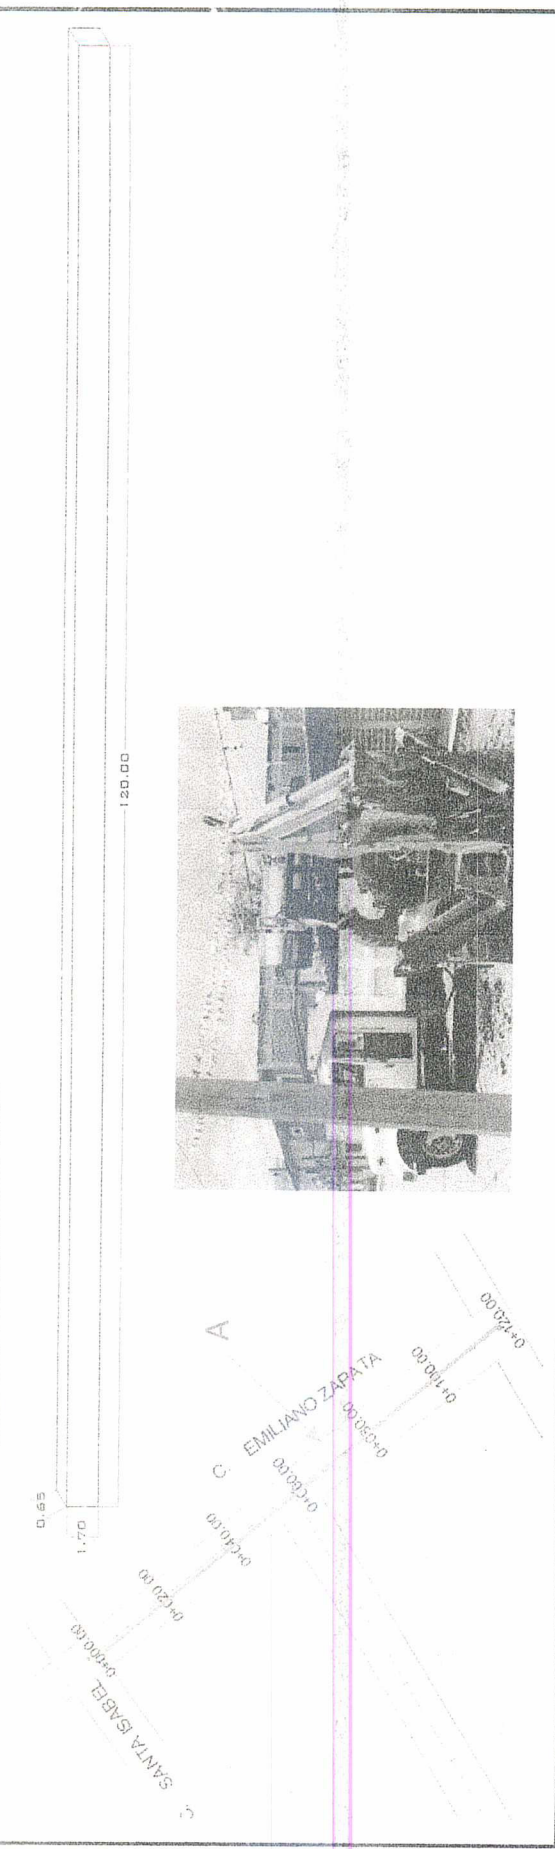



| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| REVISOR | REVISOR |
| SUPERVISOR | REPRESENTANTE LEGAL |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |
| ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | |

GENERADORES DE OBRA

RENDAO

| | |
|---|--------------------------------------|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 11 DE JUNIO DE 2018 |
| | GMJ 011C OP/2018 RAMO 33 |

| NO. | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANGHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|-----|--|-------|-------|-------|------|------------|---------|--------|
| 3 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO DE 6M3 A UNA DSITANCIA MAXIMA DE 1.00 KM FUERA DE LA OBRA. | B | 4.30 | 0.65 | 1.30 | 18 | 65.90 | M3 |
| | | | | | | SUBTOTAL 2 | 65.90 | M3 |
| | | | | | | TOTAL | 198.50 | M3 |

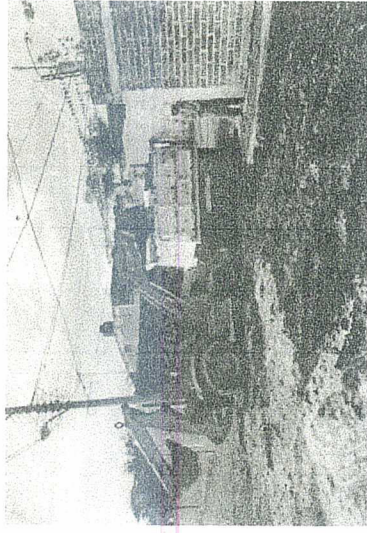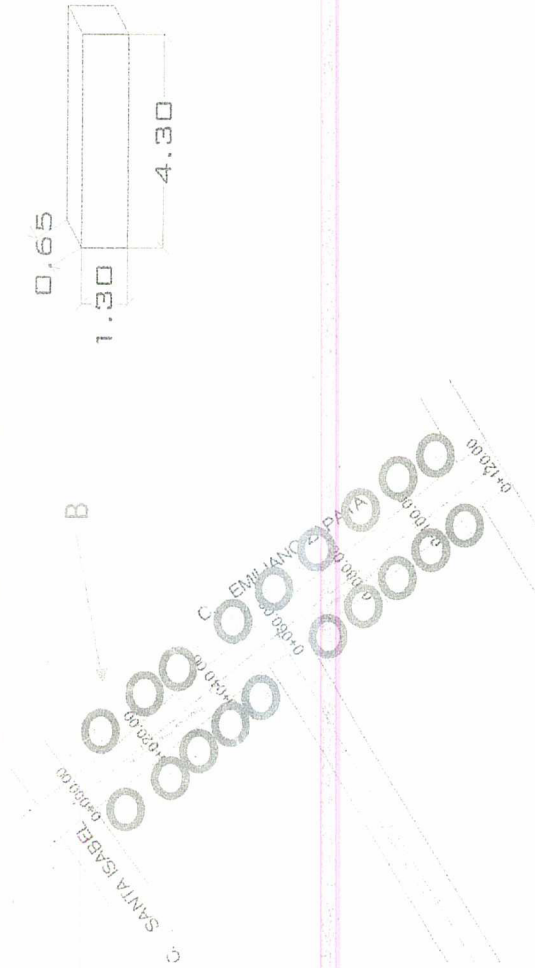




| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| REVISOR | REVISOR |
| SUPERVISOR | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |
| | REPRESENTANTE LEGAL |
| | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |

GENERADORES DE OBRA

| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 | | | | | | |
|--|--|--------|-------|------|----------|---------|--------|
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1 FINQUITO | | | | | | |
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. GENERADOR DE OBRA CONCEPTO TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANGOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 11 DE JUNIO DE 2018 GMJ 011C OP/2018 RAMO 33 | | | | | | |
| NO. | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
| 4 | A | 120.00 | - | - | 1.00 | 120.00 | ML |
| | | | | | TOTAL | 120.00 | ML |

COMFORMACION DE BASES Y SUBBASES

TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANGOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

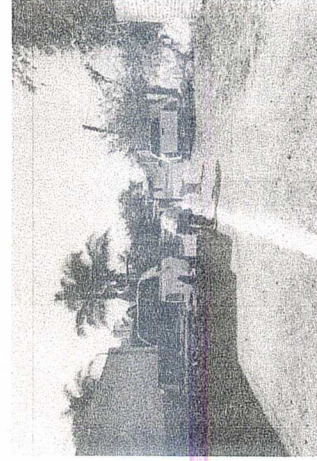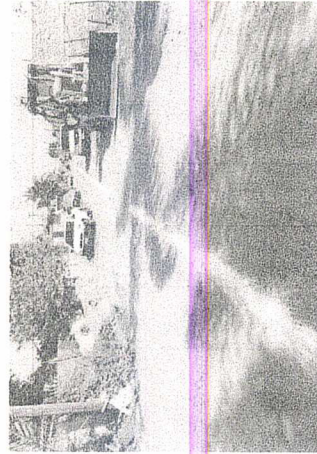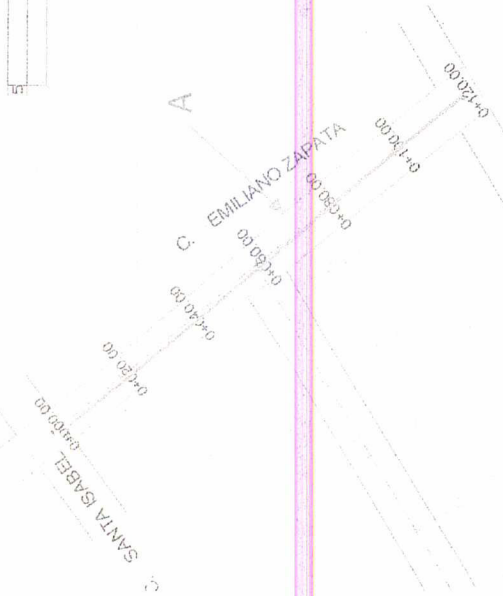

120.00




| | | |
|---|--|--|
| SUPERVISOR ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | REPRESENTANTE LEGAL C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |
|---|--|--|

GENERADORES DE OBRA

| | |
|--|--|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |
| GMJ 011C OP/2018 | GMJ 011C OP/2018 |
| RAMO 33 | RAMO 33 |

| NO. | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|-----|--|-------|--------|-------|------|-------------|---------|--------|
| 5 | PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CGN MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION. | A | 120.00 | 0.65 | - | 1.00 | 78.00 | M2 |
| | | | | | | SUB-TOTAL 1 | 78.00 | M2 |

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

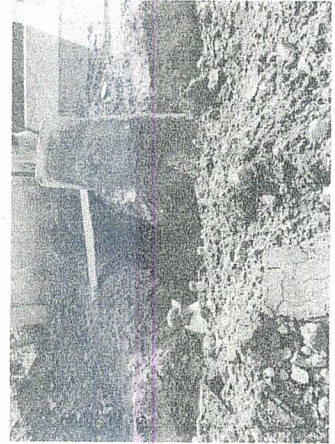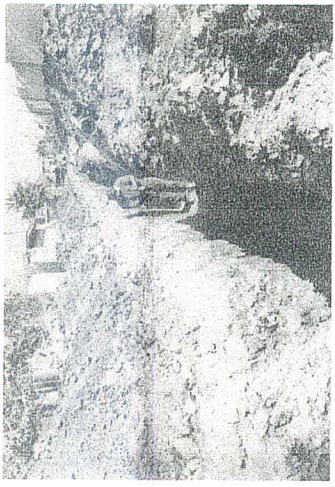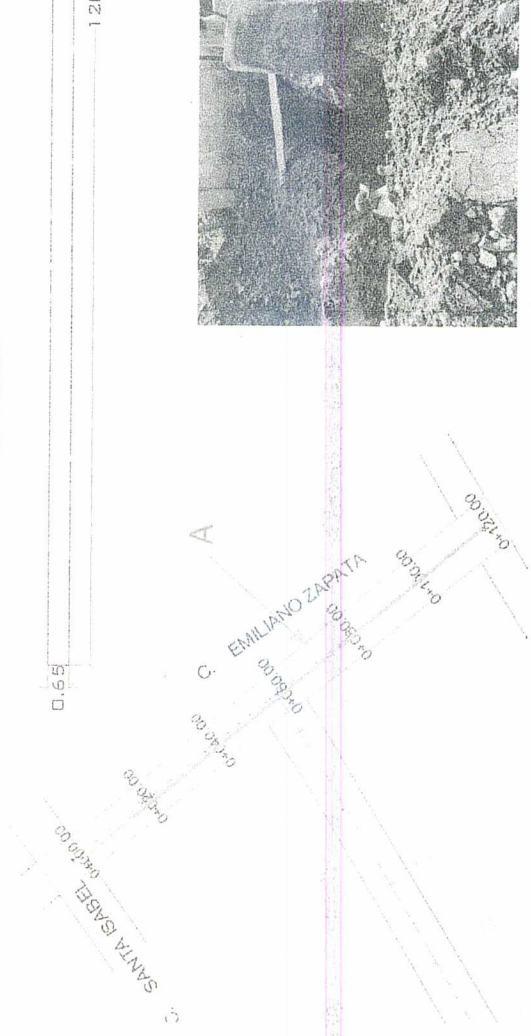

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| REVISOR | REVISOR |
| SUPERVISOR | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |
| | REPRESENTANTE LEGAL |
| | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |


GENERADORES DE OBRA



| | |
|---|--------------------------------------|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 11 DE JUNIO DE 2018 |
| | GMJ 011C OP/2018 |
| | RAMO 33 |

| NO. | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|-----|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|
|-----|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|------|-------------|--------|----|
| 5 | PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION. | B | 4.30 | 0.65 | 0.00 | 19.00 | 53.11 | M2 |
| | | | | | | SUB TOTAL 2 | 53.11 | M2 |
| | | | | | | TOTAL | 131.11 | M2 |

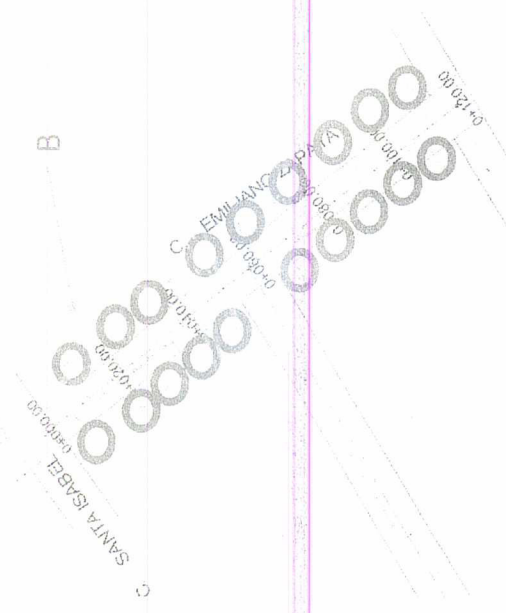

| REVISOR | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | REVISOR | REPRESENTANTE LEGAL |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |


GENERADORES DE OBRA



| | |
|---|---|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |

| NO. | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|-------|---|-------|--------|-------|------|----------|---------|--------|
| 6 | ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 60 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y SUPERVISION. | A | 120.00 | - | - | 1.00 | 120.00 | ML |
| TOTAL | | | | | | | 120.00 | ML |

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

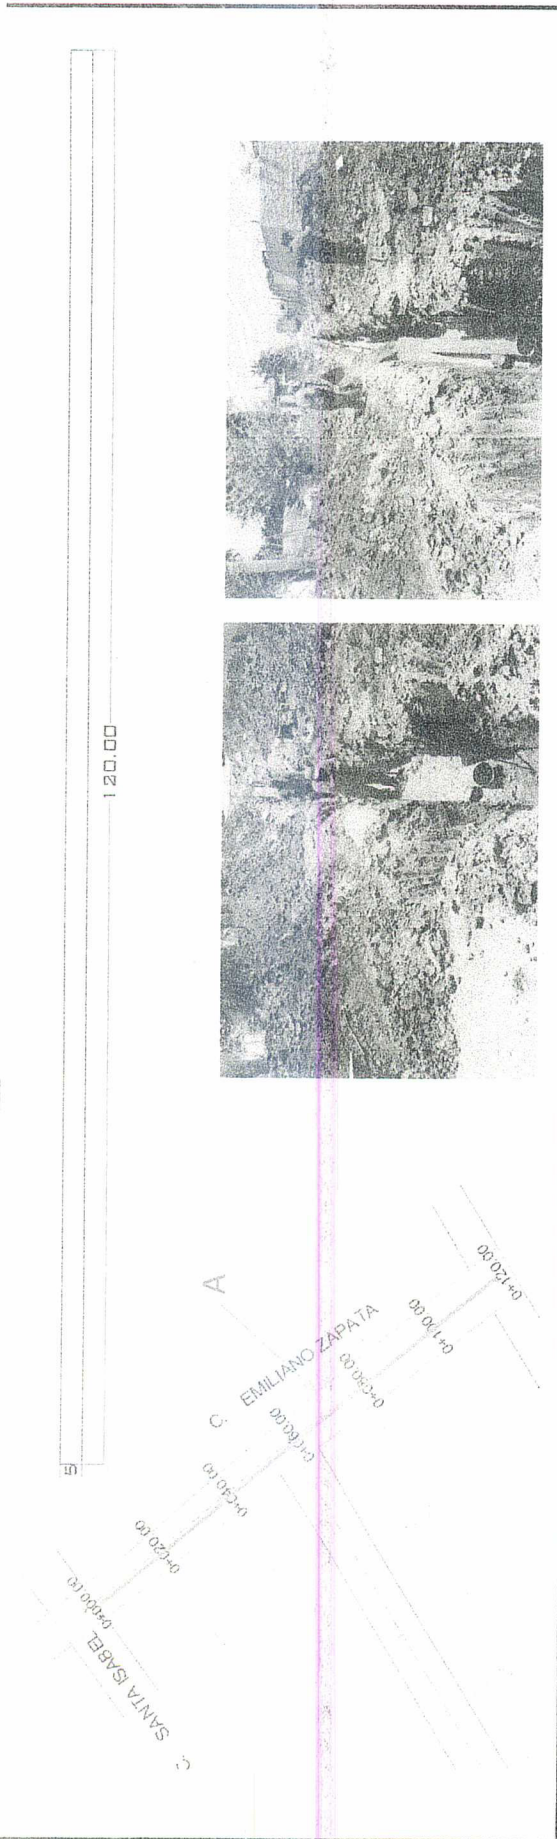


| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| REVISOR | REVISOR |
| SUPERVISOR | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |
| | REPRESENTANTE LEGAL |
| | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |

GENERADORES DE OBRA

| | |
|---|--|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | PREPARA EL ESTUDIO DE: 11 DE JUNIO DE 2018 |
| | PRELIMINAR: GMJ 011C OP/2018 |
| | PROYECTO: RAMO 33 |
| I FINIQUITO | |

RELENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.

| NO | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|----|-----------------------------------|-------|--------|-------|------|-------------|---------|--------|
| 7 | CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES | A | 120.00 | 0.65 | 1.35 | 1.00 | 105.30 | M3 |
| | | | | | | SUB TOTAL 1 | 105.30 | M3 |

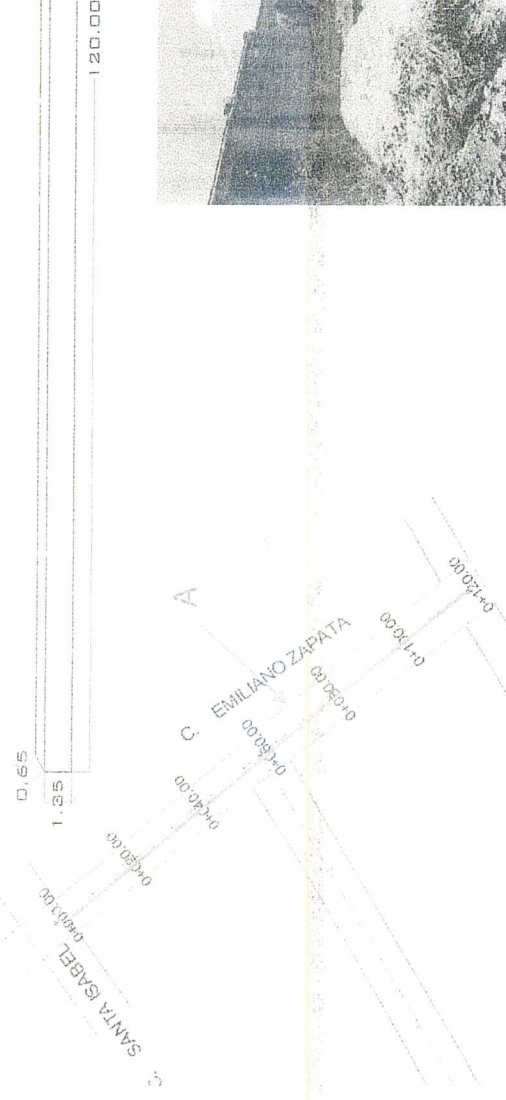

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SUPERVISOR | REVISOR |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |
| | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO |
| | REPRESENTANTE LEGAL |
| | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |



GENERADORES DE OBRA

RENDAC

| | |
|---|--------------------------------------|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | |
| GMJ 011C OP/2018 RAMO 33 | |

| GENERADOR DE OBRA | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|
| NO. | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|------|------------|--------|----|
| 7 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION. | B | 4.30 | 0.65 | 1.20 | 19.00 | 63.73 | M3 |
| | | | | | | SUBTOTAL 2 | 63.73 | M3 |
| | | | | | | TOTAL | 169.03 | M3 |

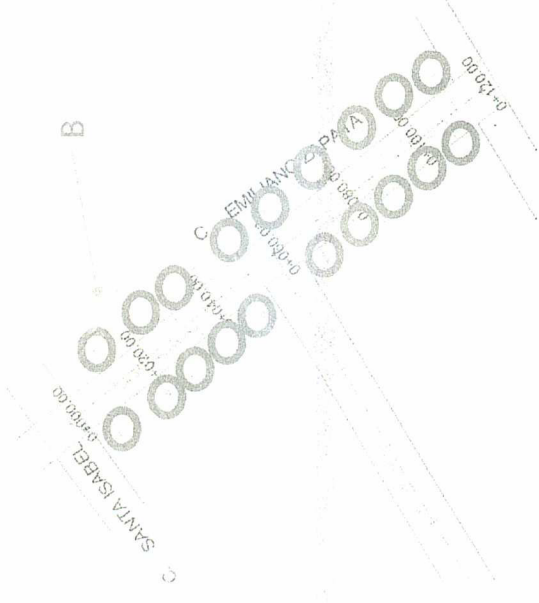


| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| REVISOR | REVISOR |
| SUPERVISOR | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |
| | REPRESENTANTE LEGAL |
| | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |

GENERADORES DE OBRA

| | |
|---|---|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |

| NO. | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|-----|---|-------|--------|-------|------|----------|---------|--------|
| 8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA | A | 120.00 | - | - | - | 120.00 | ML |
| | | | | | | TOTAL | 120.00 | ML |

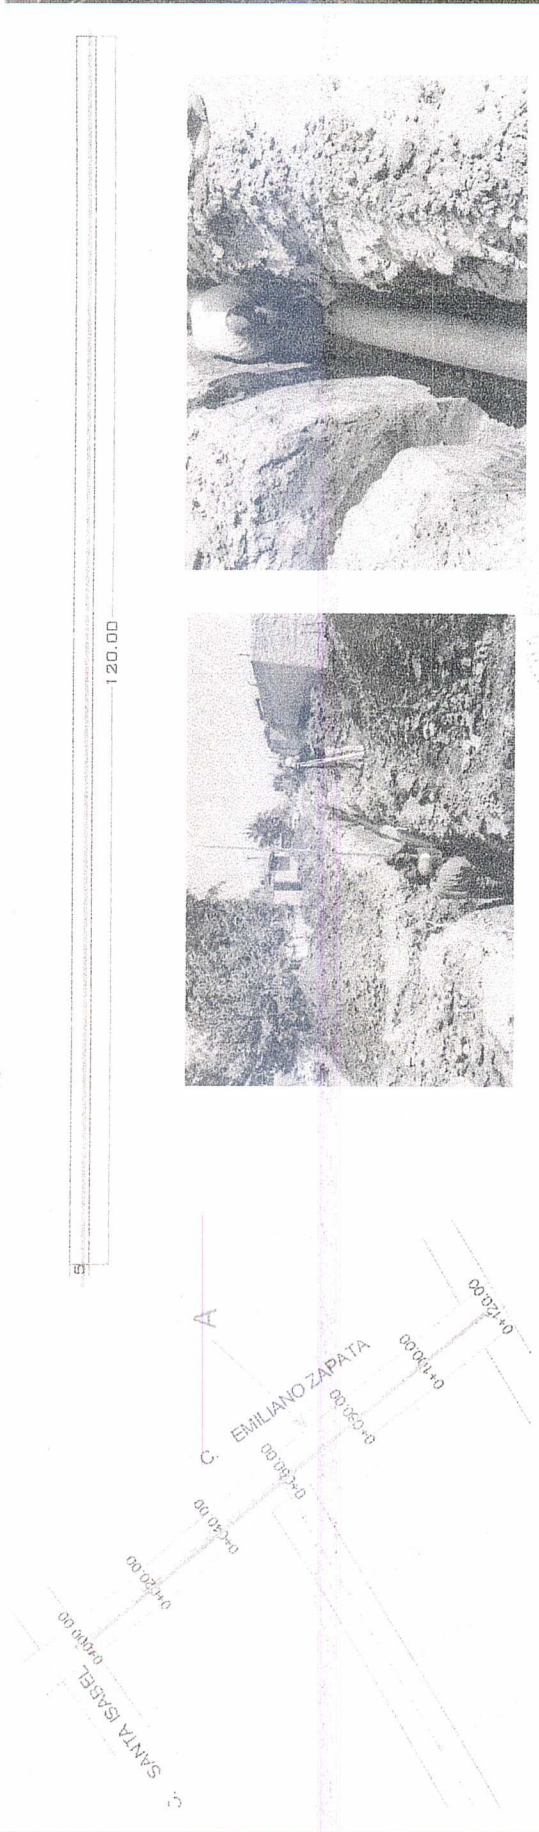

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|
| REVISOR | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | REVISOR | REPRESENTANTE LEGAL |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |

GENERADORES DE OBRA



| | |
|--|--------------------------------------|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, IALISCO. | 1 FINICUITO |

| NO. | CONCEPTO | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|-----|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|
|-----|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-----|
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | A | - | - | - | 19.00 | 19.00 | PZA |
| | | | | | | TOTAL | 19.00 | PZA |

INSTALACION DE TUBERIA










| REVISOR | | REVISOR | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| SUPERVISOR | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | REPRESENTANTE LEGAL | |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | |

GENERADORES DE OBRA

RENDADO
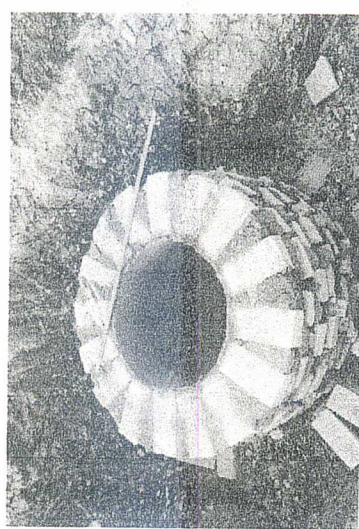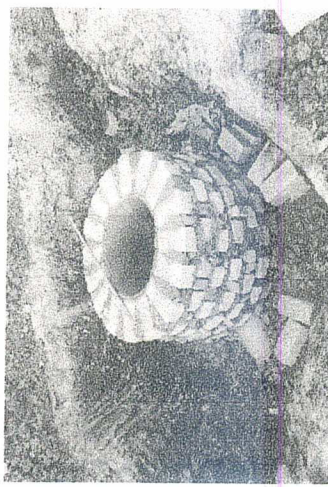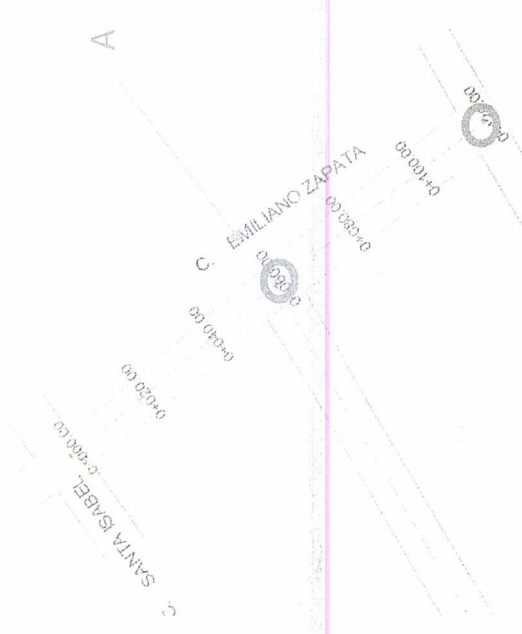
| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|------|------|-----|
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 | | | | |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1 FINQUITO | | | | |
| DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018 | DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018 | | | | |
| REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 11 DE JUNIO DE 2018 | | | | |
| GMJ 011C OP/2018 | | | | | |
| RAMO 33 | | | | | |
| GENERADOR DE OBRA | | | | | |
| CONCEPTO | | | | | |
| CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H= 180 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | | | | | |
| 10 | A | 2.00 | 2.00 | 2.00 | PZA |
| TOTAL | | | | 2.00 | PZA |



| | |
|--|--|
| REVISOR | REVISOR |
|  ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO |
| SUPERVISOR | REPRESENTANTE LEGAL |
|  ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | REVISOR  C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |

GENERADORES DE OBRA


DEL 23 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2018
 DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2018
 11 DE JUNIO DE 2018

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

GMJ 011C OP/2018
 RAMO 33

| GENERADOR DE OBRA | | PIEZA | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|------|----------|---------|--------|
| NO. | CONCEPTO | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|--------|------|---|-------|--------|----|
| 12 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | A | 120.00 | 3.50 | - | 1.00 | 420.00 | M2 |
| | | | | | | TOTAL | 420.00 | M2 |

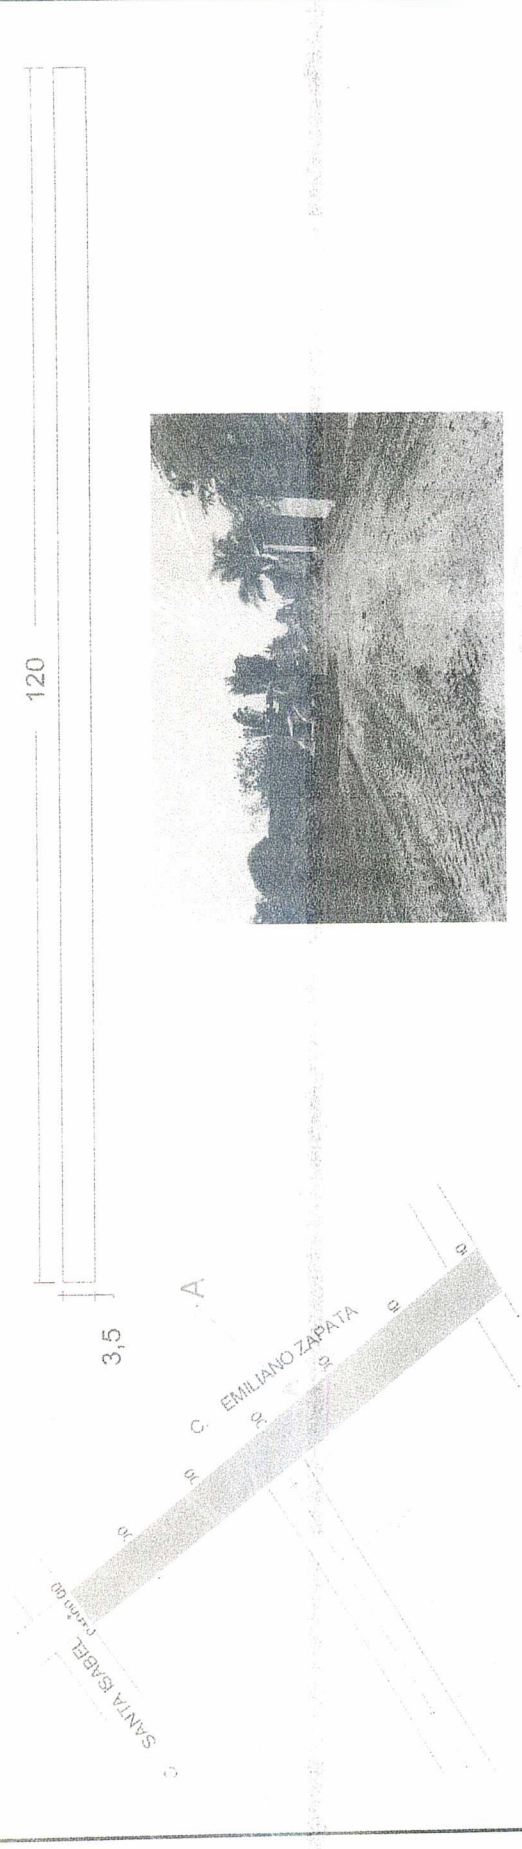

| REVISOR | | REVISOR | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| SUPERVISOR | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS | REPRESENTANTE LEGAL | |
| ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | C. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | |



CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA

PECC921214N63

VICENTE GUERRERO #72 OTE., JOCOTEPEC, JAL. CP. 45800, TEL. 387 763 1832

NOMBRE DE LA OBRA

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTTITAN DE HIDLGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

CONTRATANTE

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

PROCESO

CALENDARIO DE EJECUCION POR PARTIDAS

| PARTIDA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | PORCENTAJE |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| CALLE EMILIANO ZAPATA | | | | | |
| DEMOLICION Y EXCAVACION | | | | | 100% |
| CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES | | | | | 100% |
| INSTALACION DE TUBERIA | | | | | 100% |
| COMPLEMENTARIOS | | | | | 100% |



DIRECCION DE...



Jocotepec, Jalisco a 25 de Mayo de 2018

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS

Ing. Juan Manuel García Escoto
Director de Obras Publicas

PRESENTE

At'n: Arq. Cesar Antonio Alonso Jiménez
Supervisor de obras

Con referencia a la obra: **“REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDLGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.”**, ubicada en la localidad de Zapotitan de Hidalgo, en el Municipio de Jocotepec, Jalisco. Que esta empresa tiene contratada con su representación según contrato No. **GMJ 011C OP/2018**.

Informo a usted que con fecha 28 de Mayo del presente año se inician en tiempo y forma los trabajos de la obra antes mencionada.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

Lic. Carlos Manuel Pelayo Cervera





Jocotepec, Jalisco a 25 de Mayo de 2018

ASUNTO: ASIGNACION DE RESIDENTE

Ing. Juan Manuel García Escoto
Director de Obras Publicas

PRESENTE

At'n: Arq. Cesar Antonio Alonso Jiménez
Supervisor de obras

Con referencia a la obra: **“REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDLGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.”**, ubicada en la localidad de Zapotitan de Hidalgo, en el Municipio de Jocotepec, Jalisco. Que esta empresa tiene contratada con su representación según contrato No. **GMJ 011C OP/2018**.

Informo a usted que el Ing. Gerardo Daniel Pelayo Cervera se asigna como residente de la obra para la ejecución de los trabajos contratados.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente

Lic. Carlos Manuel Pelayo Cervera





Jocotepec, Jalisco a 2 de Junio de 2018

ASUNTO: Solicitud Volúmenes Extraordinarios

Ing. Juan Manuel García Escoto
Director de Obras Públicas
Municipio de Jocotepec, Jalisco

PRESENTE

At'n: Arq. Cesar Antonio Alonso Jiménez
Supervisor de obras

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y aprovecho para solicitarle que en la obra denominada **"REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDLGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO."**, se necesitan unos volúmenes extraordinarios en los siguientes conceptos:

| No | Concepto | Unidad | Volumen | P.U. | IMPORTE |
|----|--|--------|---------|----------|------------|
| 1 | EXCAVACION EN ZANJA DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B". | M3 | 0.04 | \$34.27 | \$1.37 |
| 2 | AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA. | M2 | 47.11 | \$9.65 | \$454.61 |
| 5 | PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION. | M2 | 74.11 | \$48.55 | \$2,287.19 |
| 7 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION. | M3 | 17.83 | \$513.87 | \$9,162.22 |


Por esto solicitamos la autorización para la ejecución de estos trabajos con volúmenes excedentes ya que son necesarios para la correcta ejecución de la obra.

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Lic. Carlos Manuel Pelayo Cervera





Jocotepec, Jalisco 3 de Junio de 2018

ASUNTO: ACEPTACION DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS

En Respuesta a la Solicitud de Vólumenes Extraordinarios de la obra **“REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO”**. Se confirma la solicitud antes mencionada debido que la infraestructura existente así lo requirió, esto con el propósito de que la obra sea apta y cumpla con las normas de calidad.

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTO DE OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JAL.



Jocotepec, Jalisco a 8 de Junio de 2018

ASUNTO: NOTIFICACION DE TERMINO DE TRABAJOS

Ing. Juan Manuel García Escoto
Director de Obras Publicas

PRESENTE

At'n: Arq. Cesar Antonio Alonso Jiménez
Supervisor de obras

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y aprovecho para notificarle que el día 11 de Junio del año en curso estaremos terminando la ejecucion de los trabajos contratados en la obra denominada **"REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDLGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO."**, para dar recorrido en la obra y supervisar lo ejecutado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Carlos Manuel Pelayo Cervera

