

RFC emisor: CASE780113C89
 Nombre emisor: SERGIO CABRERA
 Folio: 189
 RFC receptor: MJJ850101KP8
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: D2C2896C-B55F-4133-A5B6-89BB402A5C15
 No. de serie del CSD: 00001000000402923071
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45428 2018-09-17 08:41:20
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72102900		1	E48	NA	122458.20	122458.20				
Descripción	pago de estimacion No. 1 (unica) Relativo a la obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDEN AL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO", RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA \$ 859.27 MONTO PARA EFECTO DE PAGO: \$ 141,192.24				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	122458.20	Tasa	16.0000%	19593.31

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 122,458.20
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 19,593.31
 Total \$ 142,051.51

Sello digital del CFDI:

YPzltjTWKoucmWBilbEcur/1fPsg/17kG38u7c0ynTO2XBNrh5z7067UxNCQ1Uhm/9fEUIO8r7IQo02VTg8VEbZQla2xXaz2+I/EZ1mVMTRCnL/+8iAaJZZRaAI7JohfncYv9nVxqk7vaPoSZzT7kaGLQxojBkKWbQ0bfA7dRwV10rDycT1+tanIxGVuH1tqc1o9luW0HcpwPCm0RNaUn9wwGkvGBR5rQ0IdUJaUPM9X9Kbvq6oRjrFymSXuBZRdaUNS3L/1qW1y9/CqCUQuSBXw3ThivHIUK03H06ySVITG+//GblR0Lmde4OmRku1V2i633YuDMb0DJvy1xAOzg==


Sello digital del SAT:


JBBk61srzcFXRNYDU84BtgsHBtBmJAUayADR3Q9U0QJ0e0i4qKDQZF+nR5OqZPGLjn5X1PuCbMCTqi9s/GuhWiShqerGgS4gniPT0kwJXmJIBsB1rk3OMIKApJsl8C06fWED18fznan4687k0usWejez0GhQpvKGHi823uwzv+NlJwzTsdT4HtNXHhiahMfAe9q/Z/Frm3U4/sh4P3B5FUnek11KBfr6uzknquW97aAZCgKzRDqHnNsvKgDp/IMklqyq3lHkw5KqCmEz0uqjWIU2bd6pYccCagkfj9UWiiAzsOI1hnPFCsexzWjazgElsK3HC5NxfNwNfW==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D2C2896C-B55F-4133-A5B6-89BB402A5C15|2018-09-17T08:48:09|SAT970701NN3|YPzltjTWKoucmWBilbEcur/1fPsg/17kG38u7c0ynTO2XBNrh5z7067UxNCQ1Uhm/9fEUIO8r7IQo02VTg8VEbZQla2xXaz2+I/EZ1mVMTRCnL/+8iAaJZZRaAI7JohfncYv9nVxqk7vaPoSZzT7kaGLQxojBkKWbQ0bfA7dRwV10rDycT1+tanIxGVuH1tqc1o9luW0HcpwPCm0RNaUn9wwGkvGBR5rQ0IdUJaUPM9X9Kbvq6oRjrFymSXuBZRdaUNS3L/1qW1y9/CqCUQuSBXw3ThivHIUK03H06ySVITG+//GblR0Lmde4OmRku1V2i633YuDMb0DJvy1xAOzg=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-17 08:48:09
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



 (<http://www.gob.mx/>) Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT


Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CASE780113C89	SERGIO CABRERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
044034B5-3BBF-4E11-87C1-CC3F2852D387	2018-09-15T09:37:49	2018-09-17T10:37:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$142,051.51	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)

- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/siternap\)](https://www.gob.mx/siternap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)


Mantente informado. Suscríbete.


usuario@ejemplo.com



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>





H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 032 COP/2018

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".

HOJA DE RELACION ESTIMACION No.

HOJA No. 1 DE 1
01 (Uno) Unica.

PERIODO DE TRABAJO:

DEL: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

UBICACION: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

FECHA: 10 de septiembre de 2018.

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

PARTIDAS

IMPORTES


1 PRELIMINARES
2 RELLENOS
3 INSTALACION DE TUBERIA
4 COMPLEMENTARIOS

\$ 38,106.04
\$ 86,731.90
\$ 44,293.60
\$ 2,723.21

MONTO DE ESTIMACION \$ 171,854.75
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 25 % \$ 49,396.55
SUBTOTAL \$ 122,458.20
I. V. A. 16% \$ 19,593.31
SUMA \$ 142,051.51
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) \$
MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 859.27
NETO A PAGAR \$ 141,192.24

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL
ASIGNACION	\$ 197,396.21	\$ 31,613.79	\$ 229,000.00
IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 171,854.75	\$ 27,496.76	\$ 199,351.51
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 171,854.75	\$ 27,496.76	\$ 199,351.51
SALDO POR EJERCER	\$ 25,731.46	\$ 4,117.03	\$ 29,848.49
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
ANTICIPO 25%	\$ 49,396.55	\$ 7,903.45	\$ 57,300.00
AMORTIZACION	\$ 49,396.55	\$ 7,903.45	\$ 57,300.00
AMORTIZACION ACUM. ANT.	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACION A LA FECHA	\$ 49,396.55	\$ 7,903.45	\$ 57,300.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -

EL REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE
 ING. SERGIO CABRERA EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	 ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	 ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO



PERÍODO: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
CONTRATISTA: SERGIO CABRERA.
FECHA: 10 de septiembre de 2018.

ESTIMACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS												
No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO	
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA		SALDO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
EXCAVACIONES.												
1	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" BOLEO EMPACADA EN ARCILLA.	M3	73.9200	0.0000	65.9800	65.9800	7.94	\$354.77	\$ 26,224.00	\$ 23,407.72	\$ -	\$ 2,816.87
2	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIPO LIBRE FUERA DE OBRA	M3	96.1000	0.0000	85.7700	85.7700	10.33	\$155.43	\$ 14,936.82	\$ 13,331.23	\$ -	\$ 1,605.59
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	92.4000	0.0000	79.1600	79.1600	13.24	\$17.27	\$ 1,595.75	\$ 1,367.09	\$ -	\$ 228.65
							SUBTOTAL, ESTA ESTIMACION DE EXCAVACIONES:		\$ 38,106.04			
4	TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANQUOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M/L	132.0000	0.0000	113.0900	113.0900	18.91	\$16.21	\$ 2,139.72	\$ 1,833.19	\$ -	\$ 306.53
5	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL (MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	92.4000	0.0000	79.1600	79.1600	13.24	\$117.87	\$ 10,891.19	\$ 9,330.59	\$ -	\$ 1,560.60
6	ENCÓFRADO DE LINEA DE DRENAJE CON CONCRETO F'c=100 KG CM2	ML	132.0000	0.0000	113.0900	113.0900	18.91	\$576.84	\$ 76,142.88	\$ 65,234.84	\$ -	\$ 10,908.04
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	21.5600	0.0000	18.4800	18.4800	3.08	\$559.16	\$ 12,055.49	\$ 10,333.28	\$ -	\$ 1,722.21
							SUBTOTAL, ESTA ESTIMACION DE RELLENO:		\$ 86,731.90			
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	132.0000	0.0000	113.0900	113.0900	18.91	\$324.04	\$ 42,773.28	\$ 36,645.68	\$ -	\$ 6,127.60
9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.00	\$7,647.92	\$ 7,647.92	\$ 7,647.92	\$ -	\$ -
							SUBTOTAL, ESTA ESTIMACION DE INSTALACION DE TUBERIA:		\$ 44,293.60			
COMPLEMENTARIOS												

[Handwritten signature and stamp]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES




ESTIMACIÓN No. 01 (Uno) Unica.


PERÍODO: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.


OBRA : CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".


UBICACIÓN : MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
CONTRATISTA SERGIO CABRERA.
FECHA: 16 de septiembre de 2018.

No.	CONCEPTO	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
		PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	SALDO
10	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	264.0000	0.0000	226.1800	\$12.04	\$ 3,173.56	\$ 2,723.21	\$ 455.35
	SUBTOTAL, ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS:					\$	\$ 2,723.21	
	TOTAL					\$ 197,586.21	\$ 171,854.75	\$ 25,731.44



ING. SERGIO CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL


ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO".

01 (Uno) Unica.


CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACION	LONGITUD (m)	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	LADO	TOTAL	OBSERVACIONES
01	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" BOLEO EMPACADA EN ARCILLA.	M3	Privada Cardenal de R1 a R2	91.09	0.70	0.60		38.26	
			Privada Cardenal de R2 a R3	22.00	0.70	1.80		27.72	
TOTAL								65.98	M3



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO".



01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

FOTOGRAFIA

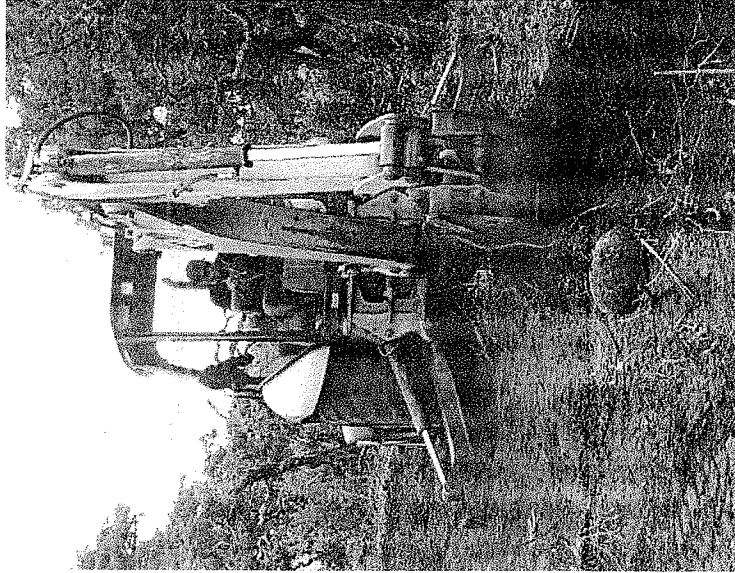


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO".



01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

CROQUIS 1

CROQUIS

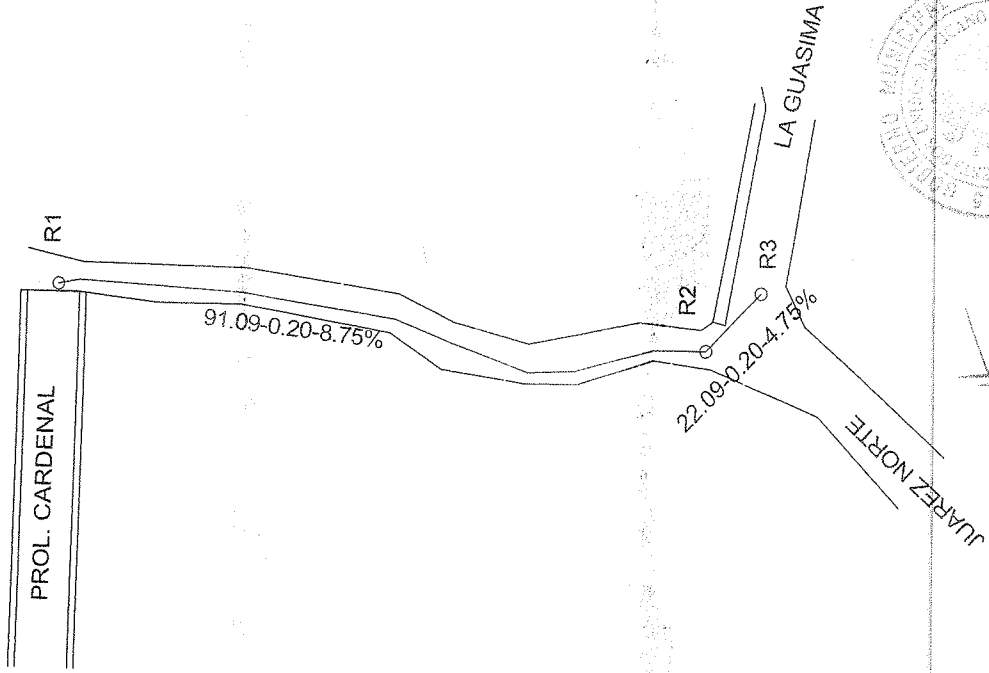

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GENERADORES DE OBRA


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO". 01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

FOTOGRAFIA



[Handwritten signature]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADORES DE OBRA



CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO". 01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

CROQUIS

CROQUIS 1

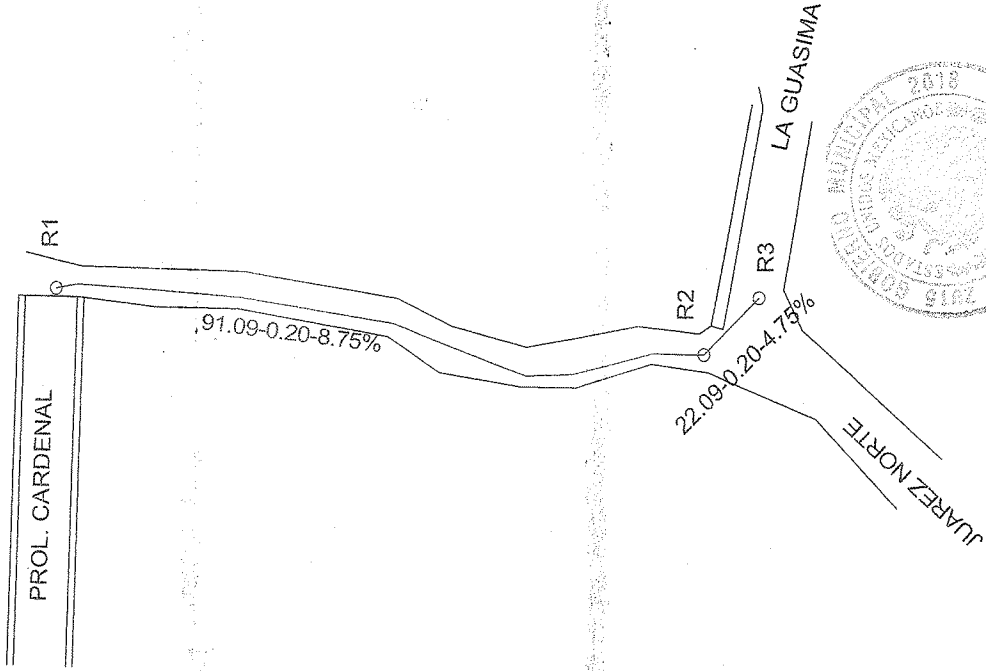

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAN JUAN COSALA, JALISCO

GENERADORES DE OBRA



CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION DE JOCOTEPEC, JALISCO".

Jocotepec

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

FOTOGRAFIA

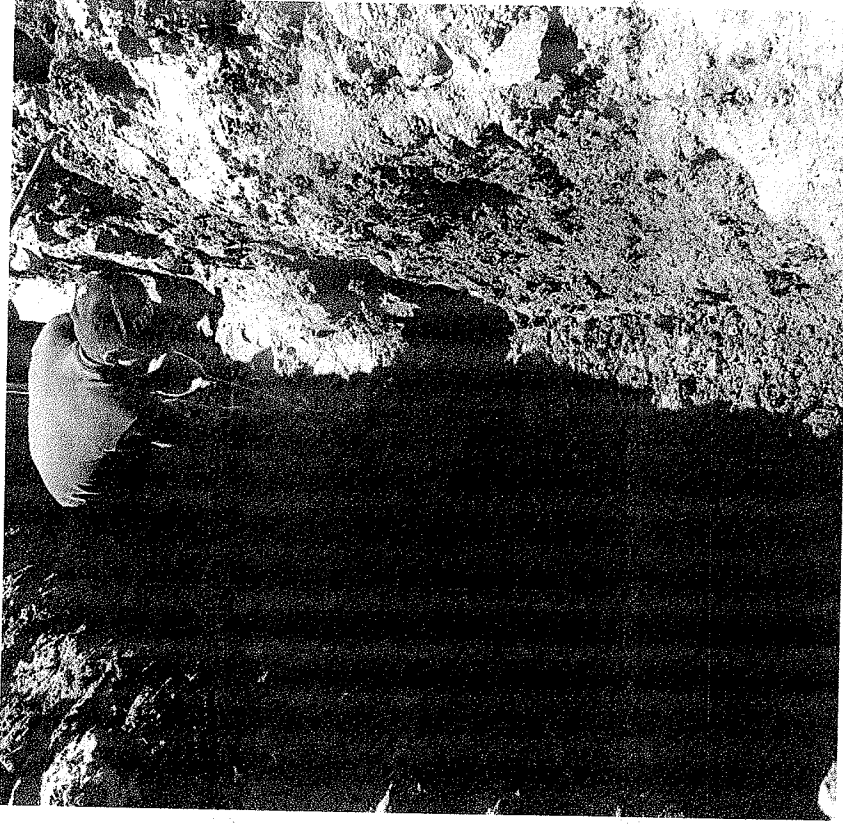

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALEA, MUNICIPIO ESTIMACION DE JOCOTEPEC, JALISCO".



01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

CROQUIS

CROQUIS 1

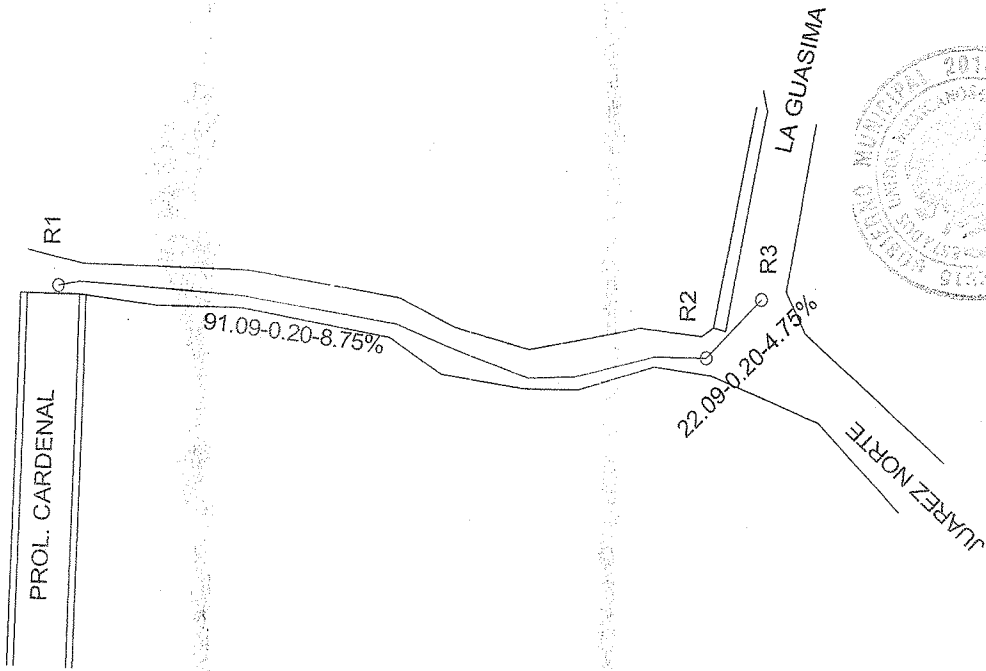

[Handwritten signature]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION DE JOCOTEPEC, JALISCO". 01 (Uno) Unica.


Jocotepec

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA


FECHA:

Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

FOTOGRAFIA

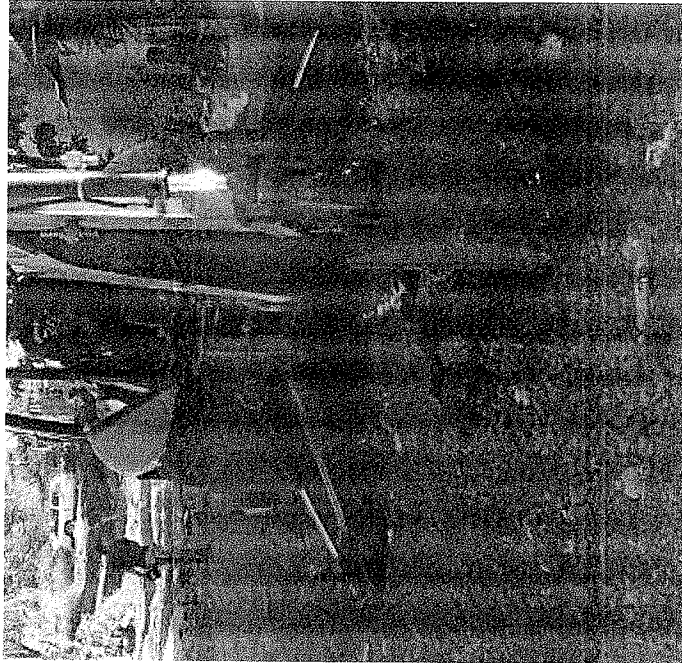

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GOSALEA, MUNICIPIO ESTIMACION DE JOCOTEPEC, JALISCO".

01 (Uno) Unica.

Jocotepec


CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

CROQUIS

CROQUIS 1

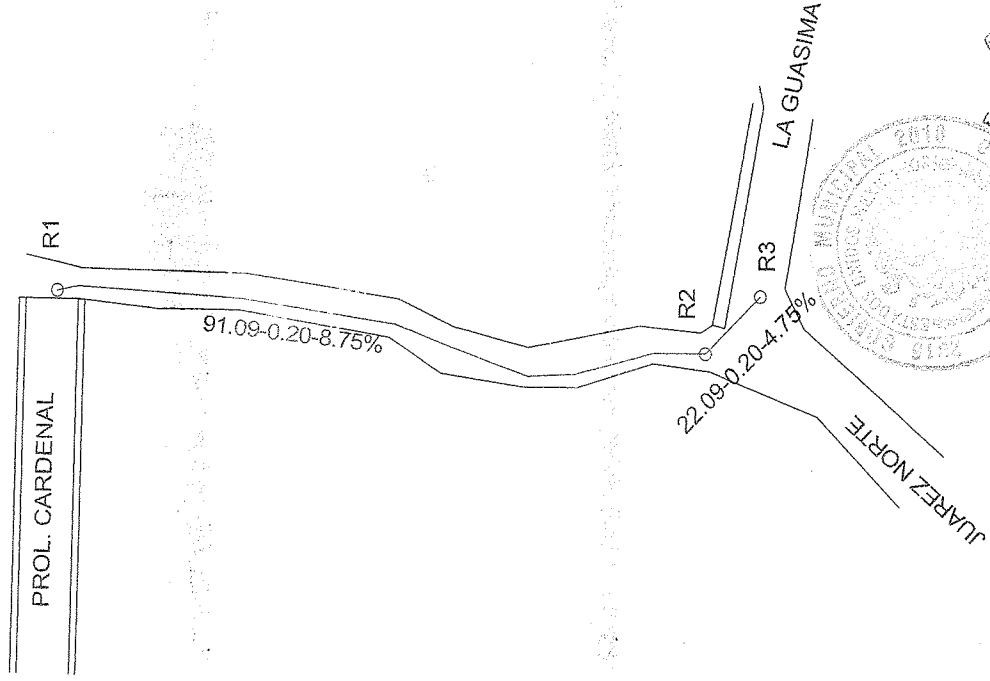

GENERADORES DE OBRA


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GOSALA, MUNICIPIO ESTIMACION DE JOCOTEPEC, JALISCO".

Jocotepec

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACION	LONGITUD (m)	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	LADO	TOTAL	OBSERVACIONES
05	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	Privada Cardenal de R1 a R2 Privada Cardenal de R2 a R3	91.09	0.70	0.10		63.76	
				22.00	0.70	0.10		15.40	
TOTAL								79.16	M2



Sergio Cabrera

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION DE JOCOTEPEC, JALISCO".

01 (Uno) Única.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

FOTOGRAFIA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION DE JOCOTEPEC, JALISCO".



UT (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

CROQUIS

CROQUIS 1

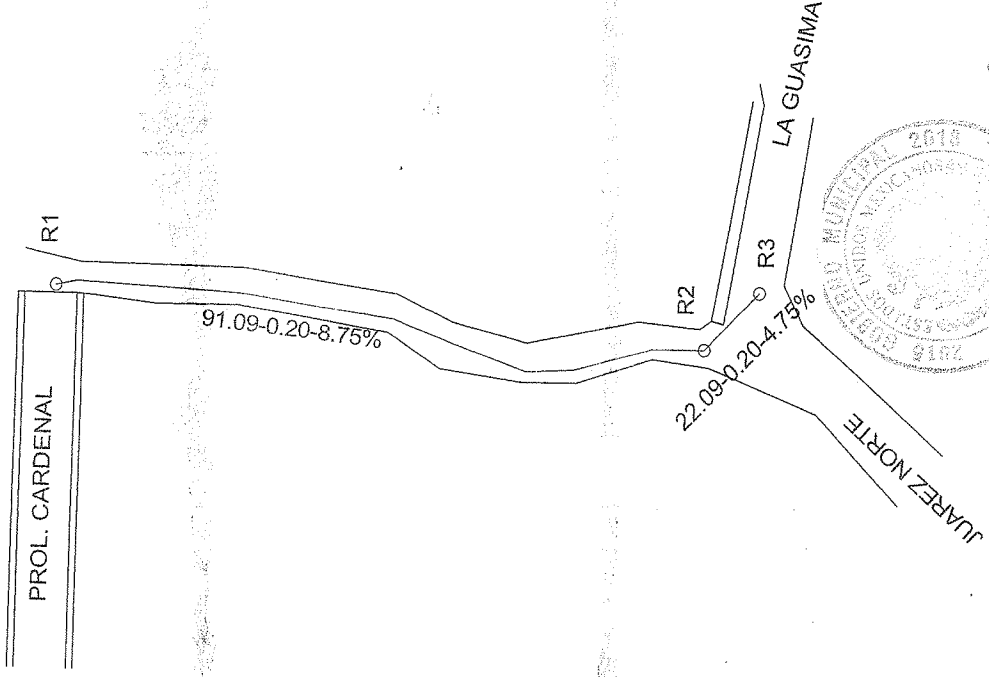

[Handwritten signature]

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO".



01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

FOTOGRAFIA

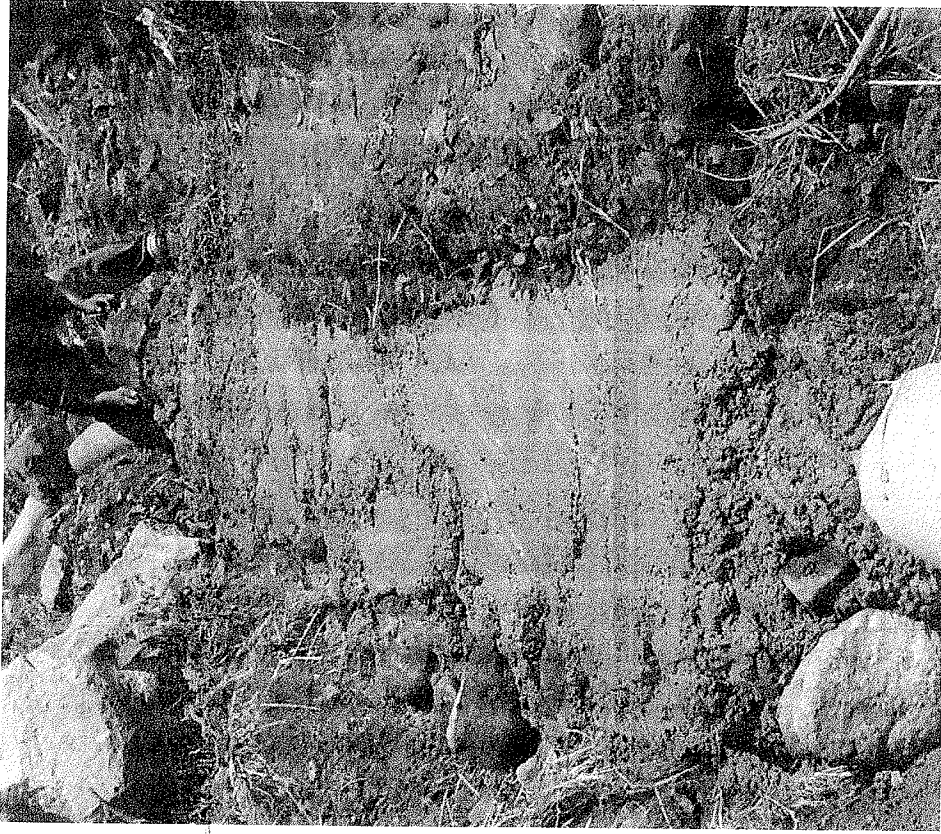

[Handwritten Signature]
DIRECCIÓN DE
CONTRATACIONES

[Handwritten Signature]

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION DE JOCOTEPEC, JALISCO".



01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

CROQUIS

CROQUIS 1

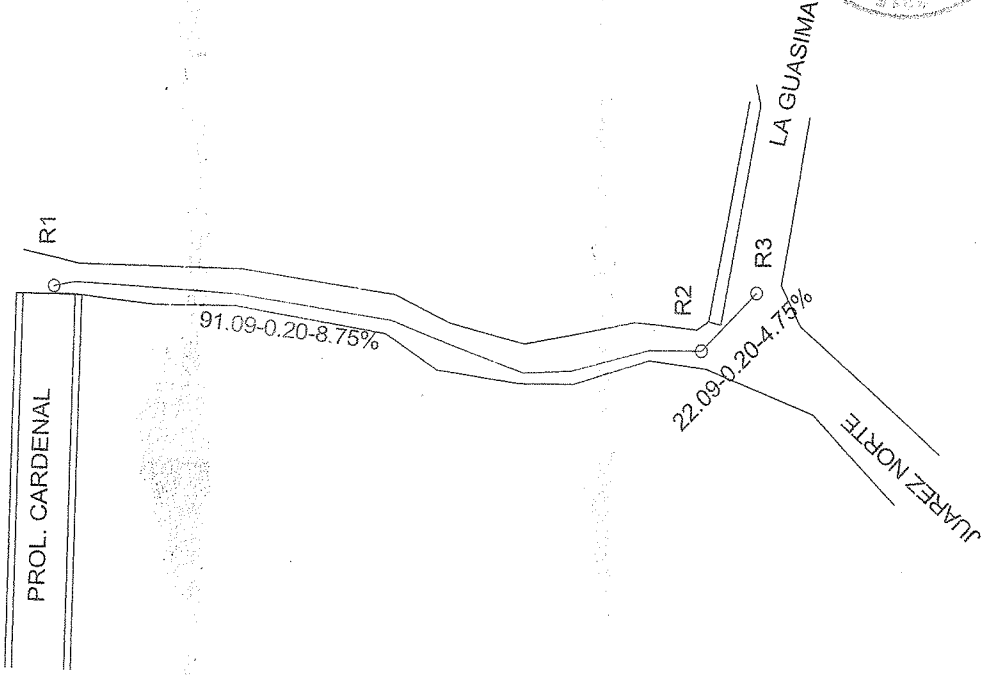

[Handwritten signature]
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO".

01 (Uno) Unica.


CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

GENERADORES DE OBRA

FOTOGRAFIA

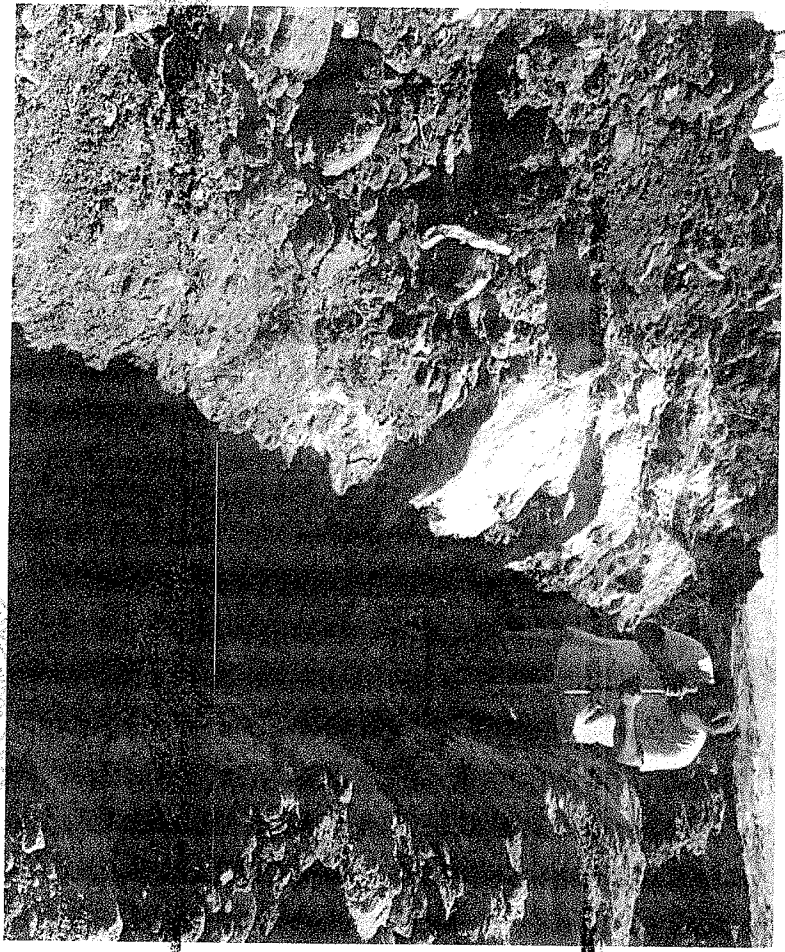

[Handwritten signature]

[Handwritten text]



CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION DE JOCOTEPEC, JALISCO".

01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA


FECHA:


Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

GENERADORES DE OBRA

CROQUIS 1

CROQUIS

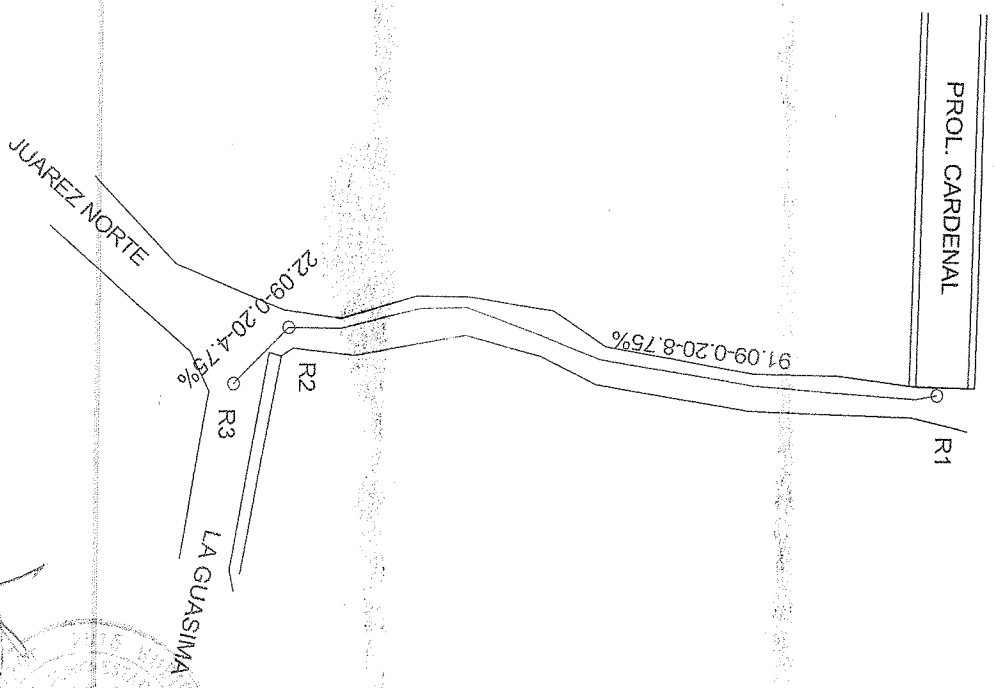



GENERADORES DE OBRA


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO".

01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

FOTOGRAFIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO".


01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

CROQUIS

CROQUIS 1

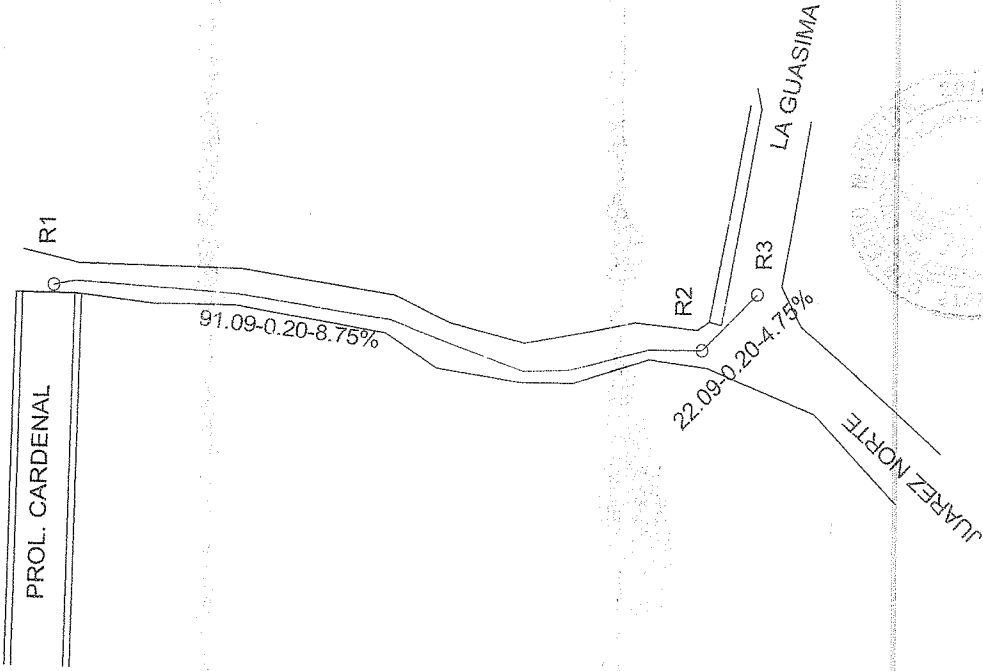

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GENERADORES DE OBRA


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO*.

01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

FOTOGRAFIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO".


01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

CROQUIS

CROQUIS 1

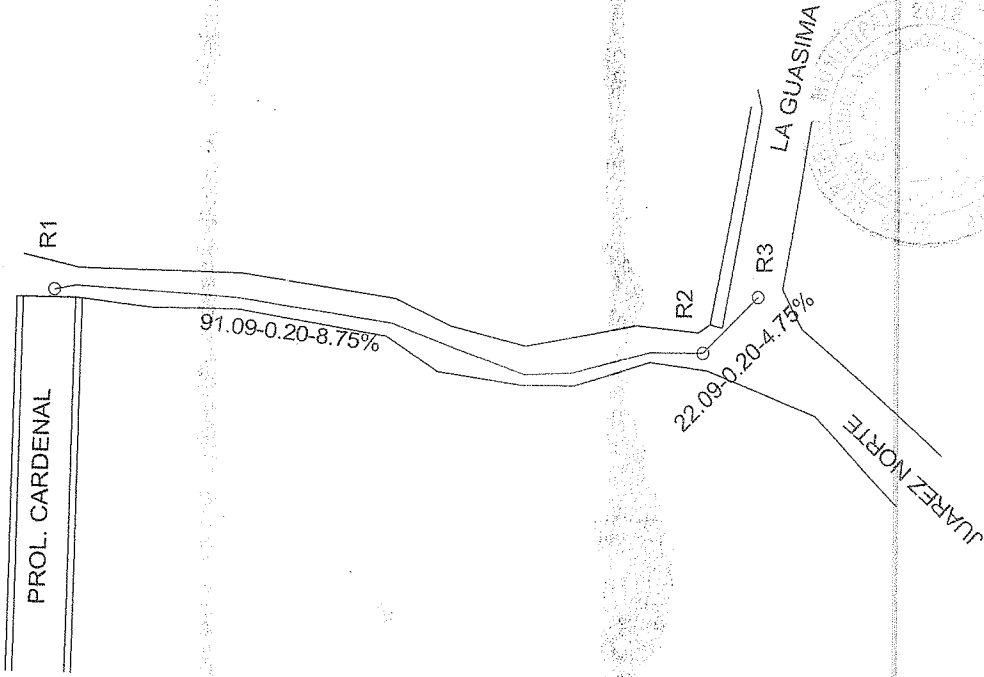

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO".

01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACION	LONGITUD (m)	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	LADO	TOTAL	OBSERVACIONES
10	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	MIL	Privada Cardenal de R1 a R2	91.09	2.00			182.18	
			Privada Cardenal de R2 a R3	22.00	2.00			44.00	
								TOTAL	226.18
								TOTAL	MIL

(Faint circular stamp and signature)



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO".


01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA:

Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

FOTOGRAFIA





Jocotepec
Gobierno Municipal

GENERADORES DE OBRA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO ESTIMACION: DE JOCOTEPEC, JALISCO".


01 (Uno) Unica.

CONTRATISTA: SERGIO CABRERA

FECHA: Del 10 al 15 de Septiembre de 2018.

CROQUIS

CROQUIS 1

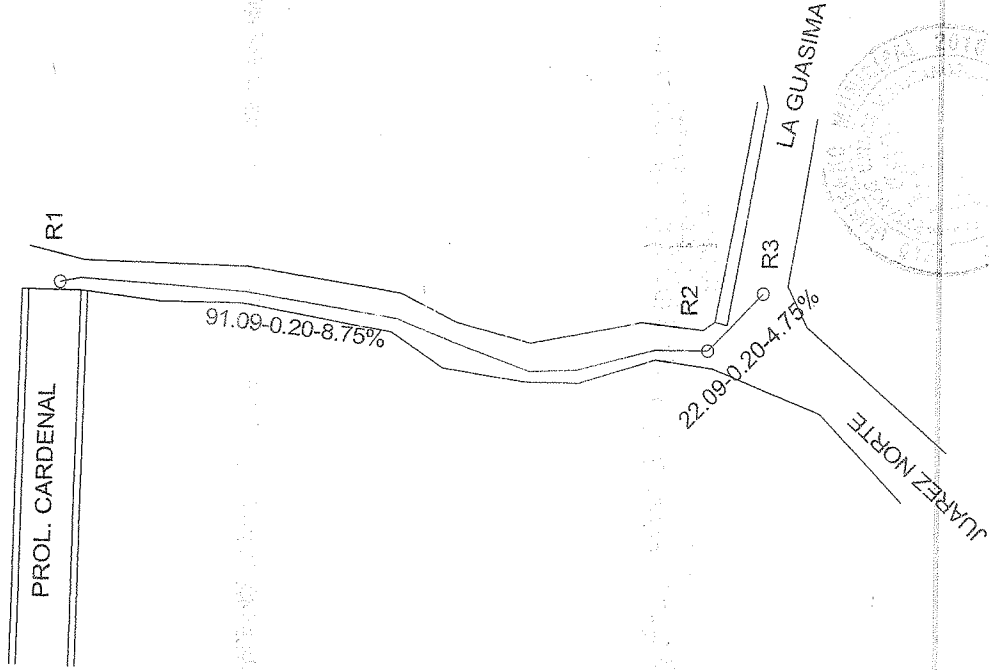

Dependencia : OBRAS PUBLICAS JOCOTEPEC

Concurso No.

Obra: "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".

Lugar: JOCOTEPEC, JALISCO.

PRESUPUESTO

No.	Concepto	Unidad	cantidad	precio	Importe
EXCAVACIONES.					
1	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 2,00M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" BOLEO EMPACADA EN ARCILLA.	M3	73.92	\$354.77	\$26,224.60
2	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE FUERA DE OBRA	M3	96.10	\$155.43	\$14,936.82
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	92.40	\$17.27	\$1,595.75
					EXCAVACIONES.
					\$42,757.17
RELLENOS					
4	TRAZO Y NIVELACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	ML	132.00	\$16.21	\$2,139.72
5	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M2	92.40	\$117.87	\$10,891.19
6	ENCOFRADO DE LINEA DE DRENAJE CON CONCRETO F'c=100 KG CM2	ML	132.00	\$576.84	\$76,142.88
7	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	21.56	\$559.16	\$12,055.49
					RELLENOS
					\$106,229.28
INSTALACION DE TUBERIA					
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	132.00	\$324.04	\$42,773.28
9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	\$7,647.92	\$7,647.92
					INSTALACION DE TUBERIA
					\$50,421.20
COMPLEMENTARIOS					
10	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	264.00	\$12.04	\$3,178.56
					COMPLEMENTARIOS
					\$3,178.56
					SUBTOTAL
					\$197,586.21
					IVA
					\$31,613.79
					TOTAL
					\$229,200.00

ING. SERGIO CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. SERGIO CABRERA

RFC; CASE780113C89

CEL; 334963034

Inicio; 20-ago-18

Fin; 10-sep-18

Obra: "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 METROS LINEALES QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO".

Lugar: JOCOTEPEC, JALISCO.

Dependencia : OBRAS PUBLICAS JOCOTEPEC

Concurso No.

PROGRAMA MENSUAL DE OBRA

No.	Partida	Unidad	20-31 Agosto	1-10 Septiembre
1	EXCAVACIONES	Partida		
2	RELLENOS	Partida		
3	INSTALACION DE TUBERIA	Partida		
4	COMPLEMENTARIOS	Partida		

ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL
