

ERR110523534

ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

AV. HIDALGO, No. Ext 297 A
Col. CENTRO, C.P. 45900
CHAPALA, CHAPALA
JALISCO, MEXICO

FOLIO FISCAL 9FB6042F-26FF-22D6-9656-A5B8FA8F9873

SERIE FOLIO
FP 17

FECHA Y HORA
2018 / 09 / 18 12:20:50

853/19

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: MJJ850101KP8

Razón Social: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

USO CFDI: P01 - Por Definir

C.P. 45800

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000410567463
Certificado SAT: 00001000000402636111
Lugar de Expedición: 45900
RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA
Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-18T12:22:51

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	39111603		PAGO ESTIMACIÓN 1 (UNICA) DEL CONTRATO No. GMJ 09C OP/2018. OBRA: Rehabilitación de imagen urbana de calle Vicente Guerrero, en el ingreso a Jocotepec de la calle independencia a la calle paseo de las rosas (alumbrado publico) en la cabecera municipal del municipio de Jocotepec. Retencion 5 al Millar de supervisión: \$2,270.16 Cantidad NETA a PAGAR: \$524,406.06	\$ 0.00	\$ 454,031.22	\$ 454,031.22

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	\$ 454,031.22	Tasa	0.160000	\$ 72,645.00

QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 22/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 454,031.22
IVA TASA 16%	\$ 72,645.00
TOTAL	\$ 526,676.22



Sello Digital Emisor

GDB6osxZ9CurzFbcBWD5ivOMsCHu0X8OggWBVqUqg/FAAUWGRfmuiry2DrKSHxJEIqIIppQXgJTSnoXIDYp/wFLISTUrbygpJC/kWk+MFv1omYT9/VEUk33mzMSg9xi9AK2AxTb5KcmThRZbA5w3dDk
gNgTUZ5yGV8yS8bVwQImbAOwmHtgEOhgVvTlaUKIScwO42qTnifXySZYDHW6E3PJ/VuuGequmycuD+g3yFyQ8o+kre+x7gXFVWpHhCe/3XnFGOb61DPkBX8rCnwVs7tb5b1921WkGXOQlaOx9rR595q1t
GBBp01uFb8STMVdICgbRm7Vv+nvCWNQ==


Sello Digital SAT

WbAYrnvNie8AqY5ZhmS45zP0v5LPIKHSDPXHO6-fwb124BCHnjpUKWR5YppSjV+JaiBKaK1mrcX4b6aDFwqo9TvwEBHKck8SZ3WzJJeW06a7g1tF2vujFIBuk4e0xWwGfRlU571wv5109tPwA01
V68SyZICcRjExCZm1zFLIWESF7rpKsbI2SOKTMOIMIdGlu12Z3aQ1mtwpapXHskJVbJSo4wUv0Bf5T1B+VrltLu.PAn4v2x5KeTWUJWdH4CULbZP2SOYKv74u0y9A7b6A9J174K1KnlGdGjhmPht17x+51
eGPqB86qokYAPIVvITiza22zJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|19FB6042F-26FF-22D6-9656-A5B8FA8F9873|2018-09-18T12:22:51|SAD110722MQA|SDB5oxZ9CurzFbcBWD5ivOMsCHu0X8OggWBVqUqg/FAAUWGRfmuiry2DrKSHxJEIqIIppQXgJTSnoXIDYp/wFLISTUrbygpJC/kWk+MFv1omYT9/VEUk33mzMSg9xi9AK2AxTb5KcmThRZbA5w3dDkNgTUZ5yGV8yS8bVwQImbAOwmHtgEOhgVvTlaUKIScwO42qTnifXySZYDHW6E3PJ/VuuGequmycuD+g3yFyQ8o+kre+x7gXFVWpHhCe/3XnFGOb61DPkBX8rCnwVs7tb5b1921WkGXOQlaOx9rR595q1IGBBp01uFb8STMVdICgbRm7Vv+nvCWNQ==|00001000000402636111|

🏠 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen *:

[Empty rectangular box for inputting the digits from the image]

Verificar CFDI

* Datos obligatorios


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ERR110523534	ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó

9FEB6042F-26FF-22D6-	2018-09-	2018-09-	SAD110722MQA
9656-A5B8FA8F9873	18T12:20:50	18T12:22:51	

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
-----------------------	-------------------------------	--------------------

\$526,676.22	Ingreso	Vigente
--------------	---------	---------

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
- [Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
(<https://www.gob.mx/privacidad>)
- [Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
(<https://www.gob.mx/terminos>)

?Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
(<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)

Contacto

- Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx
- [Denuncia contra servidores públicos](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-publicos)
(<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-publicos>)

Marco Jurídico

(<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)

Portal de Obligaciones de

Transparencia

(<http://portaltransparencia.gob.mx>)

Sistema Infomex

(<https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action>)

INAI

(<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Ifai.aspx>)

Mapa de sitio

(<https://www.gob.mx/sitemap>)

English

(<https://www.gob.mx/en/index>)

Temas

(<https://www.gob.mx/temas>)

Reformas (<http://reformas.gob.mx>)

de quejas y denuncias en la
sfp/SFP54)

Mantente informado.
Suscríbete.

Síguenos en

usuario@ejemplo.com





H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

NO. DE CONTRATO: GMJ 09C OP/2018
CONTRATISTA: ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV
OBRA: Rehabilitación de imagen urbana de calle Vicente Guerrero, en el Ingreso puente a Jocotepec, de la Calle Independencia a la Calle Paseo de las Rosas (alumbado público) en la cabecera municipal del municipio de Jocotepec
UBICACIÓN: JOCOTEPEC


HOJA DE RELACIÓN HOJA No. 1 DE 1
ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)
PERIODO DE TRABAJO:
DEL: DEL 10 JULIO AL 08 AGOSTO DEL 2018
FECHA: 10/08/2018

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.		P A R T I D A S		I M P O R T E S																							
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANFORMADOR TIPO POSTE, 2 FASES, NORMA "J" DE 15KVA EN DE 85 A 277 VOLTS, CON LUMINOSIDAD DE 6700 KELVIN, CONSTRUIDA EN ALUMINIO INYECTADO, DIODO EMISOR DE LUZ TIPO BETA, POSTE METALICO DE 7,00 MTS, ANCLA DE CONCRETO F'c= 200kg/cm2, INCLUYE: CONEXION CON CABLE ELECTRICO TIPO THW CAL 10 A 3 HILOS (NEUTRO, FASE Y TIERRA FISICA), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION</p>						\$	225,032.12																				
<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANFORMADOR TIPO POSTE, 2 FASES, NORMA "J" DE 15KVA EN 23,000 VOLTS DE ENTRADA Y 220/127 VOLTS DE SALIDA MONTADO A POSTE EXISTENTE DE CFE MEDIANTE ESTRUCTURA TIRRB CON MEDICION EN BAJA TENSION TIPO 2 FASES, 3 HILOS, COMUNICADO A REGISTRO POR DUCTO PAD, CONECTADO A TIERRA FISICA POR ELECTRODOD DE TIERRA Y CONECTOR MECANICO. TRAMITES ANTE CFE, PLANOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES</p>						\$	228,999.10																				
<p>ESTADO CONTABLE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ASIGNACION</th> <th>IMPORTE</th> <th>I . V . A .</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPORTE DE ESTIMACION</td> <td>\$ 454,031.22</td> <td>\$ 72,645.00</td> <td>\$ 526,676.22</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO A LA FECHA</td> <td>\$ 454,031.22</td> <td>\$ 72,645.00</td> <td>\$ 526,676.22</td> </tr> <tr> <td>SALDO POR EJERCER</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>						ASIGNACION	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL	IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 454,031.22	\$ 72,645.00	\$ 526,676.22	ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 454,031.22	\$ 72,645.00	\$ 526,676.22	SALDO POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ -	<p>MONTO DE ESTIMACION \$ 454,031.22 MENOS AMORTIZACION ANTICIPO % \$ - SUBTOTAL \$ 454,031.22 I . V . A . 16% \$ 72,645.00 SUMA \$ 526,676.22 MENOS 2 AL MILLAR (CMC) \$ - MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 2,270.16 NETO A PAGAR \$ 524,406.08</p>	
ASIGNACION	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL																								
IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 454,031.22	\$ 72,645.00	\$ 526,676.22																								
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -																								
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 454,031.22	\$ 72,645.00	\$ 526,676.22																								
SALDO POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ -																								
<p>EL REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>ING. JOSE VALENTIN ZARATE RIVERA</p> <p>EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO</p> <p>ING. ROBERTO OLMEDO RAMOS</p>				<p>EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO</p>																							
<p>AMORTIZACION DEL ANTICIPO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMORTIZACION %</th> <th>AMORTIZACION ACUM. ANT.</th> <th>FALTANTE POR AMORTIZAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>						AMORTIZACION %	AMORTIZACION ACUM. ANT.	FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
AMORTIZACION %	AMORTIZACION ACUM. ANT.	FALTANTE POR AMORTIZAR																									
\$ -	\$ -	\$ -																									
\$ -	\$ -	\$ -																									
\$ -	\$ -	\$ -																									
\$ -	\$ -	\$ -																									

GENERADORES DE OBRA

3 DE 3



Rehabilitación de imagen urbana de calle Vicente Guerrero, en el ingreso poniente a Jocotepec, de la Calle Independencia a la Calle Paseo de las Rosas (alumbrado público) en la cabecera municipal del municipio de Jocotepec




ESTIMACIÓN: 1 (UNICA)

CONTRATISTA: **ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV**

FECHA:

10/08

NUMERO	CONCEPTO	UNIDAD	CADENAMIENTO	LONGITUD (m)	ANCHO	ALTURA	PZA	TOTAL	OBSERVACIONE
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, 2 FASES, NORMA "J" DE 15KVA EN 23,000 VOLTS DE ENTRADA Y 220/127 VOLTS DE SALIDA MONTADO A POSTE EXISTENTE DE CFE MEDIANTE ESTRUCTURA ITR2B CON MEDICION EN BAJA TENSION TIPO 2 FASES, 3 HILOS, COMUNICADO A REGISTRO POR DUCTO PAD, CONECTADO A TIERRA FISICA POR ELECTRODO DE TIERRA Y CONECTOR MECANICO. TRAMITES ANTE CFE, PLANOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES	PZA	ESTIMACION 1 (UNICA)				1.00	1.00	
	FOTOGRAFIA								
	CROQUIS								

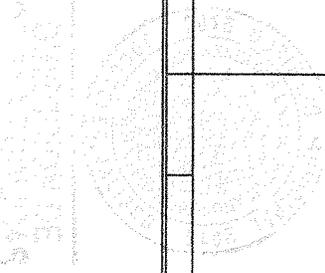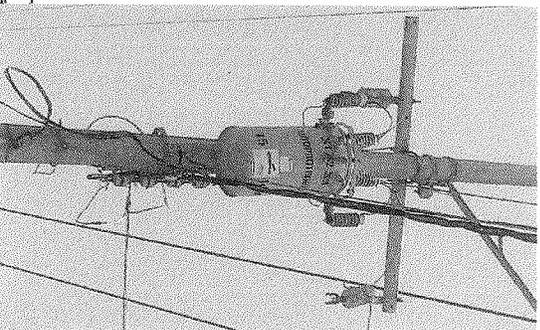



CIA. CONTRATISTA: **ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV** FECHA: **30/05/2018**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Rehabilitación de imagen urbana de calle Vicente Guerrero, en el ingreso poniente a Jocotepec, de la Calle Independencia a la Calle Paseo de las Rosas (aluminado público) en la cabecera municipal del municipio de Jocotepec

DEPENDENCIA: **JOCOTEPEC** OBRA No.: **GMJ 09C OP/2018**

10/06/2018 A 10/08/2018

No.	Concepto	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 74 WATTS CON SOPORTE MULTIVOLTIAJE DE 86 A 277 VOLTS, CON LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN, CONSTRUIDA EN ALUMINIO INYECTADO, DIODO EMISOR DE LUZ TIPO BETA, POSTE METALICO DE 7.00 MTS, ANCLA DE CONCRETO F'c= 200kg/cm2, INCLUYE: CONEXION CON CABLE ELECTRICO TIPO THW CAL 10 A 3 HILOS (NEUTRO, FASE Y TIERRA FISICA), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	11.0	\$ 20,818.10	\$ 228,999.10
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, 2 FASES, NORMA "J" DE 15KVA EN 23,000 VOLTS DE ENTRADA Y 220/127 VOLTS DE SALIDA MONTADO A POSTE EXISTENTE DE CFE MEDIANTE ESTRUCTURA TTR2B CON MEDICION EN BAJA TENSION TIPO 2 FASES, 3 HILOS, COMUNICADO A REGISTRO POR DUCTO PAD, CONECTADO A TIERRA FISICA POR ELECTRODO DE TIERRA Y CONECTOR MECANICO, TRAMITES ANTE CFE, PLANOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES	1.0	\$ 225,032.12	\$ 225,032.12
TOTAL				\$ 454,031.22

Contratista

Ing. Jose Valentin Zarate Rivera
 ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

Director de Obras Publicas

Ing. Juan Manuel Garcia Escoto



COMISION DE
 VERIFICACIONES

SOLARHOUSE



CI.A. CONTRATISTA: ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

FECHA: 30/05/2018

DESCRIPCION: Rehabilitación de imagen urbana de calle Vicente Guerrero, en el Ingreso puente a Jocotepec, de la Calle Independencia a la Calle Paseo de las Rosas (alumbrado publico) en la cabecera municipal del municipio de Jocotepec

OBRA No.: GMU 09C OP/2018

DEPENDENCIA: JOCOTEPEC

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCEPTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, 2 FASES, NORMA "J" DE 15KVA EN 23,000 VOLTS DE ENTRADA Y 220/127 VOLTS DE SALIDA MONTADO A POSTE EXALTANTE DE CFE MEDIANTE ESTRUCTURA 1TR2B CON MEDICION EN BAJA TENSION TIPO 2 FASES, 3 HILOS, COMUNICADO A REGISTRO POR DUCTO PAD, CONECTADO A TIERRA FISICA POR ELECTRODO DE TIERRA Y CONECTOR MECANICO. TRAMITES ANTE CFE, PLANOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES

UNIDAD: PIEZA

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	
1 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA	1	PZA.	48,658.78	48,658.78	
2 ESTRUCTURA 1TR2A	1	PZA.	14,765.15	14,765.15	
3 BASE DE MEDICION	1	PZA.	8,257.34	8,257.34	
4 ELECTRODOS DE TIERRA	1	PZA.	4,594.42	4,594.42	
5 DUCTO TIPO PAD DE 1 1/4	550	ML	36.22	15,554.00	
6 REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO	13	PZA.	2,151.82	27,973.66	
7 CABLE XLP 2+ 1 CAL.6	600	ML	42.60	25,560.00	
			SUMA \$	145,363.35	
MANO DE OBRA	RENDIMIENTO (R)	CANTIDAD = 1/R	UNIDAD	SALARIO INTEGRADO	IMPORTE
2 Cabo de Linero	0.12	8.3333	Jor	654.64	10,910.67
2 Linero	0.12	8.3333	Jor	326.29	5,438.17
1 Ayudante de Linero	0.12	8.3333	Jor	260.23	2,168.58
1 Ayudante General	0.12	8.3333	Jor	245.65	2,047.08
0 Sobrestante		0.0000	Jor	654.64	0.00
			SUMA \$	20,564.50	
MAQUINARIA Y EQUIPO	RENDIMIENTO (R)	CANTIDAD = 1/R	UNIDAD	COSTO H - M	IMPORTE
1 Camioneta Pick-up	0.12	8.3333	Hira	352.65	2,938.75
1 Camion Grua	0.20	5.0000	Hira	659.80	3,299.00
HERRAMIENTA DE MANO			8.00		1,645.16
EQUIPO DE SEGURIDAD			6.00		1,233.87
					SUMA \$
					9,116.78
COSTO DIRECTO (C.D.)			(MAT.+M.O.+MAQ. Y EQ.+HERR.)		175,044.63
COSTO INDIRECTO (C.I.)			(C.D.) %	15.0 %	26,256.69
COSTO FINANCIAMIENTO (C.F.)			(C.D.+C.I.) %	3.0 %	6,039.04
CARGO POR UTILIDAD (C.U.)			(C.D.+C.I.+C.F.) %	6.0 %	12,440.42
CARGOS ADICIONALES (C.A.)			(C.D.) *	3.0 %	5,251.34
			TOTAL PRECIO UNITARIO (P.U.) = \$		225,032.12

Contratista

Director de Obras Públicas

Ing. Jose Valentin Zarate Rivera
ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

Ing. Juan Manuel Garcia Escoto

SOLARHOUSE



CIA. CONTRATISTA: ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

FECHA: 30/05/2018

DESCRIPCION: Rehabilitación de imagen urbana de calle vicente Guerrero, en el ingreso puente a Jucotepec, de la Calle Independencia a la Calle Paseo de las Rosas (alumbado público) en la cabecera municipal del municipio de Jucotepec

OBRA No.: GMJ 09C OP/2018

DEPENDENCIA: JOCOTEPEC

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCEPTO 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 74 WATTS CON SOPORTE MULTIVOLTAJE DE 85 A 277 VOLTS, CON LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN, CONSTRUIDA EN ALUMINIO INYECTADO, DIODO EMISOR DE LUZ TIPO BETA, POSTE METALICO DE 7.00 MTS, ANCLA DE CONCRETO F'c= 200kg/cm2, INCLUYE: CONEXION CON CABLE ELECTRICO TIPO THW CAL 10 A 3 Hilos (NEUTRO, FASE Y TIERRA FISICA), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

UNIDAD: PIEZA

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	
1 LUMINARIA TIPO LED 72 WATSS	1	PZA.	7,275.76	7,275.76	
2 POSTE METALICO TIPO LATIGO DE 7 MTS	1	PZA.	3,905.82	3,905.82	
3 ANCLA DE CONCRETO FC 200 KG/CM2	1	PZA.	1,794.50	1,794.50	
4 CABLE THW CU CAL 10	35	ML	20.76	726.60	
SUMA \$				13,702.68	
MANO DE OBRA	RENDIMIENTO (R)	CANTIDAD = 1/R	UNIDAD	SALARIO INTEGRADO	IMPORTE
2 Cabo de Linero	1.90	0.5263	Jor	654.64	689.09
2 Linero	1.90	0.5263	Jor	326.29	343.46
1 Ayudante de Linero	1.90	0.5263	Jor	260.23	136.96
1 Ayudante General	1.90	0.5263	Jor	245.65	129.29
0 Sobrestante	1.90	0.5263	Jor	654.64	0.00
SUMA \$				1,298.80	
MAQUINARIA Y EQUIPO	RENDIMIENTO (R)	CANTIDAD = 1/R	UNIDAD	COSTO H - M	IMPORTE
1 Camioneta Pick-up	1.90	0.5263	Hra	352.65	185.61
1 Camion Grúa	0.8	1.2500	Hra	659.80	824.75
SUMA \$				1,012.45	
HERRAMIENTA DE MANO EQUIPO DE SEGURIDAD			8.00	% (M.O.)	103.90
			6.00	% (M.O.)	77.93
SUMA \$				1,192.19	
COSTO DIRECTO (C.D.)		(MAT.+M.O.+MAQ. Y EQ.+HERR.)			16,193.67
COSTO INDIRECTO (C.I.)		(C.D.) %		15.0 %	2,429.05
COSTO FINANCIAMIENTO (C.F.)		(C.D.+C.I.) %		3.0 %	558.68
CARGO POR UTILIDAD (C.U.)		(C.D.+C.I.+C.F.) %		6.0 %	1,150.88
CARGOS ADICIONALES (C.A.)		(C.D.) *		3.0 %	485.81
TOTAL PRECIO UNITARIO (P.U.) = \$					20,818.10

Contratista

Director de Obras Públicas

Ing. José Valentín Zarate Rivera
ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV

Ing. Juan Manuel García Escoto

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Chapala, Jal. A 15 de Mayo del 2018

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

Presente:

Por este conducto me permito enviarle la cotización de mejoramiento de imagen urbana en Calle Vicente Guerrero, ingreso poniente a la población para instalación de luminarias tipo LED con transformador.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 74 WATTS CON SOPORTE MULTIVOLTAJE DE 85 A 277 WOLTS, CON LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN, CONSTRUIDA EN ALUMINIO INYECTADO, DIODO EMISOR DE LUZ TIPO BETA, POSTE METALICO DE 7.00 MTS, ANCLA DE CONCRETO F'c= 200kg/cm2; INCLUYE: CONEXIÓN CON CABLE ELECTRICO TIPO THW CAL 10 A 3 HILOS (NEUTRO, FASE Y TIERRA FÍSICA), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	11.00	\$20,818.10	\$228,999.10
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, 2 FASES, NORMA "J" DE 15KVA EN 23,000 VOLTS DE ENTRADA Y 220/127 VOLTS DE SALIDA MONTADO A POSTE EXIATENTE DE CFE MEDIANTE ESTRUCTURA 1TR2B CON MEDICION EN BAJA TENSIÓN TIPO 2 FASES, 3 HILOS, COMUNICADO A REGISTRO POR DUCTO PAD, CONECTADO A TIERRA FISICA POR ELECTRODO DE TIERRA Y CONECTOR MECANICO	PZA	1.00	\$195,032.12	\$195,032.12
3	TRAMITES ANTE CFE, PLANOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES	PARTIDA	1.00	\$30,000.00	\$30,000.00
				SUB-TOTAL	\$454,031.22
				IVA	\$72,645.00
				TOTAL	\$526,676.22



Av. Hidalgo 297-A
Chapala, Jalisco.

Tel. 01 (376) 765 3680

proyectoelectricosh@gmail.com

www.solarhouse.mx



SOLAR HOUSE



EL PRESENTE PRESUPUESTO ES EN BASE A LO QUE SE VISITO EN CAMPO.

LOS MODULOS PRESENTADOS EN ESTA COTIZACION INCLUYEN TODO LO NECESARIO EN MATERIAL Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA INSTALACION, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS VIGENTES DE CFE PARA ESTE TIPO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TAMBIEN CON EL TRAMITE COMPLETO ANTE CFE (PLANOS Y DIAGRAMAS) Y TODA LA TRAMITOLOGIA HASTA OBTENER LA APROBACION PARA SU CONEXIÓN POR PARTE DE CFE.

NOTAS:

- TIEMPO ESTIMADO DE CONSTRUCCION: 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO EL ANTICIPO, Y CONTRA EXISTENCIA DE MATERIAL.
- LOS TIEMPOS EN TRÁMITE COMPLETO ANTE CFE VARIAN DE ACUERDO A CARGA DE TRABAJO DE LOS PROPIOS SUPERVISORES DE 2 SEMANAS A 4 SEMANAS.
- FORMA DE PAGO: ES NECESARIO EL 50% DE ANTICIPO, EL RESTO SEGUN AVANCE DE OBRA CON PREVIAS ESTIMACIONES.
- ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE PAGOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE REVISION DE PROYECTO ELECTRICO O SUPERVISOR POR LA C.F.E. O INDIRECTOS QUE SE OCACIONEN POR ESTA DEPENDENCIA
- EL TIEMPO DE CONSTRUCCION ES A PARTIR DE QUE SE DE LA APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE CFE.
- ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE CARTA UVIE (UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS).
- ESTE PRESUPUESTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO POR C.F.E.
- ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE CONTRATO DE TARIFA ANTE LA C.F.E.
- ESTE PRESUPUESTO TIENE VIGENCIA 15 DIAS NATURALES.
- ESTE PRESUPUESTO PUEDE VARIAR SIN PREVIO AVISO.

Sin más por el momento y en espera de la oportunidad de servirle.

ATENTAMENTE

Ing. José Valentín Zarate Rivera
Proyectos Eléctricos y Solares
chapala2mx@gmail.com

Av. Hidalgo 297-A
Chapala, Jalisco.

Tel. 01 (376) 765 3680


proyectoelctricosh@gmail.com

www.solarhouse.mx


CALENDARIO DE OBRA

CONCEPTO	JUNIO					JULIO					TOTAL SEMANAS
	11-17	18-24	25-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	5-10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 74 WATTS CON SOPORTE MULTIVOLTIAJE DE 85 A 277 VOLTS, CON LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN, CONSTRUIDA EN ALUMINIO INYECTADO, DIODO EMISOR DE LUZ TIPO BETA, POSTE METALICO DE 7.00 MTS, ANCLA DE CONCRETO F'c= 200kg/cm2, INCLUYE: CONEXION CON CABLE ELECTRICO TIPO THWV CAL 10 A 3 HILOS (NEUTRO, FASE Y TIERRA FISICA), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION										7	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, 2 FASES, NORWA, V DE 15KVA EN 23,000 VOLTS DE ENTRADA Y 220V/127 VOLTS DE SALIDA MONTADO A POSTE EXALTANTE DE CFE MEDIANTE ESTRUCTURA ITR2B CON MEDICION EN BAJA TENSION TIPO 2 FASES, 3 HILOS, COMUNICADO A REGISTRO POR DUCTO PAD, CONECTADO A TIERRA FISICA POR ELECTRODO DE TIERRA Y CONECTOR MECANICO, TRAMITES ANTE CFE, PLANOS Y DIAGRAMAS UNIFILARES										2	

Rehabilitación de imagen urbana de calle vicente Guerrero, en el ingreso pontiente a
Obra: Jocotepec, de la Calle Independencia a la Calle Paseo de las Rosas (alumbrado publico)
en la cabecera municipal del municipio de Jocotepec
CONTRATISTA: ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA SA DE CV
REPRESENTANTE: Ing. Jose Valentin Zarate Rivera




DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC



Chapala, Jal., A 08 de agosto de 2018.

Ing. Juan Manuel García Escoto
Director de Obras Públicas Jocotepec, Jalisco.

PRESENTE:

Manifiesto que la adjudicación **No.GMJ 09C OP/2018**, denominada **"REHABILITACION DE IMAGEN URBAN DE CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC"** en el Municipio de Jocotepec, Jalisco, realizada por Energías Renovables de la Rivera S.A de C.V está por concluir el día de hoy.

De acuerdo al contrato el periodo de obra es del 10 de junio de 2018 al 10 de agosto de 2018, el día 10 de agosto del 2018 finaliza la obra por lo cual se extiende la presente con el fin de programar recorrido de la obra y así finiquitar la adjudicación.

Sin otro particular le agradezco la atención prestada a la presente y le reitero mi compromiso de trabajo con usted y con el municipio de Jocotepec.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Zarate Rivera", written over a horizontal line.

ING. JOSÉ VALENTÍN ZARATE RIVERA
ENERGÍAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V.
PROYECTOS ELECTRICOS



A quien corresponda

Por medio de la presente nos permitimos enviarle la siguiente información bancaria:

RAZON SOCIAL: **ENERGÍAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V**

DOMICILIO FISCAL: **AV.HIDALGO No. 297 A**

Col. Centro

C.P. 45900

Chapala, Jalisco

RFC: **ERR110523534**

TELEFONO: **01 376 765 3680**

BANCO: **SCOTIABANK**

No. CUENTA: **01002828340**

CLABE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA: **044320010028283409**

CORREO ELECTRONICO: **proyectoelectricosh@gmail.com**

Con la cual se podrá realizar transferencia de fondos con motivo de pago, agradeceremos confirmar su transacción por medio de nuestro correo electrónico.

Sin más por el momento, agradezco su atención a la presente. Saludos cordiales.



SOLAR HOUSE


Soluciones en energía solar

José Valentín Zarate Rivera
JEFE DE PROYECTOS

TEL: 01 (376) 765 36 80
CEL: 031 382 2658

www.solarhouse.mx

Av Hidalgo # 297-A
CP 45900
Chapala, Jal



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



ERR110523534
Registro Federal de Contribuyentes

ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA
Nombre, denominación o razón social

IdCIF: 14101457079
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL



CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CHAPALA , JALISCO A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018



ERR110523534

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	ERR110523534
Denominación/Razón Social:	ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V.
Fecha inicio de operaciones:	23 DE MAYO DE 2011
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	07 DE JULIO DE 2011

Datos de Ubicación:

Código Postal: 45900	Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: HIDALGO	Número Exterior: 297 A
Número Interior:	Nombre de la Colonia:
Nombre de la Localidad: CHAPALA	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CHAPALA
Nombre de la Entidad Federativa: JALISCO	Entre Calle: CALLE MR CROWF
Y Calle: CALLE MARSELLA	Correo Electrónico: jafranco79@hotmail.com



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 83 728.
denuncias@sat.gob.mx

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por menor en ferreterías y tiapalerías	100	01/11/2012	

Regímenes:

Regimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Regimen General de Ley Personas Morales	23/05/2011	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/05/2011	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	23/05/2011	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/05/2011	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	23/05/2011	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	23/05/2011	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2012	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>


"La corrupción tiene consecuencias ¡denunciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2018/09/21ERR110523534CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL||200001000007000112188||
|bWZZA/nYwJdJehkioO6kpkZXEXZ25MjU6eij352gIQXJJ+ozTE+7HJ7N3W8U4iupkFibYTGUXy|WwXya2quRcyw
8k14GK9bu1aIR1T0+PbYizBimdn7WCUG73nqpnj|f4EnA+4ASgoujBBWZSLadk/bwms+ORUDU+EoBPSZaY=

Contacto

AV Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06309, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México.
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx



MEXICO GOBIERNO FEDERAL



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@saz.gob.mx
