



ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION: V SURESTE
PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA JOCOTEPEC-
CHAPALA DESDE CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUAREZ
(CHANTEPEC), INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL 1RA ETAPA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC
NOMBRE DE LA ACCION:

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

MONTO ASIGNADO: \$ 724,057.50

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DESDE CALLE LIBERTAD
(NEXTIPAC) HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL 1RA
ETAPA

Fecha de Inicio: 11 DE JUNIO DE 2018 Fecha de Termino Real: XXX
Metas Proyectadas: 30 PZAS Metas Alcanzadas: XXX
Beneficiarios Directos: 10,000 Beneficiarios Indirectos: 10,000

AVANCE	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTBRE		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%				40.0%
Financiero	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%				40.0%

Recibido 14 Agosto 2018
Landeros Vidrio

DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO:
INSTALACION DE BASES, REGISTROS Y ENMANGUERADO

DESCRIPCION DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:
PAGO DE ESTIMACION 1

Situación de la Obra: No Iniciada () Terminada sin Operar: ()
En Proceso (X) Terminada y Operando: ()
Suspendida ()

OBSERVACIONES:

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO MUNICIPAL

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO

Nombre: ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

Coordinador Regional

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha del reporte a 14 de AGOSTO de 2018



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUB SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

REGION

CEBULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRA


PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: Fondereg 2018
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA
JOCOTEPEC-CHAPALA DESDE CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA
CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), INGRESO ORIENTE A LA CABECERA
MUNICIPAL 1RA ETAPA

NOMBRE DEL PROYECTO:
MUNICIPIO: JOCOTEPEC LOCALIDAD: JOCOTEPEC
NOMBRE DE LA ACCION:

MONTO ASIGNADO: \$724,057.50



ANTES

INICIO

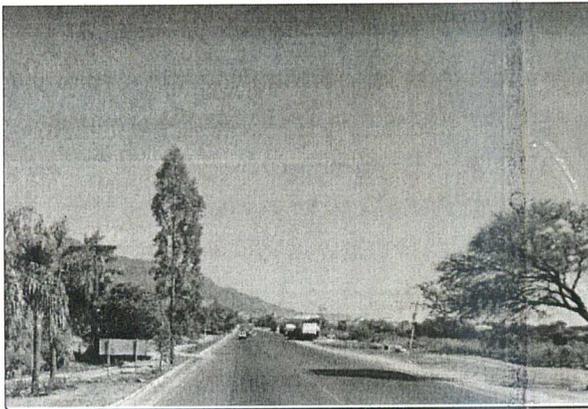

PROCESO

FINAL

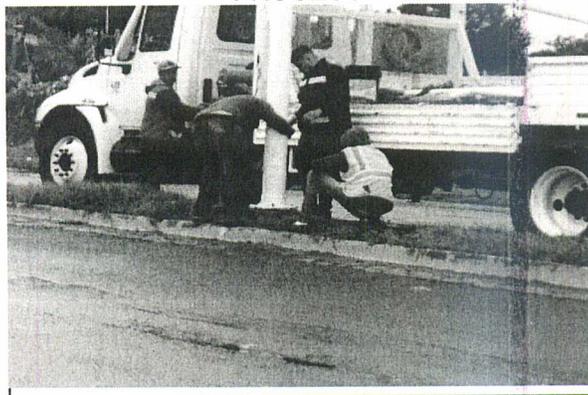

GOBIERNO DEL ESTADO
REGIÓN No. V SURESTE

GOBIERNO MUNICIPAL

SELLO MPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nombre: ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO
COORDINADOR REGIONAL

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha de reporte a 14 de AGOSTO de 2018

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
