



ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION: V SURESTE
PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA JOCOTEPEC-
CHAPALA DESDE CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUAREZ
(CHANTEPEC), INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL 1RA ETAPA

MUNICIPIO: JOCOTEPEC LOCALIDAD: JOCOTEPEC
NOMBRE DE LA ACCION:

MONTO ASIGNADO: \$ 724,057.50

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DESDE CALLE LIBERTAD
(NEXTIPAC) HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL 1RA
ETAPA

Fecha de Inicio: 11 DE JUNIO DE 2018 Fecha de Termino Real: XXX
Metas Proyectadas: 30 PZAS Metas Alcanzadas: XXX
Beneficiarios Directos: 10,000 Beneficiarios Indirectos: 10,000

| AVANCE | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTBRE | | TOTAL |
|------------|------|----|-------|----|-------|----|--------|-----|---------|----|-------|
| | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | |
| Fisico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | | | 70.0% |
| Financiero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | | | 70.0% |

DESCRIPCIÓN DE AVANCE FISICO:
INSTALACION DE BASES, REGISTROS, ENMANGUERADO Y COLOCACION DE LUMINARIAS.

DESCRIPCION DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:
PAGO DE ESTIMACIONES 1 Y DOS

Situación de la Obra: No Iniciada () Terminada sin Operar: ()
En Proceso (X) Terminada y Operando: ()
Suspendida ()

*Recibido
Puro
28-03-18*

OBSERVACIONES:

GOBIERNO DEL ESTADO


GOBIERNO MUNICIPAL

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO

Nombre: ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

Coordinador Regional

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha del reporte a 24 de AGOSTO de 2018



**SUB SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2018**

REGION



CECULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRA

PROGRAMA: FONDEREG
 EJERCICIO: Fondereg 2018
 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA
 JOCOTEPEC-CHAPALA DESDE CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA
 CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), INGRESO ORIENTE A LA CABECERA
 MUNICIPAL 1RA ETAPA
 NOMBRE DEL PROYECTO:
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC LOCALIDAD: JOCOTEPEC
 NOMBRE DE LA ACCION:

MONTO ASIGNADO: \$724,057.50


ANTES

INICIO

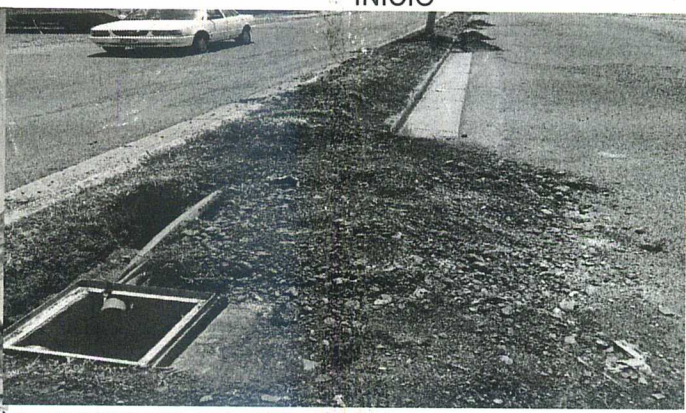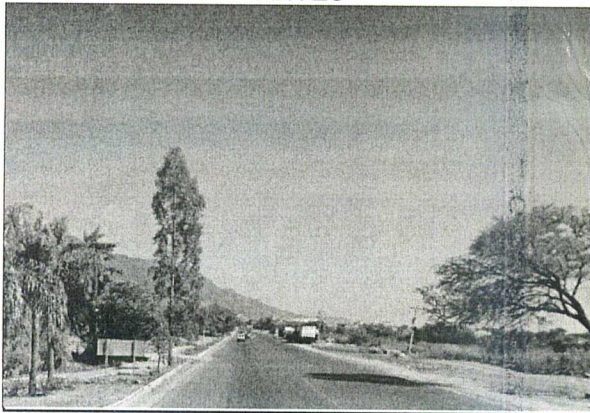

PROCESO

FINAL

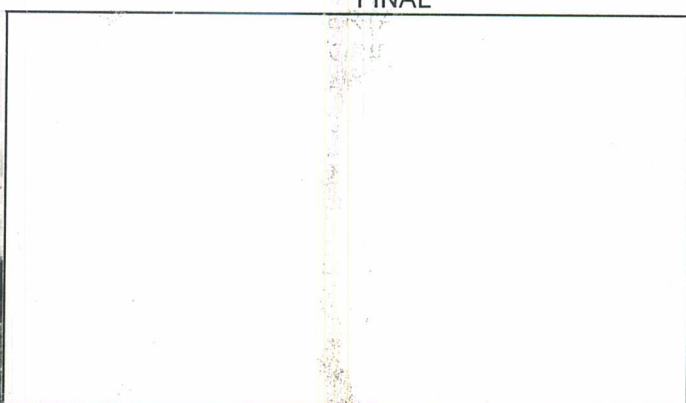

GOBIERNO DEL ESTADO
REGIÓN No. V SURESTE

GOBIERNO MUNICIPAL

[Signature]
 MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO
 COORDINADOR REGIONAL

[Signature]

Nombre: ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

Cargo Director de Obras Públicas



SELLO MPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fecha de reporte a 24 de AGOSTO de 2018
