

# JOSE MIGUEL GARCIA VALLE



SAN PABLO 36 Interior: A  
 Colonia: SANTA ROSA DEL VALLE C.P.:45690  
 EL SALTO, JALISCO. MEXICO  
 R.F.C.:GAVM8507207G5  
 Tels.:

56/12018

El Salto, Jalisco a 27 de junio de 2018 Hora : 12:18:09 pm  
 Regimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura No.	G293
No. de Certificado Emisor	00001000000405642975
No. de Certificado del SAT	00001000000405607284
Fecha Hora de Certificación	2018-06-27T13:38:18

Tipo de Comprobante: Ingreso  
 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Metodo de Pago:  
 PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de Pago:  
 99 Por definir  
 Folio Fiscal SAT:  
 4164D5EE-F705-416B-99D1-E08651A067D3  
 Condiciones de pago:

### Datos del Cliente

#### MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

R.F.C.: MJJ850101KP8  
 PALACIO MUNICIPAL Interior: S/N  
 CENTRO C.P.:45800  
 JOCOTEPEC JALISCO. MEXICO  
 Uso CFDi: I01 Construcciones

ClaveProdServ	Cantidad	U. SAT	Unidad	Descripción	Precio	Importe
30121705	1.00	E48		ESTIMACION N°: 1 (UNICA) Y FINIQUITO	930,606.13	930,606.13
				Impuesto: 002 IVA		
				Base: 930,606.13		
				Tipo factor: Tasa		
				Tasa: 0.160000		Importe: 148,896.98
				PERIODO: DEL 17 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2018		
				OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE		
				MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA		
				MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.		
				NUMERO DE CONTRATO: GMJ 017 C OP/2018 CUENTA CORRIENTE		
				CONTRATISTA: JOSE MIGUEL GARCIA VALLE		

Importe con Letra  
 (UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 11/100 M.N.)

Sub-Total:	930,606.13
I.V.A.:	148,896.98
TOTAL:	1,079,503.11

### Sello Digital del Emisor

SbFw3H7hs49H9X8mRPqcGuEG8/UgCI5if5nJLq2V+sbFNZsF1h7QUQuNdyMfewRNzOcaXEPeRc6lhL7ehJ9QMgGIL9bcNT+qXpHvF8VIEcqR1mdX4CbTs58z+VV2mLyOG90MAN1V1gzNFaVWwOgQ1aAyaHIYBqE62OhjNyk2ap4kP1mfzzKj7i9PAD63NF2D8sWYgIbWdm+ilerm9jh4K2y8XIOUA3bu12w8Pd/AP/xS+33lAgapU2J8dgJe2P4sKlqi22kuj0/Jg423ATGezIW877XN7SD6vpTVCwwl+tVm mNBndQr6yzb6f000tY655FkA54UteNWhjD5e4BHSCQ==

### Sello Digital del SAT

nmdU5h+AYmsXJYuGicqiObZGbxADCp5tjv1UZXPJcul3MKWUH9ivkeAN2NuupJeA0481UdCQWSzkOEDiwUd52Q+7ul2yQV4+0CCQUzV1i2Z+m2L1c1rSKqHpm1jVU7eO17KL6flRu6buNYR/xariyv3D3Iyp/BWJWUMQ00NWITUjifsV52/8do2SUjixunm6q7CRr9wFEXeDzQ3qQ4dQybXYje83tAsF2M1PNzddQ9vDmy5OXWXMRLRH9lg3sB+7UXozKd8+110PSggMYX/saaaF0uhUD6KuL+HIPNVP7USJOALY8w2zZIOS1wL0xTbRMqSQrFGC/53GZQ/LkrA==

### Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|4164D5EE-F705-416B-99D1-E08651A067D3|2018-06-27T13:38:18|FCG840618N51|SbFw3H7hs49H9X8mRPqcGuEG8/UgCI5if5nJLq2V+sbFNZsF1h7QUQuNdyMfewRNzOcaXEPeRc6lhL7ehJ9QMgGIL9bcNT+qXpHvF8VIEcqR1mdX4CbTs58z+VV2mLyOG90MAN1V1gzNFaVWwOgQ1aAyaHIYBqE62OhjNyk2ap4kP1mfzzKj7i9PAD63NF2D8sWYgIbWdm+ilerm9jh4K2y8XIOUA3bu12w8Pd/AP/xS+33lAgapU2J8dgJe2P4sKlqi22kuj0/Jg423ATGezIW877XN7SD6vpTVCwwl+tVm mNBndQr6yzb6f000tY655FkA54UteNWhjD5e4BHSCQ==|0001000000405607284||

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*



Jose Miguel Garcia ✓

DIRECCION DE  
 OBRAS PUBLICAS

Inicio



# Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet



*[Handwritten signature]*  
DIRECCIÓN DE OTRAS PUBLICAS

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:





Proporcione los dígitos de la imagen\*:

[Empty rectangular box for inputting the digits from the image]

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAVM8507207G5	JOSE MIGUEL GARCIA VALLE	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO



<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
4164D5EE-F705-416B-99D1-E08651A067D3	2018-06-27T12:18:09	2018-06-27T13:38:18	FCG840618N51



**Total del CFDI**

**Efecto del comprobante**

**Estado CFDI**

\$1,079,503.11

Ingreso

Vigente

Imprimir



DIRECCIÓN DE COMPROBANTES FISCALES

**Enlaces**

**¿Qué es gob.mx?**

**Contacto**

- Declaración de Accesibilidad  
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
- Política de privacidad  
(<https://www.gob.mx/privacidad>)
- Términos y Condiciones  
(<https://www.gob.mx/terminos>)
- Marco Jurídico  
(<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)
- Portal de Obligaciones de Transparencia

- Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más  
(<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)
- English  
(<https://www.gob.mx/en/index>)
- Temas  
(<https://www.gob.mx/temas>)

- Mesa de ayuda: dudas e información  
[gobmx@funcionpublica.gob.mx](mailto:gobmx@funcionpublica.gob.mx)
- Denuncia contra servidores públicos  
(<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54>)



<http://portaltransparencia.gob.mx> [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

[Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)


[INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)

[Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)


Mantente informado.  
Suscríbete.

Síguenos en

usuario@ejemplo.com >




DIRECCIÓN DE  
OPORTUNIDADES



ACARREOS, NIVELACION Y EXCAVACIONES  
**JOSE MIGUEL GARCIA VALLE**  
 RFC GAVM 8507207G5

**SAN PABLO No. 36 A SANTA ROSA DEL VALLE EN EL SALTO, JALISCO TEL 36-95-65-77 C.P 45690**

<b>I. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</b>  DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		No. DE CONTRATO: GMJ 017C-OP/2018 CONTRATISTA: JOSE MIGUEL GARCIA VALLE OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. UBICACION: CABECERA MUNICIPAL	HOJA DE RELACION ESTIMACION No. 1 (UNICA Y FINIQUITO) PERIODO DE TRABAJO: DEL: 17 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2018 FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2018
---	--	---	--

**RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION**

HOJA No.	PARTIDAS	I M P O R T E S	
	ESTIMACION 1 (UNICA Y FINIQUITO)	\$	930,606.13

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL
ASIGNACION	\$ 930,609.50	\$ 148,897.52	\$ 1,079,507.02
IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 930,606.13	\$ 148,896.98	\$ 1,079,503.11
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 930,606.13	\$ 148,896.98	\$ 1,079,503.11
SALDO POR EJERCER	\$ 3.37	\$ 0.54	\$ 3.91

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
ANTICIPO %	\$ - \$ -
AMORTIZACION	\$ - \$ -
AMORTIZACION ACUM. ANT.	\$ - \$ -
AMORTIZACION A LA FECHA	\$ - \$ -
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ - \$ -

MONTO DE ESTIMACION \$ 930,606.13  
 MENOS AMORTIZACION ANTICIPO % -  
 SUBTOTAL \$ 930,606.13  
 I . V . A . 16% \$ 148,896.98  
 SUMA \$ 1,079,503.11  
 MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) \$ -  
 MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 4,653.03  
 NETO A PAGAR \$ 1,074,850.08

EL REPRESENTANTE LEGAL

*Jose Miguel Garcia Valle*

JOSE MIGUEL GARCIA VALLE



EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

*Juan Manuel Garcia Escoto*

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

*Juan Manuel Garcia Escoto*  
 ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO





ACARREOS, NIVELACION Y EXCAVACIONE.  
JOSE MIGUEL GARCIA VALLE  
RFC GAVM 8507207G5

SAN PABLO No. 36 A SANTA ROSA DEL VALLE EN EL SALTO, JALISCO TEL 36-95-65-77 C.P 45690

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA Y FINIQUITO)  
PERIODO: 17 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2018  
OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL  
CONTRATISTA : JOSE MIGUEL GARCIA VALLE  
FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2018


No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION ACTUAL	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR
1	ELABORACION DE MACHUELO INTEGRAL PECHO DE PALOMA HECHO EN OBRA SECCION 50-35-15-15-35-20 EN UNA AREA DE 0.13 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KGS/CM2. INCLUIE: CIMBRADO EN DOS CARAS CON CIMBRA METALICA (10 USOS), COLADO, DESCIMBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.	M	467.1000	0.0000	467.1000	467.1000	0.0000	\$362.50	\$169,323.75	\$0.00	\$0.00
2	CORTE EN MATERIAL TIPO II EN AREA DE BANQUETA POR MEDIOS MECANICOS EN UN ESPESOR DE 40 CMS. INCLUIE: MANOBRAS, TRABAJO ESPECIALIZADO Y NIVELACION MANUAL.	M3	360.6023	0.0000	360.6023	360.6023	0.0077	\$68.16	\$24,579.18	\$0.00	\$0.52
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE TEZONTLE -TEPETATE 70-30 DE 40 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE BANQUETAS. INCLUIE: HOMOGENIZACION FUERA DEL AREA DE TRABAJO, HUMEDAD OPTIMA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TENDIDO, COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO, BALANINA, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M3	360.6023	0.0000	360.6023	360.6023	0.0077	\$420.88	\$151,773.54	\$0.00	\$3.22
4	ELABORACION DE CENEFA DE ADOQUIN TIPO PEATONAL CUADRADO 20x20x5 CMS ASENTADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3 COLOR ROJO. INCLUIE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.	M	1,061.2000	0.0000	1,061.2000	1,061.2000	0.0000	\$221.04	\$234,567.65	\$3.00	\$0.00
5	ELABORACION DE CENEFA DE 20 CMS. DE ANCHO EN AREA DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR SEGUN PROYECTO F'c= 200 KGS/CM2 R'N. TERMINADO ESCOBILLADO INCLUIE: TRABAJO ESPECIALIZADO EN CIMBRADO EN DOS CARAS DE 10 CMS. DE ALTO CON CIMBRA METALICA (10 USOS), COLADO, CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.	M	435.6000	0.0000	435.6000	435.6000	0.0000	\$246.64	\$107,436.38	\$0.00	\$0.00
6	ELABORACION DE LOSA DE AJUSTE DE 32 CMS. PROMEDIO DE ANCHO Y 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 200 KGS/CM2 TMA 3/4" R'N. TERMINADO ESCOBILLADO INCLUIE: COLADO, CURADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.	M2	139.3920	0.0000	139.3920	139.3920	-0.0020	\$354.41	\$49,401.21	\$0.00	-\$0.71
7	ELABORACION DE LOSA DE 60 CMS. DE ANCHO Y DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 200 KGS/CM2 TMA 3/4" R'N. TERMINADO ESCOBILLADO INCLUIE: CIMBRADO EN CUATRO CARAS, (DOS CARAS LONGITUDINALES Y DOS CARAS TRANSVERSALES @ 1.80 MTS. AFROX). COLADO, CURADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.	M	599.7700	0.0000	599.7690	599.7690	0.0010	\$322.67	\$193,527.46	\$0.00	\$0.32
			SUMA	\$ 930,603.49	\$ 930,606.13	\$	\$	\$ 3.36			
			IVA	\$ 146,897.52	\$ 146,896.98	\$	\$	\$ 0.54			
			TOTAL	\$ 1,075,507.01	\$ 1,075,503.11	\$	\$	\$ 3.90			

JOSE MIGUEL GARCIA VALLE  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS






**ACARREOS, NIVELACION Y EXCAVACIONES**  
**JOSE MIGUEL GARCIA VALLE**  
**RFC GAVM 8507207G5**

**SAN PABLO No. 36 A SANTA ROSA DEL VALLE EN EL SALTO, JALISCO TEL 36-95-65-77 C.P 45690**


EMPRESA: JOSE MIGUEL GARCIA VALLE  
 FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2018  
 OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.


LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA Y FINIQUITO)  
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 17 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2018

NUMEROS GENERADORES  
 1 ELABORACION DE MACHUELO INTEGRAL PECHO DE PALOMA HECHO EN OBRA SECCION 50-35-15--15-35-20 EN UNA AREA DE 0.13 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KGS/CM2, INCLUYE: CIMBRADO EN DOS CARAS CON CIMBRA METALICA (10 USOS), COLADO, DESCIMBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.

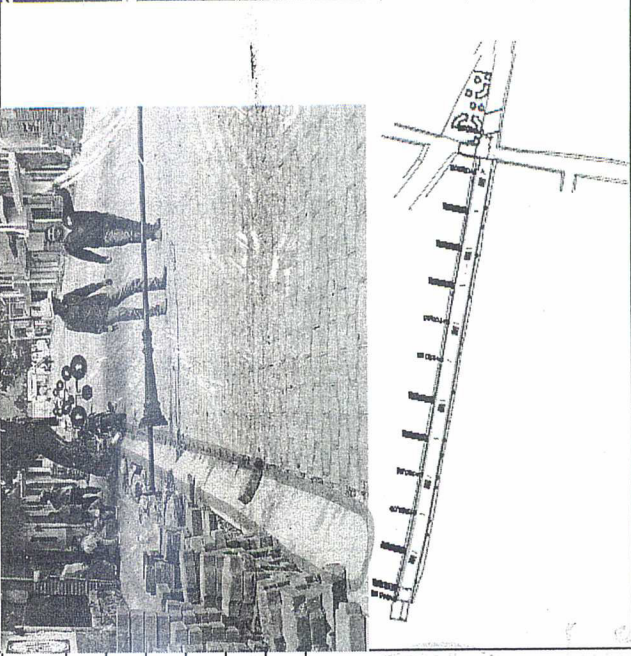


UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M	ACERA SUR	230.0000	1.0000	1.0000	1.0000	230.00
	ACERA NORTE	237.1000	1.0000	1.0000	1.0000	237.10
					SUMA	467.10

  
 JOSE MIGUEL GARCIA VALLE  
 EL REPRESENTANTE LEGAL

  
 ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





**ACARREOS, NIVELACION Y EXCAVACIONES**  
**JOSE MIGUEL GARCIA VALLE**  
**RFC GAVM 8507207G5**

**SAN PABLO No. 36 A SANTA ROSA DEL VALLE EN EL SALTO, JALISCO TEL 36-95-65-77 C.P 45690**

EMPRESA: JOSE MIGUEL GARCIA VALLE      FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2018

OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL      ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA Y FINIQUITO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO      PERIODO: 17 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2018

**NUMEROS GENERADORES**

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
2	CORTE EN MATERIAL TIPO II EN AREA DE BANQUETA POR MEDIOS MECANICOS EN UN ESPESOR DE 40 CMS. INCLUYE: MANIOBRAS, TRABAJO ESPECIALIZADO Y NIVELACION MANUAL.	1061.2000	0.2000	0.4882	1.00	103.62
	CENEFA DE ADOQUIN	435.6000	0.2000	0.4882	1.00	42.53
	LOZA DE CONCRETO (50CM)	599.7690	0.5000	0.4882	1.00	146.40
	LOZA DE CONCRETO (AJUSTE)	435.6000	0.3200	0.4882	1.00	68.05
						360.60


CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

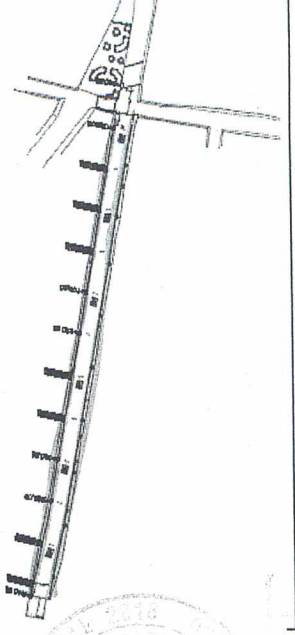

*Juan Manuel Garcia Escoto*  
**ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO**  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

*Jose Miguel Garcia Valle*  
**JOSE MIGUEL GARCIA VALLE**  
 EL REPRESENTANTE LEGAL







**ACARREOS, NIVELACION Y EXCAVACIONES**  
**JOSE MIGUEL GARCIA VALLE**  
**RFC GAVM 8507207G5**

**SAN PABLO No. 36 A SANTA ROSA DEL VALLE EN EL SALTO, JALISCO TEL 36-95-65-77 C.P 45690**

<b>EMPRESA:</b>	JOSE MIGUEL GARCIA VALLE		<b>FECHA:</b>	23 DE FEBRERO DE 2018		
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					
<b>LOCALIDAD:</b>	CABECERA MUNICIPAL		<b>ESTIMACIÓN No.</b>	1 (UNICA Y FINIQUITO)		
<b>MUNICIPIO:</b>	JOCOTEPEC, JALISCO		<b>PERIODO:</b>	17 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2018		
<b>3</b>	<p align="center"><b>NUMEROS GENERADORES</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE TEZONTLE -TEPETATE 70-30 DE 40 CMS DE ESPESOR EN AREA DE BANQUETAS, INCLUYE: HOMOGENIZACION FUERA DEL AREA DE TRABAJO, HUMEDAD OPTIMA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TENDIDO, COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO, BAILARINA, NIVELACION, HERREMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.</p>					
<b>UNIDAD</b>	<b>CADENAMIENTO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>ALTO</b>	<b>PZA</b>	<b>TOTAL</b>
	GENEFA DE ADOQUIN	1061.2000	0.2000	0.4882	1.00	103.62
	GENEFA DE CONCRETO	435.6000	0.2000	0.4882	1.00	42.53
<b>M3</b>	LOZA DE CONCRETO (50C.M)	599.7690	0.5000	0.4882	1.00	146.40
	LOZA DE CONCRETO (AJUSTE)	435.6000	0.3200	0.4882	1.00	68.05
						360.60

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

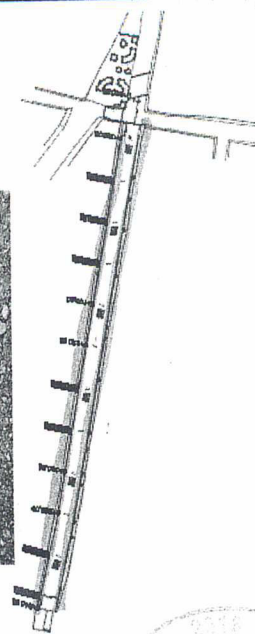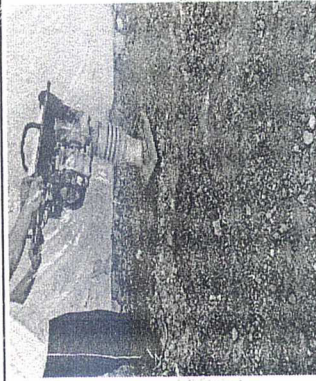


*Juan Manuel Garcia Escoto*


ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

*Jose Miguel Garcia Valle*

JOSE MIGUEL GARCIA VALLE  
EL REPRESENTANTE LEGAL







**ACARREOS, NIVELACION Y EXCAVACIONES**  
**JOSE MIGUEL GARCIA VALLE**  
**RFC GAVM 8507207G5**

**SAN PABLO No. 36 A SANTA ROSA DEL VALLE EN EL SALTO, JALISCO TEL 36-95-65-77 C.P 45690**

EMPRESA: JOSE MIGUEL GARCIA VALLE      FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2018  
 OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.




LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL      ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA Y FINIQUITO)  
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO      PERIODO: 17 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2018

**NUMEROS GENERADORES**

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
4	ACERA SUR	0.5000			127.00	63.50
	ACERA SUR (AJUSTE)	233.800C			2.00	467.60
	ACERA NORTE	0.50			127.00	63.50
	ACERA NORTE (AJUSTE)	233.30			2.00	466.60
						1061.20

ELABORACION DE CENEFA DE ADOQUIN TIPO PEATONAL CUADRADO 20x20x5 CMS  
 ASENTADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3 COLOR ROJO, INCLUYE MATERIALES,  
 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

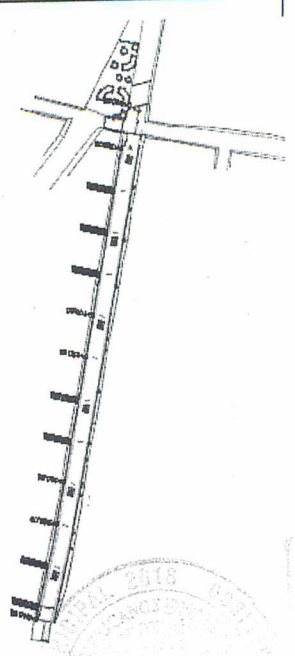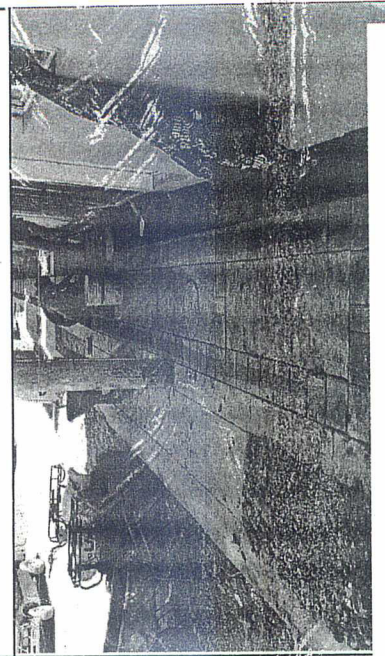


*Manuel Garcia Escoto*  
 ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

*Jose Miguel Garcia Valle*


JOSE MIGUEL GARCIA VALLE  
 EL REPRESENTANTE LEGAL





**ACARREOS, NIVELACION Y EXCAVACIONES**  
**JOSE MIGUEL GARCIA VALLE**  
**RFC GAVM 8507207G5**

**SAN PABLO No. 36 A SANTA ROSA DEL VALLE EN EL SALTO, JALISCO TEL 36-95-65-77 C.P 45690**

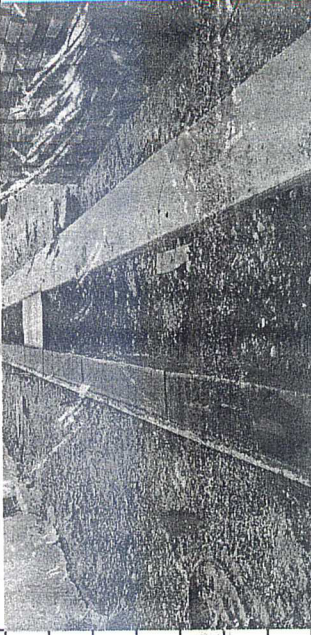EMPRESA:	JOSE MIGUEL GARCIA VALLE		FECHA:	23 DE FEBRERO DE 2018
OBRA:	CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	1 (UNICA Y FINIQUITO)	
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	17 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2018	
<b>NUMEROS GENERADORES</b>				
5	ELABORACION DE CENEFA DE 20 CMS. DE ANCHO EN AREA DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR SEGUN PROYECTO F'C= 200 KGS/CM2 R.N. TERMINADO ESCOBILLADO INCLUYE: TRABAJO ESPECIALIZADO EN CIMBRADO EN DOS CARAS DE 10 CMS. DE ALTO CON CIMBRA METALICA (1r.USOS): COIADO, CURADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.			
<b>CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES</b>				
				


UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	ACERA SUR	202.30			1.00	202.30
	ACERA NORTE	233.30			1.00	233.30
M					SUMA	435.60



*Juan Manuel Garcia Escoto*  
 ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

*Jose Miguel Garcia Valle*  
 JOSE MIGUEL GARCIA VALLE  
 EL REPRESENTANTE LEGAL





**ACARREOS, NIVELACION Y EXCAVACIONES**  
**JOSE MIGUEL GARCIA VALLE**  
**RFC GAVM 8507207G5**

**SAN PABLO No. 36 A SANTA ROSA DEL VALLE EN EL SALTO, JALISCO TEL 36-95-65-77 C.P 45690**




71

EMPRESA: JOSE MIGUEL GARCIA VALLE  
 FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2018  
 OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL  
 ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA Y FINIQUITO)  
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO  
 PERIODO: 17 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2018

**NUMEROS GENERADORES**

6	ELABORACION DE LOSA DE AJUSTE DE 32 CMS. PROMEDIO DE ANCHO Y 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C = 200 KGS/CM2 TMA 3/4" R.N. TERMINADO ESCOBILLADO INCLUYE: COLADO, CURADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.					CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES
M2	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	ACERA SUR	202.30	0.32		1.00	64.74
	ACERA NORTE	233.30	0.32		1.00	74.66
					SUMA	139.39

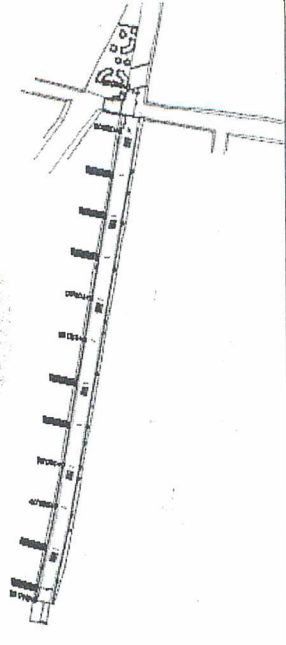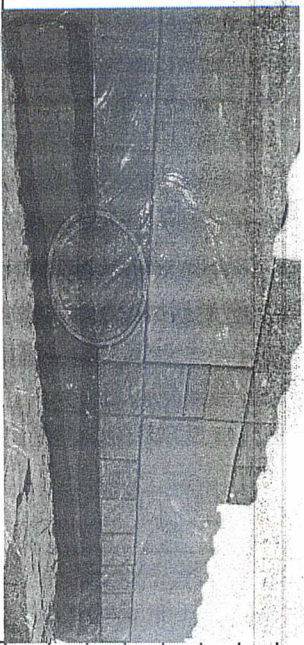


*[Signature]*  
 ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

*Jose Miguel Garcia Valle*  
 JOSE MIGUEL GARCIA VALLE  
 EL REPRESENTANTE LEGAL

DEPARTAMENTO DE  
 OBRAS PUBLICAS





**ACARREOS, NIVELACION Y EXCAVACIONES**  
**JOSE MIGUEL GARCIA VALLE**  
**RFC GAVM 8507207G5**

**SAN PABLO No. 36 A SANTA ROSA DEL VALLE EN EL SALTO, JALISCO TEL 36-95-65-77 C.P 45690**

EMPRESA: JOSE MIGUEL GARCIA VALLE      FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2018  
 OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS PTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.


LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL      ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA Y FINIQUITO)  
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO      PERIODO: 17 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO/2018

**NUMEROS GENERADORES**

7 ELABORACION DE LOSA DE 50 CMS.DE ANCHO Y DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 200 KGS/CM2 TMA 3/4" R.N. TERMINADO ESCOBILLADO INCLUYE: CIMBRADO EN CUATRO CARAS, (DOS CARAS LONGITUDINALES Y DOS CARAS TRANSVERSALES @ 1.80 MTS. APROX). COLADO, CURADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M	ACERA SUR	1.6000			127.00	203.20
	ACERA SUR (AJUSTE)	0.4800			1.00	0.48
	ACERA NORTE	1.60			127.00	203.20
	ACERA NORTE (AJUSTE)	0.55			1.00	0.55
	ACERA SUR (COCHERAS)	77.86			1.00	77.86
	ACERA NORTE (COCHERAS)	103.68			1.00	103.68
	BAJO LAS BANCAS	1.20			9.00	10.80
					SUMA	599.77

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

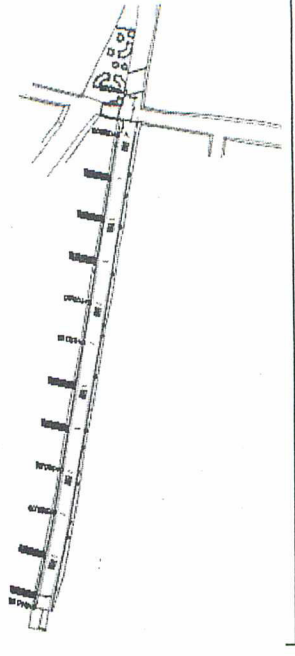

*Jose Miguel Garcia Valle*

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

JOSE MIGUEL GARCIA VALLE  
 EL REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO  
 OBRAS PUBLICAS
