

SERVICIO Y CONSTRUCCION  
NATENIO S.A. DE C.V.



SCN190411136  
Av. Cubilete No. 248  
Chapalita C.P.: 44500  
Guadalajara, Jalisco, México  
601  
Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Serie: F  
Folio: 595

15/10/2020 13:19:18

Documento Válido

Lugar de Expedición: 44500

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO  
Domicilio: Palacio Municipal No. S/N  
Colonia: Jocotepec Centro  
Ciudad: Jocotepec

Estado: Jalisco

R.F.C.: MJJ850101KP8  
Teléfono:  
C.P.: 45800  
País: México

|      |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.00 | SERVICIO | 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción | PAGO DE ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS, DELEGACION EL MOLINO JOCOTEPEC, JALISCO. NO. CONTRATO GMJ017COP/2020 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$1,824.22 NETO A PAGAR \$421,395.49 | 364,844.58 | 364,844.58 |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 71/100 M.N.

364,844.58  
58,375.13  
423,219.71

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Cta. de pago: 99 - Por definir

00001000000501500795  
7B9308B7-66D1-4CEA-A32F-CDB52753EB24  
00001000000501542236  
Octubre 15 2020 - 13:19:21

aJFTThYl2nZSVGX7EbHo6rQKtAgnBFae5ySKos9ePwVji5tBu7QrMbbtWsGOpJ30+8cllRtQOI2tiz0qh9Lbk+K3wauEYtYghSxDStjaRntAa0Pf2xYk6LZSRW9vFhNkg2iDplwQJf/6vjsePL1SVrj7X2A+q/feN9P1BoSHsTVaos0yP+mc68ikvo9F5O+THIhzN1y36QCsznMKAaEQO4bRZadVmlrPOaBDq8K2Pfw5PbuakfDZV21yBinijcyFpBJDuhXiDhHy3GButby1lguhBw+Px14vDG3FHSV565G4KJNhOASga1PxtJwV96iABCDPChqK4QRsDvVHALpBQ==



S4YFz2mMXTYzt0UjgFCTePeSxNh8wF6eEzXYiHvsLAzj4gx8CuQly2HEUgPxRytACVfDmRznTQby9Sa9GFb7mDtdZdQFHWBRmTdybiRbQ47jtYihBuMCG2Hh9cxh3FZaqEbAb7KHYnc/YZEcA8AGIUvH59yJABL6SBfSIZDPFwrHEMsrXKPLoTL/f5SAkig8VCFNO5sGyOlPswPgbdVILqkCLQEchJ5ER1v6tKlb5rzZp4XSKcv56a6leFfPgjdqOQgb3w/YKXuGnFvzPxwVWgX9pTE9MHlg9uGeqUfkkZvcreUn6HilysrvJMRSE733Pi48gWGR+kXPinY04liaQ==

||1.1|7B9308B7-66D1-4CEA-A32F-CDB52753EB24|2020-10-15T13:19:21|MAS081024|609167|ThYl2nZSVGX7EbHo6rQKtAgnBFae5ySKos9ePwVji5tBu7QrMbbtWsGOpJ30+8cllRtQOI2tiz0qh9Lbk+K3wauEYtYghSxDStjaRntAa0Pf2xYk6LZSRW9vFhNkg2iDplwQJf/6vjsePL1SVrj7X2A+q/feN9P1BoSHsTVaos0yP+mc68ikvo9F5O+THIhzN1y36QCsznMKAaEQO4bRZadVmlrPOaBDq8K2Pfw5PbuakfDZV21yBinijcyFpBJDuhXiDhHy3GButby1lguhBw+Px14vDG3FHSV565G4KJNhOASga1PxtJwV96iABCDPChqK4QRsDvVHALpBQ==|00001000000501542236||



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Firma de conformidad

\*Efectos fiscales al pago \*Pago en una sola exhibición

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor             | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SCN190411136                         | SERVICIO Y CONSTRUCCION NATENIO S.A. DE C.V. | MJJ850101KP8            | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO    |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                          | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 7B9308B7-66D1-4CEA-A32F-CDB52753EB24 | 2020-10-15T13:19:18                          | 2020-10-15T13:19:21     | MAS0810247C0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                       | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$423,219.71                         | Ingreso                                      | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

[Imprimir](#)

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)





H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 017C DOP/2020

CONTRATISTA: NATENIO SERVICIO Y CONSTRUCCION SA. DE CV.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS

UBICACIÓN: ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA DELEGACION DEL MOLINO

ESTIMACIÓN No. 1 Y FINIQUITO  
EMPEDRADO



FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

| HOJA No.                |                                   | P A R T I D A S |              |               |  | I M P O R T E S                   |               |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------|
| 1                       | PRELIMINARES                      |                 |              |               |  | \$                                | 7,257.95      |
| 2                       | CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES |                 |              |               |  | \$                                | 16,107.97     |
| 3                       | SUPERFICIE DE RODAMIENTO          |                 |              |               |  | \$                                | 334,454.83    |
| 4                       | COMPLEMENTARIOS                   |                 |              |               |  | \$                                | 7,023.83      |
|                         |                                   |                 |              |               |  | MONTO DE ESTIMACIÓN               | \$ 364,844.58 |
|                         |                                   |                 |              |               |  | MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %     |               |
|                         |                                   |                 |              |               |  | S U B T O T A L .                 | \$ 364,844.58 |
|                         |                                   |                 |              |               |  | I . V . A . 16%                   | \$ 58,375.13  |
|                         |                                   |                 |              |               |  | SUMA                              | \$ 423,219.71 |
|                         |                                   |                 |              |               |  | MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)          | \$ -          |
|                         |                                   |                 |              |               |  | MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) | \$ 1,824.22   |
|                         |                                   |                 |              |               |  | NETO A PAGAR                      | \$ 421,395.49 |
| ESTADO CONTABLE         |                                   | IMPORTE         | I . V . A .  | TOTAL:        |  |                                   |               |
| ASIGNACIÓN              |                                   | \$ 365,117.900  | \$ 58,418.86 | \$ 423,536.76 |  |                                   |               |
| IMPORTE DE ESTIMACIÓN   |                                   | \$ 364,844.58   | \$ 58,375.13 | \$ 423,219.71 |  | RESIDENTE DE OBRA                 |               |
| ACUMULADO ANTERIOR      |                                   |                 | \$ -         | \$ -          |  | CONTRATISTA                       |               |
| ACUMULADO A LA FECHA    |                                   | \$ 364,844.58   | \$ 58,375.13 | \$ 423,219.71 |  |                                   |               |
| SALDO POR CANCELAR      |                                   | \$ 273.32       | \$ 43.73     | \$ 317.05     |  |                                   |               |
|                         |                                   |                 |              |               |  |                                   |               |
| A N T I C I P O         |                                   |                 |              |               |  |                                   |               |
| ANTICIPO 25 %           |                                   |                 | \$ -         | \$ -          |  | REYES IBARRA QUINTERO             |               |
| AMORTIZACIÓN            |                                   |                 | \$ -         | \$ -          |  | SUPERVISOR DE OBRA                |               |
| AMORTIZACIÓN ACUM. ANT. |                                   |                 | \$ -         | \$ -          |  |                                   |               |
| AMORTIZACIÓN A LA FECHA |                                   | \$ -            | \$ -         | \$ -          |  |                                   |               |
| FALTANTE POR AMORTIZAR  |                                   | \$ -            | \$ -         | \$ -          |  | J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ        |               |
|                         |                                   |                 |              |               |  | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ       |               |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

|                     |                                                                       |                  |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| ESTIMACIÓN:         | 1 Y FINIQUITO                                                         | No. DE CONTRATO: | GMJ 017C DOP/2020 |
|                     | EMPEDRADO                                                             |                  |                   |
| PERÍODO DE TRABAJO: | DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020                              |                  |                   |
| OBRA :              | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS |                  |                   |

**NATENIO**  
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN: ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA DELEGACIÓN DEL MOLINO  
CONTRATISTA: CONTRATISTA: NATENIO SERVICIO Y CONSTRUCCION SA. DE CV.  
FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020

| ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA |                                                                                                                                                           |    |                  |                    |                 |                      |       |                 |                  |                 |                               |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|
| No.                          | CONCEPTO                                                                                                                                                  | U  | CANTIDADES       |                    |                 |                      |       | PRECIO UNITARIO | IMPORTES         |                 |                               |           |
|                              |                                                                                                                                                           |    | PRESUPUESTO BASE | ACUMULADA ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA | SALDO |                 | PRESUPUESTO BASE | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR | SALDO     |
|                              | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                       |    |                  |                    |                 |                      |       |                 |                  |                 |                               |           |
| 1                            | TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA              | M2 | 937.70           | 0.0000             | 936.51          | 936.51               | 1.19  | \$7.75          | \$ 7,267.18      | \$ 7,257.95     | \$ -                          | \$ 9.22   |
|                              | <b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE PRELIMNARES</b>                                                                                                            |    |                  |                    |                 |                      |       | \$ 7,267.18     | \$ 7,257.95      |                 |                               |           |
|                              | <b>CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES</b>                                                                                                                  |    |                  |                    |                 |                      |       |                 |                  |                 |                               |           |
| 2                            | MOTOCONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION                 | M2 | 937.60           | 0.0000             | 936.51          | 936.51               | 1.09  | \$17.20         | \$ 16,126.72     | \$ 16,107.97    | \$ -                          | \$ 18.75  |
|                              |                                                                                                                                                           |    |                  |                    |                 |                      |       | \$ 16,126.72    |                  |                 |                               |           |
|                              | <b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE BASES Y SUB-BASES</b>                                                                                                      |    |                  |                    |                 |                      |       |                 | \$ 16,107.97     |                 |                               |           |
|                              | <b>SUPERFICIE DE RODAMIENTO</b>                                                                                                                           |    |                  |                    |                 |                      |       |                 |                  |                 |                               |           |
| 3                            | EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 14 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION        | M2 | 927.60           | 0.0000             | 926.97          | 926.97               | 0.63  | \$352.65        | \$ 327,118.14    | \$ 326,895.97   | \$ -                          | \$ 222.17 |
| 4                            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION. | ML | 53.00            | 0.0000             | 53.00           | 53.00                | 0.00  | \$142.62        | \$ 7,558.86      | \$ 7,558.86     | \$ -                          | \$ -      |
|                              | <b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO</b>                                                                                               |    |                  |                    |                 |                      |       | \$ 334,677.00   | \$ 334,454.83    |                 |                               |           |
|                              | <b>COMPLEMENTARIOS</b>                                                                                                                                    |    |                  |                    |                 |                      |       |                 |                  |                 |                               |           |
| 5                            | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA                                                                                                                    | M2 | 939.60           | 0.0000             | 936.51          | 936.51               | 3.09  | \$7.50          | \$ 7,047.00      | \$ 7,023.83     | \$ -                          | \$ 23.18  |
|                              | <b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS</b>                                                                                                        |    |                  |                    |                 |                      |       | \$ 7,047.00     | \$ 7,023.83      |                 |                               |           |
|                              |                                                                                                                                                           |    |                  |                    |                 |                      |       |                 |                  |                 |                               |           |
|                              |                                                                                                                                                           |    |                  |                    |                 |                      |       | TOTAL           | \$ 365,117.90    | \$ 364,844.58   | \$ -                          | \$ 273.32 |

*Consuelo Sandoval de la Torre*

SERVICIO Y CONSTRUCCION NATENIO SA. DE CV.  
CONTRATISTA

ING. J GUADALUPE BARRA RAMIREZ  
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020

CONCEPTO 1

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS

LOCALIDAD: EL MOLINO

ESTIMACIÓN: 1 Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

**NUMEROS GENERADORES**

CONCEPTO:

TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA

| LARGO  | ANCHO promedio | PZA.   | TOTAL  | observacion |
|--------|----------------|--------|--------|-------------|
| 159.00 | 5.89           | 1.0000 | 936.51 |             |

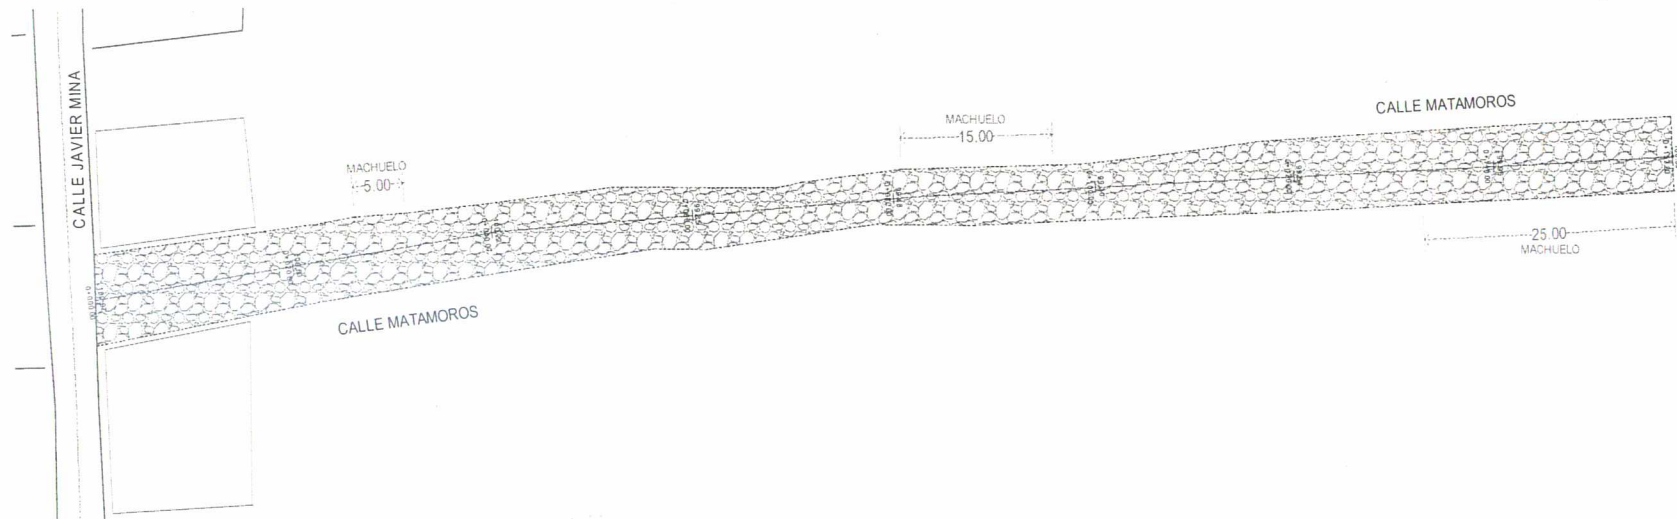

**TOTAL M2: 936.51**

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ




REYES IBARRA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA




|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020                                                                                                                    |                                                                                                                                                | CONCEPTO 1                                                                                                                          |
| OBRA: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| LOCALIDAD: EL MOLINO                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ESTIMACIÓN: 1 Y FINIQUITO                                                                                                           |
| MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.                                                                                                                   |                                                                                                                                                | PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020                                                                      |
| <b>ARCHIVO FOTOGRAFICO</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| CONCEPTO:                                                                                                                                        | TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA  |                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ<br><br>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ<br><br>SUPERVISOR DE OBRA | REYES IBARRA QUINTERO<br><br>RESIDENTE DE OBRA |

|                               |                                                                       |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020 |                                                                       | CONCEPTO 2 |
| OBRA:                         | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS |            |

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: EL MOLINO           | ESTIMACIÓN: 1 Y FINIQUITO                                      |
| MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. | PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020 |

| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CONCEPTO:           | MOTOCONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION |  |  |  |  |

| LARGO  | ANCHO promedio | ALTO | PZA. | TOTAL  |
|--------|----------------|------|------|--------|
| 159.00 | 5.89           |      | 1.00 | 936.51 |
|        |                |      |      | 936.51 |

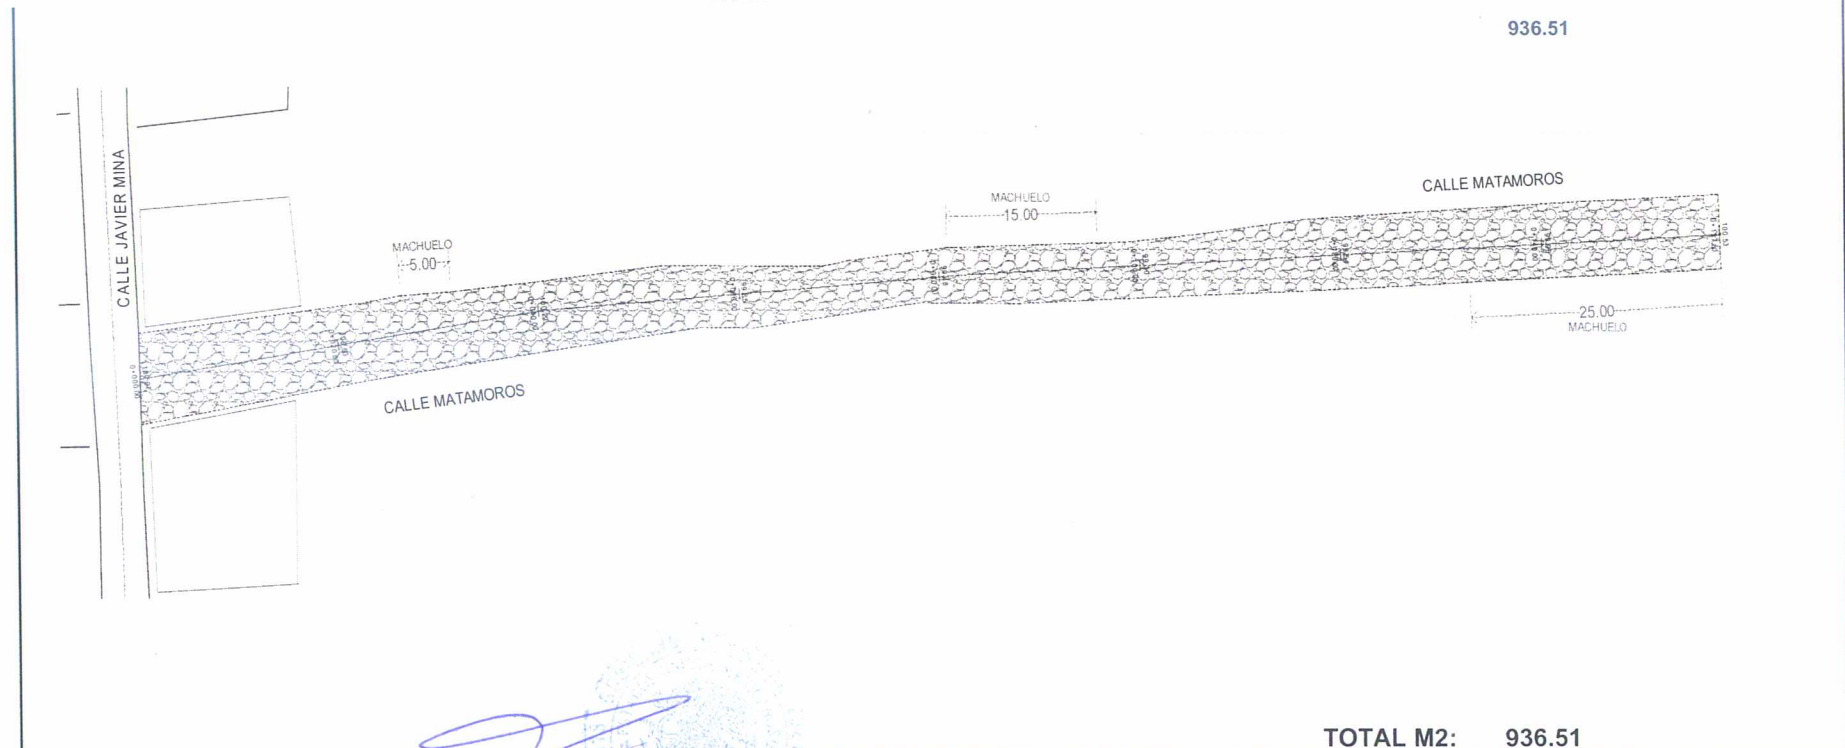

|                             |                                 |                       |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| TOTAL M2: 936.51            |                                 |                       |
| ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | REYES IBARRA QUINTERO |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  | SUPERVISOR DE OBRA              | RESIDENTE DE OBRA     |



FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020

CONCEPTO 2

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS

LOCALIDAD: EL MOLINO

ESTIMACIÓN: 1 Y FINIQUITO



MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

**ARCHIVO FOTOGRAFICO**

CONCEPTO:

MOTOCONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICON

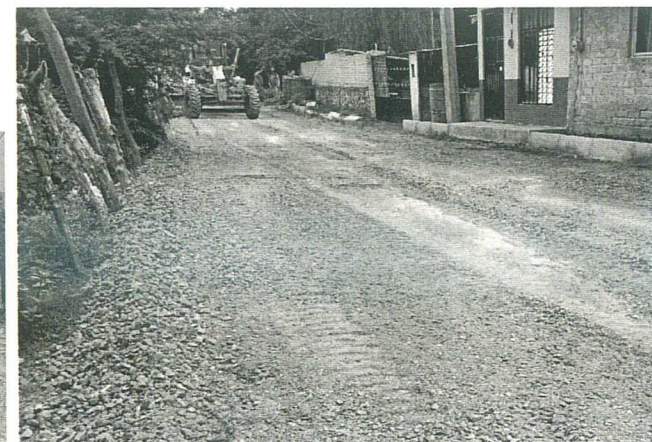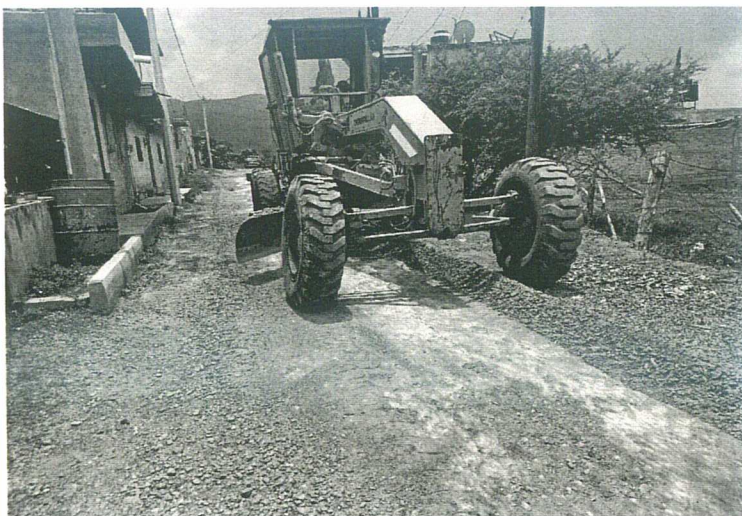

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

REYES IBARRA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA





|                                       |                                                                                                                                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 05 DE OCTUBRE DEL 2020  |                                                                                                                                                       | <b>CONCEPTO 3</b>                                                     |
| <b>OBRA:</b>                          | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS                                                                                 |                                                                       |
| <b>LOCALIDAD:</b> EL MOLINO           |                                                                                                                                                       | <b>ESTIMACIÓN:</b> 1 Y FINIQUITO                                      |
| <b>MUNICIPIO:</b> JOCOTEPEC, JALISCO. |                                                                                                                                                       | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020 |
| <b>NUMEROS GENERADORES</b>            |                                                                                                                                                       |                                                                       |
| <b>CONCEPTO:</b>                      | EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION |                                                                       |
|                                       | <b>LARGO</b>                                                                                                                                          | <b>ANCHO<br/>promedio</b>                                             |
|                                       | 159.00                                                                                                                                                | 5.83                                                                  |
|                                       | <b>ALTO</b>                                                                                                                                           | <b>PZA.</b>                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                       | 1.0000                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                       | <b>TOTAL</b>                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                       | <b>926.97</b>                                                         |

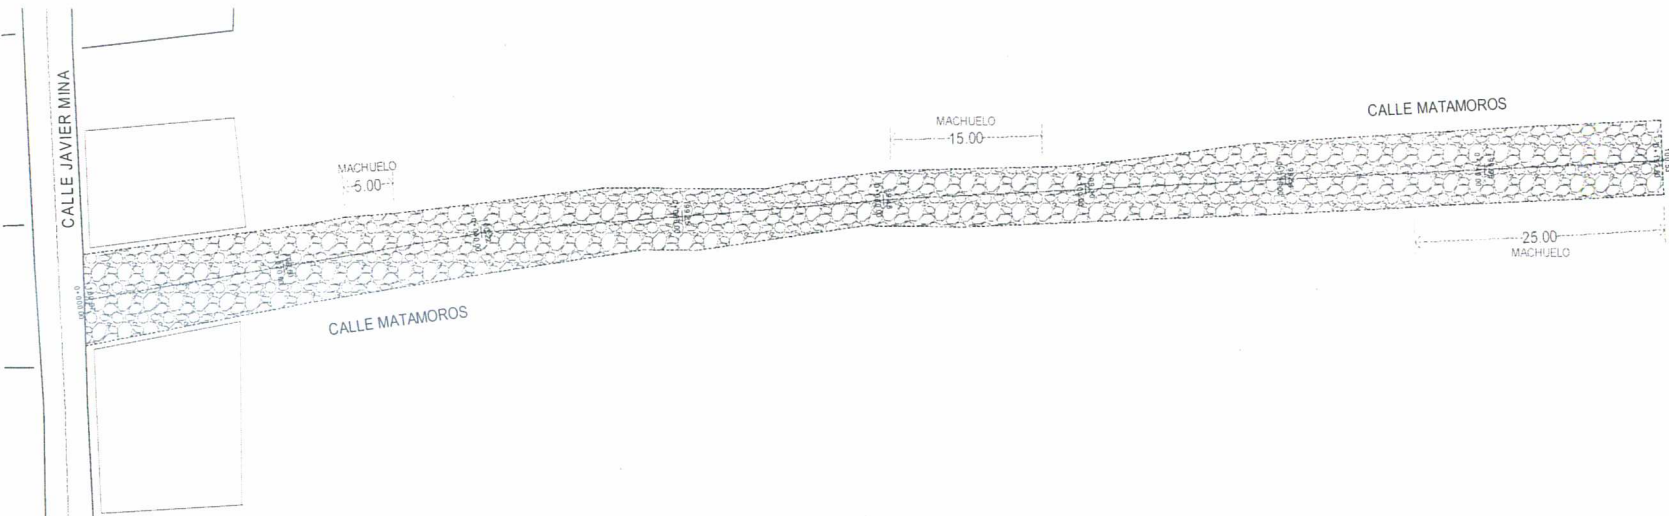

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                      | <b>TOTAL M2: 926.97</b>                                                               |
| ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ                                                         | ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ                                                      | REYES IBARRA QUINTERO                                                                 |
|  |  |  |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                                          | SUPERVISOR DE OBRA                                                                   | RESIDENTE DE OBRA                                                                     |

FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020

CONCEPTO 3

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS

LOCALIDAD: EL MOLINO

ESTIMACIÓN: 1 Y FINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

**ARCHIVO FOTOGRAFICO**

CONCEPTO:

EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP 1:4 INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION

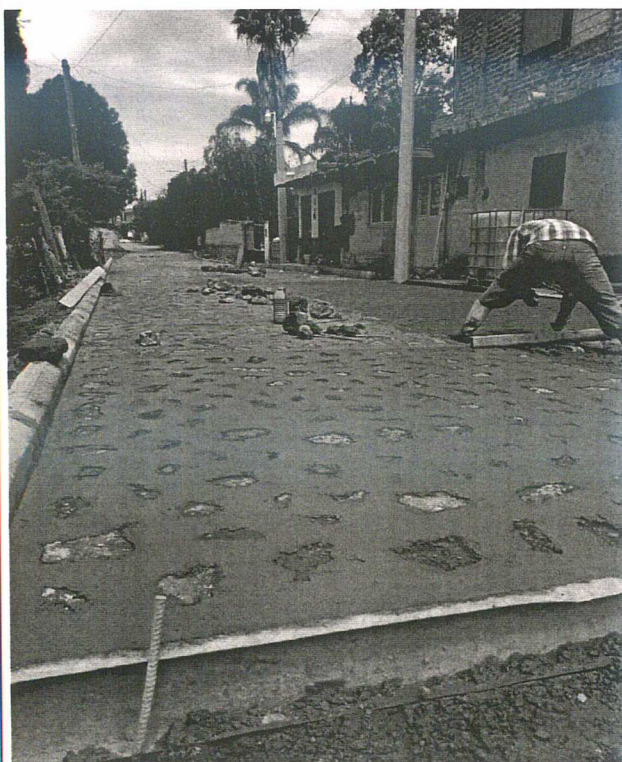

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

REYES IBARRA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA




|                                       |       |                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FECHA:</b> 05 DE OCTUBRE DEL 2020  |       | <b>CONCEPTO 4</b>                                                                                                                                         |              |
| <b>OBRA:</b>                          |       | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS                                                                                     |              |
| <b>LOCALIDAD:</b> EL MOLINO           |       | <b>ESTIMACIÓN:</b> 1 Y FINIQUITO                                                                                                                          |              |
| <b>MUNICIPIO:</b> JOCOTEPEC, JALISCO. |       | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020                                                                                     |              |
| <b>NUMEROS GENERADORES</b>            |       |                                                                                                                                                           |              |
| <b>CONCEPTO:</b>                      |       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION. |              |
|                                       | LARGO | ANCHO                                                                                                                                                     | ALTO         |
|                                       | 53.00 |                                                                                                                                                           | 1.00         |
|                                       |       |                                                                                                                                                           | <b>TOTAL</b> |
|                                       |       |                                                                                                                                                           | <b>53.00</b> |

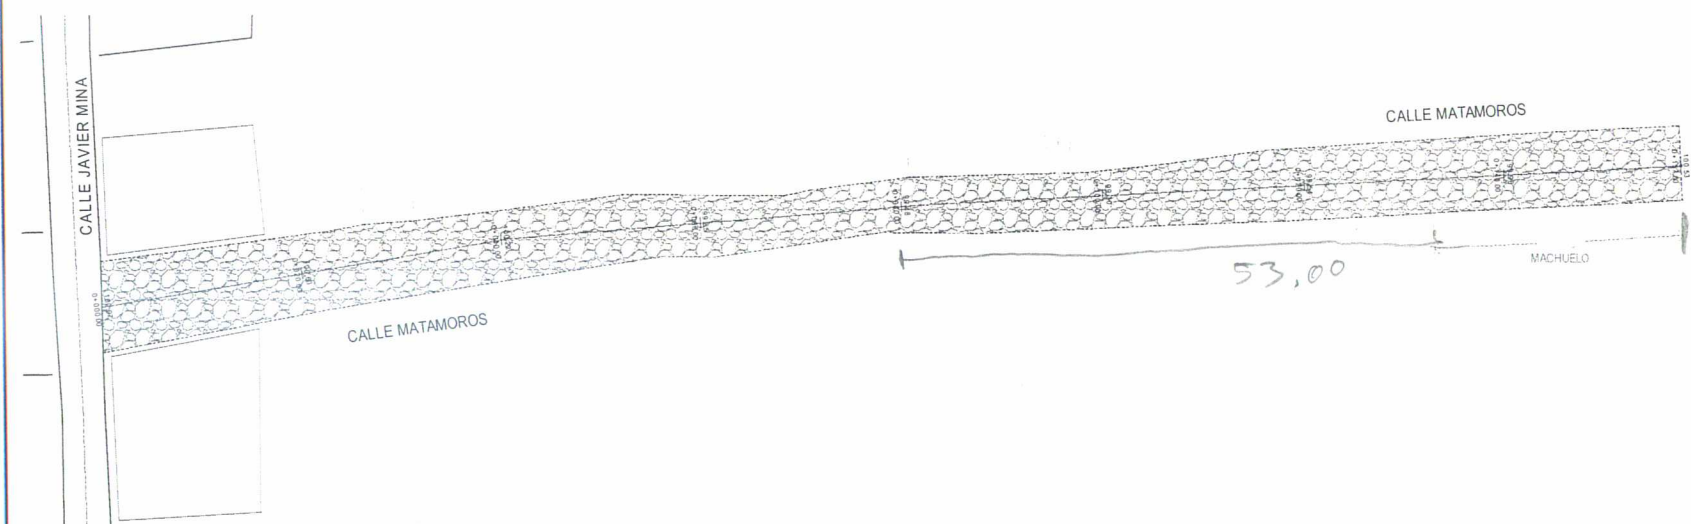

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     |                                                                                       | <b>TOTAL ML: 53.00</b>                                                                |  |
| ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ                                                         | ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ                                                       | REYES IBARRA QUINTERO                                                                 |  |
|  |  |  |  |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                                          | SUPERVISOR DE OBRA                                                                    | RESIDENTE DE OBRA                                                                     |  |

FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020

CONCEPTO 4

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS

LOCALIDAD: EL MOLINO

ESTIMACIÓN: 1 Y FINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

**ARCHIVO FOTOGRAFICO**

CONCEPTO:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.

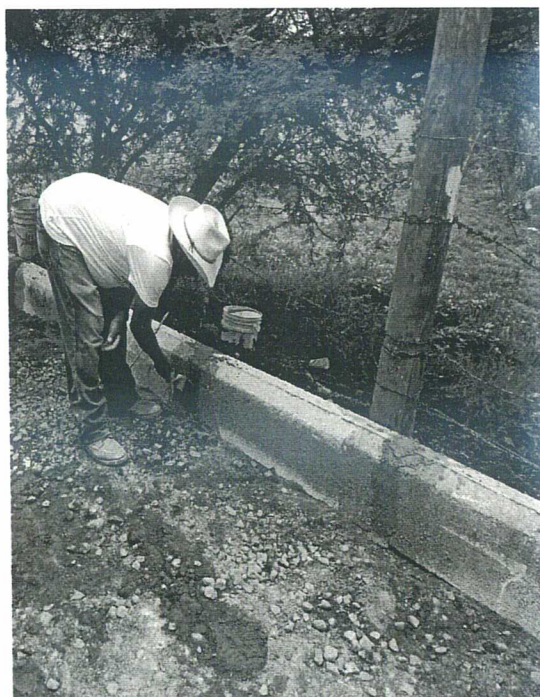

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

REYES IBARRA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020

CONCEPTO 5

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS

LOCALIDAD: EL MOLINO

ESTIMACIÓN: 1 Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

## NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA

| LARGO  | ANCHO<br>promedio | ALTO | PZA. | TOTAL  |
|--------|-------------------|------|------|--------|
| 159.00 | 5.89              |      | 1.00 | 936.51 |

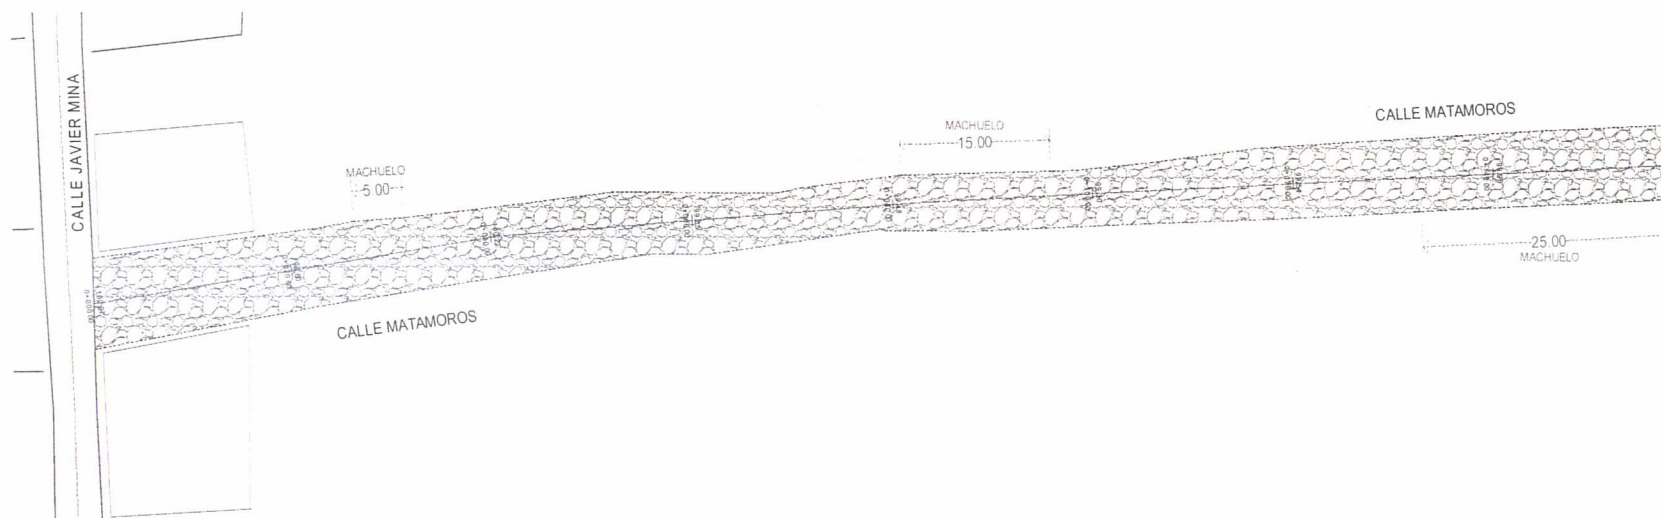

TOTAL M2: 936.51

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

REYES IBARRA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2020

CONCEPTO 5

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS

LOCALIDAD: EL MOLINO

ESTIMACIÓN: 1 Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 06 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

**ARCHIVO FOTOGRAFICO**

CONCEPTO:

LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

REYES IBARRA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA
