



Emitido por:
CONTPAQI
Software empresarial fácil y completo

Factura
Serie:
Folio: 27
Fecha: 9/11/2020 11:30:11
Lugar Expedición: 45609
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

1066/2020
[Handwritten signature]

EMISOR: BAUEN INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
R.F.C.: BIM1904222H5
Correo Electrónico: bauen2018@hotmail.com
Bahía de Acapulco No. 3416 Parques del Bosque, Tlaquepaque 45609, San Pedro Tlaquepaque Jalisco México

RECEPTOR: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

R.F.C.: MJJ850101KP8 País: México C.P.: 45800
Estado: Jalisco Municipio: Jocotepec
Ciudad: Jocotepec Colonia: Jocotepec Centro
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. SN
Uso CFDI: P01 - Por definir
NumRegIdTrib: Residencia Fiscal:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Servicio / Producto	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	72141205	14,340.21	002 - IVA - 2,294.43	14,340.21

ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO EXTRAORDINARIOS POR LA OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE" PARTIDA PRESUPUESTAL (6231-2-25.-050-270), "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO" PARTIDA PRESUPUESTAL (6241-2-25.1-050-271) Y "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO" PARTIDA PRESUPUESTAL (6251-2-25.1-050-272) DEL CONTRATO N° GMJ022C-OP/2020

Importe con letra:
DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.

Este Documento Es Una Representación Impresa De Un CFDI

SUBTOTAL	14,340.21
(+) I.V.A.	2,294.43
TOTAL	16,634.64
Devolución De Pena Convencional	0.00
2 al Millar (CMIC)	0.00
5 al Millar (R.I.V SEFUPU)	71.70
Penalización	0.00
Neto a pagar	16,562.94

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00

Observaciones:

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Folio fiscal: D045FE10-5633-4F67-B62D-B5C9782A575D
No. de Cuenta:

No de Serie del CSD: 00001000000500691769
Fecha y hora de certificación: Noviembre 10 2020 - 11:25:13
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Condiciones de Pago:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JALISCO



CFDI Versión 3.3

Sello digital del CFDI

Rdh7qWyllwReH1pn1jGtdwPBjZBE0hG0EP724f0/OleF63bJpX2zawrAXuOMh3PvV04RCsk749I+9ppegnIc
srsvqFBQcGkRLZD1sc41hshUIQubLZXLDXyJ8XC7czk+YXkLymPQTZ+cmuRn4qTSrehMUc4y02bmoGW0WUJH5rFvdv/
dWQcy8v8RNRNSWYg7n5zB7TtVWS92uehvLHydKlpoOHWmNlrOptBoAaczKYSgVHBMelb4WP9NoXKUTROTgJhPmPegMGQrbZg7
zEhQ0mLBBDOzK5UVVtoss5JHAlqKqFMYq8Tz3zCQ==

Sello del SAT

qRMVhdu8Btr3FYNcKkOP053b0dTLJNL5GyO4wY2x0mzLUt+Yhcthu0S3LUFCD9cuR9MP56FHGUJclch+ggPu6elq0
IGYhXUlxunrInS85lcn11YZbP38gtwou7TFyGyZBYHGvH4E4NLPWk8+H7JSe+VaMD190HmWtMZLzGdxoE2DnV7O
rS+ek0M4eYbhpjapzax2nz8OzV4YZ+hJ3HcSjmlU412YaxCSx00rdv5JyrhQZBp2zIMGvVvZzVw8Wb91U+y5R78A8oVvk
jGsd10kRRTwptgvQpbhcmxywukduELDFkD8se8Ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1D045FE10-5633-4F67-B62D-B5C9782A575D|2020-11-10T11:25:13|MAS081024700|rdh7qWyllwReH1pn1jGtdw
PBjZBE0hG0EP724f0/OleF63bJpX2zawrAXuOMh3PvV04RCsk749I+9ppegnIc|srsvqFBQcGkRLZD1sc41hshUIQubLZXLDXyJ8XC7czk+YXkLymPQTZ+cmuRn4qTSrehMUc4y02bmoGW0WUJH5rFvdv/
dWQcy8v8RNRNSWYg7n5zB7TtVWS92uehvLHydKlpoOHWmNlrOptBoAaczKYSgVHBMelb4WP9NoXKUTROTgJhPmPegMGQrbZg7zEhQ0mLBBDOzK5UVVtoss5JHAlqKqFMYq8Tz3zCQ||00001000000505142236||
BJHAlqKqFMYq8Tz3zCQ==

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 022C-OP/2020
CONTRATISTA: BAUEN INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE,
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON
HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PÍPILA ENTRE
CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.






ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO FINIQUITO)

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

PERÍODO DE TRABAJO: 03 AL 19 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS			IMPORTES		
D 1	EXTRAORDINARIOS EXTRAORDINARIOS				\$	14,340.21
	   				\$	14,340.21
				MONTO DE ESTIMACIÓN	\$	14,340.21
				MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 25 %	\$	-
				SUBTOTAL	\$	14,340.21
				I. V. A.	\$	2,294.43
				SUMA	\$	16,634.64
				MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$	-
				MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$	71.70
				NETO A PAGAR	\$	16,562.94
	ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:		
	ASIGNACIÓN	\$ 727,789.70	\$ 116,446.35	\$	844,236.05	
	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 14,340.21	\$ 2,294.43	\$	16,634.64	
	ACUMULADO ANTERIOR	\$ 620,262.31	\$ 99,241.97	\$	719,504.28	
	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 634,602.52	\$ 101,536.40	\$	736,138.92	
	SALDO POR EJERCER	\$ 93,187.18	\$ 14,909.95	\$	108,097.13	
	ANTICIPO					
	ANTICIPO %	\$ 181,947.42	\$ 29,111.59	\$	211,059.01	
	AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$	-	
	AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 181,947.42	\$ 29,111.59	\$	211,059.01	
	AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 181,947.42	\$ 29,111.59	\$	211,059.01	
	FALTANTE POR AMORTIZAR	0.00	0.00		0.00	
				RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA	
				ING. CARLOS A. BEJARANO CURIEL	LIC. RAFAEL LABASTIDA MARTINEZ BAUEN INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	
				SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
				ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 4 (CUATRO FINIQUITO) NO. CONTRATO: GMJ 022C-OP/2020

HOJA 1 DE 4

PERÍODO DE TRABAJO: 03 AL 19 DE AGOSTO DEL 2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PÍPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA



UBICACIÓN: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO
CONTRATISTA: BAUEN INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
			PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	
A	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE													
A1	PRELIMINARES													
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSURSO DE LA OBRA	M2	98.33	70.03	0.00	70.03	28.30	\$8.13	\$799.42	\$569.33	\$ -	\$ 569.33	\$ 230.10	
SUB-TOTAL PRELIMINARES											\$ -	\$ 569.33		
A2	EXCAVACIONES													
2	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	40.13	91.45	0.00	91.45	-51.32	\$90.28	\$3,622.94	\$8,258.05	\$ -	\$ 8,258.05	-\$ 4,633.12	
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MANO INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	68.83	70.03	0.00	70.03	-1.20	\$11.71	\$806.00	\$820.03	\$ -	\$ 820.03	-\$ 14.03	
SUB-TOTAL EXCAVACIONES											\$ -	\$ 9,078.08		
A3	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES													
4	PLANTILLA DE 10 CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	68.83	70.03	0.00	70.03	-1.20	\$82.62	\$5,686.73	\$5,785.71	\$ -	\$ 5,785.71	-\$ 98.98	
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA 50 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL DE MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	98.33	100.04	0.00	100.04	1.71	\$131.55	\$12,938.26	\$13,163.26	\$ -	\$ 13,163.26	-\$ 225.00	
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	19.48	23.63				\$13,109.07	\$15,902.59	\$ -	\$ 15,902.59	-\$ 2,793.52		
SUB-TOTAL CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES											\$ -	\$ 34,851.57		
A4	INSTALACION DE TUBERIAS													
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	98.33	100.04				\$12,892.05	\$13,116.24	\$ -	\$ 13,116.24	-\$ 224.20		
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	20.00	23.00	0.00	23.00	-3.00	\$1,031.44	\$20,626.80	\$23,720.82	\$ -	\$ 23,720.82	-\$ 3,094.02	
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3 INC	PZA	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$3,938.07	\$7,876.14	\$3,938.07	\$ -	\$ 3,938.07	\$ 3,938.07	
10	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130X90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$5,143.10	\$10,286.20	\$5,143.10	\$ -	\$ 5,143.10	\$ 5,143.10	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FOFO PARA CAJA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$4,154.25	\$8,308.50	\$4,154.25	\$ -	\$ 4,154.25	\$ 4,154.25	
SUB-TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS											\$ -	\$ 50,072.48		
A5	COMPLEMENTARIAS													
12	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	196.66	70.03	0.00	70.03	126.63	\$9.32	\$1,832.87	\$652.86	\$ -	\$ 652.86	\$ 1,180.21	
SUB-TOTAL COMPLEMENTARIAS											\$ -	\$ 652.86		
TOTAL CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE											\$ -	\$ 95,222.12		

LIC. RAFAEL LABASTIDA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 4 (CUATRO FINIQUITO) NO. CONTRATO: GMJ 022C-OP/2020
 PERÍODO DE TRABAJO: 03 AL 19 DE AGOSTO DEL 2020
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PÍPLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA

NO. CONTRATO: GMJ 022C-OP/2020

HOJA 2 DE 4




UBICACIÓN: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO
 CONTRATISTA: BAUEN INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
 FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO
B CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE													
B1 PRELIMINARES													
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHEGAR NIVELES DURANTE EL TRANSURSO DE LA OBRA.	M2	96.60	68.80	0.00	68.80	27.80	\$8.13	\$785.36	\$559.34	\$ -	\$ 559.34	\$ 226.01
SUB-TOTAL PRELIMINARES										\$ -	\$ 559.34		
B2 EXCAVACIONES													
2	EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	105.42	80.95	0.00	80.95	24.47	\$90.28	\$9,517.32	\$7,308.17	\$ -	\$ 7,308.17	\$ 2,209.15
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	67.62	68.80	0.00	68.80	-1.18	\$11.71	\$791.83	\$805.65	\$ -	\$ 805.65	-\$ 13.82
SUB-TOTAL EXCAVACIONES										\$ -	\$ 8,113.81		
B3 CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES													
4	PLANTILLA DE 10 CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.	M2	67.62	68.80	0.00	68.80	-1.18	\$499.36	\$48,238.18	\$49,077.10	\$ -	\$ 5,684.26	-\$ 97.49
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	ML	96.60	98.28	0.00	98.28	-1.68	\$336.85	\$33,300.85	\$33,637.65	\$ -	\$ 27,492.85	-\$ 469.96
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	64.85	39.67	0.00	39.67	25.18	\$430.93	\$10,680.93	\$10,680.93	\$ -	\$ 26,695.93	\$ 16,944.88
SUB-TOTAL CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES										\$ -	\$ 59,873.03		
B4 INSTALACION DE TUBERIAS													
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	96.60	98.28	0.00	98.28	-1.68	\$499.36	\$48,238.18	\$49,077.10	\$ -	\$ 49,077.10	-\$ 838.92
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4"DE DIAMETRO INCLUYEHERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA"	PZA	20.00	19.00	0.00	19.00	1.00	\$1,328.96	\$26,579.20	\$25,250.24	\$ -	\$ 25,250.24	\$ 1,328.96
9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC.HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$8,136.02	\$16,272.04	\$8,136.02	\$ -	\$ 8,136.02	\$ 8,136.02
10	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	2.00	0.00	2.00	-1.00	\$878.99	\$878.99	\$1,757.98	\$ -	\$ 1,757.98	-\$ 878.99
SUB-TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS										\$ -	\$ 84,221.34		
B5 COMPLEMENTARIAS													
11	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	193.20	147.42	0.00	147.42	45.78	\$9.32	\$1,800.62	\$1,373.95	\$ -	\$ 1,373.95	\$ 426.67
SUB-TOTAL COMPLEMENTARIAS										\$ -	\$ 1,373.95		
TOTAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE										\$ -	\$ 249,363.60		



LIC. RAFAEL LABASTIDA MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DE OBRA



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 4 (CUATRO FINIQUITO) NO. CONTRATO: GMJ 022C-OP/2020
 PERÍODO DE TRABAJO: 03 AL 19 DE AGOSTO DEL 2020
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PÍPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA

NO. CONTRATO: GMJ 022C-OP/2020

HOJA 3 DE 4



UBICACIÓN: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO
 CONTRATISTA: BAUEN INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
 FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
			PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	
C	EMPEDRADO CALLE PÍPILA													
C1	PRELIMINARES													
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSURSO DE LA OBRA	M2	682.64	482.68	0.00	482.68	199.96	\$8.13	\$5,549.86	\$3,924.19	\$ -	\$ 3,924.19	\$ 1,625.67	
SUB-TOTAL PRELIMINARES											\$ -	\$ 3,924.19		
C2	EXCAVACIONES													
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION	M3	375.45	337.88	0.00	337.88	37.57	\$173.33	\$65,076.75	\$58,564.74	\$ -	\$ 58,564.74	\$ 6,512.01	
SUB-TOTAL EXCAVACIONES											\$ -	\$ 58,564.74		
C3	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES													
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	682.64	482.68	0.00	482.68	199.96	\$19.51	\$13,417.00	\$ -	\$ -	\$ 9,417.09	\$ 3,901.22	
4	FORMACION DE SUB-RASANTE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	136.53	144.80	0.00	144.80	-8.27	\$631.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,510.70	-\$ 5,226.47	
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	136.53	96.54	0.00	96.54	39.99	\$723.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,870.83	\$ 28,942.76	
SUB-TOTAL CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES											\$ -	\$ 170,798.62		
C4	SUPERFICIE DE RODAMIENTO													
6	EMPEDRADO ECOLOGICO ELABORADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	565.62	362.63	0.00	362.63	202.99	\$147.79	\$83,592.98	\$53,593.09	\$ -	\$ 53,593.09	\$ 29,999.89	
7	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION."	ML	195.04	115.09	0.00	115.09	79.95	\$137.34	\$26,786.79	\$15,806.46	\$ -	\$ 15,806.46	\$ 10,980.33	
8	FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO MR 42 DE 20CM DE ESPESOR CON A M 1.5" TERMINADO PULIDO, APALLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	117.02	120.05	0.00	120.05	-3.03	\$530.73	\$62,106.02	\$63,714.14	\$ -	\$ 63,714.14	-\$ 1,608.11	
SUB-TOTAL SUPERFICIE DE RODAMIENTO											\$ -	\$ 133,113.68		
C5	COMPLEMENTARIAS													
9	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	682.64	482.68	0.00	482.68	199.96	\$9.32	\$6,362.20	\$4,498.58	\$ -	\$ 4,498.58	\$ 1,863.63	
SUB-TOTAL COMPLEMENTARIAS											\$ -	\$ 4,498.58		
TOTAL EMPEDRADO CALLE PÍPILA											\$ -	\$ 620,263.41		



LIC. RAFAEL LABASTIDA MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN: 4 (CUATRO FINIQUITO) NO. CONTRATO: GMJ 022C-OP/2020
PERÍODO DE TRABAJO: 03 AL 19 DE AGOSTO DEL 2020
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PÍPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA

UBICACIÓN: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO
CONTRATISTA: BAUEN INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

HOJA 4 DE 4



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
			PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	
D	EXTRAORDINARIOS													
D	EXTRAORDINARIOS													
1	Brocal de concreto y tapa de polietileno para pozo de visita de 60 cm. de diámetro, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$6,215.99	\$6,215.99	\$0.00	\$ 6,215.99	\$ 6,215.99	\$ -	
2	Aproche con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. Incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	34.53	0.00	34.53	34.53	0.00	\$235.28	\$8,124.22	\$0.00	\$ 8,124.22	\$ 8,124.22	\$ -	
SUB-TOTAL EXTRAORDINARIOS											\$ 14,340.21	\$ 14,340.21		
TOTAL EXTRAORDINARIOS											\$ 14,340.21	\$ 634,603.62		
								EN ESTA ESTIMACION			ACUMULADO		SALDO	
SUB - TOTAL											\$ 14,340.21	\$ 634,603.62	\$ 93,186.08	
IVA 16%											\$ 2,294.43	\$ 101,536.58	\$ 14,909.77	
TOTAL											\$ 16,634.64	\$ 736,140.20	\$ 108,095.86	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2021
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JALISCO

LIC. RAFAEL LABASTIDA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DE OBRA


ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PÍPLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA

NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO ESTIMACION 4
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO (CUATRO FINIQUITO) 03 AL 19 DE AGOSTO DEL 2020

D	EXTRAORDINARIOS	PERIODO DE EJECUCIÓN:							
CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
D1	EXTRAORDINARIOS								
14304-001	Brocal de concreto y tapa de polietileno para pozo de visita de 60 cm. de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.								

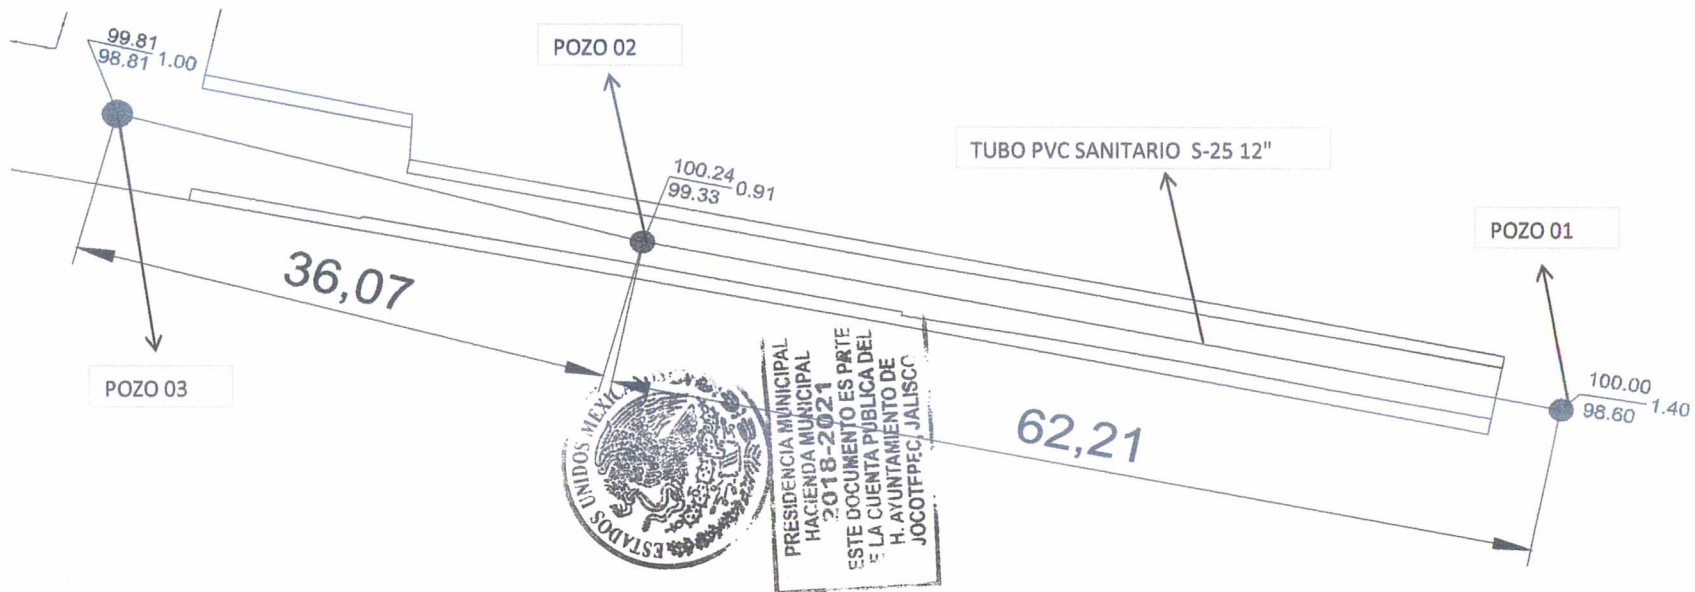

REVISOR	REVISOR	REVISOR
SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	RESIDENTE DE OBRA
 ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	 ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	 ING. CARLOS A. BEJARANO CURIEL

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

HOJA 03 DE 03

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PÍPLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA

NUMEROS GENERADORES




LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO ESTIMACION 4
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO (CUATRO FINIQUITO) 03 AL 19 DE AGOSTO DEL 2020

D	EXTRAORDINARIOS	PERIODO DE EJECUCION:							
CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
D1	EXTRAORDINARIOS								
14304-001	Brocal de concreto y tapa de polietileno para pozo de visita de 60 cm. de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2018-2021
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JALISCO



REVISOR SUPERVISOR	REVISOR DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	REVISOR RESIDENTE DE OBRA
 ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	 ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	 ING. CARLOS A. BEJARANO CURIEL

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020


HOJA 01 DE 03




OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PÍPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA

NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO ESTIMACION 4
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO (CUATRO FINIQUITO) 03 AL 19 DE AGOSTO DEL 2020

D	EXTRAORDINARIOS	PERIODO DE EJECUCION:							
CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
D2	EXTRAORDINARIOS								
10401-502	Aproche con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. Incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	FORMA 1		7.12	1.00	0.30	1.00	2.14	M3
		FORMA 2		8.24	1.00	0.30	1.00	2.47	M3
		FORMA 3		30.02	1.00	0.30	1.00	9.01	M3
		FORMA 4		41.44	1.00	0.30	1.00	12.43	M3
		FORMA 5		3.32	1.00	0.30	1.00	1.00	M3
		FORMA 6		14.19	1.00	0.30	1.00	4.26	M3
		FORMA 7		10.76	1.00	0.30	1.00	3.23	M3
							TOTAL	34.53	M3

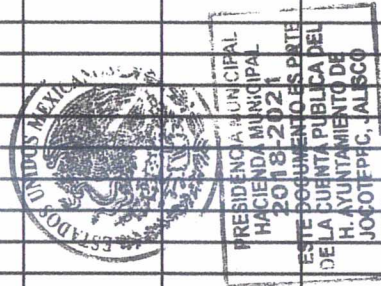

REVISOR SUPERVISOR  ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	REVISOR DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	REVISOR RESIDENTE DE OBRA  ING. CARLOS A. BEJARANO CURIEL
---	--	--

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020


HOJA 02 DE 03




OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PÍPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA

NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO ESTIMACION 4
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO (CUATRO FINQUITO) 03 AL 19 DE AGOSTO DEL 2020

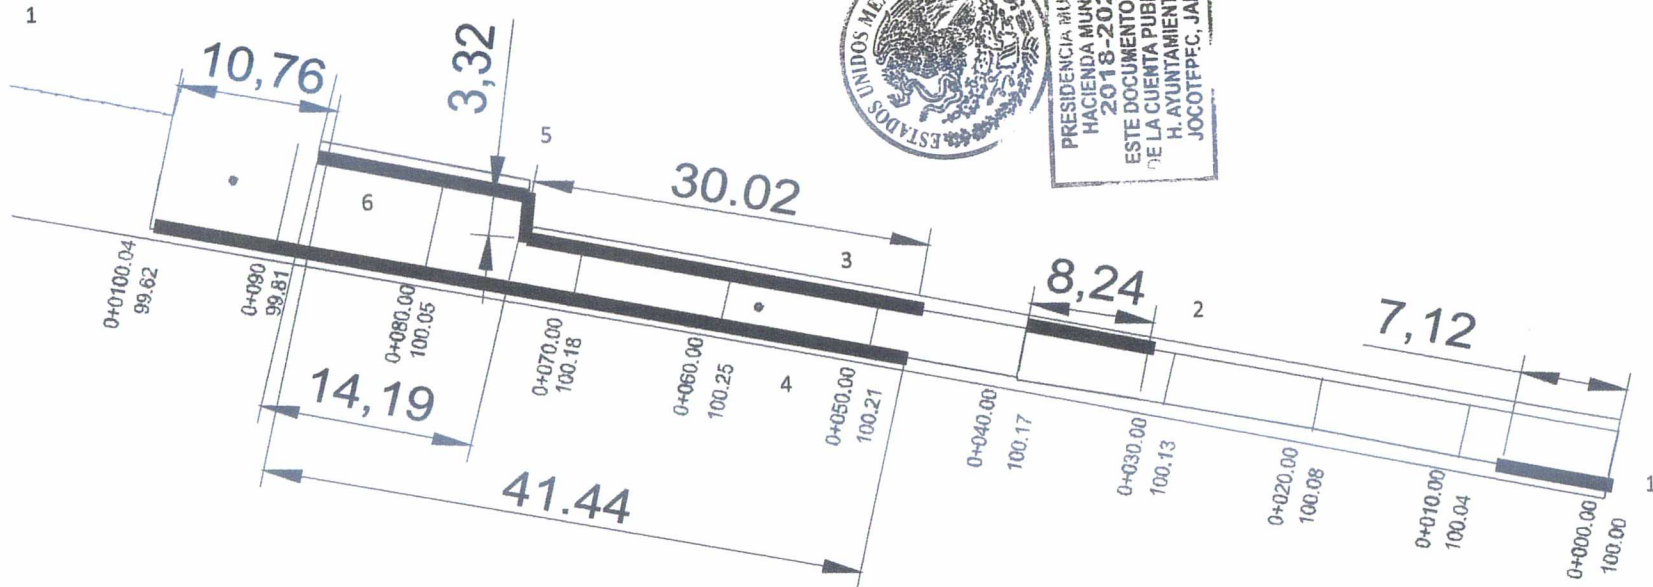D	EXTRAORDINARIOS	PERIODO DE EJECUCION:							
CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
D2	EXTRAORDINARIOS								
10401-502	Aproche con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. Incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.								



REVISOR	REVISOR	REVISOR
SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	RESIDENTE DE OBRA
		
ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	ING. CARLOS A. BEJARANO CURIEL

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

HOJA 03 DE 03




OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PÍPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA

NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO ESTIMACION 4
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO (CUATRO FINIQUITO) 03 AL 19 DE AGOSTO DEL 2020

D	EXTRAORDINARIOS	PERIODO DE EJECUCION:							
CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN	UNIDAD
D2	EXTRAORDINARIOS								
10401-502	Aproche con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. Incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.								



REVISOR SUPERVISOR  ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	REVISOR DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	REVISOR RESIDENTE DE OBRA  ING. CARLOS A. BEJARANO CURIEL
---	--	--

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

20ND9154906

Clave de R.F.C.

BIM1904222H5

Nombre, Denominación o Razón social

BAUEN INGENIERIA Y MAQUINARIA SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.


La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 16 de diciembre de 2020, a las 11:42 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no este al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.



Cadena Original

||BIM1904222H5|20ND9154906|16-12-2020|P||00001088888800000031||

Sello Digital

a1quRPN7nWl6cJvIGIJOjaPigyN/CxOSYLyeU5SQqmH1HRKOIEghBNxr1oXNjrXqSwqUID+qjAapTh38uaBzfUrqus
H3JgifyLw9yDhkUNvRvoAIGlcEsHtAfx2VKerLAT3KMWPQFgJc05wtaWGS0ePkQLbPJefrktUSIMlrE1s=



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

- 3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
- 4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
- 5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
- 6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.



Cadena Original

||BIM1904222H5|20ND9154906|16-12-2020|P||00001088888800000031||

Sello Digital

a1quRPN7nWl6cJvIGIJOjaPigyN/CxOSYLyeU5SQqmH1HRKOEghBNxr1oXNJrXqSwqUID+qjAapTh38uaBzfUrqus
H3JgfyLw9yDhkUNvRvoAIGlcEsHtAfx2VKerLAT3KMWPQFgJc05wtaWGS0ePkQLbPJefrktUSIMlrE1s=



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.
