

RFC emisor:

IEO101202HD7

Nombre emisor:

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO SA DE CV

Folio:

153

RFC receptor:

MJJ850101KP8

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

FF9626F5-3C97-42F0-837C-501C24A46225

No. de serie del CSD:

00001000000404113480

Código postal, fecha y hora de emisión:

45180 2020-09-10 09:51:19

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72101500		1	E48		196184.26	196184.26				
Descripción	ESTIMACIÓN UNO Y FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJ E SANITARIO EN LA CALLE LOS ÁNGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA PARTIDA PRESUPUESTAL (6241-2-25.1-050-254) DEL CONTRA TO NO. GMJ012C-OP/2020 FAIS RAMO 33/2020 RETENCION 0.005 PARA CONTRALORIA \$ 1,318.65 NETO A PAGAR \$226,255.09				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	196184.26	Tasa	16.0000%	31389.48

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Impuestos Traslados

Total

IVA 16.0000%

\$ 196,184.26

\$ 31,389.48

\$ 227,573.74

Sello digital del CFDI:

UMQM7Iy/oCtP+QyjkVmYPI5eaiwqXzaOZDbwMIZc/QsJKHmOhhrSIF7vseEsk/SOWPrOs+z528Vm+p001Xo2J/8499QvBD7nuWR8H5nmp2eYCBgtBNkNA7ZLSOtaYoykNSVwVlzXHm1ygo47Ec2O2MW0uC8P/TS5pt1IFk63+9n8sIIh1XKA5kC8X+mvWPIfVZzRGgFDpoTrgRF2zSWdTSPu/sJ/0UFNUb9QplsTPoOUPLLCWu0knPkUj6qj6xK5idjKdUH5oe7R0Jcs0Z1z2XafnRhJ1y4QKoKrTI0EIR8Wq5H0TMxVjo64O9bWWmsVHxZFmRbwEdt2YcVBTYXLQ==

Sello digital del SAT:

R4Tp0aKAqXHo2HxCzo6IDEN0leFXOPGPx8xDTrlHYd4BDaIZGxM7cu1yDyglcuScyDatHCpJoGC8SX11jOn6Ewsnnwfs3lZmlMfsusWiePhGFGkvTrO+eZFAj7rHTBAy3AeLj4njQBsW9xmIsYGX84rcmdwDZnihRYtUS7JOQc9csc2jngD5vmkAGNLOhEb5RDyHk32GfMPj97UJpL/sdcT4dXntmZ27mfgNs4ZxqDVi+nC4qITH+f6mHrzdZND/ypluBQxJSjILDuIGWwhMNkjNU7ZRHynK32AlpQULfTKop9I4kpSWGAYhHJsPUNKZSxaHwxEXRp43IPH0IGUFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|FF9626F5-3C97-42F0-837C-501C24A46225|2020-09-10T09:57:42|SAT970701NN3|UMQM7Iy/oCtP+QyjkVmYPI5eaiwqXzaOZDbwMIZc/QsJKHmOhhrSIF7vseEsk/SOWPrOs+z528Vm+p001Xo2J/8499QvBD7nuWR8H5nmp2eYCBgtBNkNA7ZLSOtaYoykNSVwVlzXHm1ygo47Ec2O2MW0uC8P/TS5pt1IFk63+9n8sIIh1XKA5kC8X+mvWPIfVZzRGgFDpoTrgRF2zSWdTSPu/sJ/0UFNUb9QplsTPoOUPLLCWu0knPkUj6qj6xK5idjKdUH5oe7R0Jcs0Z1z2XafnRhJ1y4QKoKrTI0EIR8Wq5H0TMxVjo64O9bWWmsVHxZFmRbwEdt2YcVBTYXLQ=|[00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2020-09-10 09:57:42

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IEO101202HD7	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FF9626F5-3C97-42F0-837C-501C24A46225	2020-09-10T09:51:19	2020-09-10T09:57:42	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$227,573.74	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 012C OP/2020

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO SA. DE CV.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

UBICACIÓN: ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 1 UNO (Y EINIQUITO) DRENAJE



FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES					
1	PRELIMINARES				\$	1,235.02				
2	EXCAVACIONES				\$	20,447.94				
3	CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES				\$	110,619.71				
4	INSTALACION DE TUBERIA				\$	128,913.63				
5	COMPLEMENTARIOS				\$	2,513.81				
					MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 263,730.11				
					MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$ 67,545.85				
					SUBTOTAL.	\$ 196,184.26				
					I.V.A. 16%	\$ 31,389.48				
					SUMA	\$ 227,573.74				
					MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -				
					MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 1,318.65				
					NETO A PAGAR	\$ 226,255.09				
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I . V . A .	TOTAL:						
ASIGNACIÓN	\$	270,183.420	\$	43,229.35	\$	313,412.77				
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$	263,730.11	\$	42,196.82	\$	305,926.93				
ACUMULADO ANTERIOR			\$	-	\$	-				
ACUMULADO A LA FECHA	\$	263,730.11	\$	42,196.82	\$	305,926.93				
SALDO	\$	6,453.31	\$	1,032.53	\$	7,485.84				
ANTICIPO										
ANTICIPO 25 %	\$	67,545.85	\$	10,807.34	\$	78,353.19				
AMORTIZACIÓN	\$	67,545.85	\$	10,807.34	\$	78,353.19				
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.			\$	-	\$	-				
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$	67,545.85	\$	10,807.34	\$	78,353.19				
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$	-	\$	-	\$	-				
					RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA				
					ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA	INEDI SA. DE CV.				
					SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				
					ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y FINIQUITO No. DE CONTRATO: GMJ 012C OP/2020

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020
OBRA: DRENAJE
OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA
ALDAMA Y CERRADA, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO



UBICACIÓN: ENTRE PRIV. ALDAMA Y CERRADA EN LA CABECERA MPAL. MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
CONTRATISTA: CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO SA. DE CV.
FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PRELIMINARES												
1	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA	M2	158.50	0.0000	158.50	158.50	0.00	\$7,7919	\$ 1,235.02	\$ 1,235.02	\$ -	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE PRELIMINARES									\$ 1,235.02			
EXCAVACIONES												
2	EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION. INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	158.20	0.0000	158.20	158.20	0.00	\$121.0342	\$ 19,147.61	\$ 19,147.61	\$ -	\$ -
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	110.95	0.0000	110.95	110.95	0.00	\$11.72	\$ 1,300.33	\$ 1,300.33	\$ -	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EXCAVACIONES									\$ 20,447.94			
CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES												
4	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	110.95	0.0000	110.95	110.95	0.00	\$76.2872	\$ 8,464.06	\$ 8,464.06	\$ -	\$ -
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	158.50	0.0000	158.50	158.50	0.00	\$270.6863	\$ 42,903.78	\$ 42,903.78	\$ -	\$ -
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	91.63	0.0000	91.63	91.63	0.00	\$646.6427	\$ 59,251.87	\$ 59,251.87	\$ -	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE BASES Y SUB-BASES									\$ 110,619.71			
INSTALACION DE TUBERIA												
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	158.50	0.0000	158.50	158.50	0.00	\$527.4921	\$ 83,607.50	\$ 83,607.50	\$ -	\$ -
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	25.00	0.0000	25.00	25.00	0.00	\$1,259.585	\$ 31,489.63	\$ 31,489.63	\$ -	\$ -
9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	0.0000	2.00	2.00	1.00	\$6,100.99	\$ 18,302.97	\$ 12,201.98	\$ -	\$ 6,100.99
10	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CARAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	0.0000	2.00	2.00	-1.00	\$807.26	\$ 807.26	\$ 1,614.52	\$ -	\$ 807.26
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE INSTALACION DE TUBERIA									\$ 128,913.63			
COMPLEMENTARIOS												



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020		CONCEPTO 1			
OBRA:	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.				
LOCALIDAD: JOCOTEPEC			ESTIMACIÓN: 1 UNO Y FIINIQUITO		
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020				
NUMEROS GENERADORES					
CONCEPTO:	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA				
	LARGO	ANCHO	PZA.	TOTAL	OBSERV
	158.50	1.0000	1.0000	158.50	
				TOTAL M2: 158.50	
ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA			
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA			



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 1

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 2

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.


FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020 CONCEPTO 3
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC ESTIMACIÓN: 1 UNO Y FIINIQUITO
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA

LARGO	ANCHO	ALTO	PZA.	TOTAL
158.50	0.7000		1.00 linea	110.95

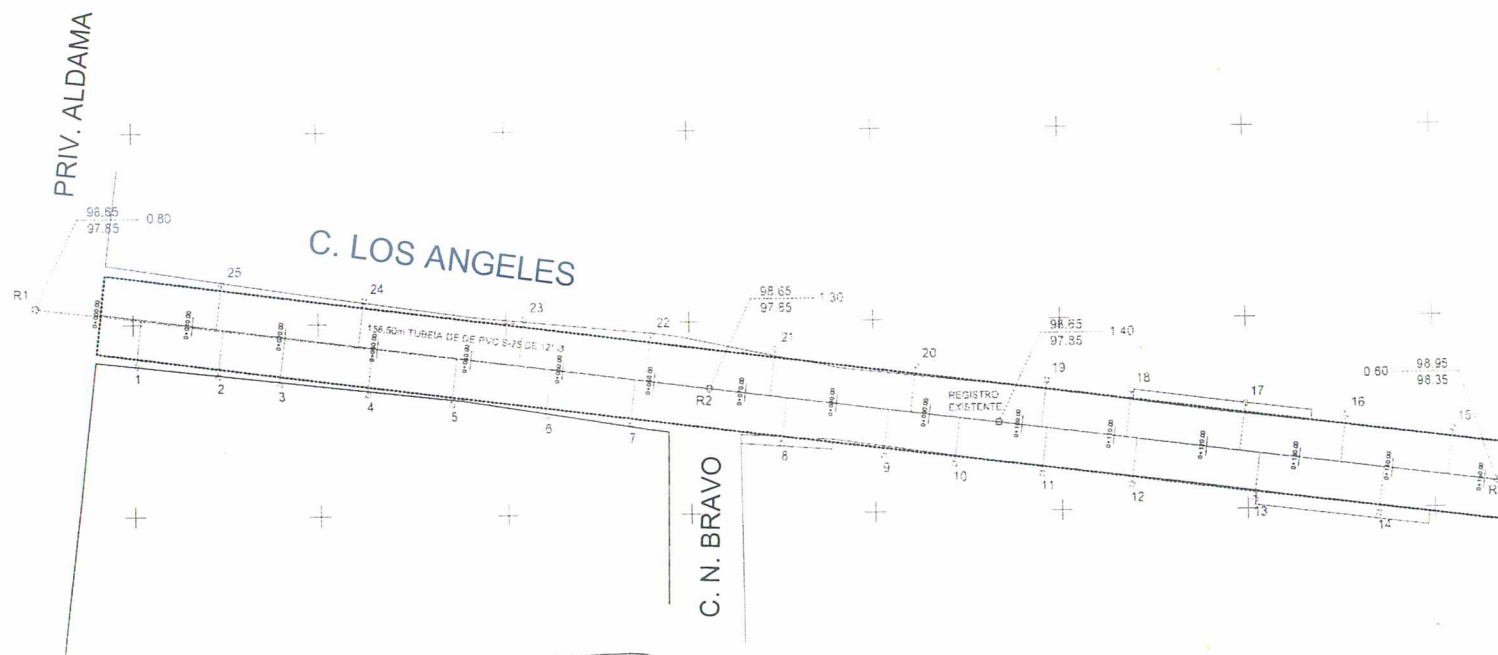

TOTAL M2: 110.95

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 3

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 4

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

LARGO	ANCHO	ALTO	PZA.	TOTAL
158.50	0.7000		1.00	línea 110.95

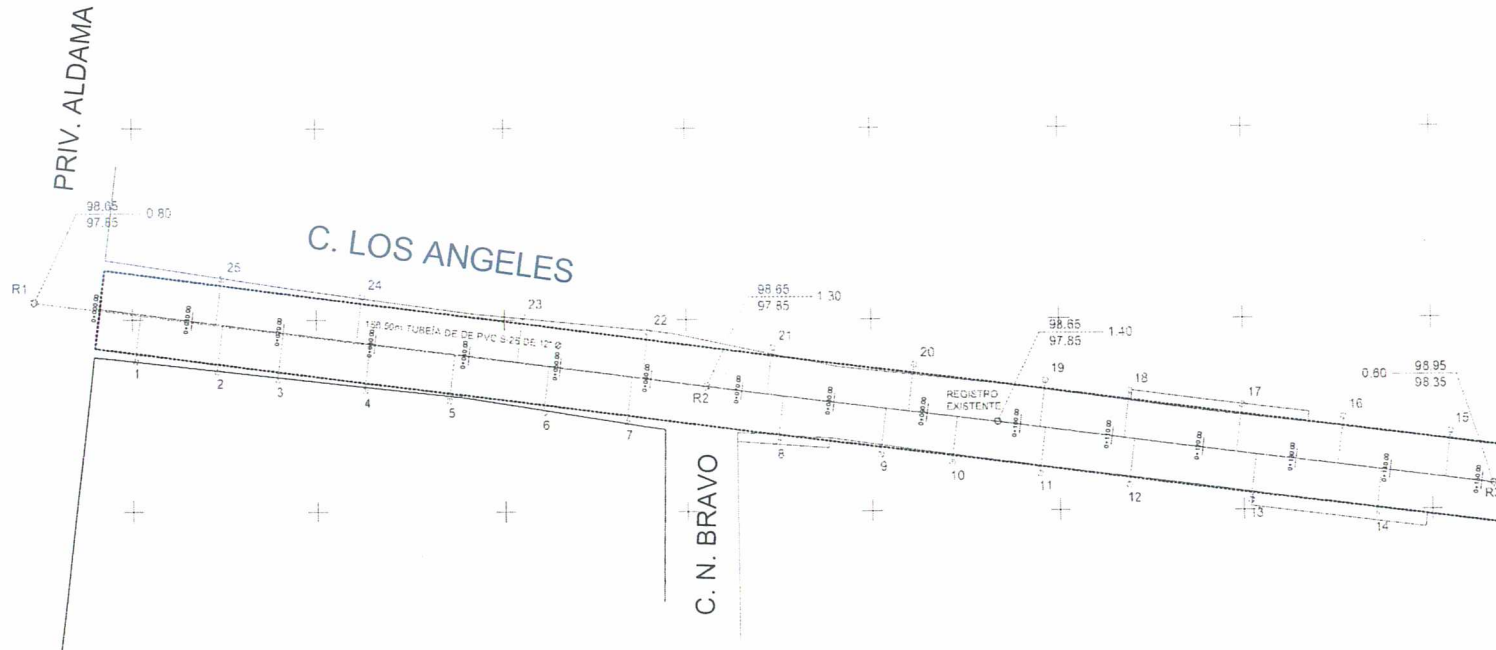

TOTAL M2: 110.95

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 4

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020 CONCEPTO 5
OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISON

LARGO	ANCHO	ALTO	PZA.	TOTAL
158.50			1.00 linea	158.50

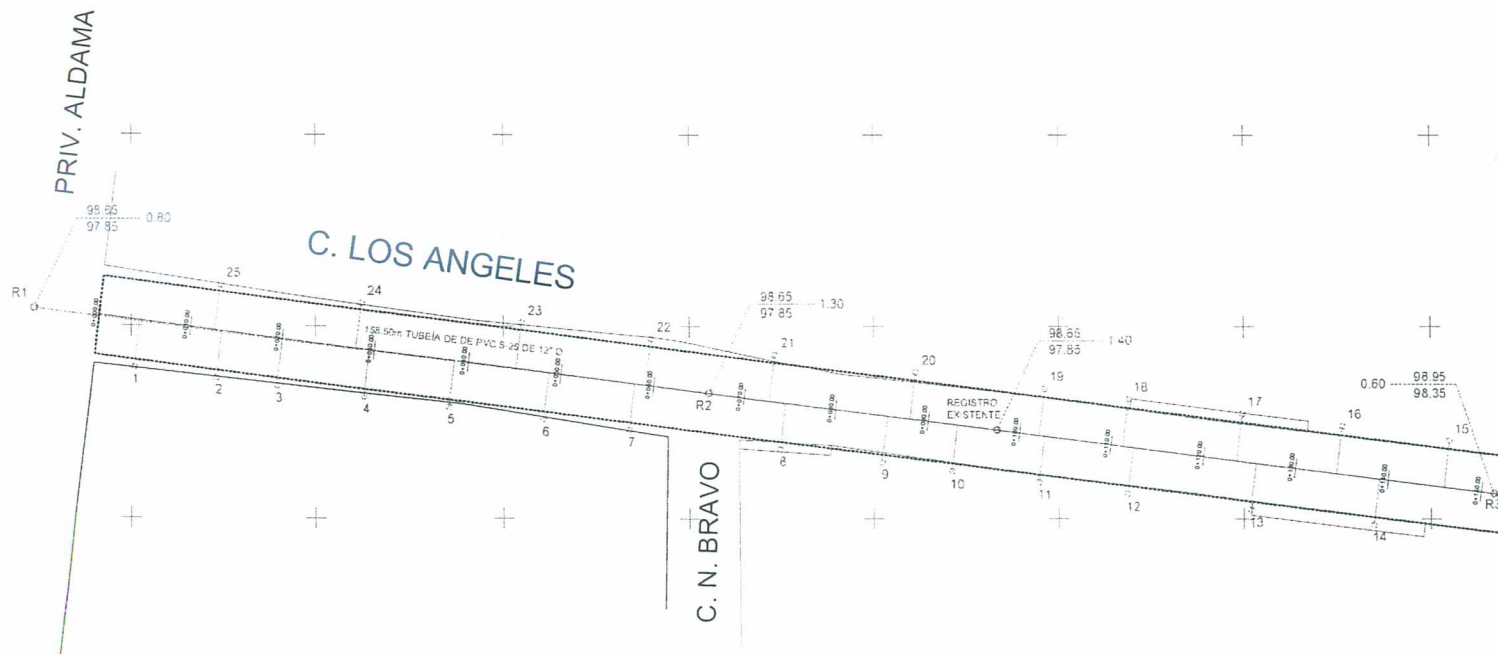

TOTAL ML: 158.50

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 5

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISON



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020 CONCEPTO 6
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FIINQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION

LARGO	ANCHO	ALTO	PZA.	TOTAL
158.50	0.7000	0.4000	1.00	linea 44.38
4.5000	0.7000	0.6000	25.00	descargas 47.25

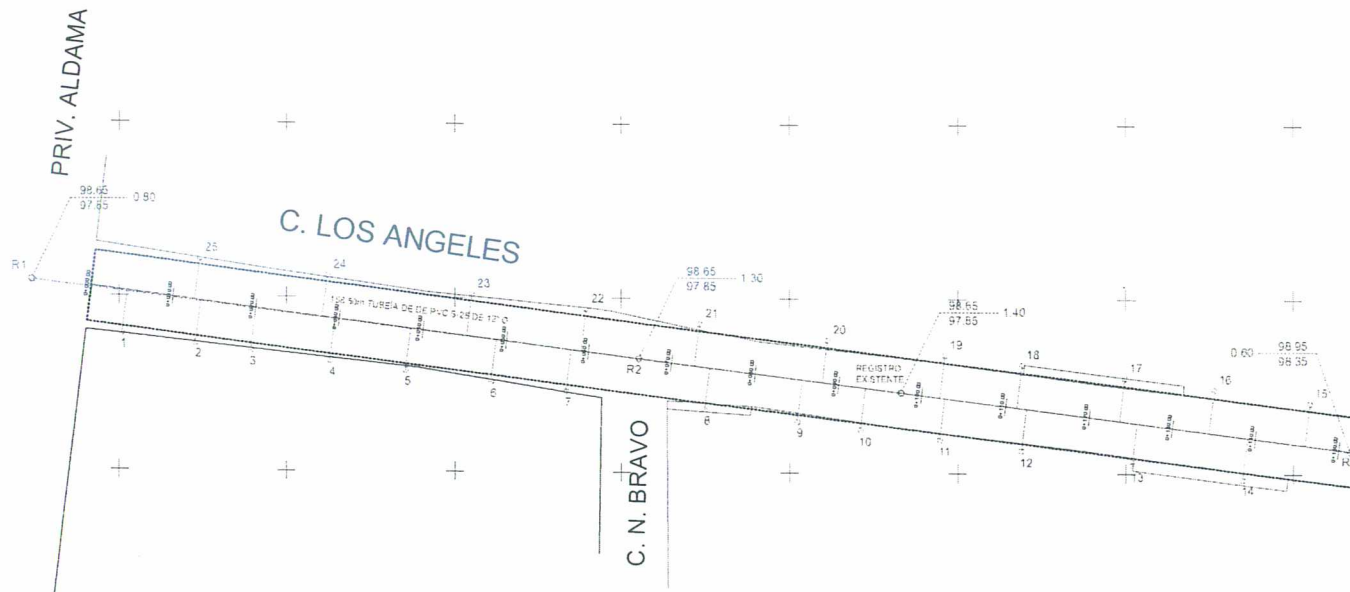

TOTAL M3: 91.63

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020		CONCEPTO 6	
OBRA:	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.		
LOCALIDAD: JOCOTEPEC	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020		ESTIMACIÓN: 1 UNO Y FIINIKUITO
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.			
ARCHIVO FOTOGRAFICO			
CONCEPTO:	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION		
			
ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 7

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FIINQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

LARGO	ANCHO	ALTO	PZA.	TOTAL
158.50			1.00 linea	158.50

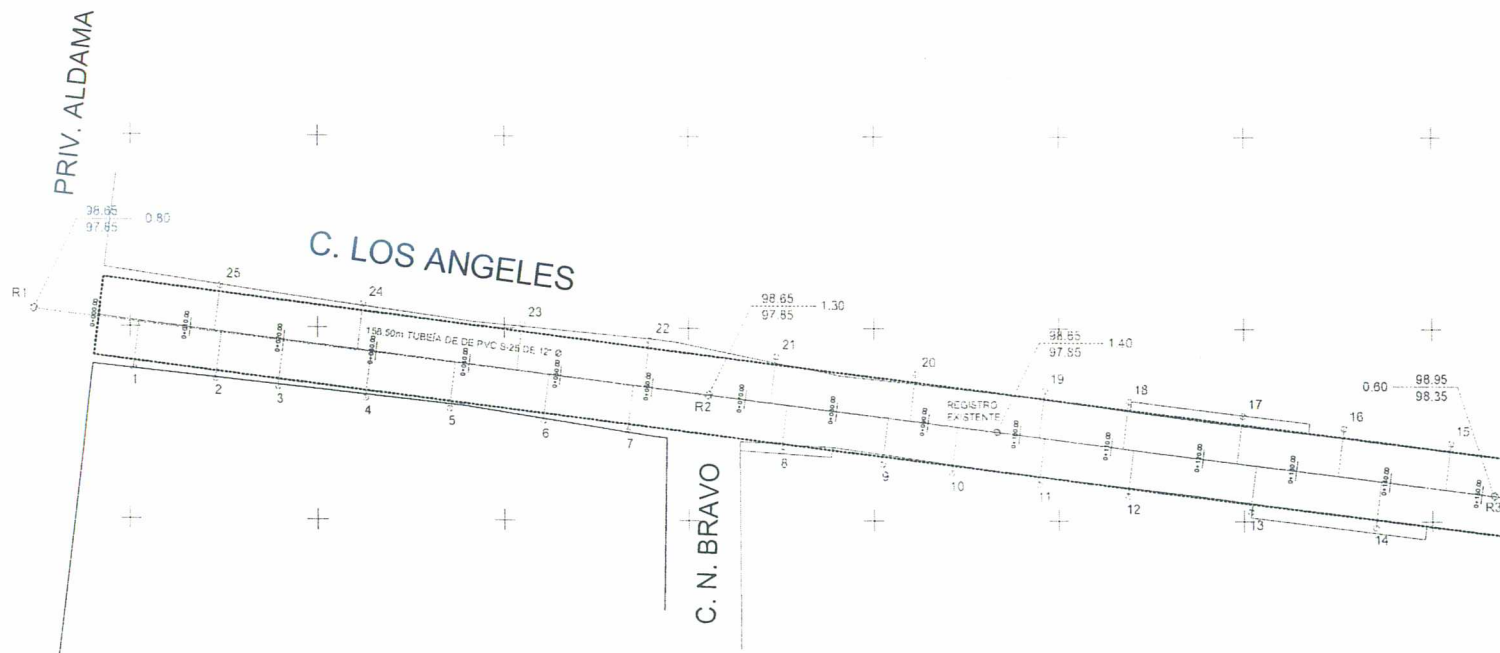

TOTAL ML: 158.50

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 7

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 8

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES


CONCEPTO:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

LARGO ANCHO ALTO PZA. OBSERVAC TOTAL

25.0000

25.00

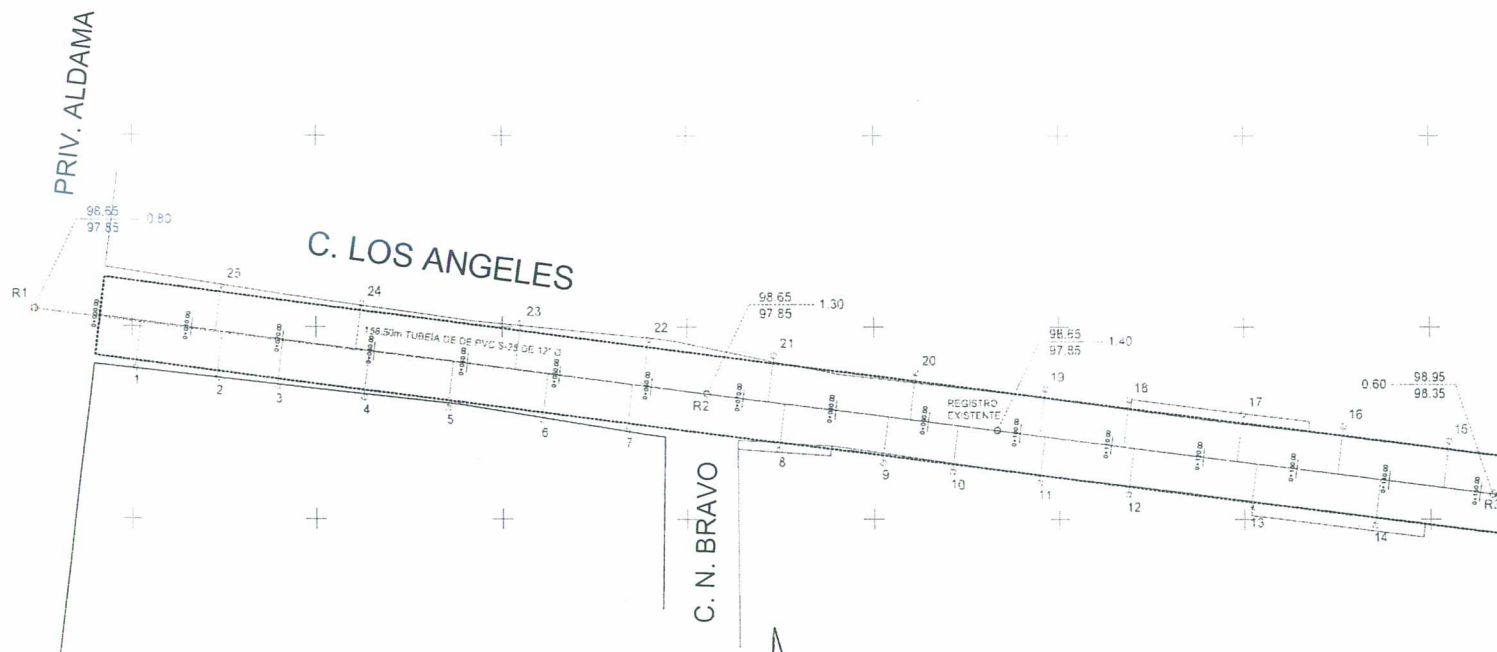

TOTAL PZA: 25.00

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 8

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 9

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES


CONCEPTO: CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

LARGO ANCHO ALTO PZA. OBSERVAC TOTAL

2.0000

2.00

2.00

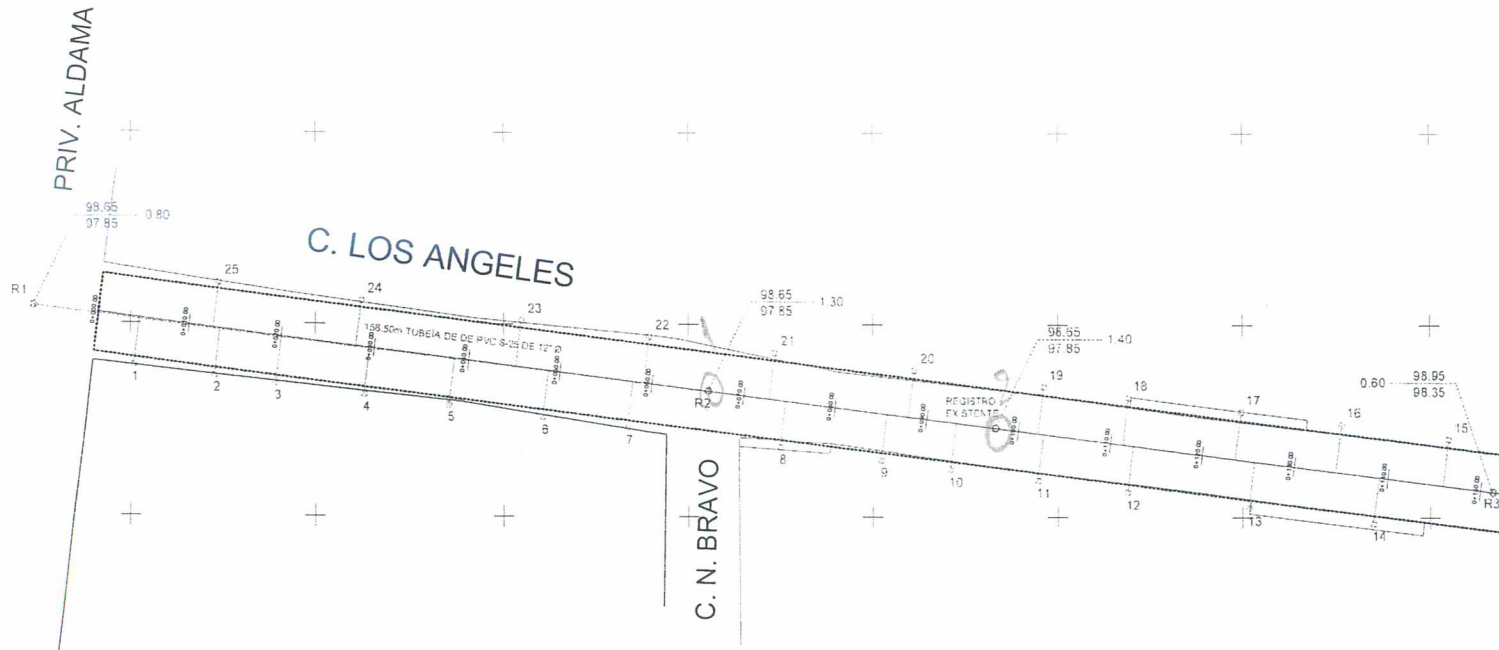

TOTAL PZA: 2.00

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 9

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO: CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 10

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FIINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA

LARGO	ANCHO	ALTO	PZA.	OBSERVAC	TOTAL
			2.0000		2.00
					2.00

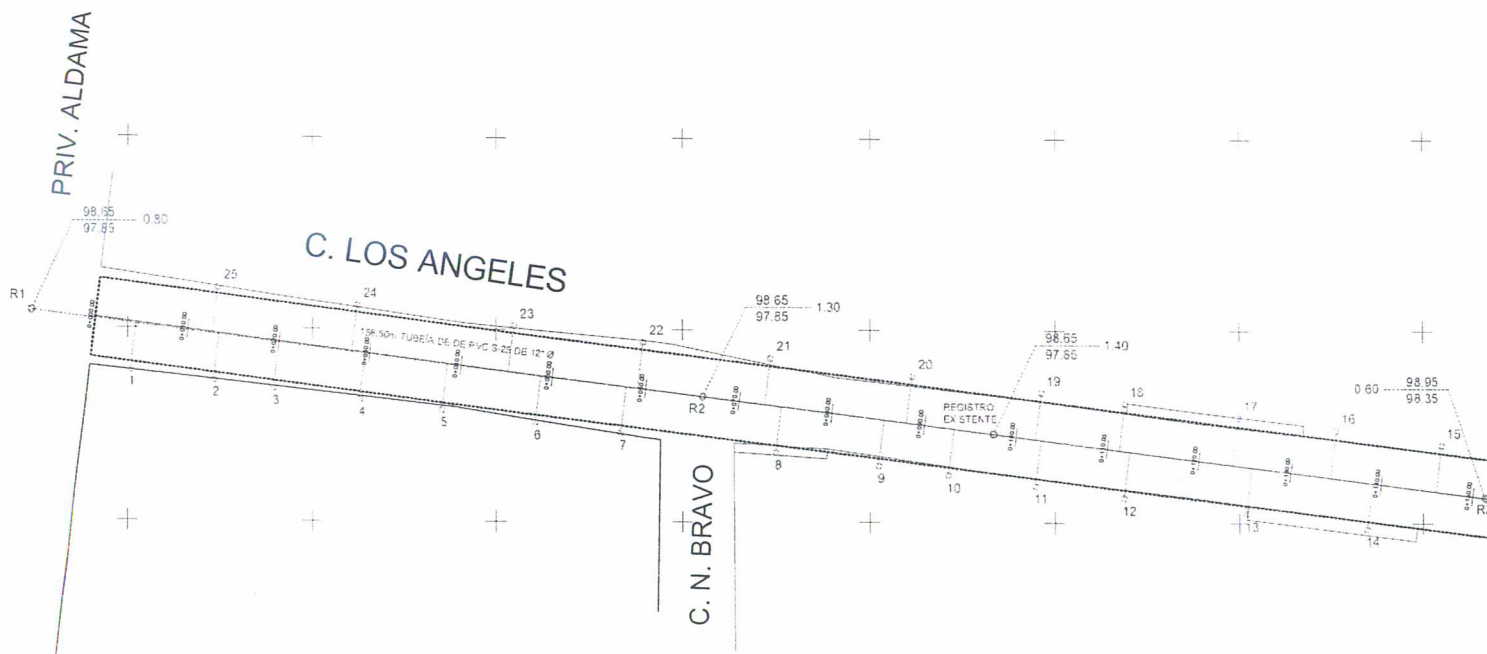

TOTAL PZA: 2.00

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 10

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO: CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 11

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA

LARGO	ANCHO	ALTO	PZA.	OBSERVAC	TOTAL
158.50	2.0000	1.0000			317.00

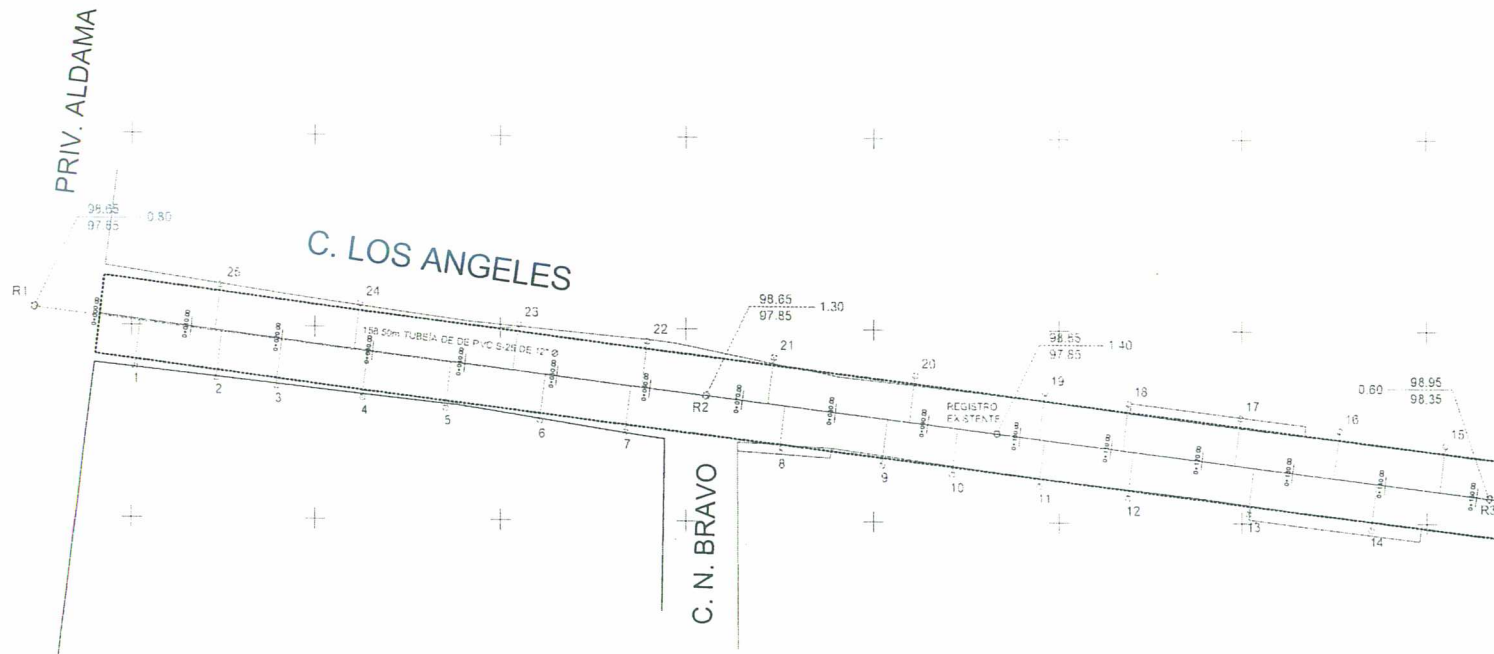



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 11

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA , CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA
