

RFC emisor:

IEO101202HD7

Nombre emisor:

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO SA DE CV

Folio:

152

RFC receptor:

MJJ850101KP8

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

31396972-3A6F-422F-A9C2-73EAD33355E7

No. de serie del CSD:

00001000000404113480

Código postal, fecha y hora de emisión:

45180 2020-09-10 09:35:10

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72101500		1	E48		562857.79	562857.79				
Descripción	ESTIMACIÓN UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRADO NORMAL Y CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE CALLE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA PARTIDA PRESUPUESTAL (6251-2-25.1-050-225) DEL CONTRATO NO. GMJ012C-OP/2020 FAIS RAMO 33/2020 RETENCION 0.005 PARA CONTRALORIA \$ 3,759.08 NETO A PAGAR \$649,155.96				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	562857.79	Tasa	16.0000%	90057.25

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 562,857.79

Impuestos Traslados

IVA 16.0000%

\$ 90,057.25

Total

\$ 652,915.04

Sello digital del CFDI:
fDsO9WL8GluS5MHuP5Dn83aPkjHknAt1xrJuqCoD8OEJgcxUt4A5nP3M8WwmmHLI2AjbCvIbpbqPppgpaKiXqcSqFFOT6LAY83nRsZL5T5XngxnLIJIOG6qYcA125+MgZPry52y0QhagP+WdqWMwudkX2dQoOtofwbukri2KM03CxsGvwAMMCsw02ovTPPVVsisgjl+NO5oXxBk/AO6WGqtwFGsd3GiBfNiQvcxSu12gtwnPov0d93KJpCm9mOteYfEqZVlaJkxEd54cVSt842WlpCPW+RaFtVgseDrINgo7plbNEMYevb7LT8ZeMq8NVEmtZr8OYxEEzU3ZB3WwIA==

Sello digital del SAT:
bIFFtBCZsaSc2l0P35B8uJ2VaUqL3KbqqIaYWO1yVOEyyjP4Mu1Otqmp9zYVKMzDbNuBun31csbLjJS2HMgfhas6Sv/n5l5c3Rm6XTR26Ew6JxVY749+Pd0WscsmD5kpJWF2dbCnekYD0nsF6vofCcIlylIntObi2u1dQ9YzxoVNjIBld0RA5yg1C5buYz/PM2GyTApKAhk6FFtHtNZHC9WIWOdaE09c5Et0ATKYVfv1GOAwBabrSY3Br+fqmygrdlnZm4EG73C8UoU02Vnp8U0hMW+fbmb/Y0Xku8QbChAV8IOEcW/Rzw/axcScL68zQ7FmNB5Bb8WbCWTxdg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|31396972-3A6F-422F-A9C2-73EAD33355E7|2020-09-10T09:45:42|SAT970701NN3|fDsO9WL8GluS5MHuP5Dn83aPkjHknAt1xrJuqCoD8OEJgcxUt4A5nP3M8WwmmHLI2AjbCvIbpbqPppgpaKiXqcSqFFOT6LAY83nRsZL5T5XngxnLIJIOG6qYcA125+MgZPry52y0QhagP+WdqWMwudkX2dQoOtofwbukri2KM03CxsGvwAMMCsw02ovTPPVVsisgjl+NO5oXxBk/AO6WGqtwFGsd3GiBfNiQvcxSu12gtwnPov0d93KJpCm9mOteYfEqZVlaJkxEd54cVSt842WlpCPW+RaFtVgseDrINgo7plbNEMYevb7LT8ZeMq8NVEmtZr8OYxEEzU3ZB3WwIA==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-10 09:45:42
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IEO101202HD7	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31396972-3A6F-422F-A9C2-73EAD33355E7	2020-09-10T09:35:10	2020-09-10T09:45:42	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$652,915.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 012C OP/2020

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO SA. DE CV.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

UBICACIÓN: ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

ESTIMACIÓN No. 1 UNO Y FIINQUITO EMPEDRADO



FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

PERÍODO DE TRABAJO:

DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.		PARTIDAS		IMPORTES	
1	PRELIMINARES			\$	9,601.62
2	EXCAVACIONES			\$	117,269.35
3	CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES			\$	354,937.29
4	SUPERFICIE DE RODAMIENTO			\$	259,357.44
5	COMPLEMENTARIOS			\$	10,649.99
				MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 751,815.69
				MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$ 188,957.90
				SUBTOTAL	\$ 562,857.79
				I. V. A. 16%	\$ 90,057.25
				SUMA	\$ 652,915.04
				MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
				MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 3,759.08
				NETO A PAGAR	\$ 649,155.96
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:	
ASIGNACIÓN		\$ 755,831.590	\$ 120,933.05	\$ 876,764.64	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN		\$ 751,815.69	\$ 120,290.51	\$ 872,106.20	
ACUMULADO ANTERIOR			\$ -	\$ -	
ACUMULADO A LA FECHA		\$ 751,815.69	\$ 120,290.51	\$ 872,106.20	
SALDO POR CANCELAR		\$ 4,015.90	\$ 642.54	\$ 4,658.44	
ANTICIPO					
ANTICIPO 25 %		\$ 188,957.90	\$ 30,233.26	\$ 219,191.16	
AMORTIZACIÓN		\$ 188,957.90	\$ 30,233.26	\$ 219,191.16	
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.			\$ -	\$ -	
AMORTIZACIÓN A LA FECHA		\$ 188,957.90	\$ 30,233.26	\$ 219,191.16	
FALTANTE POR AMORTIZAR		\$ -	\$ -	\$ -	
RESIDENTE DE OBRA				CONTRATISTA	
ING. JOSE LUIS VILLALPÁNDO GARCIA				INEDI SA. DE CV.	
SUPERVISOR DE OBRA				DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ				ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN: ENTRE PRIV. ALDAMA Y CERRADA EN LA CABECERA MPAL. MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
CONTRATISTA: CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO SA DE CV.
FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA																
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE							
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO				
PRELIMINARES																
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	1,240.00	0.0000	1232.25	1,232.25	7.75	\$7.79194	\$	9,662.01	\$	9,601.62	\$	-	\$	60.39
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE PRELIMINARES											\$	9,601.62				
EXCAVACIONES																
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1* KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISCION	M3	682.00	0.0000	677.74	677.74	4.26	\$173.03	\$	118,006.46	\$	117,269.35	\$	-	\$	737.11
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EXCAVACIONES											\$	117,269.35				
CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES																
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISCION	M2	1,240.00	0.0000	1232.25	1,232.25	7.75	\$17.20	\$	21,328.00	\$	21,194.70	\$	-	\$	133.30
4	FORMACION DE SUB-RIASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISCION	M3	248.00	0.0000	246.45	246.45	1.55	\$630.37	\$	156,331.76	\$	155,354.69	\$	-	\$	977.07
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISCION	M3	248.00	0.0000	246.45	246.45	1.55	\$723.83	\$	179,509.84	\$	178,387.90	\$	-	\$	1,121.94
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE BASES Y SUB-BASES											\$	354,937.29				
SUPERFICIE DE RODAMIENTO																
6	EMPEDRADO ECOLOGICO ELABORADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPEATE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	1,052.88	0.0000	1066.50	1,066.50	-13.62	\$150.0902	\$	158,026.97	\$	160,071.20	\$	-	\$	2,044.23
7	FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO MR 42 DE 20CM DE ESPESOR CON A M 15" TERMINADO PULIDO/APALLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	187.13	0.0000	186.00	186.00	1.13	\$533.797	\$	99,889.43	\$	99,286.24	\$	-	\$	603.19
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO											\$	259,357.44				
COMPLEMENTARIOS																
8	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	1,240.00	0.0000	1343.00	1,343.00	-103.00	\$7.93	\$	9,833.20	\$	10,649.99	\$	-	\$	816.79
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS											\$	10,649.99				
TOTAL									\$	752,587.67	\$	737,715.05	\$	-	\$	771.98
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS OROZCO SA. DE CV. CONTRATISTA																
ING. J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ SUPERVISOR DEL MUNICIPIO																
ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS																



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.


FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020 CONCEPTO 1
OBRA: OBRA:CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC ESTIMACIÓN: 1 UNO Y FIINIQUITO
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA

LARGO	ANCHO PROMEDIO	PZA.	TOTAL	OBSERV
155.00	7.9500	1.0000	1232.25	

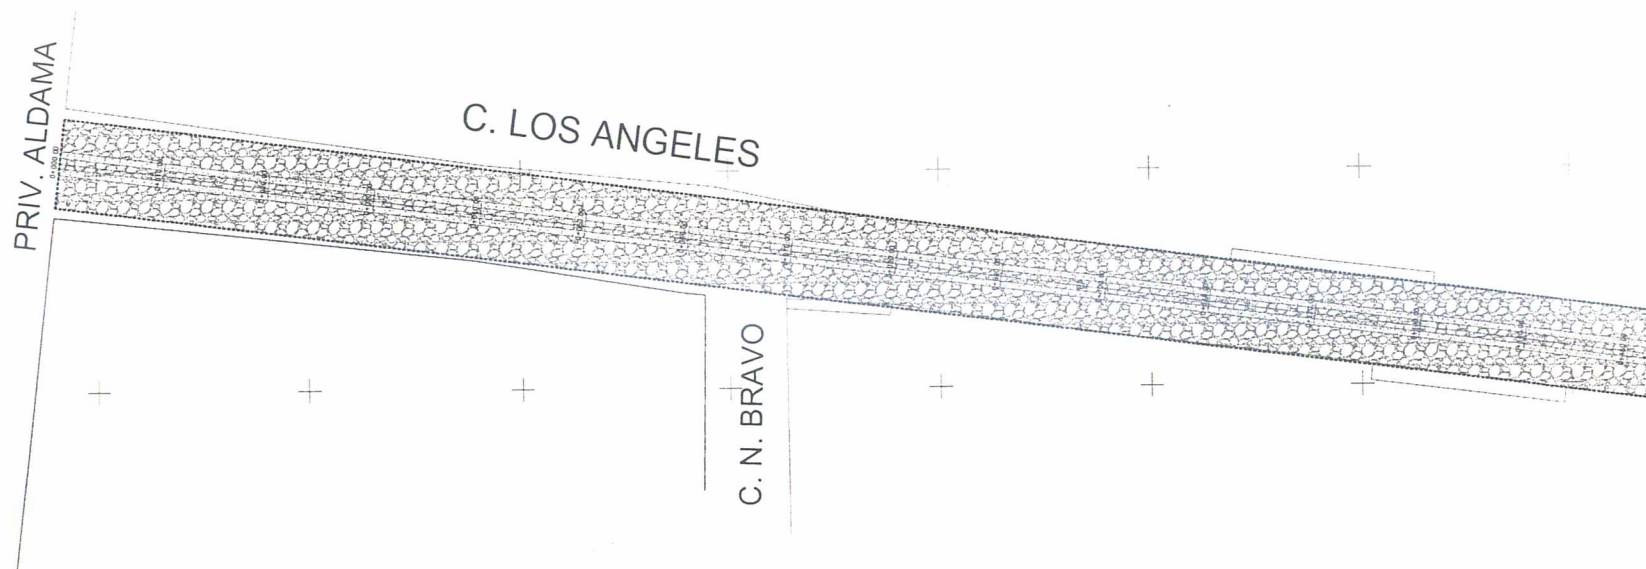

TOTAL M2: 1232.25

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 1

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA

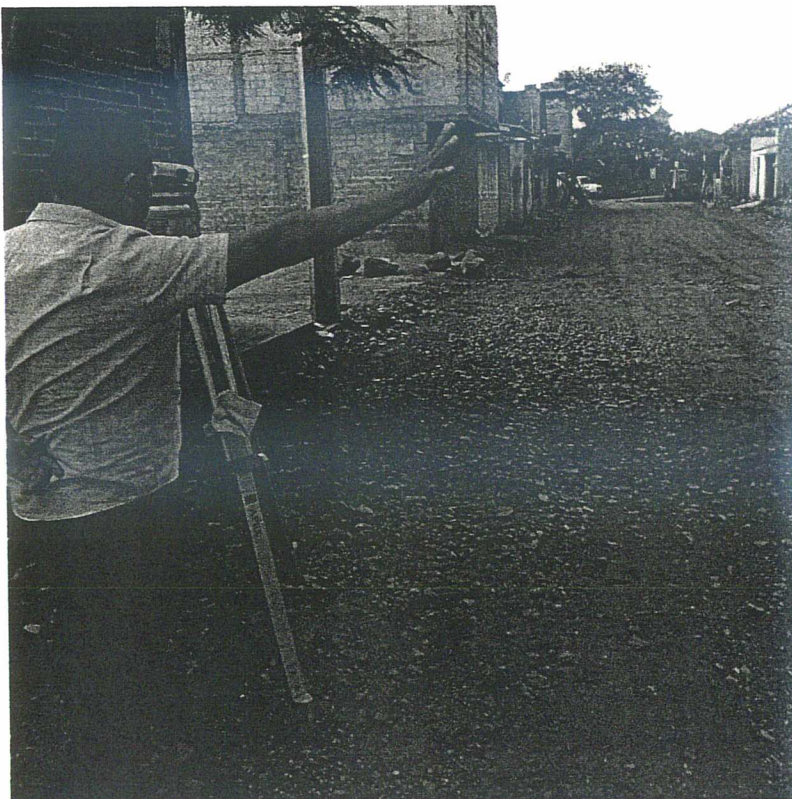

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 2

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVION

LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTO	PZA.	TOTAL
155.00	7.9500	0.5500	1.00	677.74

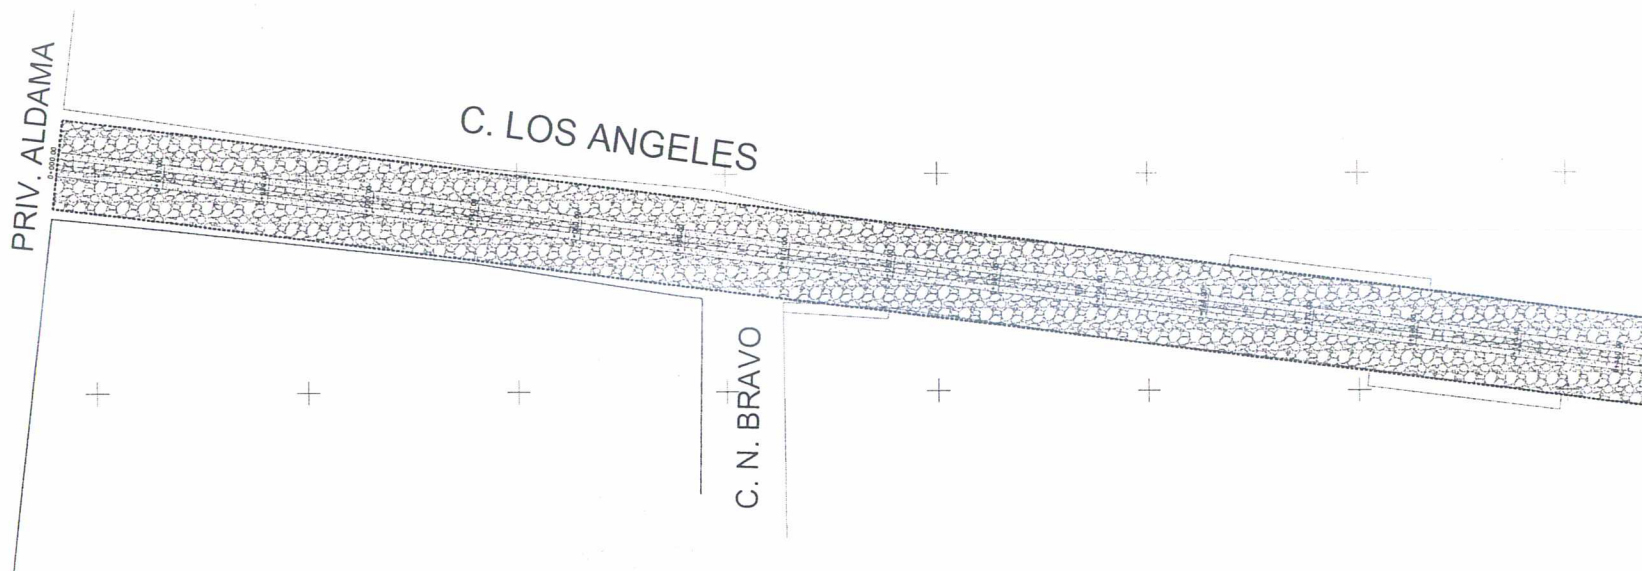

TOTAL M3: 677.74

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 2

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVICION

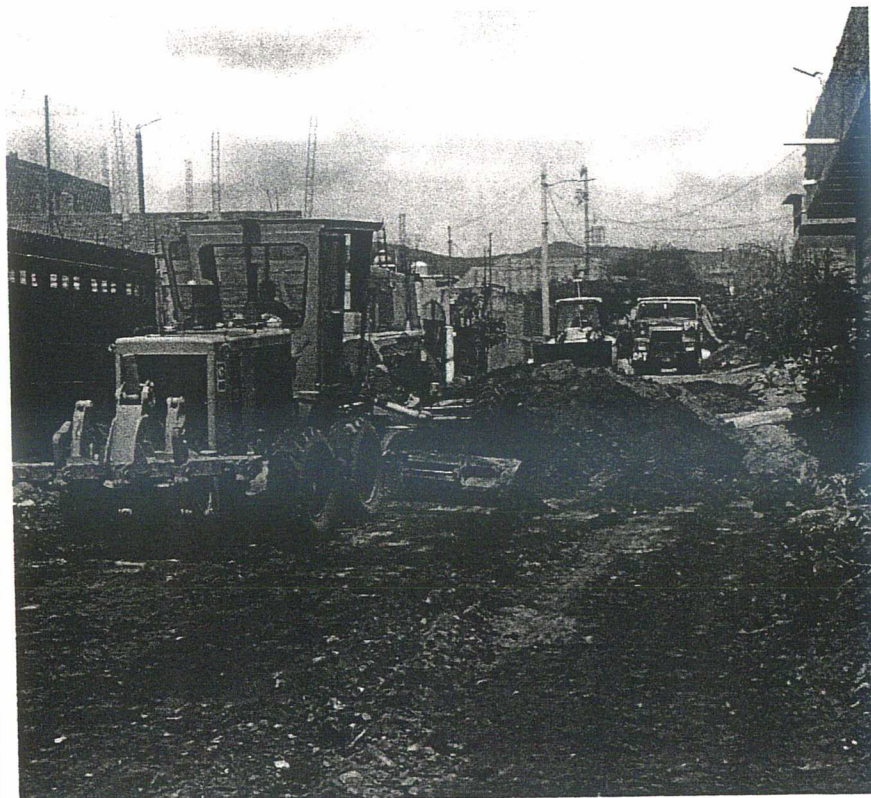

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020		CONCEPTO 3			
OBRA:	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.				
LOCALIDAD: JOCOTEPEC	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020		ESTIMACIÓN: 1 UNO Y FIINQUITO		
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.					
NUMEROS GENERADORES					
CONCEPTO:	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION				
	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTO	PZA.	TOTAL
	155.00	7.9500		1.00	1232.25
					TOTAL M2: 1232.25
ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA			
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA			



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 3

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

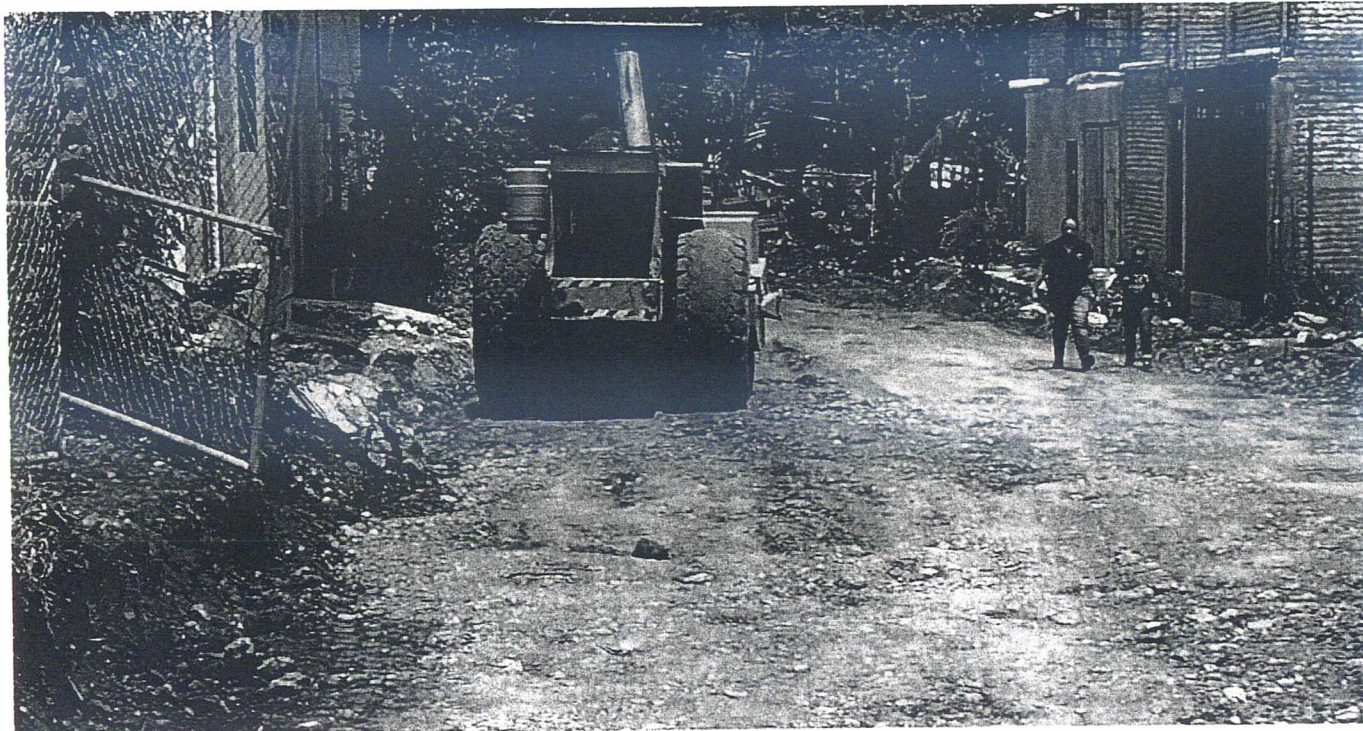

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 4

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FIINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTO	PZA.	TOTAL
155.00	7.9500	0.2000	1.00	246.45

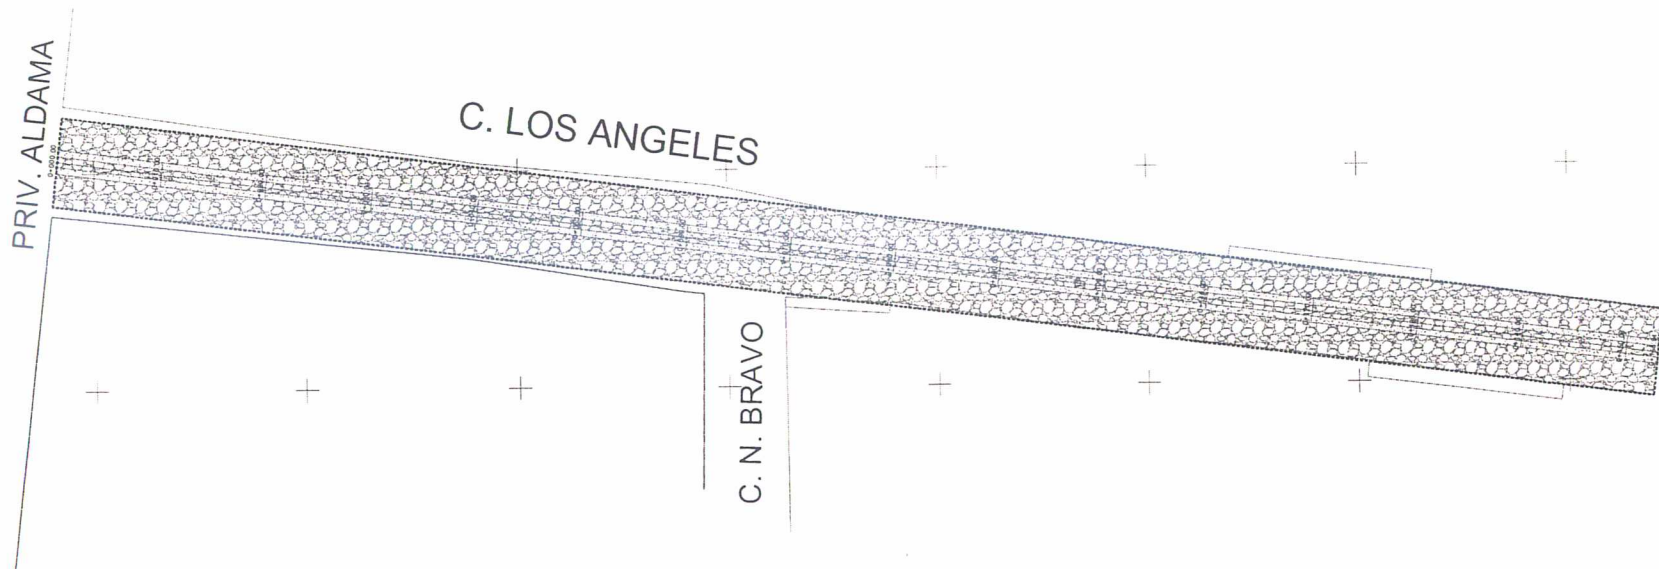

TOTAL M3: 246.45

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 4

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

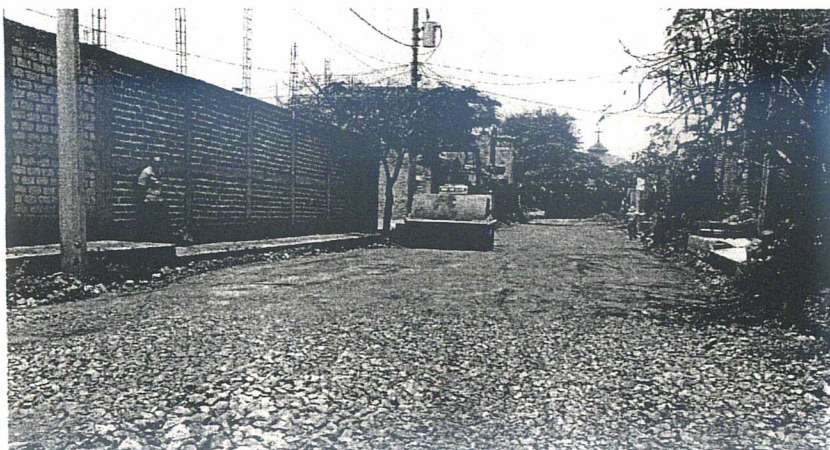

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020 CONCEPTO 5

OBRA: OBRA:CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC ESTIMACIÓN: 1 UNO Y FIINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTO	PZA.	TOTAL
155.00	7.9500	0.2000	1.00	246.45

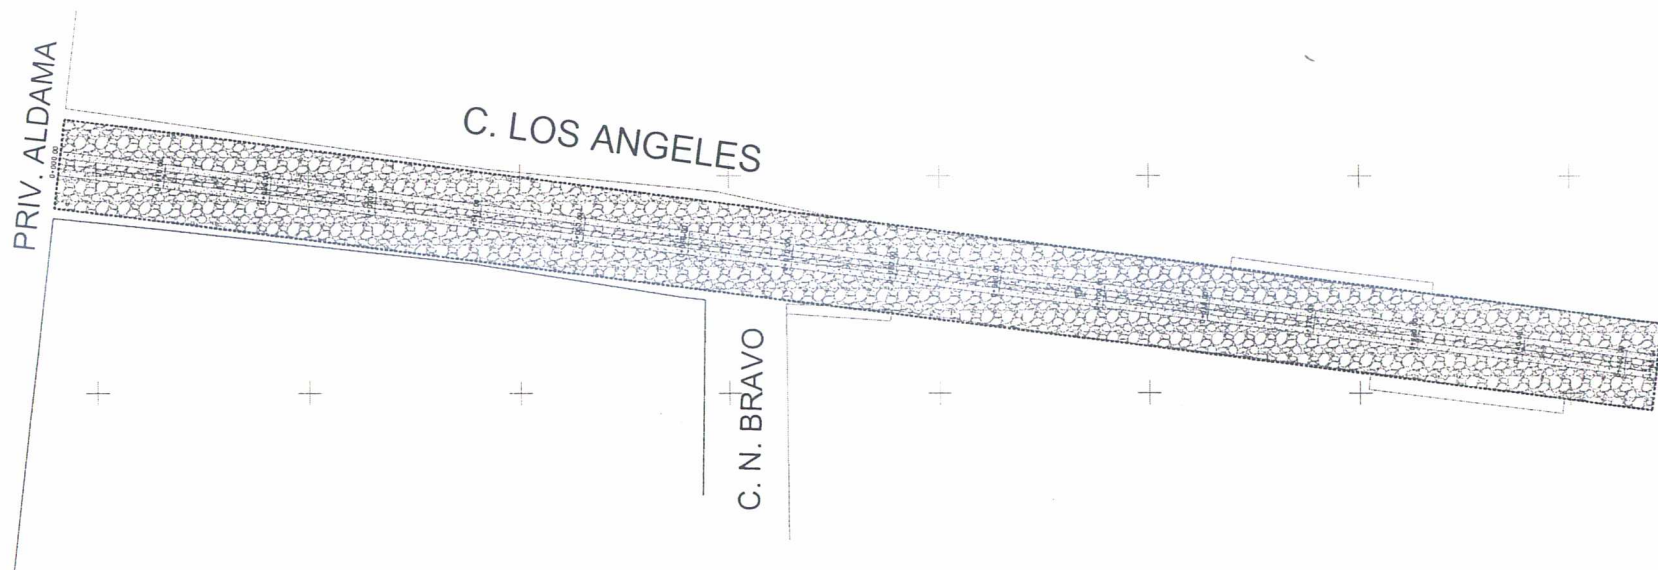

TOTAL M3: 246.45

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 5

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

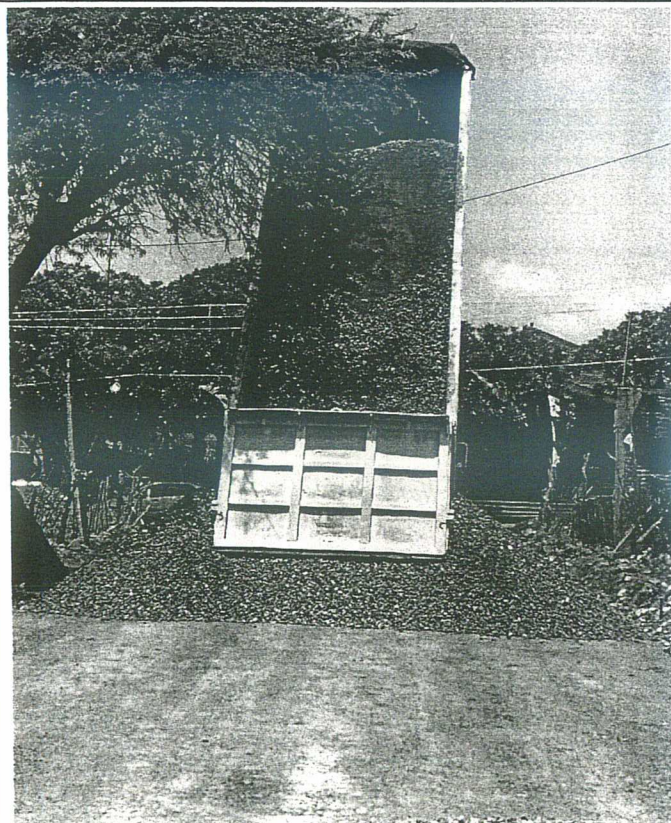

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020 CONCEPTO 6
OBRA: OBRA:CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FIINQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: EMPEDRADO ECOLOGICO ELABORADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION

LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTO	PZA.	TOTAL
158.00	6.7500		1.00	1066.50

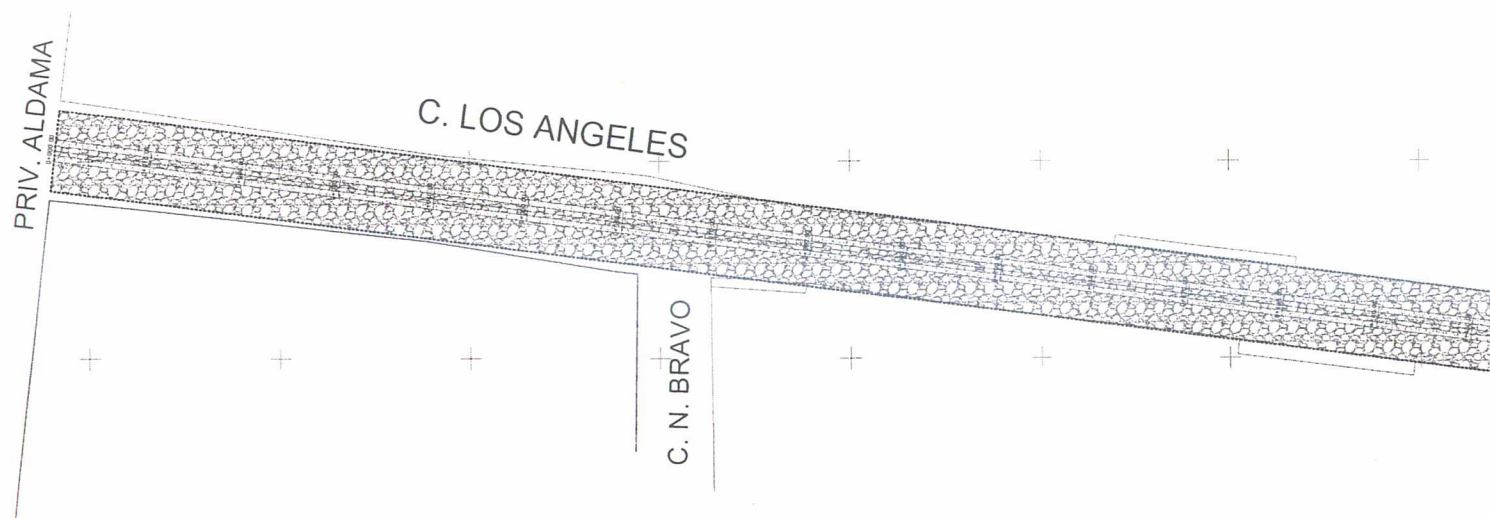

TOTAL M2: 1066.50

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 6

OBRA:

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FIINIKUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

EMPEDRADO ECOLOGICO ELABORADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION

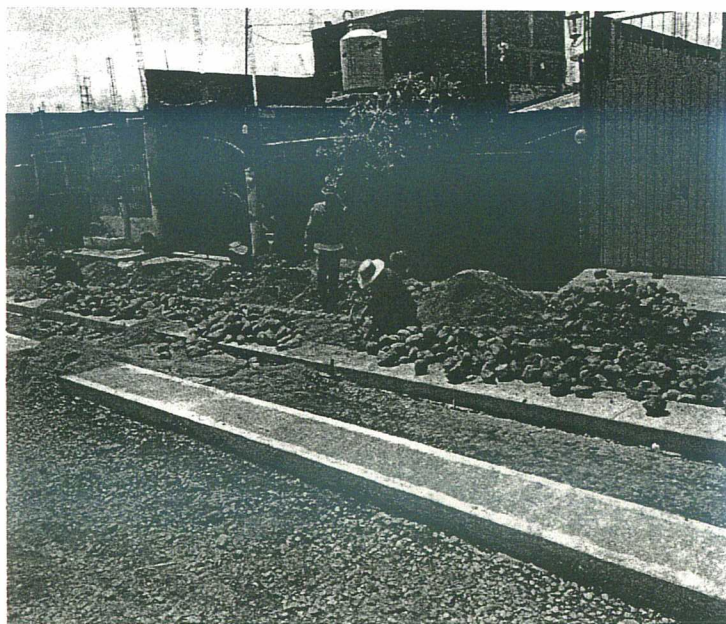

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.


FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020 CONCEPTO 7
OBRA: OBRA:CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC ESTIMACIÓN: 1 UNO Y FIINIKUITO
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO MR 42 DE 20CM DE ESPESOR CON A M 1.5" TERMINADO PULIDO,APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES

LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTO	PZA.	TOTAL
155.00	0.6000		2.00	186.00

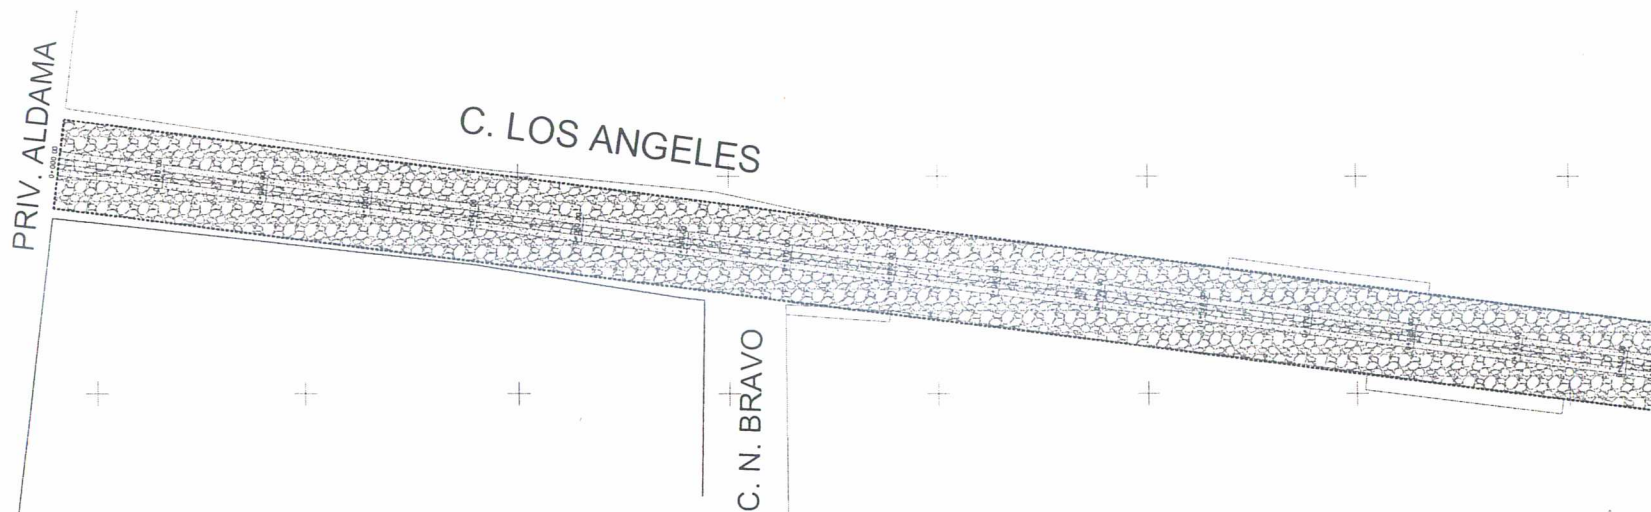

TOTAL M2: 186.00

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 7

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO MR 42 DE 20CM DE ESPESOR CON A M 1.5" TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES

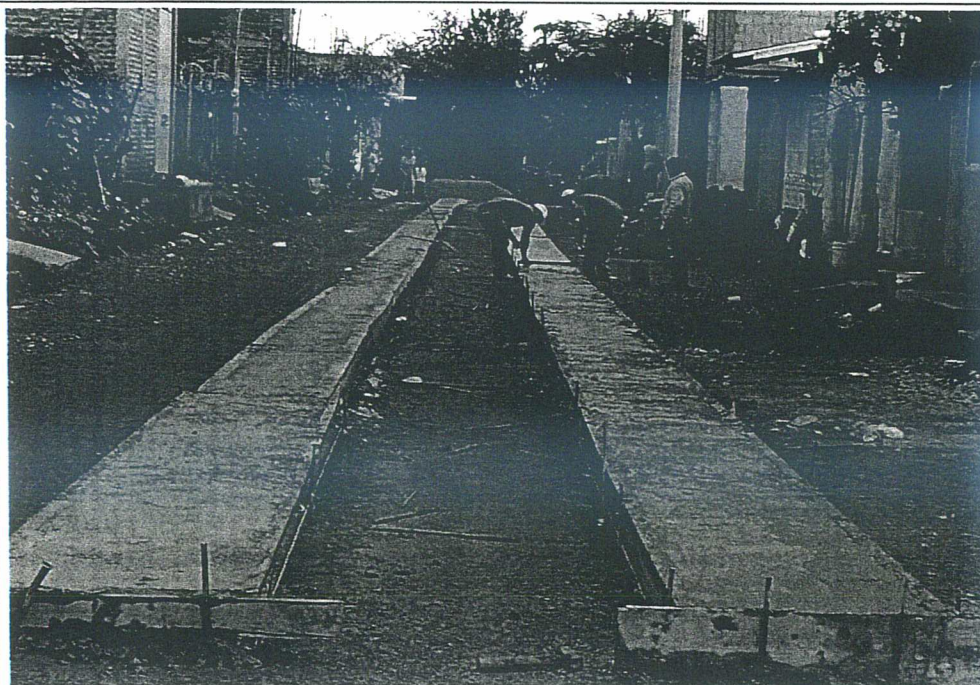

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 8

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: 1 UNO Y
FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA

LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTO	PZA.	OBSERVAC	TOTAL
158.00	8.5000		1.00		1343.00

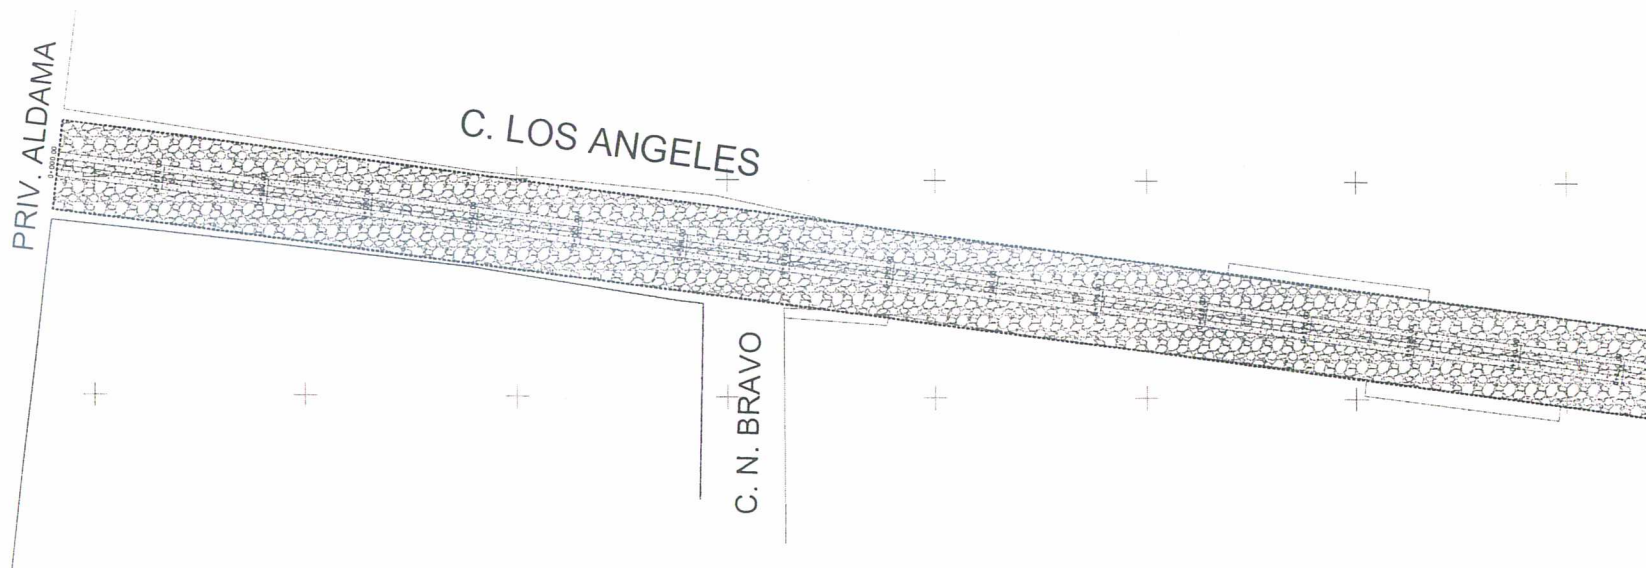

TOTAL M2: 1343.00

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A DE C.V.

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2020

CONCEPTO 8

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN C LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA., CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN: FIINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020

ARCHIVO FOTOGRAFICO

CONCEPTO:

LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

20NC0573523

Clave de R.F.C.

IEO101202HD7

Nombre, Denominación o Razón social

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 22 de julio de 2020, a las 16:26 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||IEO101202HD7|20NC0573523|22-07-2020|P||0000108888800000031||

Sello Digital

MTvAS40E3PGQqXb7qVtqOy7JKK3wk0UibdEXyKzPqovkfQArjfr37KkGQd/n4WxvDut3SG3MYyOjt257u22tkKhkhBv
DTwA5nuw9foXLnflGISQBxUdt1EPicehy8sn/DRtnGE1NG3kYzGZLK3wi1qly1Q0NcZXpDjy1XZXLWU=



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||IEO101202HD7|20NC0573523|22-07-2020|P||0000108888800000031||

Sello Digital

MTvAS40E3PGQqXb7qVtqOy7Jkk3wk0UibdEXyKzPqovkfQArjfr37KkGQd/n4WxvDut3SG3MYyOti257u22tkKkhBv
DTwA5nuw9foXLnflGISQBxUdt1EPlcehy8sn/DRtnGE1NG3kYzGZLK3wi1qIY1Q0NcZXpDjy1XZXLaWU=



GOBIERNO DE
MEXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.
