



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante

Efecto Fiscal

Folio Fiscal

Certificado SAT

Certificado del emisor

Fecha y hora de certificación

Régimen fiscal

Expedición

FACTURA

I Ingreso

D96AD0AD-0E4E-4273-93D8-99A5D8ECC8CC

00001000000404594081

00001000000406736241

2020-11-23T13:17:02

601 General de Ley Personas Morales

44540

Folio/Serie

000539G

Fecha y hora de emisión

2020-11-23T13:17:01

Método de pago

PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

Condiciones de pago

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1.00

Versión de CFDI

3.3



Emisor

DDC050127VD5 DESARROLLO DAP C SA DE CV

MEDELLIN, 117,
COL. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, C.P. 20230
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Expedido en:

ISLA AUSTRALIA, 2636,
COL. BOSQUES DE LA VICTORIA, GUADALAJARA, C.P. 44540
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor

MJJ850101KP8 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL, S/N,
JOCOTEPEC,
JOCOTEPEC, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
72101500	E48	SERV		1.00	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04 F (CUATRO FINIQUITO) DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. PARTIDA PRESUPUESTAL 6251-2-25.1-050-269 DEL CONTRATO NO. GMJ 021C- OP/2020 RETENCIÓN .005 PARA CONTRALORIA \$243.70 NETO A PAGAR \$46,907.90	\$0.00	\$40,647.93	\$40,647.93
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 40647.93	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 6503.67				

Importe con letra *** CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 60/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	6503.67

Subtotal	\$40,647.93
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$6,503.67
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$47,151.60

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT


||1.1|D96AD0AD-0E4E-4273-93D8-99A5D8ECC8CC|2020-11-23T13:17:02|5FE0807172W8|mcS0zDeQZtAGTjhV59C500XwsdbqZdpBfqDU1W/i1aZ2asOZxaz1bh4p0cESZcKZCe2L7RYwS/FNHikiHk+K4gUJ00Ji3KPjOfwxswtoO2Y9CHqQIUjMVPu+8C6Ktm dLyAx9pIpmHUBfmCiwsgehnYp296p/P24QHIGEOyZEjBgbqSwAB0KKnhlsXj5Sf/8asXodUElh29pZrRnPFbmVovLFmMRkb8pFPAhntofLXqBjLwajZckXxUx/hREUWb7ataM34xq84zg54RCfOjCkd0JbuBreVxfCP/KoiEQhMhxq58XjAKXrZJlupg+svLHzxiB9ApcYAsOXO==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

mcS0zDeQZtAGTjhV59C500XwsdbqZdpBfqDU1W/i1aZ2asOZxaz1bh4p0cESZcKZCe2L7RYwS/FNHikiHk+K4gUJ00Ji3KPjOfwxswtoO2Y9CHqQIUjMVPu+8C6Ktm dLyAx9pIpmHUBfmCiwsgehnYp296p/P24QHIGEOyZEjBgbqSwAB0KKnhlsXj5Sf/8asXodUElh29pZrRnPFbmVovLFmMRkb8pFPAhntofLXqBjLwajZckXxUx/hREUWb7ataM34xq84zg54RCfOjCkd0JbuBreVxfCP/KoiEQhMhxq58XjAKXrZJlupg+svLHzxiB9ApcYAsOXO==

Sello Digital del SAT

DVjpyWiAyUNPHHO4iutMc580MUDLyixPo9X9xEPyKuwtXunibDS8qKLoZyO1gjpRgUikvX7oa60Aoda2t1pa2g6MhzjIrxzTsH1jARzw9I6WReY5KTCu74O5PICpBO/OiNd7hvFQeQWpFCOYxQfjhPw obreB8V/dl+2Y5D9Dh8LcrDI9Tu5C+6rXG6mdmMibNGIdFKa2AXF0D87b3Uq9GOCdGAC/nb/cjJHF+NX1XbdqyV+hJfDeVdLfq+xEiCnu4+ZyH7eXWKllmWHfPMFPDfYQd7ZvtqR+1YF2F+/tu/ 9U/dGW0yqeetdWnOc4EUI5ReK5ODXPRPLIA==



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DDC050127VD5	DESARROLLO DAP C SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D96AD0AD-0E4E-4273-93D8-99A5D8ECC8CC	2020-11-23T13:17:01	2020-11-23T13:17:02	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$47,151.60	Ingreso	Cancelado	
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación	 	
Plazo vencido	2020-12-21T12:45:09		

Imprimir

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<cfdi:Comprobante

Sello="mCs0zDeQZtAGTjhVS9C500XwsdbqZdpBfqDU1W/i1aZ2asOZxaz1bh4p0cE
SZcKZCe2L7RYwS/FNHikIHk++K4gUJQOJI3KPjOfwxswtoO2Y9CHqQIUjMVPu
+8C6KtmdLyAx9pIpmHUBFmCiwsgehnYp296p/P24QHilGE0yZEjbBgbquSwAB0
KKnhlsXJ5Sf/8asXodUElh29pzRnPFbmVovLfMmRKbi8pFPAnigtoF1JXgBYLwajz
pcKXxUx/hREUWb7ataM34xq84zg54RCfQjCkd0JbuBreVxfCP/KoiEQhMhxq58Xj
AKXrZJlupg+svLHzxiB9ApcYAsOXQ==" NoCertificado="00001000000406736241"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY3MzYyN
DEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZ
XJ2aWNpbyBkZSBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UE
CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExOD
A2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmllYWQgZGUgGEgS
W5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14
MSYwJAYDVQQJBDB1Bdi4gSGlkYWxnbY3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzMzEOMA
wGA1UEEwFMDYzMDAxZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0
cm10byBGZWRlcmlFMsMRQwEgYDVQQHDAtdDdWFlaHTDqW1vYzEVMBMGGA1U
ELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJs
ZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ
1dGFyaW9zIGFsIENvbnRyaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwNjMwMTU1NjMyWhcN
MjEwNjMwMTU1NjMyWjCBxDEiMCAGA1UEAxMZREVTQVJST0xMTyBEQV
AgQyBTQSBERSBDVjEiMCAGA1UEKRMZREVTQVJST0xMTyBEQVAgQyBTQ
SBERSBDVjEiMCAGA1UEChMZREVTQVJST0xMTyBEQVAgQyBTQSBERSBD
VjEiMCMGA1UELRMcRERDMDUwMTI3VkQ1IC8gTVVNQTYyMDkxNU1EMjE
eMBwGA1UEBRMVIC8gTVVNQTYyMDkxNUhQTfHzUjAzMQ8wDQYDVOQLE
wZ1bmlkYWQwgGyEiMA0GCSqGSIb3DQEBQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC0P
GvCfoq/W1xTd0MR+WSZ5N/Q5I0QSHN+OM3Ew07sWBYwGL/Ktjl8S4gPpK
YCdhLsYbeJGKwOfgKCgab1vJTT/HNmFLLbgI4ARsOCh0BpL2ZsFBSd0U58
C4pEGQR6jeLGnC4nSBdcC6542IJIL/wU+ZjuYTJTfPnTtryzdg4njg5aBgvtM
IVA1NN5DQIRH3JU5Rug8AyZMP6+qZaDLBCQilTHV/tUfu6xSrOWA6d6B
0dXrczUzWGYursHZzggKdbIupf4JFGxynylaQ6CfayG8NTTlqH04tZiR4j
+JT390cW1pr4+FwmMFGErzVAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCM2021
CwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBBCwUAA4ICAQCmfVM3IAIXQENYA
DFAewhx/pgzu3YGghxz5DPHuQbT50BpolMSEFRSSxygbaup1zULzzDY3p4X8Pp
sflIbAWvKysMtFIDA+JyJfVT90ZcR2QjrkYa+VbM5cvyEzGcAoiOxmCmRRX1fyA
AGSZCEeReadEJWwFdxD+OJkOQp7MjZ3ebYnSVYx8FndqB7oyNWnaXlMqKrP
uUhUSP1w4mDNMOmvS/+sk+HMntFedX7mXByQ3CC1SiKI9n3UzJXhfrZCEMPV
zfpGHfU+SiOPG7duT4YKZhUcHp0k1CqO9krTgq0OEFQsLy5YnST+G2WcJ5XRE
7exl/F0ML5Q1wY4g2fFqixbn2qS54TW3kesHHnXluulazKJUPSMnK64IXIWkVmF
CfiEaYd8+4zaWe3cf2KFALC7kWdYfw7Ya0HarLkFN9O2JNSJk0/oNONP7Kj96qK
Lio6mvBqIwUYFeBNcETE3fyqTgYqSmUpvz1f+qRoqrEDeuPxmKEg+s91YAp3EQ
xAKvTVDgXUm7BiXBxAyyrofXr2vpqSft44m6w0zyVdY2A5R2WwilHDNTXVtD5
QVavRFIRxzv3I2ZT+L8i5lenNkKAuuvpk5n4RsMyBkX606nNpTocD1KGiyJou+dm



GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
ESTADO DE JALISCO
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DEL ARCHIVO PUBLICO DEL
AYUNTAMIENTO DE
JALISCO

nBPiN/XQfG8r/3Erp+dQ5fy0yH+ZCLPovODJEOftYYj0uWkWZ0A=="
LugarExpedicion="44540" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I"
Total="47151.60" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="40647.93"
FormaPago="03" Folio="539" Serie="G" Fecha="2020-11-23T13:17:01" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor RegimenFiscal="601"
Nombre="DESARROLLO DAP C SA DE CV"
Rfc="DDC050127VD5"/><cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
JALISCO" Rfc="MJJ850101KP8" UsoCFDI="I01"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto
ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="72101500" Importe="40647.93"
ValorUnitario="40647.93" Descripcion="PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04 F (CUATRO
FINIQUITO) DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL
CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE
PIPILA Y CALLE CERRADA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE
HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. PARTIDA
PRESUPUESTAL 6251-2-25.1-050-269 DEL CONTRATO NO. GMJ 021C- OP/2020
RETENCIÓN .005 PARA CONTRALORIA \$243.70 NETO A PAGAR \$46,907.90"
Unidad="SERV" Cantidad="1.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Importe="6503.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
Base="40647.93"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos
><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6503.67"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Importe="6503.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"
Impuesto="002"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:Complemento
calDigital Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1
xsd"
SelloSAT="DVjpyWiAyUNPHHO4iUtMc580MUDLyixPo9X9xEPyKuW5KLoZyO1gjjpRgUikvx7oa60Aoda2qtJpa2g6MhzjlrxxTsH1jARzw9l6WReY5K405PllCpBO/OiNd7hvFQeQWpFCOYxQfJhPwobreB8V/dl+2Y5D9Dh8LerD19Tu5C
+6rXG6mdmMIbNGldFKa2AXF0D87b3Uq9GOcDGAC/n8d/cJjIHF+NX1XbdqyV+
hJJFDeDvLfq+xEiCNu4+ZyH7eXWKllmWHfpMFPFDrYQDf7ZvtqR+1YF2F+/tu/9
U/dGW0yqeetdWnOc4EUI5ReK5ODXPRPLIA=="
NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
SelloCFD="mCs0zDeQZtAGTjhVS9C5O0XwsdbqZdpBfqDU1W/i1aZ2asOZxaz1bh4
p0cESZcKZCe2L7RYwS/FNHIkIHk++K4gUJQOJI3KPjOfwxswtoO2Y9CHqQIUjM
VPu+8C6KtmdLyAx9plPimHUBFmCiwsgehjnYp296p/P24QHilGE0yZEjbBgbquSw
AB0KKnhIsXJ5Sf/8asXodUElh29pzRnPFbmVovLfMmRKbi8pFPAnigtoF1JXgBYL
wajzpcKXxUx/hREUWb7ataM34xq84zg54RCfQjCkd0JbuBreVxfCP/KoiEQhMhxq5
8XjAKXrZJlupg+svLHzxiB9ApcYAsoXQ==" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
FechaTimbrado="2020-11-23T13:17:02" UUID="D96AD0AD-0E4E-4273-93D8-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

99A5D8ECC8CC"

xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/></cfdi:Complemento></cfdi:
Comprobante>



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JALISCO



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 021-OP/2020 FAIS RAMO 33/2020

CONTRATISTA: DESARROLLO DAPC

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON
HUELLA DE CONCRETO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE
PIPILA Y CALLE CERRADA.

UBICACIÓN: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO.

DESARROLLO DAPC S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 4 F (CUATRO FINIQUITO)

FECHA: 12/10/2020

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 31/08/2020 A 19/09/2020

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS			IMPORTES	
AD1	PRELIMINARES			\$	-
AD2	EXCAVACIONES			\$	-
AD3	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES			\$	-
AD4	SUPERFICIE DE RODAMIENTO			\$	5,082.30
AD5	COMPLEMENTARIOS			\$	43,656.90
				MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 48,739.20
				MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 25%	\$ 8,091.27
				SUBTOTAL	\$ 40,647.93
				I.V.A.	\$ 6,503.67
				SUMA	\$ 47,151.60
				MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
				MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 243.70
				NETO A PAGAR	\$ 46,907.90
				RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
				ING. FERNANDO BURGOS ARELLANO	DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.
				SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
				ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL:
ASIGNACIÓN	\$ 666,853.90	\$ 106,696.62	\$ 773,550.52
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 48,739.20	\$ 7,798.27	\$ 56,537.47
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 617,911.15	\$ 98,865.78	\$ 716,776.93
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 666,650.35	\$ 106,664.06	\$ 773,314.41
SALDO POR EJERCER	\$ 203.55	\$ 32.57	\$ 236.12

ANTICIPO			
ANTICIPO %	\$ 167,135.03	\$ 26,741.60	\$ 193,876.63
AMORTIZACIÓN	\$ 8,091.27	\$ 1,294.60	\$ 9,385.87
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 159,043.76	\$ 25,447.00	\$ 184,490.76
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 167,135.03	\$ 26,741.60	\$ 193,876.63
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN: 4 F (CUATRO FINIQUITO) No. DE CONTRATO: GMJ 021-OP/2020 FAIS RAMO 33/2020
PERÍODO DE TRABAJO:
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO
EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA.
UBICACIÓN: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO
CONTRATISTA: DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.
FECHA: 12/10/2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	
PRELIMINARES													
AD1	A CLAVE1	TRAZO Y NIVELACION DE LA SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSURSO DE LA OBRA.	M2	1022.62	1081.60	0.00	1,081.60	-58.98	13.26	\$ 13,559.94	\$ -	\$ 14,342.02	-\$ 782.08
										SUBTOTAL	\$ -		
EXCAVACIONES													
AD2	CLAVE 2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL DEL 1ER KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION MAQUINARIA Y SUPERVICION.	M3	562.44	432.64	0.00	432.64	129.80	59.98	\$ 33,735.15	\$ -	\$ 25,949.75	\$ 7,785.40
										SUBTOTAL	\$ -		
CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASE													
AD3	CLAVE 3	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	1022.62	1081.60	0.00				54,413.61	\$ -	\$ 57,551.94	-\$ 3,138.33
AD3	CLAVE 4	FORMACION DE SUB RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE:MATERIAL,MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	204.52	135.20	0.00				88,669.65	\$ -	\$ 58,615.96	\$ 30,053.69
AD3	CLAVE 5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4 A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INCLUYE:MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	204.62	0.00	0.00				102,015.35	\$ -	\$ -	\$ 102,015.35
										SUBTOTAL	\$ -		
SUPERFICIE DE RODAMIENTO													
AD4	CLAVE 6	EMPEDRADO ECOLOGICO ELABORADO CON PIEDRA BOLA Y TETATE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	816.46	794.30	0.00	794.30	22.16	230.00	\$ 187,785.80	\$ -	\$ 182,689.00	\$ 5,096.80
AD4	CLAVE 7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30 CM INCLUYE: MATERIALES,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCCION	ML	343.60	293.47	9.00	302.47	41.13	160.00	\$ 54,976.00	\$ 1,440.00	\$ 48,395.20	\$ 6,580.80
	CLAVE 8	FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO MR 42 DE 20 CM DE ESPESOR CON A M 1.5 TERMINADO PULIDO,APAULLADO O ESCOBILLADO INCLUYE:MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	206.16	0.00	0.00	0.00	206.16	533.16	\$ 109,916.27	\$ -	\$ -	\$ 109,916.27

DEARROLLO DAP C
CONTRATISTA

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN: 4 F (CUATRO FINIQUITO) No. DE CONTRATO: GMJ 021-OP/2020 FAIS RAMO 33/2020

PERÍODO DE TRABAJO:

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO
EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA.

UBICACIÓN: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO

CONTRATISTA: DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.

FECHA: 12/10/2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO

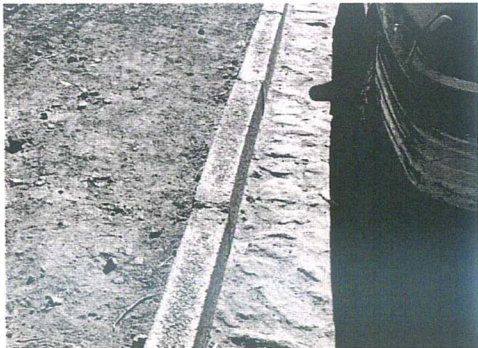


AD5	CLAVE 9	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	1022.62	1081.60	171.00	1,252.60	-229.98	21.30	\$ 21,781.81	\$ 3,642.30	\$ 26,680.38	-\$ 4,898.57
AD3	CLAVE 10	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4 A FINOS COMPACTADA AL 95% PROCTOR CON CEMENTO GRIS A RAZON DE 1M3/SACO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	0.00	135.20	0.00	135.20	-135.20	717.39	\$ -	\$ 96,991.13	-\$ 96,991.13	
	CLAVE 11	FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO MR 42 DE 0.15 CM DE ESPESOR CON A.M. 1.5" A 7 DIAS, TERMINAO PULIDO, APAULLADO O ESCOBILLADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	M2	0.00	219.70	0.00	219.70			\$ -	\$ 109,388.63	-\$ 109,388.63	
	CLAVE 12	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE:MATERIALES DE REPARACION,CONECTORES,ABRAZADERAS SIN FIN,TRABAJO TERMINADO	PZA	0.00	7.00	0.00	7.00			\$ -	\$ 541.80	-\$ 541.80	
		COMPLEMENTARIOS									5,082.30		
	CLAVE 13	RENIVELACION DE POZO DE VISITA,INCLUYE MURO DE BLOCK,ENJARRE CON MORTERO CEMENTO 1:3,COLADO DE LOSA Y CIMBRADO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	-1.00	1847.66	\$ -	\$ -	\$ 1,847.66	-\$ 1,847.66
	CLAVE 14	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE DE 20.0 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO Y FABRICACION DE BANQUETA UTILIZANDO CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 0.10 CM DE ESPESOR CON A M 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.	M2	0.00	0.00	1.8625	1.86	-1.86	133.45	\$ -	\$ 248.55	\$ 248.22	-\$ 248.22
	CLAVE 15		M2	0.00	0.00	171.00	171.00	-171.00	253.85	\$ -	\$ 43,408.35	\$ 43,408.35	-\$ 43,408.35
		SUBTOTAL ESTA ESTIMACION								SUBTOTAL	\$ 43,656.90		
									TOTAL	\$ 666,853.90	\$ 48,739.20	\$ 666,401.82	\$ 203.54

DEARROLLO DAP C
CONTRATISTA

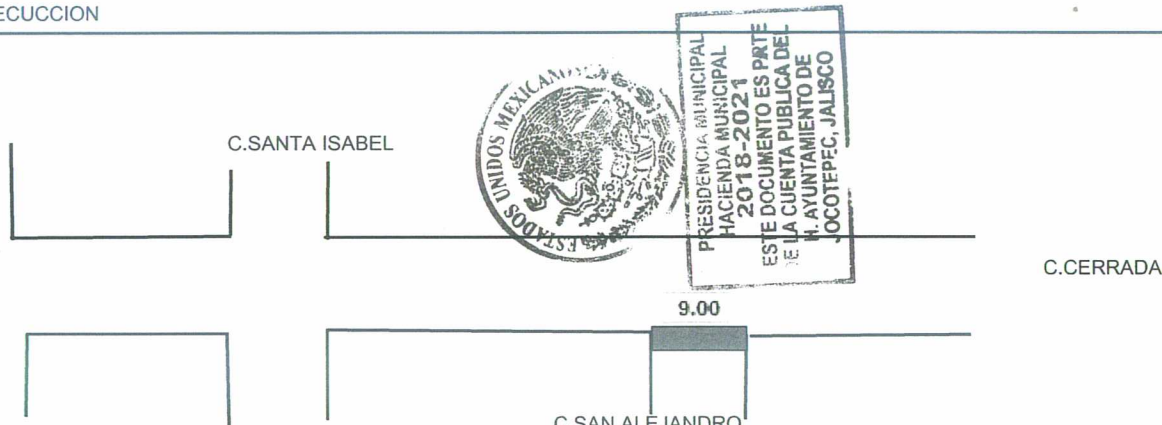
ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

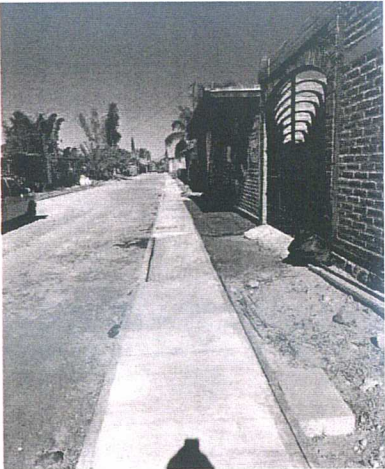
DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.

FECHA: 12/10/2020		HOJA 07/07
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA.		
LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACIÓN: 4 F DEL 31/08/2020 A 19/09/2020
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.		
NUMEROS GENERADORES		
CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30 CM INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION		
C. PIPILA A C. CERRADA	LARGO 9.00	ANCHO ALTURA PZA. TOTAL 9.00
		
		TOTAL ML: 9.00
ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ  SUPERVISOR DE OBRA	ING. FERNANDO BURGOS ARELLANO  RESIDENTE DE OBRA

DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.

FECHA: 12/10/2020		HOJA 07/07
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA.		
LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACIÓN: 4 F
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.		DEL 31/08/2020 A 19/09/2020
NUMEROS GENERADORES		
CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30 CM INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION		
		
ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. FERNANDO BURGOS ARELLANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

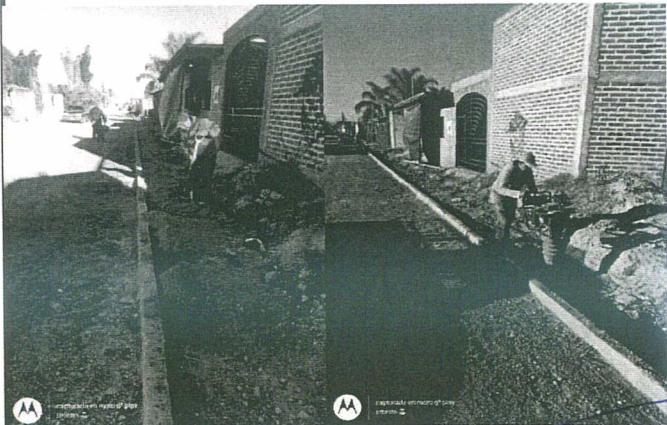
DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.

FECHA: 12/10/2020		HOJA 07/07																																										
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA.																																												
LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACIÓN: 4 F																																										
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.		DEL 31/08/2020 A 19/09/2020																																										
NUMEROS GENERADORES																																												
CONCEPTO: LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA																																												
 C. PIPILA A C. CERRADA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>PZA.</th> <th>JARDINERA</th> <th>AREA JAR</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.60</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>0.20</td> <td>-0.80</td> <td>35.80</td> </tr> <tr> <td>8.20</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.20</td> </tr> <tr> <td>43.47</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>43.47</td> </tr> <tr> <td>24.75</td> <td>1.31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32.42</td> </tr> <tr> <td>31.20</td> <td>1.13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35.26</td> </tr> <tr> <td>16.40</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.40</td> </tr> </tbody> </table>	LARGO	ANCHO	PZA.	JARDINERA	AREA JAR	TOTAL	36.60	1.00	4.00	0.20	-0.80	35.80	8.20	1.00				8.20	43.47	1.00				43.47	24.75	1.31				32.42	31.20	1.13				35.26	16.40	1.00				16.40	
LARGO	ANCHO	PZA.	JARDINERA	AREA JAR	TOTAL																																							
36.60	1.00	4.00	0.20	-0.80	35.80																																							
8.20	1.00				8.20																																							
43.47	1.00				43.47																																							
24.75	1.31				32.42																																							
31.20	1.13				35.26																																							
16.40	1.00				16.40																																							
TOTAL M2:		171.55																																										
PARA EFECTOS DE EST 4		171.00																																										
ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. FERNANDO BURGOS ARELLANO																																										
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA																																										

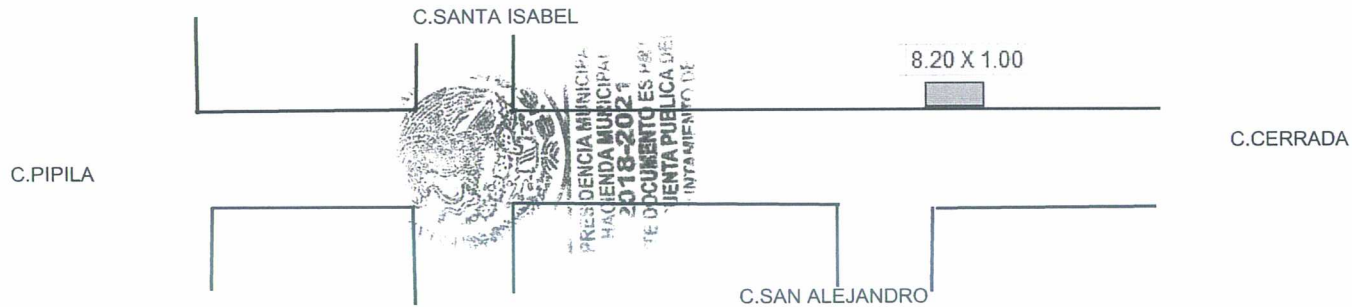


DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.


FECHA: 12/10/2020		HOJA 07/07
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA.		
LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO	ESTIMACIÓN: 4 F	
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCION DEL 31/08/2020 A 19/09/2020	
NUMEROS GENERADORES		
CONCEPTO: LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA		
		
C.PIPILA	C.SANTA ISABEL	C.CERRADA
16.40 X 1.00	31.20 X 1.13 24.75 X 1.31 43.47 X 1.00 8.20 X 1.00 36.60 X 1.00	
	C.SAN ALEJANDRO	
ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. FERNANDO BURGOS ARELLANO RESIDENTE DE OBRA

DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.

FECHA: 12/10/2020		HOJA 07/07
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA.		
LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACIÓN: 4 F
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.		DEL 31/08/2020 A 19/09/2020
NUMEROS GENERADORES		
CONCEPTO: SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE DE 20.0 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO Y SUPERVISIÓN.		
C. PIPILA A C. CERRADA	LARGO	ANCHO
8.20	1.00	0.3
2.46		
		
 		
TOTAL M2:		2.46
PARA EFECTOS DE EST 4		1.8625
ING. HECTOR JESUS NERNANDEZ	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. FERNANDO BURGOS ARELLANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.

FECHA: 12/10/2020		HOJA 07/07
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA.		
LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACIÓN: 4 F
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.		DEL 31/08/2020 A 19/09/2020
NUMEROS GENERADORES		
CONCEPTO: SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE DE 20.0 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO Y SUPERVISIÓN.		
		
ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ  SUPERVISOR DE OBRA	ING. FERNANDO BURGOS ARELLANO RESIDENTE DE OBRA



DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.

FECHA: 12/10/2020		HOJA 07/07																																										
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA.																																												
LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACIÓN: 4 F																																										
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.		DEL 31/08/2020 A 19/09/2020																																										
NUMEROS GENERADORES																																												
CONCEPTO: FABRICACIÓN DE BANQUETA UTILIZANDO CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 0.10 CM DE ESPESOR CON A M 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.																																												
C. PIPILA A C. CERRADA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>LARGO</th> <th>ANCHO</th> <th>PZA.</th> <th>JARDINERA</th> <th>AREA JAR</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.60</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>0.20</td> <td>-0.80</td> <td>35.80</td> </tr> <tr> <td>8.20</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.20</td> </tr> <tr> <td>43.47</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>43.47</td> </tr> <tr> <td>24.75</td> <td>1.31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32.42</td> </tr> <tr> <td>31.20</td> <td>1.13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35.26</td> </tr> <tr> <td>16.40</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.40</td> </tr> </tbody> </table>	LARGO	ANCHO	PZA.	JARDINERA	AREA JAR	TOTAL	36.60	1.00	4.00	0.20	-0.80	35.80	8.20	1.00				8.20	43.47	1.00				43.47	24.75	1.31				32.42	31.20	1.13				35.26	16.40	1.00				16.40	
LARGO	ANCHO	PZA.	JARDINERA	AREA JAR	TOTAL																																							
36.60	1.00	4.00	0.20	-0.80	35.80																																							
8.20	1.00				8.20																																							
43.47	1.00				43.47																																							
24.75	1.31				32.42																																							
31.20	1.13				35.26																																							
16.40	1.00				16.40																																							
																																												
		TOTAL M2: 171.55																																										
		PARA EFECTOS DE EST 4 171.00																																										
ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	ING. FERNANDO BURGOS ARELLANO																																										
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA																																										

DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.

FECHA: 12/10/2020		HOJA 07/07
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA.		
LOCALIDAD: ZAPOTITAN DE HIDALGO, JALISCO	ESTIMACIÓN: 4 F	
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCION	DEL 31/08/2020 A 19/09/2020
NUMEROS GENERADORES		
CONCEPTO: FABRICACIÓN DE BANQUETA UTILIZANDO CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 0.10 CM DE ESPESOR CON A M 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.		
The diagram shows a plan view of the sidewalk layout. It includes the following dimensions and street names: C. SANTA ISABEL (top horizontal section): 31.20 X 1.13, 24.75 X 1.31, 43.47 X 1.00, 8.20 X 1.00, 36.60 X 1.00 C. PIPILA (left vertical section): 16.40 X 1.00 C. CERRADA (right vertical section) C. SAN ALEJANDRO (bottom horizontal section)		
 ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ	 ARQ. JAIME CONDE GOMEZ	 ING. FERNANDO BURGOS ARELLANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
2018-2021
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE JALISCO
