




\$4,000,000.00

	Contractual	programado		
Plazo de ejecucion	61 días	96 días	Avance programado	85%
Inicio	15/02/2021	01/05/2021	Avance real	87%
Termino	17/04/2021	05/08/2021	Fecha del reporte	22/07/2021

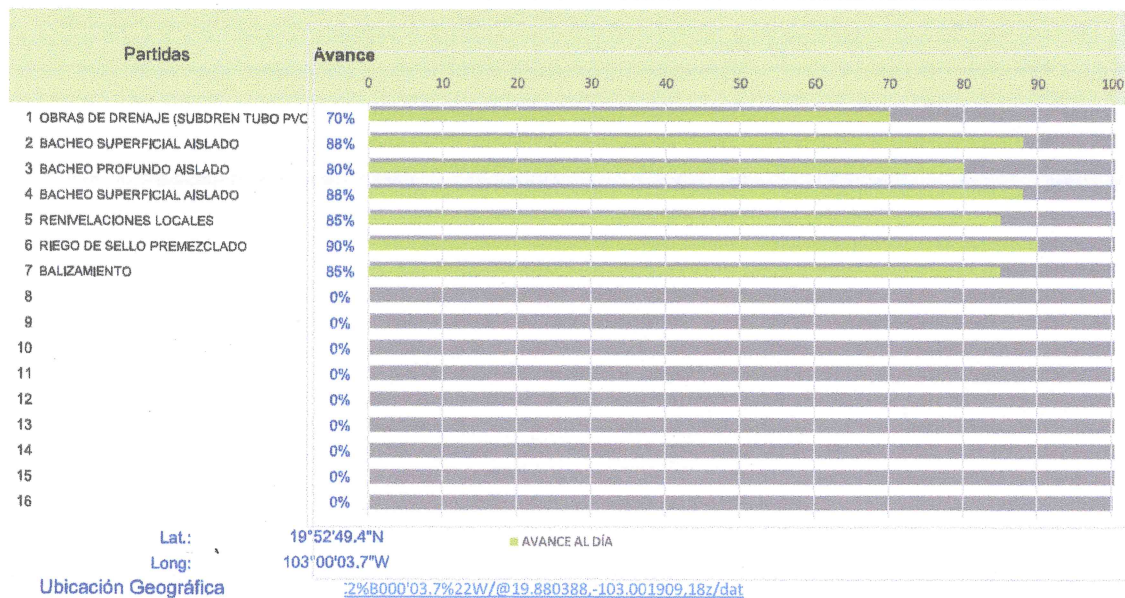

Se realizan los siguientes trabajos.

- Pintura en machuelos y camellon de ingreso.
- Colado de vados y tubos de 4" para desagüe de vialidad.
- Barrido y retiro de material de sello suelto.



Dirección General de Construcción.

REHABILITACION DEL INGRESO A ZAPOTITAN DE HIDALGO DE LA CARRETERA
FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

EMPRESA
CONTACTO
CONTRATO
IMPORTE

JOCOTEPEC, JALISCO.
LIC. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ.

\$4,000,000.00

	Contractual	programado		
Plazo de ejecucion	61 días	96 días	Avance programado	94%
Inicio	15/02/2021	01/05/2021	Avance real	87%
Termino	17/04/2021	05/08/2021	Fecha del reporte	30/07/2021

Partidas	Avance										
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
1 OBRAS DE DRENAJE (SUBDREN TUBO PVC	90%										
2 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO	88%										
3 BACHEO PROFUNDO AISLADO	80%										
4 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO	88%										
5 RENVELACIONES LOCALES	85%										
6 RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO	90%										
7 BALIZAMIENTO	85%										
8	0%										
9	0%										
10	0%										
11	0%										
12	0%										
13	0%										
14	0%										
15	0%										
16	0%										

Lat.: 19°52'49.4"N
Long: 103°00'03.7"W



Ubicación Geográfica

AVANCE AL DÍA
2%B000'03.7%22W/@19.880388,-103.001909,18z/dat

Observaciones

Se realizan los siguientes trabajos.

- Colocacion de lona informativa de obra en construccion.
- Detalles de pintura en machuelos existentes por apertura de drenes.
- Se continua en colado de vados y tubos de 4" para desague de vialidad.
- Barrido y retiro de material suelto.

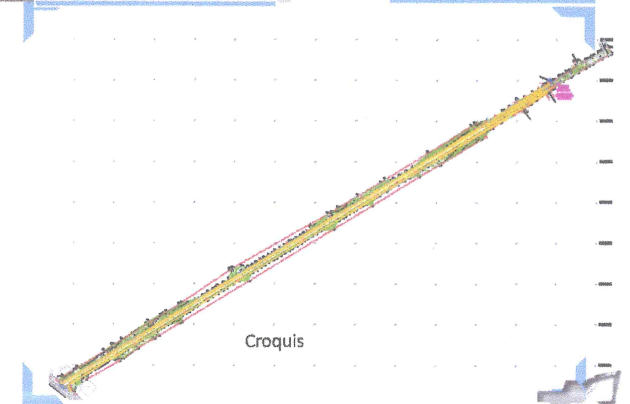

Dirección General de Construcción.
