

Jocotepec
Gobierno Municipal

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Dirección de Obras Públicas
Administración 2018-2021
Número de Oficio 973/2021

Jocotepec, Jal., a 05 de agosto del 2021.

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de; **\$3,038.68 (Tres Mil Treinta y Ocho Pesos 68/100 M.N.)** por concepto de **Estimación 02 y Finiquito**, correspondiente al siguiente proyecto

Nombre del Proyecto:	REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES (FRENTE 2)
Localidad:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO
Programa:	CUENTA CORRIENTE 2021
Partida Contable:	6151-2-11-050-296
Contrato:	GMJ 013C-OP/2021


Nº FACTURA	FECHA FACTURA	TOTAL FACTURA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA	NETO A PAGAR
185	27/07/2021	\$3,636.36	\$ 597.68	\$ 3,038.68

Anexo:

1. Factura y CDFI
2. Estimación 02 y Finiquito
3. Formato D32 (SAT) opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes

ATENTAMENTE
"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, LO HACE SU GENTE"


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RFC emisor: IEO101202HD7 Folio fiscal: D6AF5DDA-B7BE-4678-8A99-205257C7ABI
 Nombre emisor: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES No. de serie del CSD: 00001000000505528560
 OROZCO SA DE CV Serie: F
 Folio: 185 Código postal, fecha y hora de emisión: 45180 2021-07-27 11:41:19
 RFC receptor: MJJ850101KP8 Efecto de comprobante: Ingreso
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: Construcciones

Conceptos

ave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predi	
72102900		1	E48		3134.79	3134.79				
Descripción	REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFALTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELAGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 2". RETENCIÓN 0.005 PARA CONTRA LORIA \$597.68 NETO A PAGAR \$3038.68				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	IVA	Traslado	3134.79	Tasa	16.0000%	501.57				

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 3,134.79
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 501.57
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 3,636.36

Sello digital del CFDI:

E5xvcMaiDcnvIP7B2mi+CZbRHeDAxq+fKoTxE3G0+FTf1oW+wZSbil20Bwr85myNywvs7DCdptQiqzo/gwYhf7sh7udF9z5aDJ2XO95YsD6xa/Xxr8/C0zHQ9+9pvHORzPDyXRoVabawLlhyeRWbugXWa8u6PNq9sF6YxURQzeDUJdJThA5LUUcFXZtYHHh62lsCBmQqhDVaRqf4rwcEaPkHksHpVNBnGhZb2ZGEfX/iGtSc540F7ukQyAFYJt9BwGEE+F2jicJ5AVzgmRmK5sLoF3Rj6sOLf1UvydGh7wxkXuiZ+VJ5NJ+ZugfwfO3zp0SCzUZCG1jdgxvdlPkSA==

Sello digital del SAT:


lRh/thenTYko4y3HXqtjUtFfCdcwbzj/jCSTytBb6+D+Jld4+5jKcfNgER7sVyykM9IIV0twyp+ZLAidpBixA377dKI110CIUs/elnQOnsJ+SSi7GgRgXnm0uXI0vBVxunzje8oLNNmE2DovM5MGm/FT+cg8UJtwWzdXqby9sKd6zRB5nyQDhSWqp+Cvftuq9S16HWWVR0L6Grchxse+7aQGWlgbtiCfjCNSA/DNAahqr3VAV9U67l++46xXNXiSqvInMhUIHQD5jfWJI6OzHRQWh3whfIIXSWvHP:9dWt4TR/ZKM5zynDUZl7t0dl4yMfrnOxknx7I7IMZjakw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D6AF5DDA-B7BE-4678-8A99-205257C7ABDA|2021-07-27T11:57:26|SAT970701NN3|E5xvcMaiDcnvIP7B2mi+CZbRHeDAxq+fKoTxE3G0+FTf1c+wZSbil20Bwr85myNywvs7DCdptQiqzo/gwYhf7sh7udF9z5aDJ2XO95YsD6xa/Xxr8/C0zHQ9+9pvHORzPDyXRoVabawLlhyeQRWbugXWa8u6PNq9sF6URQzeDUJdJThA5LUUcFXZtYHHh62lsCBmQqhDVaRqf4rwcEaPkHksHpVNBnGhZb2ZGEfX/iGtSc540F7ukQyAFYJt9BwGEE+F2jicJ5AVzgmRmK5sL3Rj6sOLf1UvydGh7wxkXuiZ+VJ5NJ+ZugfwfO3zp0SCzUZCG1jdgxvdlPkSA=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-07-27 11:57:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.

AV. LA PAZ #2860 COL. VALLARTA C.P. 44690 GUADALAJARA, JALISCO.
R.F.C. IEO101202HD7

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	No. DE CONTRATO: GMJ 013 C-OP/2021 CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.	HOJA DE RELACIÓN ESTIMACIÓN No. <u>2 (DOS) FINIQUITO</u> PERÍODO DE TRABAJO:	HOJA No. 1 DE 1
	OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 2.		DEL: DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021 FECHA: 19 DE MAYO DE 2021
UBICACIÓN: ZAPOTITAN DE HIDALGO			

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES																									
	Pavimentación Avenida del Trabajo desde el Puente a Pedro Moreno Pavimentación Calle Morelos de 16 de Septiembre a 5 de Mayo Pavimentación Calle Lopez Cotilla de Morelos a Pedro Moreno Pavimentación Calle 16 de Septiembre de Abasolo a Morelos				\$	76,572.08																								
					\$	42,963.52																								
					\$	119,535.60																								
					\$	116,400.81																								
					\$	3,134.79																								
					\$	501.57																								
					\$	3,636.36																								
					\$	597.68																								
					\$	3,038.68																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ESTADO CONTABLE</th> <th style="width: 15%;">IMPORTE</th> <th style="width: 15%;">I. V. A.</th> <th style="width: 15%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASIGNACIÓN</td> <td style="text-align: right;">\$ 971,705.09</td> <td style="text-align: right;">\$ 155,472.81</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,127,177.90</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE DE ESTIMACIÓN</td> <td style="text-align: right;">\$ 119,535.60</td> <td style="text-align: right;">\$ 19,125.70</td> <td style="text-align: right;">\$ 138,661.30</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR</td> <td style="text-align: right;">\$ 506,101.83</td> <td style="text-align: right;">\$ 80,976.29</td> <td style="text-align: right;">\$ 587,078.12</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO A LA FECHA</td> <td style="text-align: right;">\$ 625,637.43</td> <td style="text-align: right;">\$ 100,101.99</td> <td style="text-align: right;">\$ 725,739.42</td> </tr> <tr> <td>SALDO POR EJERCER</td> <td style="text-align: right;">\$ 346,067.66</td> <td style="text-align: right;">\$ 55,370.83</td> <td style="text-align: right;">\$ 401,438.49</td> </tr> </tbody> </table>					ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL	ASIGNACIÓN	\$ 971,705.09	\$ 155,472.81	\$ 1,127,177.90	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 119,535.60	\$ 19,125.70	\$ 138,661.30	ACUMULADO ANTERIOR	\$ 506,101.83	\$ 80,976.29	\$ 587,078.12	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 625,637.43	\$ 100,101.99	\$ 725,739.42	SALDO POR EJERCER	\$ 346,067.66	\$ 55,370.83	\$ 401,438.49		
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL																											
ASIGNACIÓN	\$ 971,705.09	\$ 155,472.81	\$ 1,127,177.90																											
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 119,535.60	\$ 19,125.70	\$ 138,661.30																											
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 506,101.83	\$ 80,976.29	\$ 587,078.12																											
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 625,637.43	\$ 100,101.99	\$ 725,739.42																											
SALDO POR EJERCER	\$ 346,067.66	\$ 55,370.83	\$ 401,438.49																											
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO					EL CONTRATISTA																									
ANTICIPO %	\$ 242,926.27	\$ 38,868.20	\$ 281,794.47	ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ																										
AMORTIZACIÓN	\$ 116,400.81	\$ 18,624.13	\$ 135,024.94	EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS																									
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 126,525.46	\$ 20,244.07	\$ 146,769.53	ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ																										
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 242,926.27	\$ 38,868.20	\$ 281,794.47																											
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ																										



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.

AV. LA PAZ #2860 COL. VALLARTA C.P. 44690 GUADALAJARA, JALISCO.
R.F.C. IEO101202HD7

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
 PERÍODO: DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021
 OBRA : RECARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENOVACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 2.
 UBICACIÓN : ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC, JALISCO.
 CONTRATISTA : INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.
 FECHA: 19 DE MAYO DE 2021

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
ZAPOTITAN DE HIDALGO													
001	RECARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENOVACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 1.												
04	Pavimentación Avenida del Trabajo desde el Puente a Pedro Moreno												
BS-01	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada. VOLUMEN EXCEDENTE	M3	0.00	26.00		26.00	-	26.00	\$4,343.40	\$0.00	\$0.00	\$112,928.40	-\$112,928.40
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	M2	3,378.10		1,768.00		1,610.10	\$43.31	\$146,305.51	\$76,572.08	\$0.00	\$69,733.43	
RV-01	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS Renovaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	M3	24.00	15.00		15.00	9.00	\$4,222.47	\$101,339.28	\$0.00	\$63,337.05	\$38,002.23	
SH-02	Reposición de Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura termoplastica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	ML	519.48			0.00	519.48	\$12.76	\$6,628.56	\$0.00	\$0.00	\$6,628.56	
	Pavimentación Avenida del Trabajo desde el Puente a Pedro Moreno								\$254,273.35	\$76,572.08	\$176,265.45	\$1,435.82	
05	Pavimentación Calle Morelos de 16 de Septiembre a 5 de Mayo												
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	M2	1,308.02		992.00	992.00	316.02	\$43.31	\$58,650.35	\$42,963.52	\$0.00	\$13,686.83	
RV-01	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS Renovaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	M3	50.00	42.00		42.00	8.00	\$4,222.47	\$211,123.50	\$0.00	\$177,343.74	\$33,779.76	
SH-02	Reposición de Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura termoplastica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	ML	347.54			0.00	347.54	\$12.76	\$4,434.61	\$0.00	\$0.00	\$4,434.61	
	Pavimentación Calle Morelos de 16 de Septiembre a 5 de Mayo								\$272,208.46	\$42,963.52	\$177,343.74	\$51,901.20	
06	Pavimentación Calle Lopez Cotilla de Morelos a Pedro Moreno												
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	M2	445.45			0.00	445.45	\$43.31	\$19,292.44	\$0.00	\$0.00	\$19,292.44	
RV-01	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS Renovaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	M3	40.00	19.00		19.00	21.00	\$4,222.47	\$168,898.80	\$0.00	\$80,226.93	\$88,671.87	
SH-02	Reposición de Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura termoplastica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	ML	155.94			0.00	155.94	\$12.76	\$1,989.79	\$0.00	\$0.00	\$1,989.79	
	Pavimentación Calle Lopez Cotilla de Morelos a Pedro Moreno								\$190,181.03	\$0.00	\$80,226.93	\$109,954.10	
07	Pavimentación Calle 16 de Septiembre de Abasolo a Morelos												
BS-01	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra terminada.	M3	21.00	4.00		4.00	17.00	\$4,343.40	\$91,211.40	\$0.00	\$17,373.60	\$73,837.80	
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	M2	2,262.59			0.00	2,262.59	\$43.31	\$97,992.77	\$0.00	\$0.00	\$97,992.77	
RV-01	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS Renovaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.	M3	14.00	13.00		13.00	1.00	\$4,222.47	\$59,114.58	\$0.00	\$54,892.11	\$4,222.47	
SH-02	Reposición de Marcas M-2.1 Raya separadora de carriles continua sencilla, con pintura termoplastica blanca retroreflejante de 15 cm de ancho, por unidad de obra terminada.	ML	526.92			0.00	526.92	\$12.76	\$6,723.50	\$0.00	\$0.00	\$6,723.50	
	Pavimentación Calle 16 de Septiembre de Abasolo a Morelos								\$255,042.25	\$119,535.60	\$72,265.71	\$182,776.54	
									SUMA	\$ 971,705.00	\$ 239,071.20	\$ 506,101.83	\$ 346,061.68
									IVA	\$ 155,472.80	\$ 38,251.39	\$ 80,976.29	\$ 55,370.83
									TOTAL	\$ 1,127,177.80	\$ 277,322.59	\$ 587,078.12	\$ 401,438.49



ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.


Av. La Paz #2860, Col. Vallarta, C.P. 44690 Guadalajara Jalisco


R.F.C. IEO101202HD7

EMPRESA:	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.	FECHA:	19 DE MAYO DE 2021
OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 2.			

LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021

UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	LADO	AREA	OBSERVACIONES
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado							
m3	0+000.00	0+010.00	10.00	6.80			68.00	
	0+010.00	0+020.00	10.00	6.80			68.00	
	0+020.00	0+030.00	10.00	6.80			68.00	
	0+030.00	0+040.00	10.00	6.80			68.00	
	0+040.00	0+050.00	10.00	6.80			68.00	
	0+050.00	0+060.00	10.00	6.80			68.00	
	0+060.00	0+070.00	10.00	6.80			68.00	
	0+070.00	0+080.00	10.00	6.80			68.00	
	0+080.00	0+090.00	10.00	6.80			68.00	
	0+090.00	0+100.00	10.00	6.80			68.00	
	0+100.00	0+110.00	10.00	6.80			68.00	
						SUMA	748.00	


 ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ
 EL CONTRATISTA


 ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.

Av. La Paz #2860, Col. Vallarta, C.P. 44690 Guadalajara Jalisco

R.F.C. IEO101202HD7

EMPRESA:	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.	FECHA:	19 DE MAYO DE 2021
OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 2.			

LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021

RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.								OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	LADO	AREA	
	0+110.00	0+120.00	10.00	6.80			68.00	
	0+120.00	0+130.00	10.00	6.80			68.00	
	0+130.00	0+140.00	10.00	6.80			68.00	
	0+140.00	0+150.00	10.00	6.80			68.00	
	0+150.00	0+160.00	10.00	6.80			68.00	
	0+160.00	0+170.00	10.00	6.80			68.00	
	0+170.00	0+180.00	10.00	6.80			68.00	
	0+180.00	0+190.00	10.00	6.80			68.00	
	0+190.00	0+200.00	10.00	6.80			68.00	
	0+200.00	0+210.00	10.00	6.80			68.00	
	0+210.00	0+220.00	10.00	6.80			68.00	
						SUMA	680	

ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ
EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



07



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.


Av. La Paz #2860, Col. Vallarta, C.P. 44690 Guadalajara Jalisco


R.F.C. IEO101202HD7

EMPRESA:	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.	FECHA:	19 DE MAYO DE 2021
OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 2.			

LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA:REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021

RS-01	RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unidad de obra terminada.							OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	LADO	AREA	
	0+220.00	0+230.00	10.00	6.80			68.00	
	0+230.00	0+240.00	10.00	6.80			68.00	
	0+240.00	0+250.00	10.00	6.80			68.00	
	0+250.00	0+260.00	10.00	6.80			68.00	
	0+260.00	0+270.00	10.00	6.80			68.00	
						SUMA	340	
						TOTAL	1,768	


 ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ
 EL CONTRATISTA


 ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.

Av. La Paz #2860, Col. Vallarta, C.P. 44690 Guadalajara Jalisco

R.F.C. IEO101202HD7

EMPRESA:	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.	FECHA:	19 DE MAYO DE 2021
OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 2.			

LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021

RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	FOTOGRAFÍA
-------	---	------------



ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ
EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.


Av. La Paz #2860, Col. Vallarta, C.P. 44690 Guadalajara Jalisco

R.F.C. IEO101202HD7

EMPRESA:	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.	FECHA:	19 DE MAYO DE 2021
OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 2.			

LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA:	REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021

RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	CROQUIS
-------	---	---------

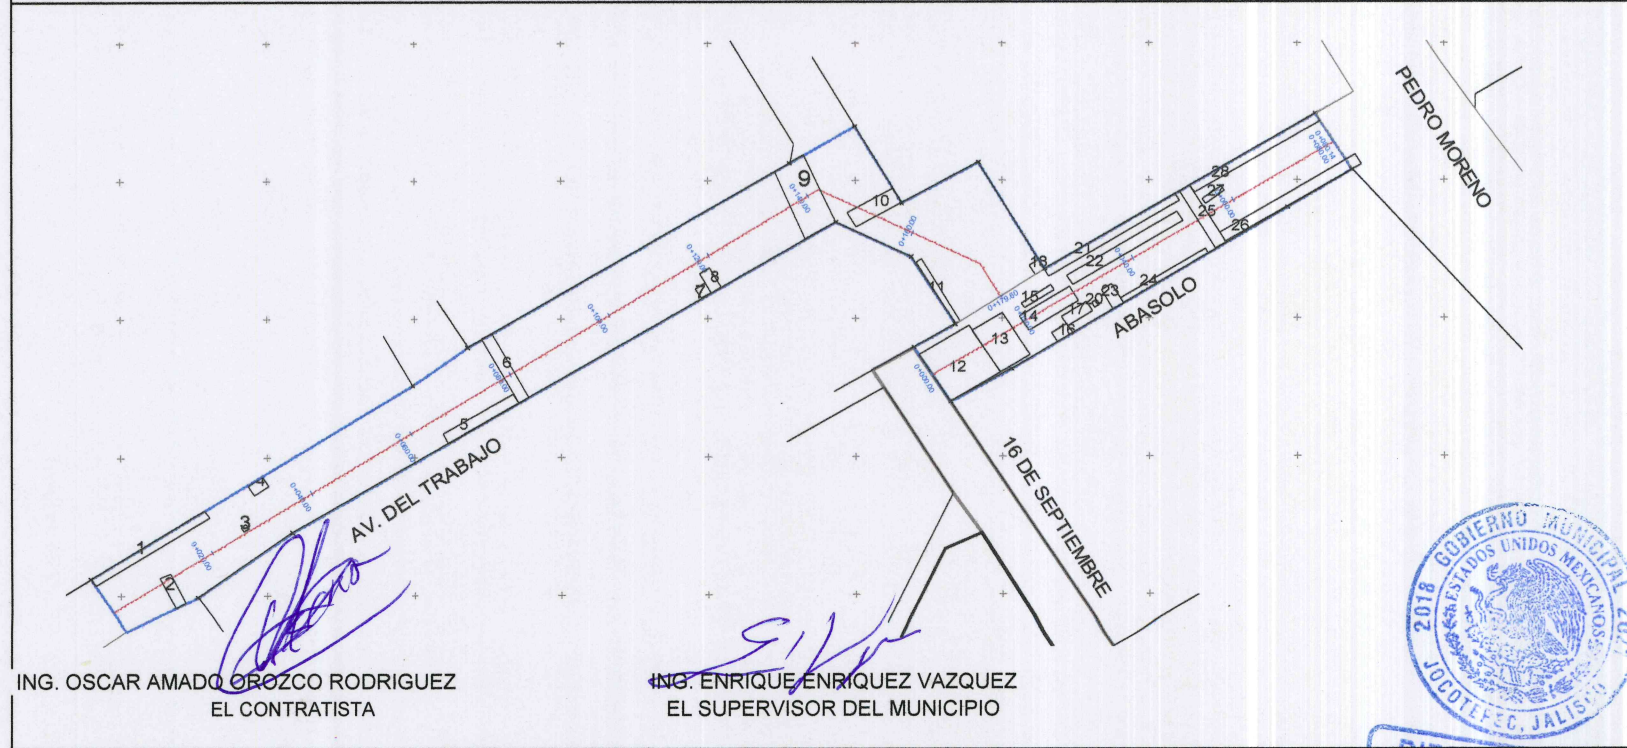



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.

Av. La Paz #2860, Col. Vallarta, C.P. 44690 Guadalajara Jalisco

R.F.C. IEO101202HD7

EMPRESA: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.

FECHA: 19 DE MAYO DE 2021

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 2.

LOCALIDAD: ZAPOTITÁN DE HIDALGO

OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021

RS-01

Riego de sello con material petreo 3A premezclado

FOTOGRAFÍA

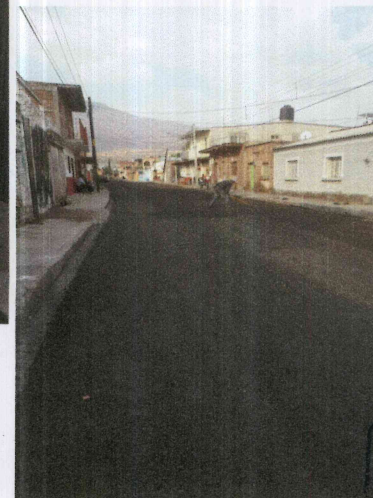

ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ
EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.

Av. La Paz #2860, Col. Vallarta, C.P. 44690 Guadalajara Jalisco

R.F.C. IEO101202HD7

EMPRESA:	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.	FECHA:	19 DE MAYO DE 2021
OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENOVACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO OBRA: SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. FRENTE 2.			

LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA:REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021


Pavimentación Calle Morelos de 16 de Septiembre a 5 de Mayo							OBSERVACIONES
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado						
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	LADO	AREA
	CALLE 5 DE MAYO						
M3	0+000.00	0+010.00	10.00	6.10			61.00
	0+010.00	0+020.00	10.00	6.10			61.00
	0+020.00	0+030.00	10.00	6.10			61.00
	0+030.00	0+040.00	10.00	6.10			61.00
	0+040.00	0+050.00	10.00	5.00			50.00
	CALLE MORELOS						
	0+050.00	0+060.00	10.00	5.00			50.00
	0+060.00	0+070.00	10.00	5.00			50.00
	0+070.00	0+080.00	10.00	5.00			50.00
	0+080.00	0+090.00	10.00	5.00			50.00
	0+060.00	0+070.00	10.00	5.00			50.00
	0+070.00	0+080.00	10.00	5.00			50.00
	0+080.00	0+090.00	10.00	5.00			50.00
	0+090.00	0+100.00	10.00	5.90			59.00
	0+070.00	0+080.00	10.00	5.90			59.00
	0+080.00	0+090.00	10.00	5.90			59.00
	0+090.00	0+100.00	10.00	5.90			59.00
	0+100.00	0+110.00	10.00	5.90			59.00
						SUMA	756.00

ING. OSCAR AMADOR OROZCO RODRIGUEZ

EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO







INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.

Av. La Paz #2860, Col. Vallarta, C.P. 44690 Guadalajara Jalisco

R.F.C. IEO101202HD7

EMPRESA:	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.	FECHA:	19 DE MAYO DE 2021
OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO OBRA: SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, FRENTE 2.			

LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA:	REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021

Pavimentación Calle Morelos de 16 de Septiembre a 5 de Mayo								OBSERVACIONES
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado							
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	LADO	AREA	
	0+110.00	0+120.00	10.00	5.90			59.00	
	0+000.00	0+010.00	10.00	5.90			59.00	
	0+000.00	0+010.00	10.00	5.90			59.00	
	0+000.00	0+010.00	10.00	5.90			59.00	
						SUMA	236.00	
						TOTAL	992.00	
 ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ EL CONTRATISTA				 ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO				





INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.

Av. La Paz #2860, Col. Vallarta, C.P. 44690 Guadalajara Jalisco




R.F.C. IEO101202HD7


EMPRESA:	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.	FECHA:	19 DE MAYO DE 2021
OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, FRENTE 2.			


LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021

Pavimentación Calle Morelos de 16 de Septiembre a 5 de Mayo	
--	--

RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	FOTOGRAFÍA
-------	---	------------

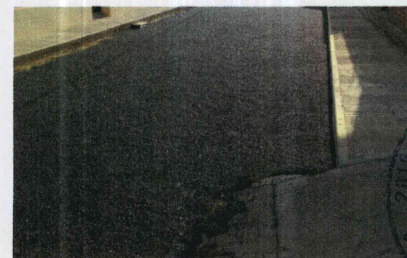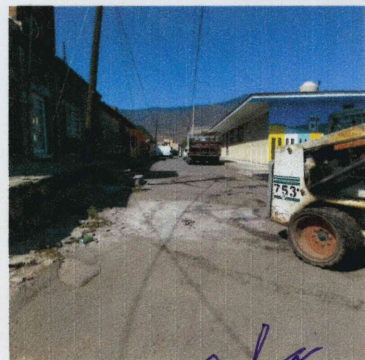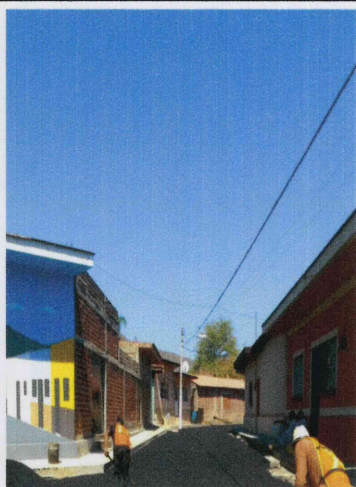


 ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ
 EL CONTRATISTA


 ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.


Av. La Paz #2860, Col. Vallarta, C.P. 44690 Guadalajara Jalisco


R.F.C. IEO101202HD7


EMPRESA:	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V.	FECHA:	19 DE MAYO DE 2021
OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENOVACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, BACHEO OBRA: SUPERFICIAL Y BACHEO DE CAJA CON MEZCLA ASFÁLTICA, ASI COMO BALIZAMIENTO EN VARIAS CALLES EN LA DELEGACION DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, FRENTE 2.			

LOCALIDAD:	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	OBRA: REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2021

Pavimentación Calle Morelos de 16 de Septiembre a 5 de Mayo		
RS-01	Riego de sello con material petreo 3A premezclado	CROQUIS

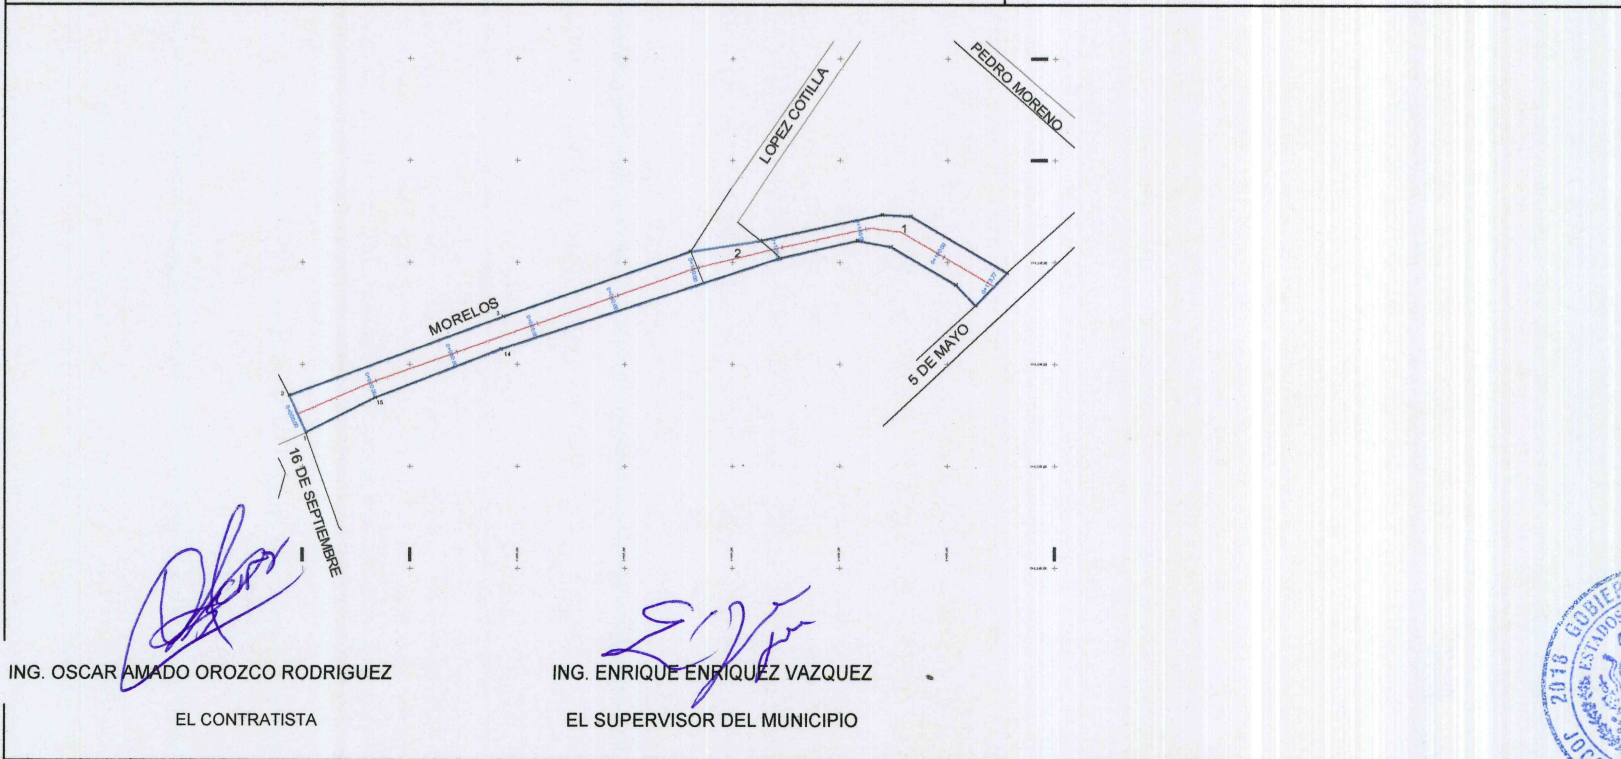


 ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ
 EL CONTRATISTA


 ING. ENRIQUE ENRIQUEZ VAZQUEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

