

Jocotepec
Gobierno Municipal

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Dirección de Obras Públicas
Administración 2018-2021
Número de Oficio 1120/2021

Jocotepec, Jal., a 08 de septiembre del 2021.

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de; **\$90,414.33 (Noventa Mil Cuatrocientos Catorce Pesos 33/100 M.N.)** por concepto de **Estimación 03 y Finiquito**, del programa **CUENTA CORRIENTE 2021** correspondiente al siguiente proyecto

Nombre del Proyecto:	IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN
Localidad:	JOCOTEPEC-NEXTIPAC
Programa:	CUENTA CORRIENTE 2021
Partida Contable:	6151-2-11-050-307
Contrato:	GMJ 009C-OP/2021

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL FACTURA	TOTAL FACTURA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA	NETO A PAGAR
560	06/09/2021	\$78,280.80	\$90,805.73	\$391.40	\$90,414.33

Anexo:

1. Factura y CDFI
2. Estimación 03 y Finiquito
3. Minuta
4. Acta Entrega Recepción
5. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones
6. Fianzas

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes

ATENTAMENTE

“AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, LO HACE SU GENTE”

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS





CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	848599A9-5B6D-4BA5-BBA5-87263F0D26EC
Certificado SAT	00001000000505619865
Certificado del emisor	00001000000507743176
Fecha y hora de certificación	2021-09-06T16:23:35
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	44540

Folio/Serie	000560G
Fecha y hora de emisión	2021-09-06T16:23:34
Método de pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago	99 POR DEFINIR
Condiciones de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3



Emisor

DDC050127VD5 DESARROLLO DAP C SA DE CV

MEDELLÍN, 117,
COL. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, C.P. 20230
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Expedido en:

ISLA AUSTRALIA, 2636,
COL. BOSQUES DE LA VICTORIA, GUADALAJARA, C.P. 44540
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor

MJJ850101KP8 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL, S/N,
JOCOTEPEC,
JOCOTEPEC, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
72101500	E48	SERV		1.00	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03F (TRES FINIQUITO) DE LA OBRA: "INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50" DE LA LOCALIDAD JOCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. DEL CONTRATO NO. GMJ 009C- OP/2021	\$0.00	\$78,280.80	\$78,280.80
					RETENCIÓN .005 PARA CONTRALORIA \$391.40 NETO A PAGAR \$90,414.33			
					Impuestos trasladados			
					Impuesto Base Tipo Factor Tasa o Cuota Importe			
					IVA 78280.8 Tasa 0.160000 12524.93			

Importe con letra *** NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 73/100 M.N. ***

Subtotal \$78,280.80

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$12,524.93

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$90,805.73

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|848599A9-5B6D-4BA5-BBA5-87263F0D26EC|2021-09-06T16:23:35|SFE0807172W8|Hb4FUG65pjbAwM09kyDxp3GFRfdvNjL8mxcMaO|mun7a28crdyg/5Hkm2raZfqqn|bogspiEgitdfNgruU3dhnSmpynqKGCTBCb6hqcq+/QSU3Uitf+07|shwVYV04vIa+k8UuOZUCngQMIIcJNKRhLPX90IZXJGFbd5B+mwudKZSi9Ukll5Vbxr9oBG7m1WS5fP0SA8zvlfmOxgC60EZY42ne8A/A66O6INDiKTy/sdHOYe9almR2T+nX16HBLCTvWJ0FdtOeyD4F9frzS/HqYNQ P0xoYv+i13n2ZvSPes+ysvHvNozqxc0FaDIFDFBco4dqfzLVsvgi5f3/eHA==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

Ihb4FUG65pjbAwM09kyDxp3GFRfdvNjL8mxcMaO|mun7a28crdyg/5Hkm2raZfqqn|bogspiEgitdfNgruU3dhnSmpynqKGCTBCb6hqcq+/QSU3Uitf+07|shwVYV04vIa+k8UuOZUCngQMIIcJNKRhLPX90IZXJGFbd5B+mwudKZSi9Ukll5Vbxr9oBG7m1WS5fP0SA8zvlfmOxgC60EZY42ne8A/A66O6INDiKTy/sdHOYe9almR2T+nX16HBLCTvWJ0FdtOeyD4F9frzS/HqYNQ P0xoYv+i13n2ZvSPes+ysvHvNozqxc0FaDIFDFBco4dqfzLVsvgi5f3/eHA==

Sello Digital del SAT

ggDvO/SCAzCTNkBaYhRCQS8AAP+Di/+ZA3ajpDEPbhnMSfijM/+cXNmp2+qdAq4|3aW5UdBmDlrwTkYGFROWVq9IbCn+V3iwRawfh399dj+izkZOFI4zN/iXy2b9oiz2xYlB7w4zmw8u8YhUhuUIVRa55cPQTKM+cBa7sgQHSKuKcue6ah3NIYj5JpOAEFQvC6gDiyMciOwoao8KfIdQz3PKNA61/KACfNkM3V5dXC7zltm8Ldv4Vla3WdqccaDXzVhnS2LajMT8+kTTZ8rcpL8bYtl4Vtms8o2hmgewjXBLiU hnvVp50PwBWERgbqlo7n9NBKk9bWxMGn3Ua==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DDC050127VD5	DESARROLLO DAP C SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
848599A9-5B6D-4BA5-BBA5-87263F0D26EC	2021-09-06T16:23:34	2021-09-06T16:23:35	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$90,805.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





No. DE CONTRATO		NO. JOCOTEPEC- GMJ 009 CUENTA CORRIENTE/2021	
CONTRATISTA: DESARROLLO DAP C		DESARROLLO DAP C S. A. DE C. V.	
OBRA:		ESTIMACIÓN No.	3 (TRES) FINIQUITO
INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50		FECHA:	22 DE MARZO DEL 2021
UBICACIÓN:	JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC)	PERÍODO DE TRABAJO:	DEL 14 AL 22 DE MARZO DEL 2021

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES				
	PARTIDA 1 PRELIMINARES PARTIDA 2 TERRACERIAS PARTIDA 3 BANQUETAS PARTIDA 4 MOBILIARIO URBANO PARTIDA 5 JARDINERIA PARTIDA 6 HUELLAS PARTIDA 7 EXTRAORDINARIOS								
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ -
									\$ 78,280.80
							TOTAL \$		78,280.80
							MONTO DE ESTIMACIÓN	\$	78,280.80
							MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %		
							SUBTOTAL	\$	78,280.80
							I. V. A.	\$	12,524.93
							SUMA	\$	90,805.73
							MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$	-
							MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$	391.40
							NETO A PAGAR	\$	90,414.33
	ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:					
	ASIGNACIÓN	\$ 2,256,858.51	\$ 361,097.36	\$ 2,617,955.87					
	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 78,280.80	\$ 12,524.93	\$ 90,805.73					
	ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,198,394.76	\$ 191,743.16	\$ 1,390,137.92					
	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,276,675.56	\$ 204,268.09	\$ 1,480,943.65					
	SALDO POR EJERCER	\$ 980,182.95	\$ 156,829.27	\$ 1,137,012.22					
	ANTICIPO								
	ANTICIPO %	\$ -	\$ -	\$ -					
	AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -					
	AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ -	\$ -	\$ -					
	AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ -	\$ -	\$ -					
	FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -					
							RESPONSABLE DE OBRA		CONTRATISTA
							DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.		DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.
							ING HECTOR TORRES CHAVARRIA		ING ARIEL MUÑOZ MAYA
							RESIDENTE DE OBRA		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
							ING VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA		ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ





ESTIMACIÓN:	3 (TRES) FINIQUITO	No. DE CONTRATO	NO. JOCOTEPEC- GMJ 009 CUENTA CORRIENTE/2021
PERÍODO DE TRABAJO:	DEL 14 AL 22 DE MARZO DEL 2021		
OBRA:	INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50		
UBICACIÓN:	JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC)		
CONTRATISTA:	DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.		
FECHA:	22 DE MARZO DEL 2021		


PARTIDA 1	No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE												
				PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO									
PARTIDA 1																						
	1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,524.00	2,236.62		2,236.62	287.38	7.65	N\$	19,308.60	N\$	-	N\$	17,110.14	N\$	2,198.46					
	2	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE ESPESOR DE 20 CM, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO QUE SEÑALE OBRAS PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO. RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2,524.00	2,236.62		2,236.62	287.38	113.85	\$	287,357.40	\$	-	\$	254,639.19	N\$	32,718.21					
	3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	192.24	66.07		66.07	126.17	150.00	\$	28,836.00	\$	-	\$	9,910.50	\$	18,925.50					
	4	CORTE DE CAJON EN ARROYO DE VIALIDAD EN MATERIAL TIPO B SECO CON UN ESPESOR DE 20 CM MEDIDO EN SECCIONES COMPACTO. INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M3	504.77	452.5400		452.54	52.23	58.32	\$	29,438.19	\$	-	\$	26,392.13	\$	3,046.05					
	5	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN A TIRO LIBRE, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3	656.22	571.44		571.44	84.78	46.68	\$	30,632.35	\$	-	\$	26,674.82	\$	3,957.53					
PARTIDA 1 PRELIMINARES											TOTAL PARTIDA 1				N\$	395,572.54	N\$	-	N\$	334,726.78	N\$	60,845.75
PARTIDA 2 TERRECIERIAS																						
	6	ESCARIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,524.00	2,199.02	-	2,199.02	324.98	53.32	\$	134,579.68	\$	-	\$	117,251.75	\$	17,327.93					
	7	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE TRITURACIÓN Y MATERIAL DE BANCO EN PROPORCIÓN 60-40 COMPACTADA EN FORMA MECÁNICA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 100% PROCTOR DE SUP.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO, COMPACTACIÓN, AFINE, HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,524.00	1,576.29		1,576.29	947.71	140.15	\$	353,738.60	\$	-	\$	220,917.04	\$	132,821.56					
PARTIDA 2 TERRECIERIAS											TOTAL PARTIDA 2				N\$	488,318.28	N\$	-	N\$	338,168.79	N\$	150,149.49
PARTIDA 3 BANQUETAS																						
	8	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,281.60	660.68		660.68	620.92	7.65	\$	9,804.24	\$	-	\$	5,054.20	\$	4,750.04					





ESTIMACIÓN:	3 (TRES) FINIQUITO	No. DE CONTRATO	NO. JOCOTEPEC- GMJ 009 CUENTA CORRIENTE/2021
PERÍODO DE TRABAJO:	DEL 14 AL 22 DE MARZO DEL 2021		
OBRA:	INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50		
UBICACIÓN:	JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC)		
CONTRATISTA:	DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.		
FECHA:	22 DE MARZO DEL 2021		

PARTIDA 1 No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES									
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO						
PARTIDA 1																		
9	MURO DE NIVELACION CON BLOCK ESTANDAR 8-12-28 DE SOGA, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 UNA CARA CON PLOMO, DEJANDO UNA JUNTA DE SEPARACION A CADA 20 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	180.00	98.88		98.88	81.12	355.04	\$	63,907.20	\$	-	\$	35,106.36	\$	28,800.84		
10	RELLENO PARA EL DESPLANTE DE BANQUETAS CON BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE TRITURACIÓN Y MATERIAL DE BANCOEN PROPORCIÓN 70-30 COMPACTADA EN FORMA MECÁNICA EN CAPAS NOMAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 100% PROCTOR DE SUP.V. S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TENDIDO, COMPACTACIÓN, AFINE, HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	150.00	93.93		93.93	56.07	355.03	\$	53,254.50	\$	-	\$	33,347.97	\$	19,906.53		
11	BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2., R.N., T.M.A. 19 MM, CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMBRA, DESCUMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,281.60	660.68000		660.68	620.92	250.92	\$	321,579.07	\$	-	\$	165,777.83	\$	155,801.25		
12	APLANADO DE MURO DE NIVELACION CON MEZCLA ARENA CEMENTO 1:4 A PLOMO TERMINADO APALILLADO FINO CON FLOTA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	220.00	128.70		128.70	91.30	140.25	\$	30,855.00	\$	-	\$	18,050.18	\$	12,804.83		
PARTIDA 3	BANQUETAS									TOTAL PARTIDA 3	N\$	479,400.01	N\$	-	N\$	257,336.54	N\$	222,063.49
PARTIDA 4 MOBILIARIO URBANO																		
13	SUMINISTRO E INSTALACIONE DE LUMINARIAS TIPO LED INCLUYE: FOTOSELDA, CABLEADO, POSTE, BASE DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00	-		0.00	13.00	21,249.81	\$	276,247.53	\$	-	\$	-	\$	276,247.53		
14	EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE LINEA DE POLIDUCO DE ALTA DENSIDAD PARA LUMINARIAS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	34.18	13.44		13.44	20.74	59.04	\$	2,017.99	\$	-	\$	793.50	\$	1,224.49		
15	SUMINISTRO DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 2" PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SUBTERRANEAS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	427.00	168.00		168.00	259.00	75.55	\$	32,259.85	\$	-	\$	12,692.40	\$	19,567.45		
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 4, DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	803.99	-		0.00	803.99	43.89	\$	35,287.54	\$	-	\$	-	\$	35,287.12		
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA TIPO ARTESANAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	-		0.00	8.00	1,530.03	\$	12,240.24	\$	-	\$	-	\$	12,240.24		
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA ARTESANAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	-		0.00	6.00	2,661.95	\$	15,971.70	\$	-	\$	-	\$	15,971.70		
PARTIDA 4	MOBILIARIO URBANO									TOTAL PARTIDA 3	N\$	374,024.85	N\$	-	N\$	13,485.90	N\$	360,538.53
PARTIDA 5 JARDINERIA																		
19	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLADO	PZA	26.00	-		0.00	26.00	341.87	\$	8,888.62	\$	-	\$	-	\$	8,888.62		
20	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERAS	PZA	26.00	-		0.00	26.00	714.98	\$	18,589.48	\$	-	\$	-	\$	18,589.48		





ESTIMACIÓN:	3 (TRES) FINIQUITO	No. DE CONTRATO	NO. JOCOTEPEC- GMJ 009 CUENTA CORRIENTE/2021
PERÍODO DE TRABAJO:	DEL 14 AL 22 DE MARZO DEL 2021		
OBRA:	INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50		
UBICACIÓN:	JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC)		
CONTRATISTA:	DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V.		
FECHA:	22 DE MARZO DEL 2021		

PARTIDA 1	No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
				PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PARTIDA 1													
PARTIDA 5		JARDINERIA											TOTAL PARTIDA 3 N\$ 27,478.10 N\$ - N\$ - N\$ 27,478.10
PARTIDA 6		HUELLAS											
	21	HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 KG/CM2 DE RESISTENCIA Y 20 CMS DE ESPESOR, ACABADO CON PIEL DE ELEFANTE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1,124.00	662.02		662.02	461.98	437.78	\$ 492,064.72	\$ -	\$ 289,819.12	\$ 202,245.60
PARTIDA 6		HUELLAS											TOTAL PARTIDA 3 N\$ 492,064.72 N\$ - N\$ 289,819.12 N\$ 202,245.60
PARTIDA 7		EXTRAORDINARIOS											
	EXT-01	GUARNICIÓN TIPO "L" EN SECCIÓN 45-20X60 Y CORONA DE 15 CM. DEALTURA POR 40X15 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N.,INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES,CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	340		200.72			390.00	N\$ 132,600.00	N\$ 78,280.80		N\$ 54,319.20
										N\$ 132,600.00	N\$ 78,280.80		
									TOTAL	\$ 2,256,858.51	\$ 78,280.80	\$ 1,233,537.13	\$ 945,040.58

DESARROLLO DAP C. DE S. A. DE C. V.
ING. HECTOR TORRES CHAVARRIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



HOJA DE GENERADOR






DATOS DE LA OBRA		DATOS DEL CONTRATO:			DATOS DE LA ESTIMACION:		
CONTRATO N°:	MJ 009C- OP/2021	INICIO:		TERMINACIÓN:		ESTIMACIÓN N°: 3 (TRES)	
OBRA:	INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50	FECHA:	22 DE MARZO DEL 2021	PERÍODO:	DEL 14 AL 22 DE MARZO DEL 2021		3
LOC. Y MPIO:	NEXTIPAC, JOCOTEPEC, JALISCO	ELEMENTO PEP:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATISTA:		DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V.

FOTOS DE GENERADOR

GUARNICION

EXT-01

GUARNICIÓN TIPO "L" EN SECCIÓN 45-20X60 Y CORONA DE 15 CM. DE ALTURA POR 40X15 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

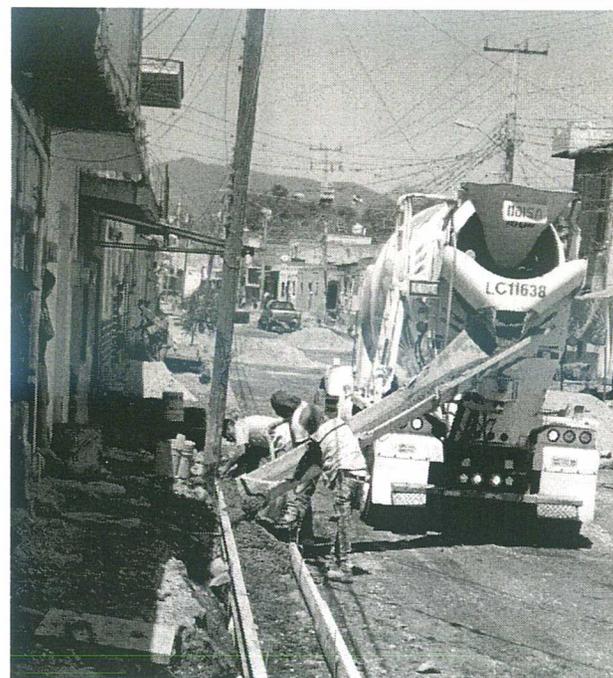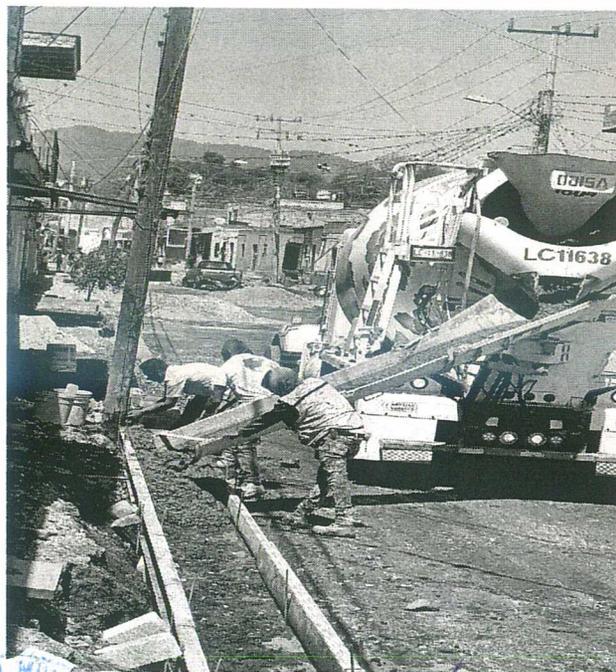



HOJA DE GENERADOR



DATOS DE LA OBRA		DATOS DEL CONTRATO:			DATOS DE LA ESTIMACION:		
CONTRATO N°:	MJ 009C- OP/2021	INICIO:		TERMINACIÓN:		ESTIMACIÓN N°: 3 (TRES)	3
OBRA:	INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50	FECHA:	22 DE MARZO DEL 2021	PERÍODO:	DEL 14 AL 22 DE MARZO DEL 2021		
LOC. Y MPIO:	NEXTIPAC, JOCOTEPEC, JALISCO	ELEMENTO PEP:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATISTA:		

CROQUIS DE GENERADOR



GUARNICION

EXT-01

GUARNICIÓN TIPO "L" EN SECCIÓN 45-20X60 Y CORONA DE 15 CM. DE ALTURA POR 40X15 CM, DE CONCRETO Premezclado F'c=250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
