

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC
REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00
AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A
ESMERALDA)

FOLIO: SADER-202112

SEMANA # 1

LOCALIDAD: Potrerillos

INVERSION: \$512,378.61

FECHA: 12/01/2022

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$130,414.39

AVANCE GRAL DE OBRA: 25.45%

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:				
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1 CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION, A MANO, INCLUYE DEPOSITO EN SITIO DONDE SE ALMACENARA HASTA SU REUTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	79.19	\$ 155.00	12,274.45	79.19	100.00%	\$ 12,274.45	\$ -
2 EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR PROPORCION 70-30, TERMINADO CEPILLADO, COLADO EN MODULOS DE 3.00 X 3.50 MTS, FC=200 KG/C/M2 TMA 1 1/2" INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-002/00 P.U.O.T.	M2	369.58	\$ 319.66	118,139.94	369.58	27.15%	\$ 118,139.94	\$ -
3 DENTELON O MACHUELO PARA CONFINAR EMPEDRADO, EN FORMA RECTANGULAR DE .12*.30*1M, CON CONCRETO DE 200 KG/C/M2 ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: EXCAVACION Y APROCHE CON MATERIAL DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 P.U.O.T	ML	-	\$ 133.79	0.00	-	0.00%	\$ -	\$ -
4				130,414.39		63.57%	130,414.39	0.00

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES Y COMENTARIOS.

AVANCE DE TRABAJOS: DEL 0+000 AL 0+060.00
79.19 M3 DE RECUPERACIÓN DE PIEDRA
369.58 MTS2 DE EMPEDRADO

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00
AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A
ESMERALDA)

FOLIO: SADER-202112

SEMANA #

1

LOCALIDAD: Potrerillos

INVERSION: \$512,378.61


FECHA: 12/01/2022

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$130,414.39

AVANCE GRAL DE OBRA: 25.45%

REPORTE FOTOGRAFICO:

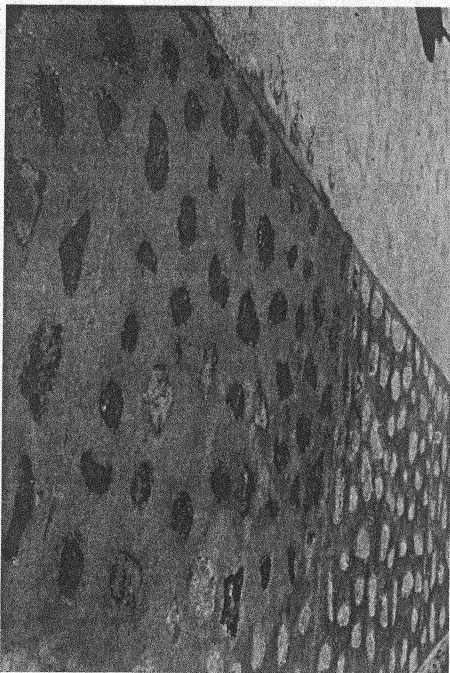

FOTOS

FOTOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. IMELDÁKARMA PÉREZ GONZÁLEZ

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00
AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A
ESMERALDA)

FOLIO: SADER-2021112

SEMANA # 2

LOCALIDAD: Potrerillos

INVERSION: \$512,378.61

FECHA: 27/11/2021

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$258,399.86

AVANCE GRAL DE OBRA: 50.43%

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1 CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION, A MANO, INCLUYE DEPOSITO EN SITIO DONDE SE ALMACENARA HASTA SU REUTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	-	\$ 155.00	\$ -	79.19	100.00%	\$ 12,274.45	\$ -	-
2 EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR PROPORCION 70-30, TERMINADO CEPILLADO, COLADO EN MODULOS DE 3.00 X 3.50 MTS, FC=200 KG/CM2 TMA 1 1/2" INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-002/00 P.U.O.T.	M2	400.38	\$ 319.66	\$ 127,985.47	769.96	56.56%	\$ 246,125.41	\$ 189,027.74	
3 DENTELLON O MACHUELO PARA CONFINAR EMPEDRADO, EN FORMA RECTANGULAR DE .12*.30*1M, CON CONCRETO DE 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y APROCHE CON MATERIAL DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 P.U.O.T	ML	-	\$ 133.79	\$ -	-	0.00%	\$ -	\$ 53,516.00	
4				127,985.47		78.28%	258,399.86	242,543.74	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES Y COMENTARIOS.

AVANCE DE TRABAJOS: DEL 0+060.00 AL 0+125.00
400.38 MTS2 DE EMPEDRADO

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00
AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A
ESMERALDA)

FOLIO: SADER-202112

SEMANA #

2

LOCALIDAD: Potrerillos

INVERSION: \$512,378.61


FECHA: 27/11/2021

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$258,399.86

AVANCE GRAL DE OBRA: 50.43%

REPORTE FOTOGRAFICO:

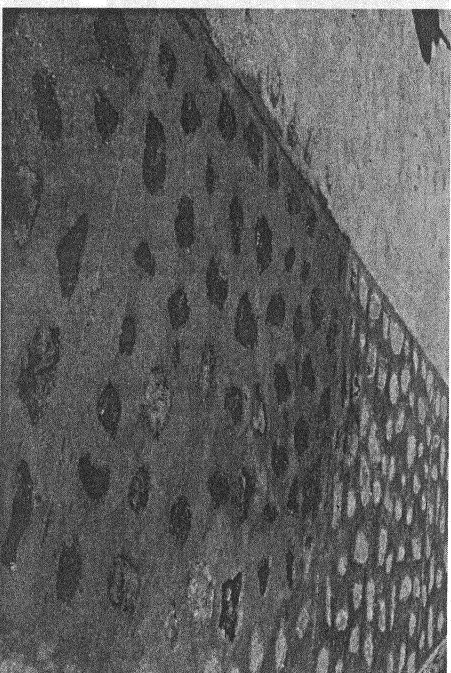

FOTOS

FOTOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00
AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A
ESMERALDA)

FOLIO: SADER-2021112

SEMANA # 3

LOCALIDAD: Potrerillos

INVERSION: \$512,378.61

FECHA: 04/12/2021

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$366,697.48

AVANCE GRAL DE OBRA: 71.57%

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1 CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION. A MANO, INCLUYE DEPOSITO EN SITIO DONDE SE ALMACENARA HASTA SU REUTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	-	\$ 155.00	\$ -	79.19	100.00%	\$ 12,274.45	\$ -	-
2 EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR PROPORCION 70-30. TERMINADO CEPILLADO. COLADO EN MODULOS DE 3.00 X 3.50 MTS. FC=200 KG/C/M2 TMA 1 1/2" INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-002/00 P.U.O.T.	M2	338.79	\$ 319.66	\$ 108,297.61	1,108.75	81.45%	\$ 354,423.03	\$ 80,730.13	
3 DENTELLON O MACHUELO PARA CONFINAR EMPEDRADO, EN FORMA RECTANGULAR DE .12*.30*1M. CON CONCRETO DE 200 KG/C/M2 ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y APROCHE CON MATERIAL DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 P.U.O.T	ML	-	\$ 133.79	\$ -	-	0.00%	\$ -	\$ 53,516.00	
4				108,297.61		90.72%	366,697.48	134,246.13	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES Y COMENTARIOS.

AVANCE DE TRABAJOS: DEL 0+125.00 AL 0+180.00
338.78 MTS2 DE EMPEDRADO

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC
REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00
AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A
ESMERALDA)

FOLIO: SADER-202112

SEMANA # 3

LOCALIDAD: Potrerillos

INVERSION: \$512,378.61


FECHA: 04/12/2021

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$366,697.48

AVANCE GRAL DE OBRA: 71.57%

REPORTE FOTOGRAFICO:

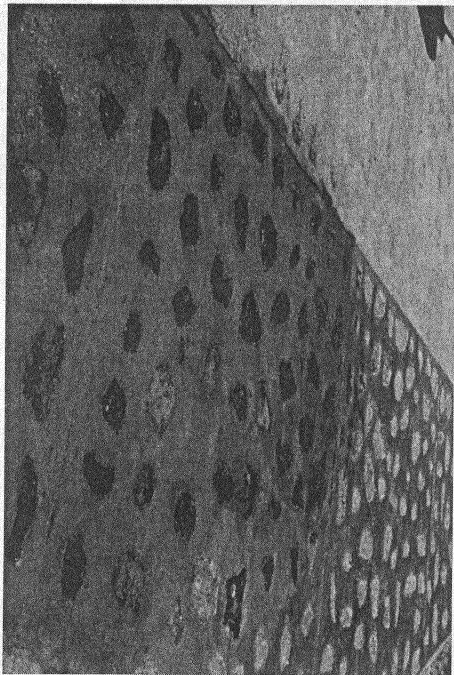

FOTOS

FOTOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JAMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC
REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00
NOMBRE DEL PROYECTO: AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A
ESMERALDA)

FOLIO: SADER-2021112

SEMANA # 3

LOCALIDAD: Potrerillos

INVERSION: \$512,378.61

FECHA: 04/12/2021

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$500,943.61

AVANCE GRAL DE OBRA: 97.77%

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1 CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION. A MANO. INCLUYE DEPOSITO EN SITIO DONDE SE ALMACENARA HASTA SU REUTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	-	\$ 155.00	\$ -	79.19	100.00%	\$ 12,274.45	\$ -	-
2 EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR PROPORCION 70-30. TERMINADO CEPILLADO. COLADO EN MODULOS DE 3.00 X 3.50 MTS. FC=200 KG/C/M2 TMA 1 1/2" INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-002/00 P.U.O.T.	M2	252.55	\$ 319.66	\$ 80,730.13	1,361.30	100.00%	\$ 435,153.16	\$ -	-
3 DENTELLON O MACHUELO PARA CONFINAR EMPEDRADO, EN FORMA RECTANGULAR DE .12*.30*1M. CON CONCRETO DE 200 KG/C/M2 ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y APROCHE CON MATERIAL DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 P.U.O.T	ML	400.00	\$ 133.79	\$ 53,516.00	400.00	100.00%	\$ 53,516.00	\$ -	-
4				134,246.13		100.00%	500,943.61		0.00

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES Y COMENTARIOS.

AVANCE DE TRABAJOS: DEL 0+180.00 AL 0+221.00
252.54 MTS2 DE EMPEDRADO
400 M DE MACHUELO

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00
AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A
ESMERALDA)

FOLIO: SADER-202



LOCALIDAD: Potrerillos

INVERSION: \$512,37

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$500,94

REPORTE FOTOGRAFICO:

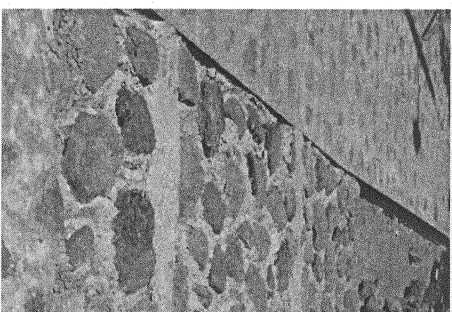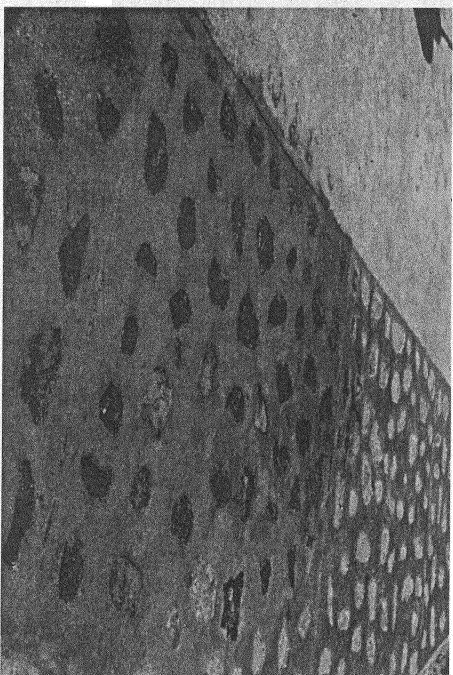

FOTOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. INEIDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
