



Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 1166/2022

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **EDUARDO VENTURA PADILLA**, por la cantidad de; **\$246,752.07 (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 07/100 M.N.)** por concepto de **Estimación 03 y Finiquito**, del programa **FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2022** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRADO EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ”, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6231-2-25.1-050-332

Contrato: N° GMJ 004C- OP/2022

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
1460	05/10/2022	\$213,900.37	\$248,124.43	\$1,372.06	\$246,752.07

Anexo:

1. Factura y Verificación CFDI
2. Estimación 03 y Finiquito
3. Minuta de termino
4. Acta Entrega Recepción
5. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones
6. Fianza de Vicios Ocultos
7. Formato D32 (SAT) opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes



HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024

07 OCT. 2022

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE
JOCOTEPEC, JAL., A 06 DE OCTUBRE DE 2022
“2022, TÚ DECIDES MEJORAR”



C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



EDUARDO VENTURA PADILLA

RFC: VEPE781012JM7

Francisco I. Madero No. 22 Col: S/C C.P.47940 La Ribera
Municipio: Ayotlán Estado: Jalisco País: México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47940
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso del Cfdi: G03 - Gastos en general

Municipio de Jocotepec, Jalisco	CLIENTE	FACTURA :	- 1460
RFC: MJJ850101KP8		Folio Fiscal :	DBBA52A0-03E9-4A8B-A359-8C7E417D78C3
Dirección: Palacio Municipal No. S/N, Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México		Fecha :	5/10/2022 13:11:51
		Moneda :	MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Concepto	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48	72141003	ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE LA OBRA: Estimación tres de la obra: PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRADO DE EQUIPOS DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPOSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. CON No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022. MENOS 5 AL MILLAR (R.L.V. SEFUPU) \$1,372.06 NETO A PAGAR \$246,752.07	213,900.3700	002 - IVA - 34,224.06	213,900.37

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506482489	Subtotal :	213,900.37
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236	I.V.A. :	34,224.06
Fecha y hora de certificación: Octubre 5 2022 - 13:11:53	TOTAL :	248,124.43
Este documento es una representación impresa de un CFDI	Importe con letra:	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N.
CFDI Relacionado:		
Tipo Relación: -		
CFDI Relacionado:		



Sello Digital del CFDI:

WclsU26BJQ8RD8xM1Znrg4CE0C78iGzu7RGzbyeszMVu9mBuanVwKzFNrglGej/GowhUsnkK2eZbtyFq0m6sPH VjEsMoofr/QOowxvShbDUuoyGzxb+qTOZUDzXlEIJ6N1kwaUuFmHofn0xUxywM6M7Y3wngpQ3Ug900v+b5d Wb7pIvPqNc1Laayo0n5tSEHI+ZhGN4sH60cylP2qAhd0eXWpvsurbQySMkRYhm3gq3Z0ioPaR9PUhSLKd9ec KhxoBjd9g+ORNNJXfKRMa7H58z3bA1qHPAU8oovV02KjnimsjaRh+mcn3HSzt9VEmCO6lcw5dpOFpNGrPw==

Sello del SAT

fH1tzUCaxxfoYGEmbZ1j73J2sQJFnfjWak0fidhIqOKJ0OD5dATxbmsv/7dFXckSr0Qp9k485y6GxK SumvsrYRZ0Y9ZaNY8wGyl9+aDhixeKZcLUSnqt9T47eYkpS7MPE8CIPi1Fglv3CRkyp+hdh6rbsY4XC 8pzVsqdcTFHP3Anxif5EHIVQ1pvqoIYe8aBDJhDyjhUBIahSXV7WlStFKCTluf0XWnFyPldcx+aM /rIHqdNA77tgeP/Li/aWkNz+rsjWSKS8ZcIcblGc7fAbpRB++Kt/rMlZtGpotvP5TjOqUeuMywXsg oqajPJeOh7uX2GV/iiFEig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DBBA52A0-03E9-4A8B-A359-8C7E417D78C3|2022-10-05T13:11:53|MAS0810247C0|WclsU26BJQ8RD8xM1Znrg4CE0C78iGzu7RGzbyeszMVu9mBuanVwKzFNrglGej/GowhUsnkK2eZbtyFq0m6s PHVjEsMoofr/QOowxvShbDUuoyGzxb+qTOZUDzXlEIJ6N1kwaUuFmHofn0xUxywM6M7Y3wngpQ3Ug 900v+b5dWb7pIvPqNc1Laayo0n5tSEHI+ZhGN4sH60cylP2qAhd0eXWpvsurbQySMkRYhm3gq3Z0io PaR9PUhSLKd9ecKhxoBjd9g+ORNNJXfKRMa7H58z3bA1qHPAU8oovV02KjnimsjaRh+mcn3HSzt9VEm CO6lcw5dpOFpNGrPw==|00001000000505142236|



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature in blue ink]



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

CONTRATISTA: EDUARDO VENTURA PADILLA

OBRA: Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN: priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

ESTIMACIÓN No. 3 finiquito



FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS			IMPORTES		
A1	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AFORO DE 72 Hrs.			\$	57,823.88	
A2	ENTRONQUES A DEPOSITO			\$	11,027.76	
A5	LINEA AEREA TRIFASICA MEDIA TENSION			\$	180,556.68	
A13	EQUIPO DE CLORACION			\$	25,064.32	
				\$	274,472.64	
				\$	60,572.27	
				\$	213,900.37	
				\$	34,224.06	
				\$	248,124.43	
				\$	-	
				\$	1,372.36	
				\$	246,752.07	
ESTADO CONTABLE			TOTAL:			
ASIGNACIÓN	\$ 1,751,623.97	\$ 280,259.84	\$	2,031,883.81		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 274,472.64	\$ 43,915.62	\$	318,388.26		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,509,334.87	\$ 241,493.58	\$	1,750,828.45		
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,783,807.51	\$ 285,409.20	\$	2,069,216.71		
SALDO POR EJERCER	-\$ 32,183.54	-\$ 5,149.37	-\$	37,332.91		
AMORTIZACION DE ANTICIPO						
ANTICIPO %	\$ 437,905.99	\$ 70,064.96	\$	507,970.95		
AMORTIZACIÓN	\$ 60,572.27	\$ 9,691.56	\$	70,263.83		
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 377,333.72	\$ 60,373.40	\$	437,707.12		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 437,905.99	\$ 70,064.96	\$	507,970.95		
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$	-		
			RESIDENTE DE OBRA			
			CONTRATISTA			
			GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GUERRERO			
			EDUARDO VENTURA PADILLA			
			SUPERVISOR DE OBRA			
			DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS			
			ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ			
			G. IMELDA KARNA PEREZ GONZALEZ			

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 3 FINQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
A1	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AFORO DE 72 Hrs.												
1	AFORO DE 72 Hrs. A 120 Ms. DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO ELECTRICO Y BOMBA CENTRIFUGA, incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	SERV.	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 98,573.86	\$ 98,573.86	\$ -	\$ 98,573.86	\$ -	
2	AMPLIACION DE LA PERFORACION DE POZO A 16" PARA LA COLOCACION DE CONTRA ADEME Y SELLO SANITARIO 2.00 Ms. X 0.40 Ms., incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PDA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 6,125.37	\$ 6,125.37	\$ -	\$ 6,125.37	\$ -	
3	Suministro e instalación de tubo de 16" EN ACERO C-40 PARA CONTRA ADEME., incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	2.00	2.00		2.00	0.00	\$ 1,520.62	\$ 3,041.24	\$ -	\$ 3,041.24	\$ -	
4	COLOCACION DE SELLO SANITARIO, CIMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME, incluye: excavacion, concreto hecho en obra, materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PDA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 10,832.47	\$ 10,832.47	\$ -	\$ 10,832.47	\$ -	
5	PROTECCION SANITARIA SUPERFICIAL TIPO PLANTILLA con 2 tubos engravadores, incluye: concreto hecho en obra, materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PDA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 2,930.55	\$ 2,930.55	\$ -	\$ 2,930.55	\$ -	
6	Suministro e instalación de TUBERIA DE 4" PARA COLUMNA EN ACERO C-40 CON COPLEROS Y ROSCA CONICA, incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	ML	102.40	102.00		102.00	0.40	\$ 1,175.36	\$ 120,356.86	\$ -	\$ 119,886.72	\$ 470.14	

[Handwritten signature]



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Crisobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Crisobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
7	Suministro e instalacion de NIPLA DE 4" x 1.50 Ms. CON COPLA Y ROSCA CONICA, Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$ 2,884.59	\$ 5,769.18	\$ -	\$ 5,769.18	\$ -	
8	Suministro e instalacion de TUBO DE DESCARGA Y PLACA DE 1/2", CON CODO BRIDADO SOLDABLE EN ACERO A 90 GRADOS, Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 7,230.23	\$ 7,230.23	\$ -	\$ 7,230.23	\$ -	
9	Suministro e instalacion de BOMBA MSX6-253460 CON DESCARGA EN 3" Y MOTOR DE 25 H.P. MARCA ALTAMIRA EN ACERO INOXIDABLE 440V. MODELO KOR 10-R25-2, Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 82,916.93	\$ 82,916.93	\$ -	\$ 82,916.93	\$ -	
10	Suministro e instalacion de ARRANCADOR MARCA SIEMENS TENSION REDUCIDA DE 25 A 40 HP. 53 AMP. 440 V., Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 57,823.88	\$ 57,823.88	\$ 57,823.88	\$ -	\$ -	
11	Suministro e instalacion de CABLE 3 HILOS CALIBRE 8 PARA 1000V. DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE PVC. CON 3 CONECTORES CON AISLADORES, Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	ML	100.00	102.00		102.00	-2.00	\$ 170.75	\$ 17,075.00	\$ -	\$ 17,416.50	-\$ 341.50	
12	Suministro e instalacion de MANGUERA DE SONDA DE 3/4" DE DIAMETRO, Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	ML	100.00	102.00		102.00	-2.00	\$ 10.11	\$ 1,011.00	\$ -	\$ 1,031.22	-\$ 20.22	
13	Suministro e instalacion de REDUCCION ESPECIAL DE 4" - 3" Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00			0.00	\$ 2,319.60	\$ 2,319.60	\$ -	\$ 2,319.60	\$ -	
14	RENTA DE GRUA PARA MANIOBRAS DE BOMBA Y COLUMNA.	RENTA	1.00	1.00			0.00	\$ 9,092.01	\$ 9,092.01	\$ -	\$ 9,092.01	\$ -	
									\$ 425,098.18	\$ 57,823.88			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco


UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
A2 ENTRONQUES DE LA RED DE AGUA POTABLE AL DEPOSITO DE CONCRETO Y CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS.													
15	TRAZO EN CALLE PARA ENTRONQUE DE LINEA DE AGUA POTABLE EN 6" AL TANQUE EXISTENTE EN LATERAL DE CARRETERA., incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	88.00	72.00		72.00	16.00	\$ 11.68	\$ 1,027.84	\$ -	\$ 840.96	\$ 186.88	
16	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "C" CON MARTILLO HIDRAULICO EN RED Y CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, incluye RENTA DE MAQUINARIA, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	50.62	47.52		47.52	3.10	\$ 296.33	\$ 15,000.22	\$ -	\$ 14,081.60	\$ 918.62	
17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO B - C PARA SALIDA DE DEPOSITO., incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	1.20	0.00		0.00	1.20	\$ 370.84	\$ 445.01	\$ -	\$ -	\$ 445.01	
18	Suministro e instalacion de TUBERIA DE 6" PVC. RD-41, incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	24.00	12.00		12.00	12.00	\$ 281.22	\$ 6,749.28	\$ -	\$ 3,374.64	\$ 3,374.64	
19	Suministro e instalacion de TUBERIA DE 4" RD-41, incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	60.00	60.00		60.00	0.00	\$ 101.67	\$ 6,100.20	\$ -	\$ 6,100.20	\$ -	
20	Suministro e instalacion de VALVULA COMPUERTA DE 6" FO.FO., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00	1.00	3.00	-1.00	\$ 6,329.25	\$ 12,658.50	\$ 6,329.25	\$ 12,658.50	\$ -6,329.25	
21	Suministro e instalacion de VALVULA COMPUERTA DE 4" FO.FO., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 4,022.29	\$ 4,022.29	\$ -	\$ 4,022.29	\$ -	
22	Suministro e instalacion de EXTREMIDAD DE 6" MM. CLASE 7, incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$ 565.47	\$ 2,261.88	\$ -	\$ 2,261.88	\$ -	
23	Suministro e instalacion de EXTREMIDAD DE 6" PVC. RD-28, incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	4.00	1.00	5.00	-1.00	\$ 599.95	\$ 2,399.80	\$ 599.95	\$ 2,399.80	\$ -599.95	
24	Suministro e instalacion de JUNTA GIUBAULT DE 6" PARA PVC. MM, incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	\$ 583.42	\$ 2,333.68	\$ -	\$ 2,333.68	\$ -	
25	Suministro e instalacion de JUNTA GIUBAULT DE 6" 170mm., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	4.00	1.00	5.00	-1.00	\$ 640.40	\$ 2,561.60	\$ 640.40	\$ 2,561.60	\$ -640.40	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
26	Suministro y aplicación de SELLO PARA MUROS Y PISOS EN DEPOSITO DE CONCRETO DE 117 M2, CON UNA DOSIFICACION A 2 MANOS Y CON LA FORMULA DE CR-GG DOSIFICADA EN PORCENTAJE PARA SU APLICACION., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	117.00	117.00		117.00	0.00	\$ 234.11	\$ 27,390.87	\$ -	\$ 27,390.87	\$ -	
27	Suministro e instalacion de TEE BRIDADA DE 6 x 6" FO.FO., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$ 4,496.37	\$ 8,992.74	\$ -	\$ 8,992.74	\$ -	
28	Suministro e instalacion de CODO BRIDADO DE 6 x 90 FO.FO., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$ 2,573.53	\$ 5,147.06	\$ -	\$ 5,147.06	\$ -	
29	Suministro e instalacion de NIPLE DE 4 x 10" FO. NEGRO., incluye cortes, materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$ 307.33	\$ 614.66	\$ -	\$ 614.66	\$ -	
30	Suministro e instalacion de TAPON HEMBRA DE 4" GALV., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$ 399.09	\$ 798.18	\$ -	\$ 798.18	\$ -	
31	Suministro e instalacion de CODO BRIDADO DE 4 x 90 FO.FO., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$ 1,632.66	\$ 3,265.32	\$ -	\$ 3,265.32	\$ -	
32	Suministro e instalacion de REDUCCION BRIDADA DE 6 x 4" FO.FO., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 1,806.09	\$ 1,806.09	\$ -	\$ 1,806.09	\$ -	
33	Suministro e instalacion de REDUCCION CAMPANA DE 4 x 3" PVC., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 339.60	\$ 339.60	\$ -	\$ 339.60	\$ -	
34	Suministro e instalacion de JUNTA GIUBAULT DE 3" FO.FO., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	1.00		1.00	1.00	\$ 206.50	\$ 413.00	\$ -	\$ 206.50	\$ 206.50	
35	Suministro e instalacion de CARRETE BRIDADO DE 4" x 1.00M., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 3,389.18	\$ 3,389.18	\$ -	\$ 3,389.18	\$ -	
36	Suministro e instalacion de CARRETE BRIDADI DE 6" x 0.50M., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 5,149.53	\$ 5,149.53	\$ -	\$ 5,149.53	\$ -	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotiltan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotiltan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADLLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
37	Suministro e instalacion de CODO DE 6 x 90 EN ACERO AL CARBON SOLDABLE, incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	3.00		3.00	0.00	\$ 1,171.49	\$ 3,514.47	\$ -	\$ 3,514.47	\$ -	
38	Suministro e instalacion de TUBERIA DE 6" EN ACERO AL CARBON, incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	6.40	6.40		6.40	0.00	\$ 1,514.45	\$ 9,692.48	\$ -	\$ 9,692.48	\$ -	
39	Suministro e instalacion de BRIDA SOLDABLE DE 6" EN ACERO AL CARBON, incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$ 769.43	\$ 1,538.86	\$ -	\$ 1,538.86	\$ -	
40	CORTES CON SOPLETE EN TUBERIA DE 6" Y BICELADO CON EQUIPOELECTRICO Y DISCO DEVASTADORES., incluye herramienta equipo de corte, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	CORTE	7.00	7.00		7.00	0.00	\$ 52.99	\$ 370.93	\$ -	\$ 370.93	\$ -	
41	SOLDADURA EN TUBERIA DE 6" CON UN FONDO Y UN RELLENO ENPULGADAS, incluye materiales, renta de planta de luz, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PULGADA	169.56	169.56		169.56	0.00	\$ 46.94	\$ 7,959.15	\$ -	\$ 7,959.15	\$ -	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de doración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlán

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
42	SOLDADURA EN TUBERIA DE 4" CON UN FONDO Y UN RELLENO ENPULGADAS, incluye materiales, renta de planta de luz, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PULGADA	37.60	25.07		25.07	12.53	\$ 46.94	\$ 1,764.94	\$ -	\$ 1,176.79	\$ 588.16
43	Suministro e instalacion de CODO DE 4 x 90 PVC., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 404.94	\$ 404.94	\$ -	\$ 404.94	\$ -
44	Suministro e instalacion de TORNILLO DE 3/4 x 3 1/2", incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	112.00	112.00	16.00	128.00	-16.00	\$ 33.64	\$ 3,767.68	\$ 538.24	\$ 3,767.68	-\$ 538.24
45	Suministro e instalacion de TORNILLO DE 5/8 x 3", incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	56.00	48.00		48.00	8.00	\$ 20.86	\$ 1,168.16	\$ -	\$ 1,001.28	\$ 166.88
46	Suministro e instalacion de JUNTA GIUBAULT DE 4" FO.FO., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	2.00		2.00	-1.00	\$ 333.55	\$ 333.55	\$ -	\$ 667.10	-\$ 333.55
47	Suministro e instalacion de EXTREMIDAD ESPIGA DE 4" PVC., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 214.57	\$ 214.57	\$ -	\$ 214.57	\$ -
48	Suministro e instalacion de TAPA A.P. 50 x50 FO.FO., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	2.00		2.00	-1.00	\$ 3,294.82	\$ 3,294.82	\$ -	\$ 6,589.64	-\$ 3,294.82
49	Suministro e instalacion de CONTRAMARCO SENCILLO DE 4 x 1.80M., incluye materiales, herramienta, equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	1.00	2.00	-1.00	\$ 2,919.92	\$ 2,919.92	\$ 2,919.92	\$ 2,919.92	-\$ 2,919.92
50	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.60 x 1.00 M. CON PLANTILLA Y LOSA DE CONCRETO, incluye los materiales, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 14,800.81	\$ 14,800.81	\$ -	\$ 14,800.81	\$ -
51	SONDEO POR MEDIOS MANUALES EN LINEA DE RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN 6" EN MATERIAL TIPO C, incluye los materiales, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	SONDEO	3.00	3.00		3.00	0.00	\$ 531.08	\$ 1,593.24	\$ -	\$ 1,593.24	\$ -
52	ATRAQUES PRAMIDALES DE CONCRETO COLADO, incluye los materiales, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	8.00	6.00		6.00	2.00	\$ 391.68	\$ 3,133.44	\$ -	\$ 2,350.08	\$ 783.36
53	LMPIEZA GENERAL DE OBRA Y CARGA A CAMION, incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	10.00	9.00		9.00	1.00	\$ 241.41	\$ 2,414.10	\$ -	\$ 2,172.69	\$ 241.41
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE ENTRONQUES DE LA RED DE AGUA POTABLE AL DEPOSITO								\$ 171,752.59	\$ 11,027.76			



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
A3 CERCO PERIMETRAL Y OBRA CIVIL												
54	TRAZO DE TERRENO , incluye los materiales, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	82.00	82.00		82.00	0.00	\$ 11.68	\$ 957.76	\$ -	\$ 957.76	\$ -
55	EXOAVACION EN MATERIAL TIPO C, incluye renta de maquinaria, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	20.50	26.65		26.65	-6.15	\$ 296.33	\$ 6,074.77	\$ -	\$ 7,897.19	\$ -1,822.43
56	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA CIMENTACION TIPO PIEDRA Y/O FILTRO COMPACTADO A REBOTE DE PIZON, CON UN ABUNDAMIENTO DEL 30%, incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	21.32	21.32		21.32	0.00	\$ 299.75	\$ 6,390.67	\$ -	\$ 6,390.67	\$ -
57	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, CON UNADOSIFICACION DE 10.30 COMPACTADO A REBOTE DE PIZON., incluye suministro de material de banco tipo tepetate, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	5.41	5.33		5.33	0.08	\$ 380.44	\$ 2,058.18	\$ -	\$ 2,027.75	\$ 30.44
58	CADENA DE DESPLANTE DE MALLA DE 15 x 15 Mts. INCLUYE ARMADO TIPO ARMEX CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/M2. , incluye los materiales, mano de obra herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	82.00	77.00		77.00	5.00	\$ 212.20	\$ 17,400.40	\$ -	\$ 16,339.40	\$ 1,061.00
59	LIMPIEZA GENERAL, incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	330.00	330.00		330.00	0.00	\$ 24.72	\$ 8,157.60	\$ -	\$ 8,157.60	\$ -
60	CONSTRUCCION DE UN CERCO PERIMETRAL DE 30 x 10 Mts. CON PUERTA DOBLE ABATIBLE DE MAS UNA CHICA, POSTES DE REFUERZO Y MARCO SUPERIOR., incluye materiales adicionales para su construcción, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	CERCO	1.00	1.00		1.00	0.00	\$ 85,305.00	\$ 85,305.00	\$ -	\$ 85,305.00	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CERCO PERIMETRAL Y OBRA CIVIL									\$ 126,344.38	\$ -		
A4 ESTUDIO BACTEREOLÓGICO												
60A	ESTUDIO BACTEREOLÓGICO DEL AGUA NOM-127-SSA1-1994 COMPLETO. INCLUYE RECOLECCION DE MUESTRAS, INFORME DETALLADO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO.	ESTUDIO	1.00	1.00				\$ 56,466.67	\$ 56,466.67	\$ -	\$ 56,466.67	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE ESTUDIO BACTERIOLÓGICO									\$ 56,466.67	\$ -		



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco


UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADLLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
A5	LINEA AEREA TRIFASICA MEDIA TENSION											
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE C12-750 MCA. CENTRIFUGADOS MEXICANOS, MACODE O PROFENCO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion	PZA	4.00	4.00	1.00	5.00	-1.00	\$ 11,304.51	\$ 45,218.04	\$ 11,304.51	\$ 45,218.04	-\$ 11,304.51
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA CCF PARA ACOMETIDA AEREA QUE CONSISTE EN CRUCETA, CORTACIRCUITOS FUSIBLES, ABRAZADERA Y HERRAJES. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	1.00	2.00	-1.00	\$ 11,612.37	\$ 11,612.37	\$ 11,612.37	\$ 11,612.37	-\$ 11,612.37
63	SUMINISTRO E NSTALLACION DE ESTRUCTURA VD30 CONSISTE EN CRUCETA, AISLADORES 22 PD Y PERNO DOBLE ROSCA. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	\$ 8,053.28	\$ 24,159.84	\$ -	\$ 24,159.84	\$ -
64	SUMINISTRO E NSTALLACION DE ESTRUCTURA VR30 CONSISTE EN CRUCETA, AISLADORES ASUS Y PERNO DOBLE ROSCA. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	\$ 10,411.52	\$ 31,234.56	\$ -	\$ 31,234.56	\$ -
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R CONSISTE EN BASTIDOR, AISLADORES, ETC. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	4.00	1.00	5.00	-1.00	\$ 1,666.42	\$ 6,665.68	\$ 1,666.42	\$ 6,665.68	-\$ 1,666.42
66	SUMINISTRO E NSTALLACION DE RETENIDA RSA QUE CONSISTE EN ABRAZADERAS, CABLE DE ACERO 3/8, AISLADORES, PERNO ANCLA, REMATE V 3/8. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00		2,751.91	\$ -	\$ 2,751.91	\$ -
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACSR S.A. CAL. 1/0 MCA. CONDUMEX O VIAKON. CONSIDERANDO DESPERDICIOS. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	MT	400.00	400.00	64.98	464.98	-64.98		113,392.00	\$ 18,420.53	\$ 113,392.00	-\$ 18,420.53
68	SUMINISTRO E NSTALLACION DE ESTRUCTURA 1TR3B EN POSTE, NCLUYE CRUCETA, ABRAZADERA, APARTARRAYOS, CORTACIRCUITOS, VARILLA DE , MANO DE OBRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00		23,774.08	\$ -	\$ 23,774.08	\$ -



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
69	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA DE RELACION 23000/440 VOLTS MARCA GH, Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 65,665.72	\$ 65,665.72	\$ -	\$ -	\$ 65,665.72	
69 A	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA DE RELACION 23000/440 VOLTS MARCA GH, Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	-1.00	\$ 56,549.58	\$ -	\$ -	\$ 56,549.58	-\$ 56,549.58	
70	TRAMITE DE CARTA DE UNIDAD VERIFICADORA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO, INCLUYE PLANOS M.T.	SERV	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 36,032.72	\$ 36,032.72	\$ 36,032.72	\$ -	\$ -	
71	TRAMITES ANTE CFE POR LA SUPERVISION Y CONEXIÓN DE LA LINEA DE M.T	SERV	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 37,389.00	\$ 37,389.00	\$ 37,389.00	\$ -	\$ -	
72	ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, PLANOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INTERPRETACION	SERV	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 9,483.38	\$ 9,483.38	\$ -	\$ 9,483.38	\$ -	
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA, Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 5,647.19	\$ 5,647.19	\$ -	\$ 5,647.19	\$ -	
74	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO REA, CON POSTE DE 7 RETENIDA, AISLADORES, Incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 10,248.02	\$ 10,248.02	\$ -	\$ 10,248.02	\$ -	
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRCILLA DOBLE DE 13 MTS Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 56,549.58	\$ 56,549.58	\$ -	\$ -	\$ 56,549.58	
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE I.T. DE 3X60 AMP EN GABINETE, Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 3,257.21	\$ 3,257.21	\$ 3,257.21	\$ -	\$ -	
77	SUMINISTRO E INSTACION DE BASE DE MEDICION 7-200 CON MUFA PARA ACOMETIDA Y PUESTA A TIERRA SEGÚN NOM DE CFE, Incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 7,252.51	\$ 7,252.51	\$ 7,252.51	\$ -	\$ -	
78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALDAS PARA LUMINARIAS EN CUARTO DE CONTROL. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	\$ 1,740.02	\$ 6,960.08	\$ -	\$ 6,960.08	\$ -	
79	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALDAS PARA CONTACTOS Y APAGADORES, Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	\$ 1,927.57	\$ 7,710.28	\$ -	\$ 7,710.28	\$ -	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlán

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADLLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO DE 440/220 VOLTS DE 45KVA. Incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 8,156.04	\$ 8,156.04	\$ -	\$ -	\$ 8,156.04	
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA ALUMBRADO QO4 CON UNIDADES TERMICAS. Incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 4,380.96	\$ 4,380.96	\$ 4,380.96	\$ -	\$ -	
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 6. Incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	MTS	80.00	0.00	54.00	54.00	26.00	\$ 118.55	\$ 9,484.00	\$ 6,401.70	\$ -	\$ 3,082.30	
83	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS LED DE SOBREPONER. Incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	\$ 582.77	\$ 2,331.08	\$ 2,331.08	\$ -	\$ -	
84	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES DE SUJECION Y CONEXIÓN. Incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 3,495.55	\$ 3,495.55	\$ 3,495.55	\$ -	\$ -	
84A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR, PARA LINEA NEUTRO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00		158.00	159.00	-158.00	\$ 51.44	\$ -	\$ 8,127.52	\$ -	\$ -	\$ 8,127.52
84B	DESAMANTELAMIENTO DE LINEA DE BAJA TENSION EXISTENTE INCLUYE: RETIRO DE PARTES DE BAJA TENSION Y REINSTALACION DE LA MISMA CON ACOMETIDA AEREA EN POSTE DE MEDIA TENSION.	SERV	0.00		1.00	1.00	-1.00	\$ 28,884.60	\$ -	\$ 28,884.60	\$ -	\$ -	\$ 28,884.60
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE LINEA AEREA TRIFASICA MEDIA TENSION									\$ 532,851.80	\$ 180,556.68	\$ 355,407.01		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
A6	TREN DE DESCARGA - POZO PRIVADA ZARAGOZA												
85	Suministro e instalacion de CARRETE DE 4" x 0.50M x 3/4" FO.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 2,468.57	\$ 2,468.57	\$ -	\$ 2,468.57	\$ -	
86	Suministro e instalacion de MEDIDOR DE FLUJO DE 4" Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 6,934.25	\$ 6,934.25	\$ -	\$ 6,934.25	\$ -	
87	Suministro e instalacion de CARRETE DE 4" x 0.25M FO.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 1,533.64	\$ 1,533.64	\$ -	\$ 1,533.64	\$ -	
88	Suministro e instalacion de VALVULA CHECK DE 4" FO.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 4,455.25	\$ 4,455.25	\$ -	\$ 4,455.25	\$ -	
89	Suministro e instalacion de TEE DE 4 x 4" FO.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 3,004.58	\$ 3,004.58	\$ -	\$ 3,004.58	\$ -	
90	Suministro e instalacion de VALVULA COMPUERTA DE 4" FO.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 4,022.29	\$ 8,044.58	\$ -	\$ 8,044.58	\$ -	
91	Suministro e instalacion de BRIDA ROSCADA DE 4" FO.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 715.08	\$ 1,430.16	\$ -	\$ 1,430.16	\$ -	
92	Suministro e instalacion de NIPLA DE 4 x 6" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 260.07	\$ 520.14	\$ -	\$ 520.14	\$ -	
93	Suministro e instalacion de TEE DE 4 x 4" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 2,393.08	\$ 2,393.08	\$ -	\$ 2,393.08	\$ -	
94	Suministro e instalacion de REDUCCION BUSHING DE 4 x 2" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 313.31	\$ 313.31	\$ -	\$ 313.31	\$ -	
95	Suministro e instalacion de CODO DE 4 x 45 GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 638.17	\$ 1,276.34	\$ -	\$ 1,276.34	\$ -	



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlán

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
96	Suministro e instalacion de NIPLA DE 4 x2.00M GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 3,739.77	\$ 3,739.77	\$ -	\$ 3,739.77	\$ -	
97	Suministro e instalacion de ADAPTADOR ESPIGA DE 4" PVC.Titulos_a_imprimir Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 156.01	\$ 156.01	\$ -	\$ 156.01	\$ -	
98	Suministro e instalacion de COPLE DRESSER DE 4" FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 1,450.15	\$ 1,450.15	\$ -	\$ 1,450.15	\$ -	
99	Suministro e instalacion de EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	\$ 38.68	\$ 309.44	\$ -	\$ 309.44	\$ -	
100	Suministro e instalacion de TORNILLO DE 5/8 x3 1/2" Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	\$ 31.83	\$ 2,037.12	\$ -	\$ 2,037.12	\$ -	
101	Suministro e instalacion de NIPLA DE 1 x4" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 33.64	\$ 67.28	\$ -	\$ 67.28	\$ -	
102	Suministro e instalacion de VALVULA ESFERA DE 1"MARCA DICA Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 261.95	\$ 261.95	\$ -	\$ 261.95	\$ -	
103	Suministro e instalacion de NIPLA DE 1 x2" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	\$ 14.53	\$ 43.59	\$ -	\$ 43.59	\$ -	
104	Suministro e instalacion de VALVULA DE AIRE DE 1" FO.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 750.81	\$ 1,501.62	\$ -	\$ 1,501.62	\$ -	
105	Suministro e instalacion de TEE DE 1" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 39.73	\$ 39.73	\$ -	\$ 39.73	\$ -	
106	Suministro e instalacion de VALVULA COMBINADA DE 1" FO.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 2,107.91	\$ 2,107.91	\$ -	\$ 2,107.91	\$ -	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
107	Suministro e instalacion de REDUCCION BUSHING DE 1 A 1/2" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 36.99	\$ 36.99	\$ -	\$ 36.99	\$ -	
108	Suministro e instalacion de NIPLE DE 1/2 x 6" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 15.53	\$ 15.53	\$ -	\$ 15.53	\$ -	
109	Suministro e instalacion de CODO DE 1/2" x 90 GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 124.98	\$ 124.98	\$ -	\$ 124.98	\$ -	
110	Suministro e instalacion de NIPLE DE 1/2 x 4" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 14.53	\$ 14.53	\$ -	\$ 14.53	\$ -	
111	Suministro e instalacion de VALVULA ESFERA DE 1/2" MARCA DICA Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 94.14	\$ 94.14	\$ -	\$ 94.14	\$ -	
112	Suministro e instalacion de REDUCCION BUSHING DE 1/2 x 1/4" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 31.98	\$ 31.98	\$ -	\$ 31.98	\$ -	
113	Suministro e instalacion de TIRABUZON DE 1/4" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 65.90	\$ 65.90	\$ -	\$ 65.90	\$ -	
114	Suministro e instalacion de COUPLE DE 1/4" GALV. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 28.92	\$ 28.92	\$ -	\$ 28.92	\$ -	
115	Suministro e instalacion de MANÓMETRO DE GLICERINA DE 0 A 14 KGS/ CM2 Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 429.75	\$ 429.75	\$ -	\$ 429.75	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE ENTRONQUES DE LA RED DE AGUA POTABLE AL DEPOSITO									\$ 44,931.19	\$ -	\$ -	\$ -	



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlán

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
A7 CRUCERO 1													
116	Suministro e instalación de TEE DE 4 x 4" F.O.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 3,004.58	\$ 3,004.58	\$ -	\$ 3,004.58	\$ -	
117	Suministro e instalación de REDUCCION DE 4 x 2" F.O.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 1,109.36	\$ 1,109.36	\$ -	\$ 1,109.36	\$ -	
118	Suministro e instalación de EXTREMIDAD ESPIGA DE 4" PVC. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	3.00	0.00	3.00	-1.00	\$ 214.57	\$ 429.14	\$ -	\$ 643.71	\$ 214.57	
119	Suministro e instalación de EXTREMIDAD ESPIGA DE 2" PVC. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 181.27	\$ 181.27	\$ -	\$ -	\$ 181.27	
120	Suministro e instalación de JUNTA GIUBAULT DE 4" 115mm. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 333.55	\$ 667.10	\$ -	\$ 667.10	\$ -	
121	Suministro e instalación de JUNTA GIUBAULT DE 2" 65mm. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 271.83	\$ 271.83	\$ -	\$ -	\$ 271.83	
122	Suministro e instalación de EMPAQUE DE NEUPRENO DE 4" Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	\$ 38.68	\$ 116.04	\$ -	\$ 116.04	\$ -	
123	Suministro e instalación de EMPAQUE DE NEUPRENO DE 2" Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 35.90	\$ 35.90	\$ -	\$ -	\$ 35.90	
124	Suministro e instalación de TORNILLO DE 5/8 x 3 1/2" Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	\$ 31.83	\$ 763.92	\$ -	\$ 763.92	\$ -	
125	Suministro e instalación de TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2" Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	\$ 31.23	\$ 124.92	\$ -	\$ -	\$ 124.92	
126	Suministro e instalación de CODO DE 4 x 45 PVC. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 404.93	\$ 404.93	\$ -	\$ 404.93	\$ -	
127	Suministro e instalación de TUBERIA DE 4" PVC. RD-26 Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	ML	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	\$ 210.03	\$ 31,504.50	\$ -	\$ 31,504.50	\$ -	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlán

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
128	Suministro e instalación de TUBERIA DE 2" PVC. RD-26 Incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	ML	60.00	24.00	0.00	24.00	36.00	\$ 65.42	\$ 3,925.20	\$ -	\$ 1,570.08	\$ 2,355.12
129	Suministro e instalación de TAPON CAMPANA DE 2"PVC. Incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 65.18	\$ 65.18	\$ -	\$ 65.18	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CRUCERO 1								\$ 42,603.87	\$ -			



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlán

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
A8 CRUCERO 2													
130	Suministro e instalacion de TEE DE 4 x4" FO.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 3,004.58	\$ 3,004.58	\$ -	\$ 3,004.58	\$ -	
131	Suministro e instalacion de VALVULA COMPUERTA DE 4" FO.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 4,022.29	\$ 8,044.58	\$ -	\$ 8,044.58	\$ -	
132	Suministro e instalacion de EXTREMIDAD ESPIGA DE 4" PVC. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	\$ 214.57	\$ 643.71	\$ -	\$ 643.71	\$ -	
133	Suministro e instalacion de JUNTA GIUBAULT DE 4" 115mm. FO.FO. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	\$ 333.55	\$ 1,000.65	\$ -	\$ 1,000.65	\$ -	
134	Suministro e instalacion de EMPAQUE DE NEUPRENO DE 4". Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	6.00	5.00	0.00	5.00	1.00	\$ 38.68	\$ 232.08	\$ -	\$ 193.40	\$ 38.68	
135	Suministro e instalacion de TORNILLO DE 5/8 x3 1/2". Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	\$ 31.83	\$ 1,273.20	\$ -	\$ 1,273.20	\$ -	
136	Suministro e instalacion de MARCO CON TAPA. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 3,294.82	\$ 6,589.64	\$ -	\$ 6,589.64	\$ -	
137	Suministro e instalacion de CONTRAMARCO DOBLE DECENTRADO CON CANAL DE 6" x 2.00 Mts.. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 2,919.92	\$ 2,919.92	\$ -	\$ 2,919.92	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CRUCERO 2									\$ 23,708.36	\$ -	\$ -	\$ -	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Crisóbal Zapotitlán, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Crisóbal Zapotitlán

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
A9 CRUCERO 3													
138	Suministro e instalación de TEE DE 4 x 4" FO.FO.. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 3,004.58	\$ 3,004.58	\$ -	\$ 3,004.58	\$ -	
139	Suministro e instalación de REDUCCION DE 4 x 2" FO.FO.. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 1,129.91	\$ 1,129.91	\$ -	\$ 1,129.91	\$ -	
140	Suministro e instalación de VALVULA COMPUERTA DE 4" FO.. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 4,022.29	\$ 4,022.29	\$ -	\$ 4,022.29	\$ -	
141	Suministro e instalación de VALVULA COMPUERTA DE 2" FO.. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 1,985.08	\$ 1,985.08	\$ -	\$ 1,985.08	\$ -	
142	Suministro e instalación de EXTREMIDAD ESPIGA DE 4" PVC.. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 214.57	\$ 429.14	\$ -	\$ 429.14	\$ -	
143	Suministro e instalación de EXTREMIDAD ESPIGA DE 2" PVC.. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 181.27	\$ 181.27	\$ -	\$ 181.27	\$ -	
144	Suministro e instalación de JUNTA GUBAULT DE 4" 115mm.. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 333.55	\$ 667.10	\$ -	\$ 667.10	\$ -	
145	Suministro e instalación de JUNTA GUBAULT DE 2" 65mm.. Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 271.83	\$ 271.83	\$ -	\$ -	\$ 271.83		
146	Suministro e instalación de EMPAQUE DE NEUPRENO DE 4". Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	3.00	0.00	3.00	1.00	\$ 38.68	\$ 154.72	\$ -	\$ 116.04	\$ 38.68	
147	Suministro e instalación de EMPAQUE DE NEUPRENO DE 2". Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 35.90	\$ 71.80	\$ -	\$ 71.80	\$ -	
148	Suministro e instalación de TORNILLO DE 5/8 x 3 1/2". Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	32.00	24.00	0.00	24.00	8.00	\$ 31.83	\$ 1,018.56	\$ -	\$ 763.92	\$ 254.64	
149	Suministro e instalación de TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2". Incluye: materiales complementarios , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	\$ 31.23	\$ 249.84	\$ -	\$ 249.84	\$ -	



DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Crisóbal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Crisóbal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
150	Suministro e instalación de MARCO CON TAPA A.P. 50 x50 FO.FO.. incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 3,294.82	\$ 6,589.64	\$ -	\$ 6,589.64	\$ -	
151	Suministro e instalación de CONTRAMARCO DOBLE DESCENTRADO CON CANAL DE 6" x 2.00 Mts.. incluye: materiales complementarios, herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 2,919.92	\$ 2,919.92	\$ -	\$ 2,919.92	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CRUCERO 3								\$ 22,695.68	\$ -				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADLLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
A10 EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, RELLENOS Y CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS													
152	TRAZO DE TERRENO , incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	219.20	174.00		174.00	45.20	\$ 11.68	\$ 2,560.26	\$ -	\$ 2,032.32	\$ 527.94	
153	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B - C CON MARTILLO HIDRAULICO , incluye renta de maquinaria, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	99.00	104.40		104.40	-5.40	\$ 296.33	\$ 29,336.67	\$ -	\$ 30,936.85	-\$ 1,600.18	
154	AFNACION DE ZANJA POR MEDIOS MANUALES , incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	204.00	174.00		174.00	30.00	\$ 14.49	\$ 2,955.96	\$ -	\$ 2,521.26	\$ 434.70	
155	PLANTILLA PARA TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO , incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	13.26	10.44		10.44	2.82	\$ 298.69	\$ 3,960.63	\$ -	\$ 3,118.32	\$ 842.31	
156	RELLENO SEMCOMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO , incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	53.04	46.98		46.98	6.06	\$ 298.69	\$ 15,842.52	\$ -	\$ 14,032.46	\$ 1,810.06	
157	RELLENO TOTAL A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION , incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	53.04	46.98		46.98	6.06	\$ 71.23	\$ 3,778.04	\$ -	\$ 3,346.39	\$ 431.65	
158	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA , incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	66.30	78.22		78.22	-11.92	\$ 241.41	\$ 16,005.48	\$ -	\$ 18,883.09	-\$ 2,877.61	
159	FABRICACION DE ATRAQUES PRAMIDALES FC=250 KG/CM2 Incluye: materiales de construccion , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	6.00	2.00	0.00	2.00	4.00	\$ 391.68	\$ 2,350.08	\$ -	\$ 783.36	\$ 1,566.72	
160	SONDEO POR MEDIOS MANUALES DE TUBERIAS PARA ENTRONQUE A LINEAS EXSTENTES, incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	SONDEO	7.00	3.00	0.00	3.00	4.00	\$ 531.08	\$ 3,717.56	\$ -	\$ 1,593.24	\$ 2,124.32	
161	FABRICACION DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 5 Incluye: materiales de construccion , herramienta, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00		\$ 23,797.98	\$ 47,595.96	\$ -	\$ 47,595.98	\$ -	
162	CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA, MACHUELO, PIEDRA AHOGADA Y PIEDRA ECOLOGICA, incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	17.20	18.00	0.00	18.00		\$ 172.91	\$ 2,992.80	\$ -	\$ 3,132.00	-\$ 139.20	
163	DEMOLICIONDE CONCRETO, BANQUETA, MACHUELO, PIEDRA AHOGADA Y PIEDRA ECOLOGICA, incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	3.60	9.00	0.00	9.00	-5.40	\$ 169.34	\$ 1,689.62	\$ -	\$ 4,224.06	-\$ 2,534.44	
164	REPOSICION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO Y PIEDRA ECOLOGICA , incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M3	0.72	0.90	0.00	0.90		\$ 499.94	\$ 445.98	\$ -	\$ 557.47	-\$ 111.49	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlán

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADLLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
165	REPOSICION DE BANQUETA Y MACHUELO, incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	1.00	0.90	0.00	0.90	0.10	\$ 377.19	\$ 377.19	\$ -	\$ 339.47	\$ 37.72	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y RELLENOS								\$ 133,608.77	\$ -				



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADLLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
A11 CASETA DE MEDICION												
166	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	15.45	17.12		17.12	-1.67	\$ 11.68	\$ 180.46	\$ -	\$ 199.96	-\$ 19.51
167	Excavación de cepa a máquina en material tipo III, de 0.00 a 2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	7.72	7.87		7.87	-0.15	\$ 296.33	\$ 2,287.67	\$ -	\$ 2,332.12	-\$ 44.45
168	Acarreo en camión 1er km, con carga a maquina, incluye: equipo y herramienta.	M3	10.03	10.23		10.23	-0.20	\$ 61.84	\$ 620.26	\$ -	\$ 632.62	-\$ 12.37
169	Omiento de piedra braza, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	6.18	6.52		6.52	-0.34	\$ 2,299.98	\$ 14,213.88	\$ -	\$ 14,995.87	-\$ 781.99
170	Losa de cimentación a base de concreto hidráulico Fc=250 kg/cm2 con espesor de 15 cm, acabado pulido, armada con varilla en lecho medio del firme. Incluye: materiales, siletas de plástico para calzar la malla, elevaciones, desperdicios, acarreo, tendido y acomodo de malla, colado, nivelación, curado, mano de obra y herramienta menor. así como todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	M2	15.45	17.12		17.12	-1.67	\$ 899.53	\$ 13,897.74	\$ -	\$ 15,399.95	-\$ 1,502.22
171	Cadena de Desplante de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de Fc=200 kg/cm2., acabado comun, armado con armex 15-20-4., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amrres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	16.18	16.40		16.40	-0.22	\$ 226.52	\$ 3,665.09	\$ -	\$ 3,714.93	-\$ 49.83
172	Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de Fc=200 kg/cm2., acabado comun, armado con armex 15-20-4., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amrres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	21.60	20.80		20.80	0.80	\$ 226.52	\$ 4,892.83	\$ -	\$ 4,711.62	\$ 181.22
173	Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2				47.30	-0.78	\$ 441.73	\$ 20,549.26	\$ -	\$ 20,893.83	-\$ 344.55
174	Cadena de Corona de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de Fc=200 kg/cm2., acabado comun, armado con armex 15-20-4., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amrres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M				19.40	-0.12	\$ 226.52	\$ 4,367.31	\$ -	\$ 4,394.49	-\$ 27.18
175	Estrudura metálica (vigas I.P.R. ligeras) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	16.00	256.70	0.00	256.70	-240.10	\$ 106.93	\$ 1,775.04	\$ -	\$ 27,448.93	-\$ 25,673.89
176	Suministro y colocacion de boveda de cuña. Incluye: ladrillo, mortero, nivelacion, equipo y herramienta.	M2				17.11	-1.66	\$ 619.00	\$ 9,563.55	\$ -	\$ 10,591.09	-\$ 1,027.54



**DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlán

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
177	Suministro y fabricación de firme en planta baja a base de jalcreto de 8cm de espesor, incluye: acarreo, tendido nivelado, acabado común, terminación con pasta de óm-are 1:5 de 1 cm de espesor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	15.45	17.11	0.00	17.11	-1.66	\$ 278.85	\$ 4,308.23	\$ -	\$ 4,771.12	-\$ 462.89	
178	Suministro y fabricación de relleno en azotea a base de jalcreto de 15cm de espesor, para pendiente pluvial, incluye: acarreo, tendido nivelado, acabado común.	M2	15.45	17.11	0.00	17.11	-1.66	\$ 404.05	\$ 6,242.57	\$ -	\$ 6,913.30	-\$ 670.72	
179	Enbriillado en azotea asentado con mezcla cemento arena en proporción 1:5, incluye: lechada, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	15.45	17.11	0.00	17.11	-1.66	\$ 238.49	\$ 3,684.67	\$ -	\$ 4,080.56	-\$ 395.89	
180	Suministro y colocación de Piso de loseta antiferropante vitromex o similar de 33x33 cm, en 1ra. asentado con pegazulejo, en planta baja, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	15.45	17.11	0.00	17.11	-1.66	\$ 498.60	\$ 7,703.37	\$ -	\$ 8,531.05	-\$ 827.68	
181	Aplanado acabado fino en muros y plafones de planta baja, con mezcla cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	46.35	46.35	0.00	46.35	0.00	\$ 147.48	\$ 6,835.70	\$ -	\$ 6,835.70	\$ -	
182	Puerta abatible de 0.90 x 2.10 m. a base de perfiles tubulares, con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6 mm., acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 9,824.18	\$ 9,824.18	\$ -	\$ 9,824.18	\$ -	
183	Puerta abatible de 1.50 x 2.10 m. a base de perfiles tubulares, con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6 mm., acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 13,140.58	\$ 13,140.58	\$ -	\$ 13,140.58	\$ -	
184	Pintura vinílica en muros marca Comex Real flex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	46.35	46.35	0.00	46.35	0.00	\$ 70.64	\$ 3,274.16	\$ -	\$ 3,274.16	\$ -	
185	Suministro y colocación de salida pluvial con tubo de pvc rd-26, incluye materiales adicionales, herramienta equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza			0.00	1.00	0.00	\$ 498.92	\$ 498.92	\$ -	\$ 498.92	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CASETA DE MEDICION									\$ 131,525.49	\$ -	\$ -	\$ -	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, eledrificación, caseta de control y suministro de equipos de doración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
A12	MURETE DE MEDICION												
186	Excavación por medios manuales en material tipo "T" de 0 a 1.00 m. de profundidad. incluye: señalización y apile del material en el lugar. volumen medido en banco.	pda	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 123.62	\$ 123.62	\$ -	\$ 123.62	\$ -	
187	Orimentacion de piedra braza, asentada con cemento arena 1:4 acabado comun, incluye materiales de construcción, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	\$ 2,299.98	\$ 1,149.99	\$ -	\$ 1,149.99	\$ -	
188	Suministro y colocacion de relleno con material producto de banco tipo tepetate con grava, compactado a rebote de pizon. incluye: acomodo de material por medio mecanicos, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	\$ 380.44	\$ 190.22	\$ -	\$ 190.22	\$ -	
189	Losa de óimentacion a base de concreto hidráulico f _c =250 kg/cm2 con espesor de 15 cm, acabado pulido, armada con varilla en lecho medio del firme. incluye: materiales, sñletas de plástico para calzar la malla, elevaciones, desperdicios, acarreo, tendido y acomodo de malla, colado, nivelación, curado, mano de obra y herramienta menor. así como todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 593.88	\$ 593.88	\$ -	\$ 593.88	\$ -	
190	Cadena de cerramiento de concreto armado de 20 x15 cm acabado comun, con concreto f _c =250kg/cm2, 4 varillas del n° 3 y estribos del n° 2 @20 cm, anclas con varillas del n° 3 @50 cm de 20 cm de largo, incluye: preparación de la superficie, concreto, acero de refuerzo, separadores de varilla, cimbra y descimbra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para cumplir con el proyecto estructural. p.u.o.t.	ML	4.49	4.49	0.00	4.49	0.00	\$ 226.52	\$ 1,017.07	\$ -	\$ 1,017.07	\$ -	
191	Suministro y colocacion de muro de tabique rojo recocido 7x14x28cm, asentado con mezcla cemento-arena 1:4 acabado comun, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	M2	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00	\$ 441.73	\$ 1,554.89	\$ -	\$ 1,554.89	\$ -	
192	Losa de 10 cms de espesor, de concreto a base de tabique rojo recocido de 7 x 14 x 28, asentado con mortero cemento - arena en proporcion 1:4, acabado comun, incluye materiales, mano de obraherramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	\$ 390.25	\$ 522.94	\$ -	\$ 522.94	\$ -	
193	Apñanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporcion de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.45	6.45	0.00	6.45	0.00	\$ 147.48	\$ 951.25	\$ -	\$ 951.25	\$ -	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del depósito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristóbal Zapotitlán

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
194	Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y techos hasta cubrir la superficie. Incluye: preparación de la superficie con sellador, fondo, andamios, protección de superficies, acarrees, elevaciones, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a proyecto y a la especificación general de construcción precio por unidad de obra terminada.	M2	7.79	7.79	0.00	7.79	0.00	\$ 70.64	\$ 550.29	\$ -	\$ 550.29	\$ -	
195	Suministro y colocación de tubo conduit en 2" con curvas y codos a 90 grados así como conectores, incluye materiales adicionales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 1,234.23	\$ 1,234.23	\$ -	\$ 1,234.23	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE MURETE DE MEDICION								\$ 7,888.38	\$ -				



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
A13 EQUIPO DE CLORACION													
196	Suministro e instalacion de DOSIFICADOR LMI MILTON ROY, incluye materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 16,899.05	\$ 16,899.05	\$ 16,899.05	\$ -	\$ -	
197	Suministro e instalacion de ALMACENAMIENTO ENVASE DE PLASTICO, incluye materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	\$ 869.98	\$ 1,739.96	\$ 869.98	\$ -	\$ 869.98	
198	Suministro e instalacion de HIPOCLORITO, incluye materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	KGS	5.00	0.00		0.00	5.00	\$ 11.63	\$ 58.15	\$ -	\$ -	\$ 58.15	
199	Suministro e instalacion de COMPARADOR CLORIMETRICO, incluye materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	0.00		0.00	1.00	\$ 857.88	\$ 857.88	\$ -	\$ -	\$ 857.88	
200	Suministro e instalacion de TUBO DE 1/2" C-80 CON COPLES PARA CLORO incluye materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4.00	0.00	1.00	1.00	3.00	\$ 1,766.09	\$ 7,064.36	\$ 1,766.09	\$ -	\$ 5,298.27	
201	Suministro e instalacion de TABLERO ELECTRICO, incluye materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 1,254.87	\$ 1,254.87	\$ 1,254.87	\$ -	\$ -	
202	Suministro e instalacion de TRANSFORMADOR ELECTRICO, incluye materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00		4,274.33	\$ 4,274.33	\$ 4,274.33	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EQUIPO DE CLORACION								\$ 32,148.60	\$ 25,064.32				
								\$ 1,751,623.96	\$ 274,472.64	-\$ 32,183.54			

EDUARDO VENTURA PADILLA
CONTRATISTA

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

22ND3282850

Clave de R.F.C.

VEPE781012JM7

Nombre, Denominación o Razón social

EDUARDO VENTURA PADILLA

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 19 de octubre de 2022, a las 11:28 horas

Notas

- 1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
- 2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- 3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

Cadena Original

||VEPE781012JM7|22ND3282850|19-10-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

U84lGtDFO8Xs4tkzXdiTEyGwD4K09beXCf1Z2Xrt/kQjrCOLe6BH5tEFBo9EAIp4oFojOIHOIGpzDpnaddVhCrNCJ1w
cfFJ4RmifdWoN1r/OQCKl6t0A8COE4TnBfuTDmEGCO4bUY7wJs7zeXSJRPDR/NlyHA/K82FdsQW1Onwo=




GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.



ESTIMACIÓN: 3 finiquito REP. FOTOGRAFICO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de válvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN: priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan



CONTRATISTA: EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

REPORTE FOTOGRAFICO

A1

EQUIPAMIENTO DE POZO

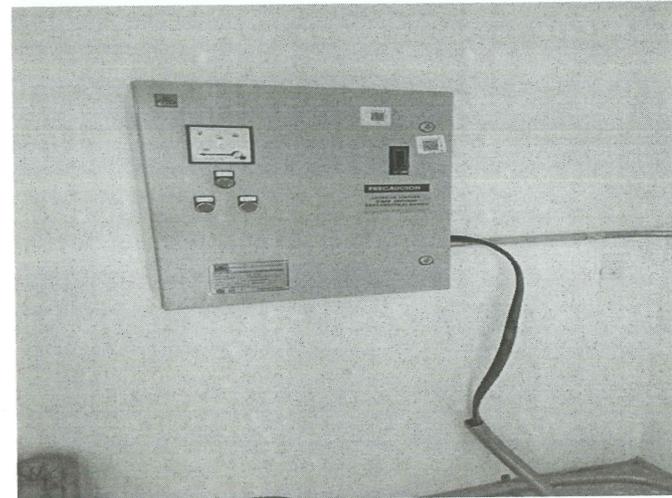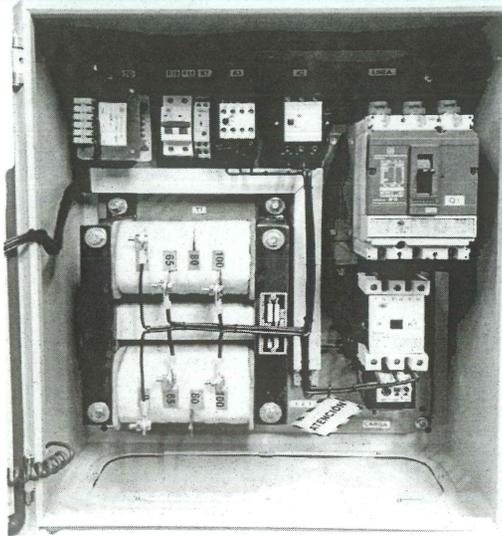

6/7/22

10



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]



ESTIMACIÓN: 3 finiquito REP. FOTOGRAFICO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco



UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

REPORTE FOTOGRAFICO

A2 ENTRONQUES DE RED A DEPOSITO

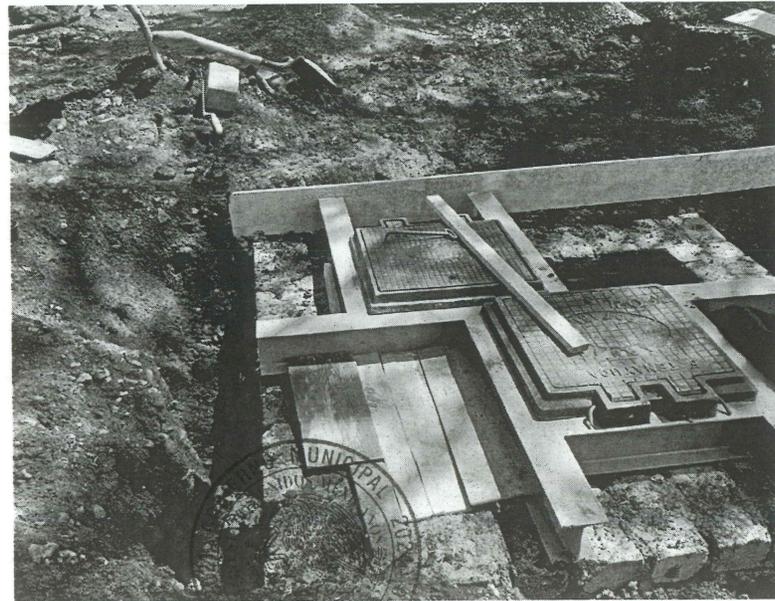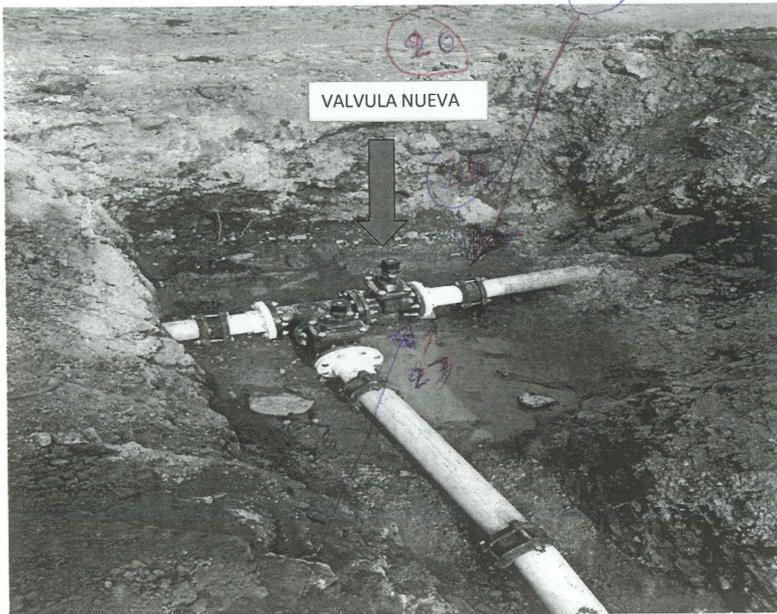

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN: 3 finiquito REP. FOTOGRAFICO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotiltan, del municipio de Jocotepec, Jalisco



UBICACIÓN: priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotiltan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

REPORTE FOTOGRAFICO

A5 LINEA AEREA TRIFASICA MEDIA TENSION

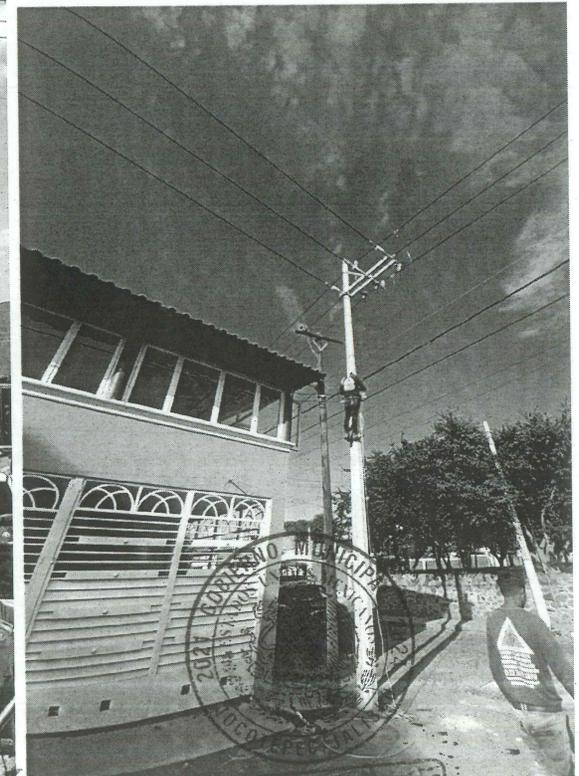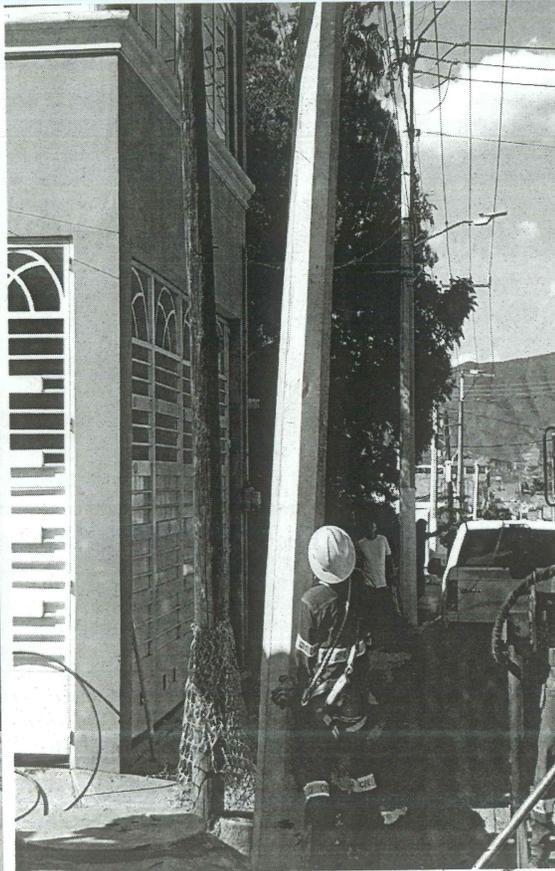

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

6/1/22

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTIMACIÓN: 3 finiquito REP. FOTOGRAFICO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022





OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

REPORTE FOTOGRAFICO

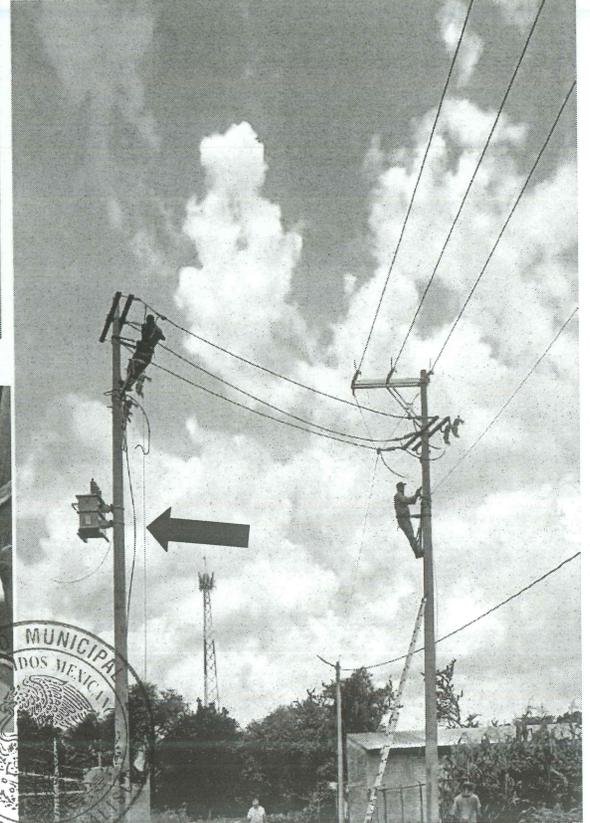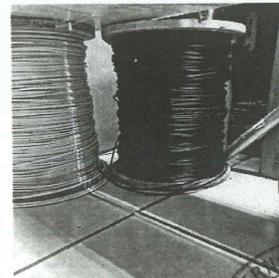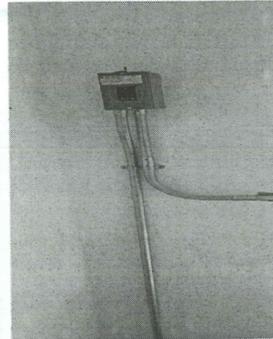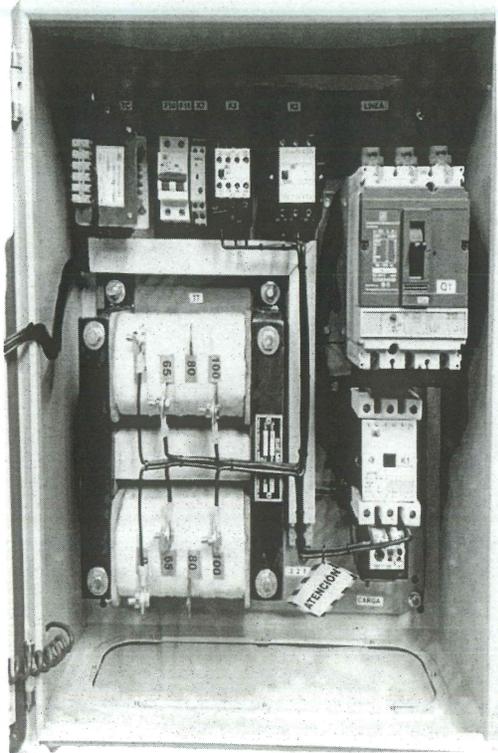

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signatures in blue ink]



ESTIMACIÓN: 3 finiquito REP. FOTOGRAFICO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022



OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

REPORTE FOTOGRAFICO

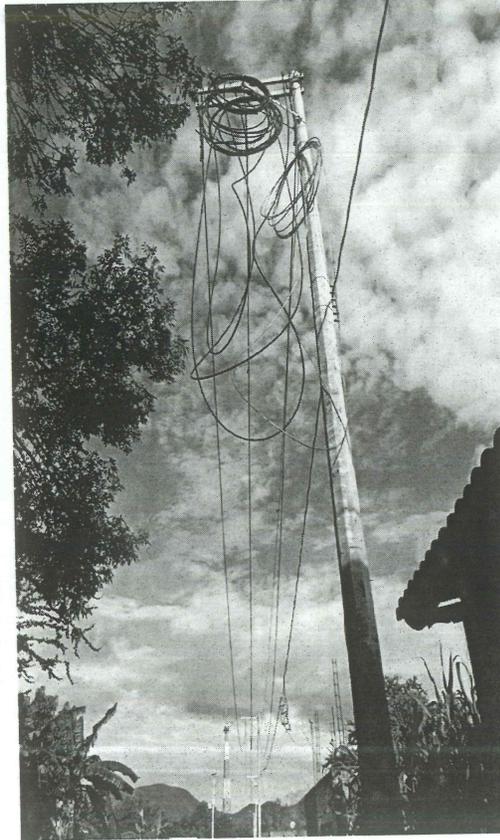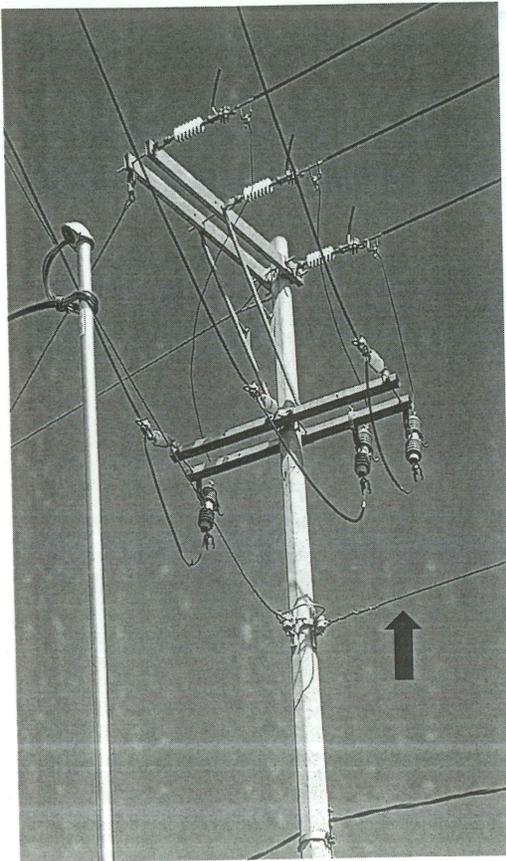

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACIÓN: 3 finiquito REP. FOTOGRAFICO

No. DE CONTRATO: GMJ 004C-OP/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2022

OBRA : Proyecto de equipamiento, electrificación, caseta de control y suministro de equipos de cloración, cerca perimetral del pozo de agua potable de calle privada zaragoza y construcción de sistema a base de valvulas de seccionamiento para el llenado del deposito ubicado entre c. vicente guerrero y c. san jose" en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, del municipio de Jocotepec, Jalisco



UBICACIÓN : priv. Zaragoza, San Cristobal Zapotitlan

CONTRATISTA : EDUARDO VENTURA PADILLA

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2022

REPORTE FOTOGRAFICO

A13 EQUIPO DE CLORACION

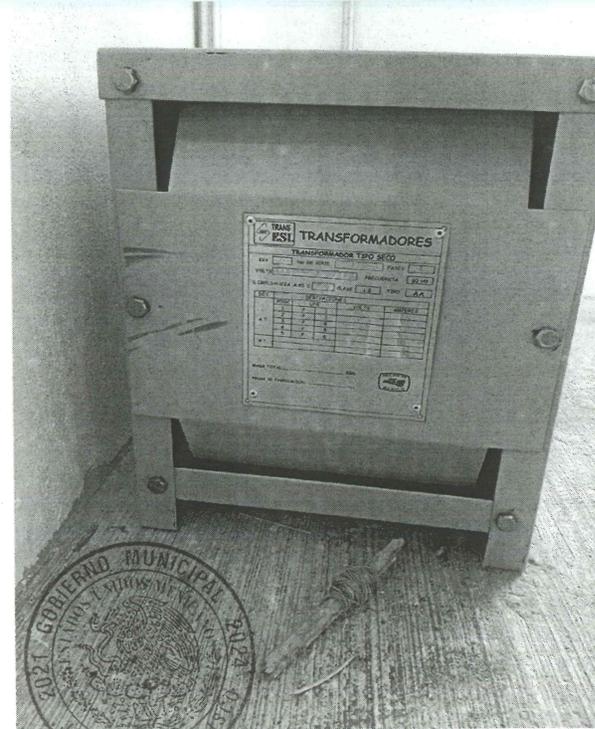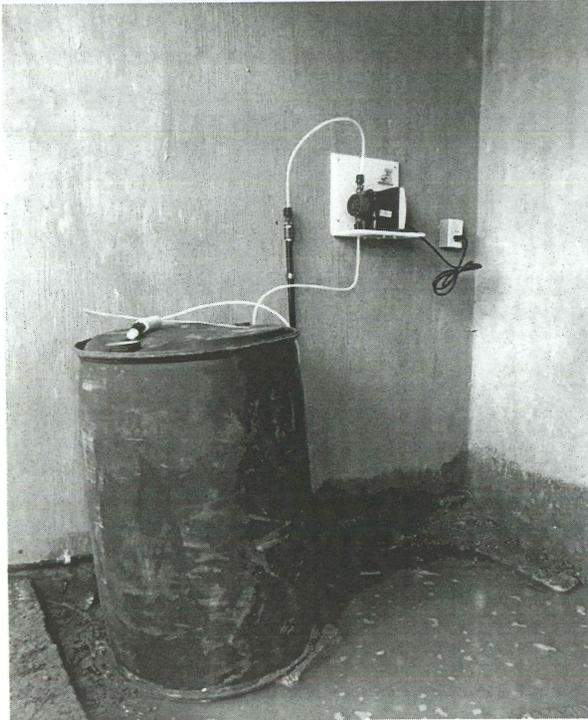

GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



EDUARDO VENTURA PADILLA
CONTRATISTA
Carpetas Asfálticas y Riegos de Sello
R.F. VENTURA PADILLA
FRANCISCO S. TORRES 2032 COL. LA AMERINDA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN JALISCO
TEL. 01-41-346 46461 CEL. 01-41-346 46461 E-MAIL: eduardoventurapadilla.com

EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, CASETA DE CONTROL, SUMINISTRADO EQUIPO DE CLORTACION, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCION DE SISTEMA A BASE DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DE DEPOSITO UBICADO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y SAN JOSE EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN

GENERADOR DE ESTIMACION # 3 FINIQUITO

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
EQUIPAMIENTO DE POZO									
10	ARRANCADOR MARCA SIEMENS TENSION REDUCIDA DE 25 A 40 HP. 53 AMP. 440 V.	PZA				1.00	1.00	1.00	CUARTO CONTROL
ENTRONQUES DE LA RED DE AGUA POTABLE AL DEPOSITO DE CONCRETO Y CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS.									
20	VALVULA COMPUERTA DE 6" FO.FO.	PZA				2.00	2.00	2.00	nueva en llenado tanque
23	EXTREMIDAD DE 6" PVC. RD-26,	PZA				4.00	4.00	4.00	nueva en llenado tanque
25	JUNTA GIUBAULT DE 6" 170mm.	PZA				4.00	4.00	4.00	nueva en llenado tanque
44	TORNILLO DE 3/4 x 3 1/2",	PZA	tornillos p/ conexión =		8	2.00	16.00	16.00	valvula nueva
49	CONTRAMARCO SENCILLO DE 4 x 1.80M.	PZA				1.00	1.00	1.00	caja valvulas x nueva valv.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ficha de pago

DIVISION: JALISCO
ZONA: CHAPALA
FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

REVISIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS AÉREAS, ACOMETIDAS

BANCO BANORTE

CONVENIO: 3820
REFERENCIA: 49830291010836691234

REGIMEN DE APORTACIONES:

SOLICITUD: 00001165/2022
SOLICITANTE: MUNICIPIO DE JOCOCTEPEC
FECHA LIMITE DE PAGO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2022

TIPO DE DEPOSITO:

EFFECTIVO:	
CHEQUE:	

I.V.A. \$:	1,541.88
SUBTOTAL \$:	9,636.77

TOTAL \$:	11,178.65
-----------	-----------

La aportación podrá ser liquidada por transferencia electrónica con el número de referencia, cuenta N°1009355535 y/o la Clabe interbancaria N°072580095000000084. En caso de requerir factura, favor solicitar formato de requisitos de facturación en un plazo no mayor a 3 días hábiles, después de realizado su pago, al correo: alejandro.durand@cfe.mx, francisco.plascencia@cfe.mx, con los siguientes datos: 1.- Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, 2.-R.F.C (cédula emitida por SAT), 3.- Comprobante de pago.



Transferencia Interbancaria SPEI

1 mensaje

<banbajoinforma@bb.com.mx>
Para: hidtsa@gmail.com

jue., 28 de julio de 2022 a la hora 11:05 a.m.

NOTIFICACIONES

Hola **ALDO TRUJILLO GUERRERO**

La siguiente operación ha sido efectuada a través de BajioNet.

Transferencia Interbancaria SPEI

Fecha de Operación:	28-Jul-2022
Hora de Operación:	11:05:16 horas
Cuenta Origen:	CUENTA CONECTA BANBAJIO - *****0201
Nombre del Ordenante:	ALDO TRUJILLO GUERRERO
Cuenta Destino:	CFE Jocotepec - *****0084
Banco Destino:	BANORTE
Nombre del Beneficiario:	Comision Federal de Electricidad
Aplicar:	Mismo Dia
Importe:	\$ 3,670.85 MN
Concepto de Pago:	San Cristobal 49830211070436179264
Referencia:	3820
Comisión:	\$ 7.50 MN
IVA Comisión:	\$ 1.20 MN
Número de Autorización:	272891108
Clave de Rastreo:	BB664507018376

Agradecemos tu preferencia.

Si no reconoces esta operación comunícate a nuestro Centro de Contacto.

"2022 Año de Ricardo Flores Magón,
Precursor de la Revolución Mexicana"

14 NOV. 2022

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NUMERO: PL/1509/2022
Expediente: 00001165/2022

En la ciudad de Chapala, Jal., siendo las 10:00 hrs. del día **04 de octubre del 2022**, reunidos en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en la Av. Estación No. 82 en Chapala, Jal., comparecen por una parte el **Ing. Manuel Alfonso Díaz López**, en su carácter de Superintendente de la Zona Chapala, División Jalisco, por la otra parte el **C. Carlos Alberto Zuñiga Chacon** en su carácter de representante legal, ambas partes de común acuerdo manifiestan haberse cumplido fielmente las normas y procedimientos para la obra: **00001165/2022 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC Privada Zaragoza S/N, Col. San Cristobal** en el Municipio de Jocotepec, Jalisco (20.223146,-103.372022) Cto. San Luis 5110, la cual fue certificada bajo la supervisión del Ing. Luis Antonio Ruvalcaba Acosta.

Entrega: Poste PCR 13-600 (4 pz), Cable AL ACSR 1/0 SA (450 mt) y una toma identificada con el numero de F-8898.

Carlos Alberto Zuñiga Chacon en su carácter de representante legal hace entrega física de las instalaciones correspondientes a la obra señalada en el parrafo anterior, misma que fue construida, según proyecto aprobado mediante la aprobacion oficio N° 2963/2022, de fecha 12/SEP/2022.

El **Ing. Manuel Alfonso Díaz López**, en su carácter de representante de CFE Distribución Zona Chapala recibe las instalaciones antes mencionadas, las cuales serán incorporadas al patrimonio de la institución, para realizar a través de las mismas, las funciones que le otorga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica vigente.

ENTREGA:



CARLOS ALBERTO ZUÑIGA CHACON
REPRESENTANTE LEGAL



ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
CONTRATISTA



ING. ANTONIO MUÑOZ IÑIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE M.C.S.

c.c.p. Ing. Maximiliano Siordia Zambrano
C.A.C. Chapala
MADL/OSR/lara


RECIBE:



MANUEL ALFONSO DÍAZ LÓPEZ
SUPERINTENDENTE ZONA



ING. OSCAR SILVA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN



ING. GILBERTO HIDALGO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN


Ing. Horacio Vega Angel
Jefe del Departamento Comercial
Presente:

Chapala, Jal., a 15 de Noviembre del 2022.
Oficio MCS/275/2022
Asunto: Contratación servicios de fuerza.

Con relación al expediente **No.00001165/2022** donde se da la aprobación al servicio de energía eléctrica a nombre de **MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.** con domicilio en **PRIVADA ZARAGOZA S/N.** Lo anterior con la finalidad de verificar que la documentación y la preparación se encuentran en norma para contratar el servicio solicitado hago de su conocimiento que queda autorizada dicha contratación para que el cliente pase al **C.A.C. EL JOCOTEPEC** para realizar trámite correspondiente, **el cual deberá ser dado de alta con un suministro 2 (ALTA - BAJA),** este oficio tiene una vigencia de 1 mes después de su entrega.

Sin más de momento quedo de Usted.

Atentamente

7A 

Ing. Antonio Muñoz Iñiguez
Jefe del Departamento de Medición, Conexiones y Servicios

C.C.P.- Minutario
AMI/ Imvz

COMETER ENERGIAS RENOVABLES, S.A. DE C.V.
 CER180424IPA
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 José María Gómez #130 Col. Blanco Cuellar,
 Guadalajara, Jalisco; C.P. 44730. MEX
 Teléfono(s): 3333305064
 Lugar y Fecha de Expedición
 C.P: 44730 a Jueves 28 de Abril del 2022 12:27:13

Factura	FA1139
Tipo de Comprobante	I - Ingreso
UUID	d0b45ab3-e2bb-4837-a085-b61de845dc13
Certificado SAT	00001000000509846663
Fecha Timbrado	2022-04-28T12:27:13
Fecha y Hora de Expedición	Jueves 28 de Abril del 2022 12:27:13
No.Certificado	00001000000410962212
Método de Pago	Pago En Parcelalidades o Diferido - PPD
Forma de Pago	Por Definir - 99
Condiciones de Pago	CREDITO
Moneda	MXN
Uso del CFDI	G03 - Gastos en general

Este documento es representación impresa de un CFDI

CLIENTE

GOLC551120KC5
 MA CARMEN GONZALEZ LLAMAS
 KM 14 CARR ZAPOTLANEJO #400 - E , Col. LA LAJA
 C.P. 45438. ZAPOTLANEJO, JALISCO; MEX.



CLAVE SAT	CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
83101803		1	H87 PIEZA	MEDIDOR KI28 AUTOCONTENIDO CON NUMERO R268XR <small>Imp. Traslado Base: \$ 10,344.8300 002-IVA Tasa 16.0000% \$ 1,655.17</small>	\$ 10,344.8300	\$ 10,344.83

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	(+) IVA 16%	TOTAL
DOCE MIL PESOS 00/100 MXN	\$ 10,344.83	\$ 1,655.17	\$ 12,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UzALExNISNINmKEvZEWXh2pYFHBIS+cuE8x2EzWw96lcO17FRn8UIEIHIX/ASJRhxCDof/PgdOpX9mbqhdU+rmo4vhKqccKIWRjghcvuDHVYpZAB+PufeMzm343zbNjYbk5yGixmNw6nwLHDEFSLaLg+wm++VikQINrk+2RIDuo3zKad9aiOU4pqtBkKgmVe7Unuye44iO0cxwR
 uGyKqsyYP46eYOVTPaP9Lat6/4Q4t+9bQuPJJr5kyoB+qVobdAvn9of0/kKkgbwFuf2ePFhdzpxavkDjIwSEW7skXvDWX9HcVvGeerY11ogD31OkL639CSeVb4slg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FRGHlyVm/ADFoLbhOI53KfYQJ93UrcwvMDcQ6vPINur3nElyA/GYy0ma7MHD2ozhs1XbG26MsZLDX9breUaCWaSSzwx6JMioB/xXmr1Ck+1zn6J3T1HIS98Ay3Q6JCnxZmSg3D7/RGXNb5JJUrmWisue8d/JPYluzvighN2aBA2UAgaPOn53nE0SJCqG0tx+EKhhbBK+A+2Je
 NOXLe5JLuCRNFPwH7zv6GldFETHQB9501ARunGZ/Dm3U9//8vclXeli5V8nkW5cQ5hRJaiejZrW2mMjaWWJ7Fue65sVVOGJ+5wB3y4wcW4BekZmR18FwQXVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|d0b45ab3-e2bb-4837-a085-b61de845dc13|2022-04-28T12:27:13|LSO1306189R5|UzALExNISNINmKEvZEWXh2pYFHBIS+cuE8x2EzWw96lcO17FRn8UIEIHIX/ASJRhxCDof/PgdOpX9mbqhdU+rmo4vhKqccKIWRjghcvuDHVYpZAB+PufeMzm343zbNjYbk5yGixmNw6nwLHDEFSLaLg+wm++VikQINrk+2RIDuo3zKad9aiOU4pqtBkKgmVe7Unuye44iO0cxwRao7uGyKqsyYP46eYOVTPaP9Lat6/4Q4t+9bQuPJJr5kyoB+qVobdAvn9of0/kKkgbwFuf2ePFhdzpxavkDjIwSEW7skXvDWX9HcVvGeerY11ogD31OkL639CSeVb4slg==|00001000000509846663|

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital a Través de Internet.
 Emitido en Factura 123, Así de fácil es !
www.factura123.mx

CFDI 3.3

ORIGINAL

DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracciones IV-A y XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 y 99 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica; 112 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y demás disposiciones legales aplicables, en mi carácter de Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, aprobada con registro número: **UVSEIE 578-A**, con acreditación vigente de fecha: **martes, 29 de noviembre de 2016** otorgada por una entidad de acreditación autorizada, y aprobación vigente de la Secretaría de Energía otorgada en oficio No. **314/DGDCEEVS/00010/2017** de fecha **jueves, 5 de enero de 2017**, y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente a las instalaciones para el uso de energía eléctrica que se describen a continuación:

Dictamen de Verificación Folio No.: DVNP12S2-2022-UVSEIE 578-A/000164		Fecha: 21/10/2022
Nombre, denominación o razón social: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC		
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101KP8		
Actividad de la instalación conforme al SCIAN: BOMBEO		
Tensión eléctrica de suministro: (entre conductores)	* Lugar de concentración pública	Instalación Nueva <input checked="" type="checkbox"/>
Hasta 1000 volts () Mayor a 1000 volts (<input checked="" type="checkbox"/>)	* Áreas peligrosas (clasificadas)	Ampliación de una instalación existente
Capacidad de la Subestación 30.00 (kVA)	* Industria	Modificación de una instalación existente
	* Otro POZO DE BOMBEO <input checked="" type="checkbox"/>	Verificación periódica de instalación con áreas peligrosas
Carga instalada 24.38 kW	Subestación para cambio de tensión para la alimentación de la instalación.	
Alcance de la verificación 24.38 kW	Instalación existente construida antes de la entrada en vigor de la NOM-001-SEDE-2012	

Fecha de la próxima verificación para áreas peligrosas (clasificadas): **No Aplica**

NOTAS:

Datos del visitado

Calle: PRIV. ZARAGOZA	No. Exterior: S/N	No. Interior:
Colonia o Población: San Cristóbal Zapotitlán	Municipio o Alcaldía: Jocotepec	
Ciudad y Estado: Jocotepec, Jalisco	Código Postal: 45840	
Teléfono:	Celular: 3316085989	Correo Electrónico: aguapotable@jocotepec.gob.mx

Solicitante del servicio

Nombre: Carlos Alberto Zúñiga Chacón	CURP: ZUCC930515HJCXHR05
Teléfono: Información no disponible	Correo Electrónico: aguapotable@jocotepec.gob.mx

CERTIFICO, en los términos establecidos en los artículos 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, que las instalaciones en cuestión cumplen con las disposiciones aplicables de la **Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)**.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que, en su caso, procedan.

EL TITULAR (O GERENTE) DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN

INSPECCIÓN Y CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE ENERGÍA, S.C.

UVSEIE 578-A

Domicilio: **Avenida Río Nilo, No. 2941, Col. Jardines de La Paz, C.P. 44860, Guadalajara, Jalisco**
Teléfono: **3318629815** Correo electrónico: **icse.uvie@gmail.com**

NOTA – En caso de realizar modificaciones en la instalación eléctrica después de la emisión del presente dictamen, se requerirá que dicha instalación sea verificada para evaluar el cumplimiento con la **Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)**.



EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, CASETA DE CONTROL, SUMINISTRADO EQUIPO DE CLORACION, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCION DE SISTEMA A BASE DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DE DEPOSITO UBICADO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y SAN JOSE EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN

GENERADOR DE ESTIMACION # 3 FINIQUITO

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
LINEA AEREA TRIFASICA MEDIA TENSION									
61	POSTE C12-750 MCA. CENTRIFUGADOS MEXICANOS, MACODE O PROFENCO.	PZA				1.00	1.00	1.00	para conexión calle zaragoza
62	ESTRUCTURA CCF PARA ACOMETIDA AÉREA QUE CONSISTE EN CRUCETA, CORTACIRCUITOS FUSIBLES, ABRAZADERA Y HERRAJES.	PZA				1.00	1.00	1.00	para conexión calle zaragoza
65	ESTRUCTURA 1R , CONSISTE EN BASTIDOR, AISLADORES,	PZA				1.00	1.00	1.00	para conexión calle zaragoza
67	CONDUCTOR ACSR S.A. CAL. 1/0, MCA. CONDUMEX O VIAKON,	MT	21.66			3.00	64.98	64.98	complemento conexión
70	TRAMITE DE CARTA DE UNIDAD VERIFICADORA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO, INCLUYE PLANOS M.T.	SERV				1.00	1.00	1.00	tramite
71	TRAMITES ANTE CFE POR LA SUPERVISION Y CONEXIÓN DE LA LINEA DE M.T	SERV				1.00	1.00	1.00	tramite
76	I.T. DE 3X60 AMP EN GABINETE,	PZA				1.00	1.00	1.00	centro de carga
77	BASE DE MEDICIÓN 7.200 CON MUFA PARA ACOMETIDA Y PUESTA A TIERRA SEGÚN NOM DE CFE,	PZA				1.00	1.00	1.00	base medicion
81	CENTRO DE CARGA PARA ALUMBRADO Q04 CON UNIDADES TERMICAS,	PZA				1.00	1.00	1.00	caseta control
82	CABLE THW CAL 6,	MTS	18.00			3.00	54.00	54.00	de poste a medidor y cto de control
83	LUMINARIOS LED DE SOBREPONER,	PZA				4.00	4.00	4.00	caseta control
84	MATERIALES DE SUJECION Y CONEXIÓN,	PZA				1.00	1.00	1.00	consumibles
84A	CABLE DE ALUMINIO ACSR PARA LINEA NEUTRO	ML	150.00			1.00	150.00		de poste frente pozo a calle
84B	DESMANTELAMIENTO DE LINEA DE BAJA TENSION EXISTENTE	SERV	8.00			1.00	8.00	158.00	de poste a pozo
						1.00	1.00	1.00	baja tension para casas
EQUIPO DE CLORACION									
196	DOSIFICADOR LMI MILTON ROY,	PZA				1.00	1.00	1.00	cto cloracion
197	ALMACENAMIENTO ENVASE DE PLASTICO,	PZA				1.00	1.00	1.00	cto cloracion
200	TUBO DE 1/2" C-80 CON COPLES PARA CLORO	PZA				1.00	1.00	1.00	cto cloracion
201	TABLERO ELECTRICO,	PZA				1.00	1.00	1.00	cto cloracion
202	TRANSFORMADOR ELECTRICO,	PZA				1.00	1.00	1.00	cto cloracion



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Formato de Portada que debe anexarse a los dictámenes de verificación de instalaciones eléctricas, en los servicios de alta tensión y lugares de concentración pública

De conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización), NOM-007-ENER-2014, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales y NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades, o los que los sustituyan.

HAGO CONSTAR, en los términos establecidos en el artículo 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, que la instalación eléctrica ubicada en:

Calle y No.: PRIV. ZARAGOZA S/N
Colonia y Población: San Cristóbal Zapotitlán
Municipio o Delegación: Jocotepec
Ciudad y Estado: Jocotepec, Jalisco
Código Postal: 45840

queda comprendida dentro del campo de aplicación de las siguientes normas oficiales mexicanas, o las que la sustituyan, emitidas por la Secretaría de Energía y deberán cumplir con las disposiciones aplicables a las mismas, presentando ante el organismo suministrador los dictámenes correspondientes para efecto de la contratación del suministro.

Norma Oficial Mexicana	Aplica (si o no)
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización).	Si
NOM-007-ENER-2014, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.	No
NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades.	No

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en los dictámenes de verificación anexos son verdaderos, acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que, en su caso, procedan.

EL TITULAR Ó REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN

INSPECCION Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE ENERGIA S.C.
ING. OSCAR ANDRES CISNEROS SANCHEZ – GERENTE TECNICO

Domicilio: Av. Rio Nilo No. 2941, Col. Jardines de la Paz, Guadalajara, Jalisco.

Teléfono: 01-33-3839-1400

Celular: 044-33-1862-9815

Correo electrónico: icse.uvie@gmail.com

De conformidad con el artículo tercero del ACUERDO que establece el formato de portada de los dictámenes de verificación de las instalaciones eléctricas, en los servicios de alta tensión y lugares de concentración pública, en caso de que exista diferencia o discrepancia en las disposiciones y especificaciones de carácter técnico y jurídico que prevén las normas oficiales mexicanas antes señaladas, así como sus respectivos alcances, prevalecerán y se aplicarán invariablemente las prescripciones contenidas en la NOM001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización).

Ley de la Industria Eléctrica

“Artículo 40. Corresponde al Usuario Final realizar a su costa y bajo su responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, mismas que deberán satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas. Los productos, dispositivos, equipos, maquinaria, instrumentos o sistemas que utilicen para su funcionamiento y operación la energía eléctrica, quedan sujetos al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.”

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica

“Artículo 112. Todas las instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables. La Secretaría podrá verificar el cumplimiento de dichas normas oficiales mexicanas.

Cuando se trate de conexiones de instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica para servicios en Alta Tensión y de la prestación de servicios en lugares de concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Secretaría verifique en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumpla con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas instalaciones.

Se consideran lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones eléctricas a que se refiere el párrafo anterior, los destinados a actividades de esparcimiento, deportivas, educativas, de trabajo, comerciales, de salud, además de cualquier otra área en donde se reúna público en general.

La Secretaría emitirá el acuerdo que determine los lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica, conforme al párrafo anterior.”

No. Folio del Colegio o Asociación: AMUVIE-FPO-16056365



ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.
PRESENTE.

NOS REFERIMOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GMJ 004C-OP/2022 CELEBRADO ENTRE GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC MEDIANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EDUARDO VENTURA PADILLA, COMO CONTRATISTA EL DÍA 09 DE MAYO DE 2022, RELATIVO A **“PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRADO EQUIPO DE CLORACION, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCION DE SISTEMA A BASE DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPOSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSE”** EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, MPIO. DE JOCOTEPEC, JALISCO, DEL CUAL SOLICITAMOS POR ESTE MEDIO, LA EMISION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, CON FECHA: 29 DE JUNIO DE 2022. (FECHA DE CIERRE ADMINISTRATIVO) GARANTIZANDO UN 10 % DEL MONTO TOTAL ESTIMADO DE OBRA, EL CUAL REPRESENTA LA CANTIDAD DE: \$206,921.67 (DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 71/100 M.N).

AL RESPECTO SEÑALAMOS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRA CERRADA ADMINISTRATIVAMENTE AL 100% EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO PACTADO EN DICHO CONTRATO, POR LO TANTO A ESTA FECHA NO TENEMOS RECLAMACIÓN ALGUNA EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y NO SE HAN PRESENTADO DEFECTOS DERIVADOS DE VICIOS OCULTOS.

ATENTAMENTE

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS JOCOTEPEC

