



LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **SERGIO CABRERA**, por la cantidad de; **\$138,722.95 (Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintidós Pesos 95/100 M.N.)** por concepto de complemento de Estimación 02 y Finiquito, del programa **FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6151-2-25.1-050-367

Contrato: GMJ 002C- OP/2023

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
188	24/08/2023	\$120,149.74	\$139,373.70	\$600.75	\$138,722.95

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 02 y Finiquito
4. Fianza Vicios Ocultos
5. Minuta de Termino de Obra
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones
8. D-32 Opinión de Cumplimiento y Obligaciones Fiscales



Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE
JOCOTEPEC, JAL., A 31 DE AGOSTO DEL 2023
"2023, TÚ DECIDES MEJORAR"



C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



Tú decides mejorar

SERGIO CABRERA
Ingeniería de costos
Topografía
Construcción
Supervisión

SERGIO CABRERA

RFC: CASE780113C89

Domicilio: HACIENDA DE LA SABILA No. 120 No. Int 5/N, C.P. 45425, Tonalá, Jalisco, México
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45425
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 188
Fecha: 24/8/2023 14:36:54

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: Palacio Municipal No. SN, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Uso CFDI: 101 - Construcciones

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Régimen Fiscal:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72141001 - Servicio de construcción de calles y carreteras nuevas	PAGO DE ESTIMACION No. 2(DOS) FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS, ETAPA 1. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO DEL CONTRATO No. GMJ 002C-OP/2023. MENOS 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO(R.I.V. SEFUPU) POR LA CANTIDAD DE \$600.75 MONTO EFECTIVO A PAGAR;\$138,772.95	120,149.74	0.00	002 - IVA - 19,223.96	120,149.74



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.

Subtotal: 120,149.74
Impuestos Traslados: 19,223.96
Total: 139,373.70

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000515803161
Folio fiscal: 99CC2789-7BDD-4CE2-806F-CA779410AD53
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 24 2023 - 14:36:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TMcz6+rbNS8Dp89E7tqLdVKxtovGmd/ZuMjhqgRobXOGgVJnnsGm7EHSFMQqX5UIDCLFoiCURgCGi2f0Vont0I/6zW5KflqE85rJFgIiRhAXdGTCQRH/VBm6bHgPLWJk3faNVVkaGJXXGve/mg1elv2HwXUYJoSAJ7th6PIReM B9crfselKQ1N8OikwxS9VvQvADgutBss7svkiiMWKNSicZJvUbvbn9i/hMbplevSyPI9PaC6fc781jWxAWGNM E360kUND+kSJ73DcvG6v5BdZo92BeimYxaK+Pspke/BujQmXs/W7EB/SdIK5TUw25sBq4dAPFd+bV00WKT==

3A+V1cldgfbpHvFW68h+ONgYIY1bMQcE5TPpwioGw+vIXnOZLwYiGdnzditKUSS1rKmv4A9T5W2AqmT
un/QhI7bm1mhI9Su+gkQkMbRmyno6EakOM6PmtOLQ93FFeCUaJWJ7t1t2tPQ5AmmHK2risKleeE9cZmf
X9BOSzJxYM1DIlloxP9X3+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|99CC2789-7BDD-4CE2-806F-CA779410AD53|2023-08-24T14:36:57|MAS0810247C0|TMcz
6+rbNS8Dp89E7tqLdVKxtovGmd/ZuMJhgRobXOGgVJnnsGm7EHSFMQqX5UIDCLFoiCURgCCi2f0Vont
0l/6zW5KfllqE85rJFgIiRhAXdGTCQRH/VBm6bHgPLWJk3faNVVkaGJXXGve/mg1elv2HwXUYjOoSAJ7
th6PIReMB9crfseIKQ1N8OikwxS9VvQvADgutBss7svkiiMWKNSicZjvUbvbn9i/hMbplev5yPI9PaC
6fc781jWxAwGNME360kUNd+k5j73DcvG6v5BdZo92BeimYxaK+Psppe/BujQmXs/W7EB/5diK5TUw25
sBq4dAPFd+bV00WKTW==|00001000000505142236||



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0"
Folio="188" Fecha="2023-08-24T14:36:54" Sello="TMcz6
+rbNS8Dp89E7tqLdVKxtovGmd/ZuMJhgqRobXOGgVJnnsGm7EHSFMQqX5UIDCLFoiCURg
CCi2f0Vont0I/6zW5KfllqE85rJFgIiRhAXdGTCQRH/VBm6bHgPLWJk3faNVVKaGJXXGv
e/mglelv2HwXUYjOoSAJ7th6PIReMB9crfseIKQlN8OikwxS9VvQvADgutBss7svkiMW
KNSicZJvUbvbn9i/hMbpLev5yPl9PaC6fc781jWxAWGNME360kUNd+k5j73DcvG6v5Bd
Zo92BeimYxaK+Psppe/BujQmXs/W7EB/5diK5TUw25sBq4dAPFd+bV00WKTw=="
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000515803161"
Certificado="MIIFyzCCA7OgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTU4MDMxNjEwDQYJKoZI
hvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODDBdVVVRPuklEQUQgQ0VSVELGSUNBRE9SQTEuMCwGA
1UECgwLU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBGGA1UECw
wRU0FULULFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29
Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYUeUEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFULJFUK8x
DjAMBGNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZMBCGALUECAwQ001VREFEIERFIE1FW
E1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUURU1PQzEVMmBGA1UELRMU0FUOTcWZAxTk4zZmVwWg
YJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCTBERSB
TRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1MgQUUwQ090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMjEwMjE1
MDNaFw0yMjEwMjE1MDNaMIGZMRcwFQYDVQQDEw5TRVJHSU8gQ0FCUkVSQTEEXMBUGA
1UEKRMOU0VSR01PIENBQ1JFUKExFzAVBgNVBAoTD1NFUkdJTyBDQUJSRVJBMRYwFAyDVQ
QtEw1DQVNFNzgwMTEzQzQ5MRswGQYDVQQFEw5TRVJHSU8gQ0FCUkVSQTEEXMBUGA
VBAStD1NFUkdJTyBDQUJSRVJBMRIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
3pViS8o6rf8GhXkvdr44J9FxtlQW17TsrlACJuGswV127/KSoDANqhrLWgt58maA91lw
ME4csej6XXTZ0LU4t9LNQwleioM+LbzNkzLtJ8hGu99LyTy6mqyxvaXQNFDRITW57m49
XSQJhWl/uxPfpnrOKVGIsw/ljyGTQDQBgmh1/+7zquqKqRcEGSxsOscHPuoHh1H1GGJN+
7DVt0K8vnk9X53
+PsZWRWDvrDLZWSa1KBugpLN1Noyh/Gd8E/hDj1o7vSz/CCrGz6Yok+usXQe/Oa5VkoYR
g66jPXjolXBuM/LYM24QWiVNG/0tU4kHKEoJi9EBZT7/3wYzOFSQIDAQABox0wGzAMBGN
VHRMBAf8EAjAAMAsGALUdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAC0fbShunrJyX
oHNl4xnz+EbLf/4d8XJJsTsfVHhT6TK9XrTQyEnHZsBwaxPXauqwws2t+pe4QTuDKZ6S
zohWx32et1lyvi61l1tkYNq2kwldeGdaa7ng/aJufCW3ZiL5/
+RUFdu0cJWgutW3Hr6SsUv2UAp24wtoRckBQ4oYx0P6WJhQ+
6FxsarcR4jxVxcqTv5VS7P5PYMx1wk4yFFw+fpR++aS+NWwxwpgotvTA/qIzd5Q2odp28
w3A9Rqpk1TADOWa/7hjCjeHR/e53tJSpE26Tsa09M2FwNkg5/a7pFe1UtmcvdSJgzdXU
WHWP+owmIXMRMwtUZLFrPj1zZ/Wy6jy0OKXZk+Y7RtkEdoDXmH03DBzJhDEE0lbTmSwET
qTpiBaPlZ11DCrJyrb32z4h4RwoMi3CdBpR/TltjDsyk9zLaulsBtHol4Y5Blra4WsKDP
E330hGy4+P4IoGxm1Ef88zYPytmyNM6hC+HpFCPhsbgwwy5Wkb6I+
9mlVq+sS3SUZrxYhcu/BuUut658OIEQxwEsaAHnmzGWhnf4a4rpfRGMzAH59u6UHCXX
sLzNWS/ItkvwvZHDz+K8qmF9fvffdlYmLUtHCBRIfcKkKjkmLIg31NjX9Fh153hR4TY
JRnFpdETfJq69GMIWlfuyGtC13IMjRRNIMQ5x0=" SubTotal="120149.74"
Moneda="MXN" Total="139373.70" TipoDeComprobante="I" Exportacion="0"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45425">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="CASE780113C89"
Nombre="SERGIO CABRERA"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor
Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO"
DomicilioFiscalReceptor="45800" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="I01"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141001" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.00" Unidad="SERVICO" NoIdentificacion="SERV0015"
Descripcion="PAGO DE ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO OBRA:
CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA
HASTA LA CALLE FILOSOFOS, ETAPA 1. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC JALISCO
DEL CONTRATO No.
GMJ 002C -OP/2023.

MENOS 5 AL MILLAR
PARA CONTRALORIA
DEL ESTADO (R.I.V.

SEFUPU) POR LA
CANTIDAD DE
\$600.75
MONTO EFECTIVO
A
PAGAR;\$138,772.95" ValorUnitario="120149.74"
Importe="120149.74" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="120149.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="19223.96"/></cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos



TotalImpuestosTrasladados="19223.96"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="19223.96" Base="120149.74"/></cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFi
scalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
UUID="99CC2789-7BDD-4CE2-806F-CA779410AD53"
FechaTimbrado="2023-08-24T14:36:57" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="TMcz6
+rbNS8Dp89E7tqLdVKxtovGmd/ZuMJhggRobXOGgVJnnsGm7EHSFMQqX5UIDCLFoiCURg
CCi2f0VontOI/6zW5Kf11qE85rJFgIiRhAXdGTCQRH/VBm6bHgPLWJk3faNVVKaGJXXGv
e/mgl1elv2HwXUYjOoSAJ7th6PIReMB9crfseIKQ1N8OikwxS9VvQvADgutBss7svkiiMW
KNSicZJvUbbvbN9i/hMbplev5yPl9PaC6fc781jWxAWGNME360kUNd+k5j73DcvG6v5Bd
Zo92BeimYxaK+Pspkpe/BujQmXs/W7EB/5diK5TUw25sBq4dAPFd+bV00WKTW=="
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="LQis5Pp+A70bazMp/Ery3KaDhAIvqkx4dK7CEXfDM830mRcHun84Zt2xRWf
PO8ahl/kCFJd8HgRauwuLXyAuLR7mF/KHx9MwTggbgvLKkmMvuklI6oWPC9u+Z1JL/biXD
tJFpVLZeotJd8yabg+dddxrsVr40qTId3A+V1cldgfbfpHvfw68h+ONgYIY1bMQcE5TPp
wiOgw+v1XnOZLwYiGdnzditKUSslrKmv4A9T5W2AqmTun/QhI7bmlmhl9Su+gkQkMbRmy
no6EakOM6PmtOLQ93FFeCUaJWj7t1t2tPQ5AmmHK2risKlEeE9cZmfX9BOSzJxYM1Dllo
xP9X3+w=="></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



[Handwritten signature]
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CASE780113C89	SERGIO CABRERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99CC2789-7BDD-4CE2-806F-CA779410AD53	2023-08-24T14:36:54	2023-08-24T14:36:57	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139,373.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Imprimir

SERGIO CABRERA
CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.
 R.F.C. CASE780113C89

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	No. DE CONTRATO: GMJ 002C- OP/2023	HOJA DE RELACIÓN	HOJA No. 1 DE 1
	CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS, ETAPA 1	PERIODO DE TRABAJO:	
	UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL	DEL:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023
		FECHA:	16 DE MAYO DE 2023

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES	
A	EMPEDRADO				\$	48,173.18
A01	EMPEDRADO				\$	71,976.56
B	EXTRAORDINARIOS					
 				MONTO DE ESTIMACIÓN	\$	120,149.74
				MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$	-
				SUBTOTAL.	\$	120,149.74
				I. V. A. 16%	\$	19,223.96
				SUMA	\$	139,373.70
				MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$	600.75
				NETO A PAGAR	\$	138,772.95
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL			
ASIGNACIÓN	\$ 1,560,492.20	\$ 249,678.75	\$ 1,810,170.95			
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 120,149.74	\$ 19,223.96	\$ 139,373.70			
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,504,438.98	\$ 240,710.24	\$ 1,745,149.22			
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,624,588.72	\$ 259,934.19	\$ 1,884,522.91			
SALDO EXCEDENTE	-\$ 64,096.52	-\$ 10,255.44	-\$ 74,351.96			
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				ING. SERGIO CABRERA		
ANTICIPO %	\$ -	\$ -	\$ -	EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO		EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	<i>Daniel Rodriguez V.</i>		
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ -	\$ -	\$ -	DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA		IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ -	\$ -	\$ -			
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -			

SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.
R.F.C. CASE780113C89

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 2(DOS) FINIQUITO

PERÍODO: DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023

OBRA : CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS, ETAPA 1



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA : SERGIO CABRERA

FECHA : 16 DE MAYO DE 2023

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ													
A	EMPEDRADO												
A01	EMPEDRADO												
ADS-L-EMP-01	TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	1,209.14	1,268.82	0.00	1,268.82	- 59.68	\$13.26	\$16,033.20	\$0.00	\$16,824.55	-\$791.36	
ADS-L-EMP-02	EXCAVACIONES EN CAJA EN MATERIALES TIPO II Y III PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO MEDIANTE TRACTOR Y EXCAVADORA CON MARTILLO	M3	483.86	507.51	0.00	507.51	- 23.85	\$161.05	\$77,893.44	\$0.00	\$81,734.49	-\$3,841.04	
ADS-L-EMP-03	ESCARIFICACION, COMPACTACION, HUMECTACION Y CONFORMACION PARA DAR NIVELES DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PESO MAXIMO	M3	241.83	253.75	0.00	253.75	- 11.92	\$172.17	\$41,835.87	\$0.00	\$43,888.14	-\$2,052.27	
ADS-L-EMP-04	FORMACION DE CAPA BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO	M2	1,209.14	1,268.82	0.00	1,268.82	- 59.68	\$254.51	\$307,738.22	\$0.00	\$322,927.38	-\$15,189.16	
ADS-L-EMP-05	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAPA DE EMPEDRADO ASENTADO EN MORTERO DE 20 CMS ESPESOR CON PIEDRA BOLA O DE BANCO	M2	759.76	717.03	0.00	717.03	42.73	\$668.53	\$500,324.75	\$0.00	\$472,184.38	\$28,140.37	
ADS-L-EMP-06	CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 KG/CM2 DE RESISTENCIA COLOR ROJO INTEGRADO ACABADO PIEL DE ELEFANTE O SIMILAR	M2	387.96	551.81	0.00	551.81	- 163.85	\$918.14	\$356,201.59	\$0.00	\$506,638.83	-\$150,437.24	
ADS-L-EMP-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO TIPO "L" DE CONCRETO Fc=200 Kg/Cm2 DE 20 DE BASE Y 35 CMS ALTURA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	311.00	98.13	0.00	98.13	212.87	\$615.93	\$191,554.23	\$0.00	\$60,441.21	\$131,113.02	
ADS-L-EMP-08	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO EN MACHUELOS, COLOR AMARILLA O BLANCA, CUMPLIENDO CON ESPESOR DE 0.38 A 0.51 MILIMETROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	311.00	0.00	282.00	282.00	29.00	\$124.19	\$38,823.09	\$35,021.58	\$0.00	\$3,801.51	
ADS-L-EMP-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS METALICOS Y TORNILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2 1/2" POR 1/4" DE DIAMETRO INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	102.00	0.00	44.00	44.00	58.00	\$298.90	\$30,487.80	\$13,151.60	\$0.00	\$17,336.20	
Total:	EMPEDRADO								\$1,560,492.20	\$48,173.16	\$1,504,438.98	\$7,880.04	
B	EXTRAORDINARIOS												
EXT-001	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO	M2	0.00	0.00	32.28	32.28	32.28	\$92.84	\$0.00	\$2,996.88	\$0.00	\$0.00	
EXT-002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	0.00	0.00	32.28	32.28	32.28	\$26.24	\$0.00	\$847.03	\$0.00	\$0.00	
EXT-004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 Cm. DE ESPESOR, DE CONCRETO Fc=200 Kg/Cm2 DE RESISTENCIA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	0.00	0.00	32.28	32.28	32.28	\$418.99	\$0.00	\$13,525.00	\$0.00	\$0.00	
EXT-005	LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	0.00	0.00	1,308.92	1,308.92	1,308.92	\$12.53	\$0.00	\$16,400.77	\$0.00	\$0.00	
EXT-006	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	0.00	0.00	484.49	484.49	484.49	\$78.86	\$0.00	\$38,206.88	\$0.00	\$0.00	
Total:	EXTRAORDINARIOS								\$0.00	\$71,976.56	\$0.00	\$0.00	
									SUMA	\$ 1,560,492.20	\$ 120,149.74	\$ 1,504,438.98	-\$ 64,096.52
									IVA	\$ 249,678.75	\$ 19,223.96	\$ 240,710.24	-\$ 10,255.44
									TOTAL	\$ 1,810,170.95	\$ 139,373.70	\$ 1,745,149.22	-\$ 74,351.96



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. SERGIO CABRERA
PERSONA FISICA

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

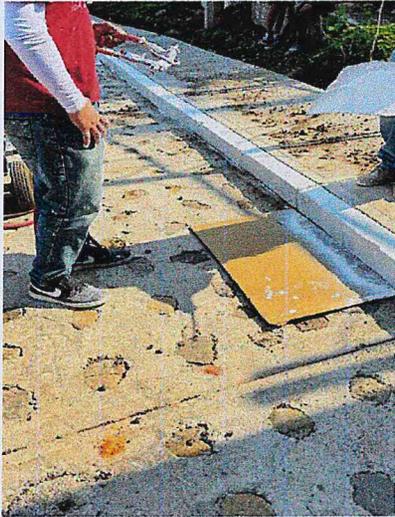EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1			
ADS-L-EMP-08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN MACHUELOS,, COLOR AMARILLA O BLANCA, CUMPLIENDO CON ESPESOR DE 0.38 A 0.51 MILIMETROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA	
			
			
 ING SERGIO CABRERA EL CONTRATISTA		 DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	
			



SERGIO CABRERA


CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1	
ADS-L-EMP-08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN MACHUELOS,, COLOR AMARILLA O BLANCA, CUMPLIENDO CON ESPESOR DE 0.38 A 0.51 MILIMETROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	CROQUIS

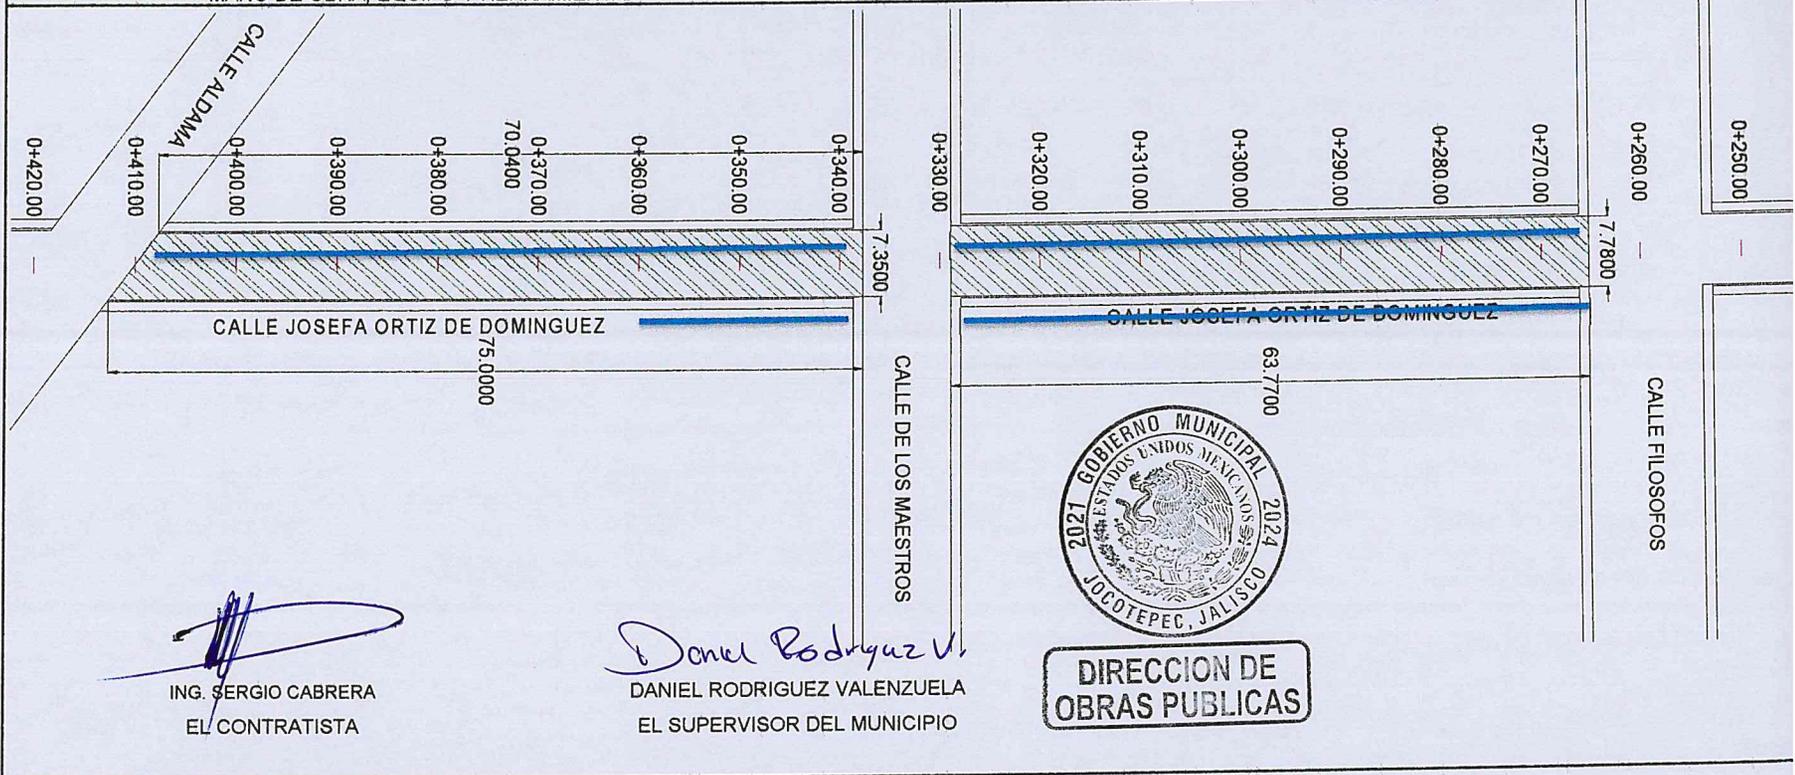





SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023
	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1		
ADS-L-EMP-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS METÁLICOS Y TORNILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2		FOTOGRAFÍA

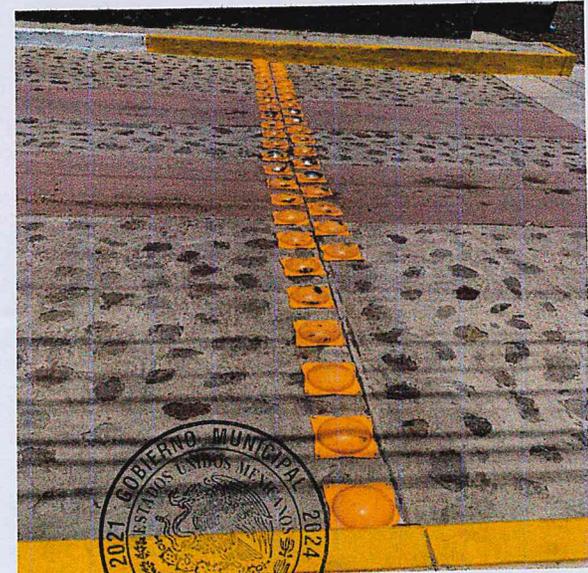


ING. SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA


DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1			
ADS-L-EMP-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS METÁLICOS Y TORNILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2	CROQUIS	
ING. SERGIO CABRERA EL CONTRATISTA	Daniel Rodriguez V. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1			
EXT-001	DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO	FOTOGRAFÍA	

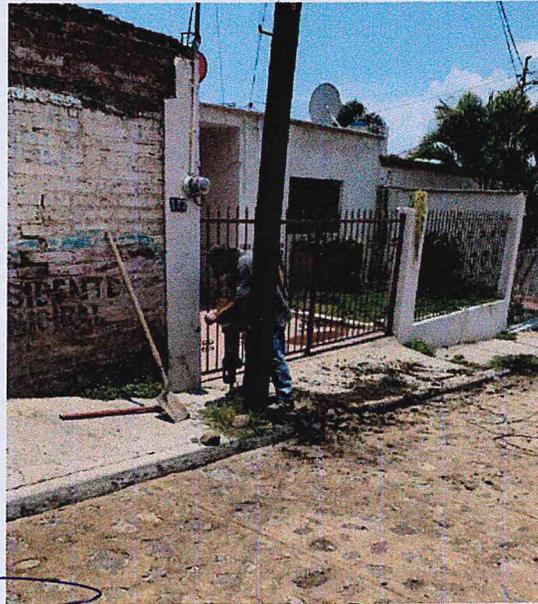


ING. SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA


DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023
EXT-001	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1 DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO	CROQUIS	

Diagram showing the layout of Calle Josefa Ortiz de Dominguez, Calle Aldama, Calle de los Maestros, and Calle Filósofos. The diagram includes stationing markers (e.g., 0+420.00, 0+340.00) and dimensions (e.g., 7.3500, 7.7800). A hatched area indicates the area to be demolished.

ING. SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024
JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



SERGIO CABRERA


CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89


EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		


LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1		
EXT-002	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA

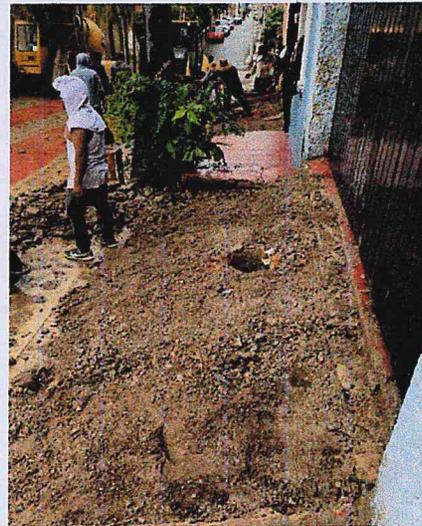

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


ING. SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA


DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SERGIO CABRERA


CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.


R.F.C. CASE780113C89


EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023

EXT-002	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1 AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	CROQUIS
---------	---	---------

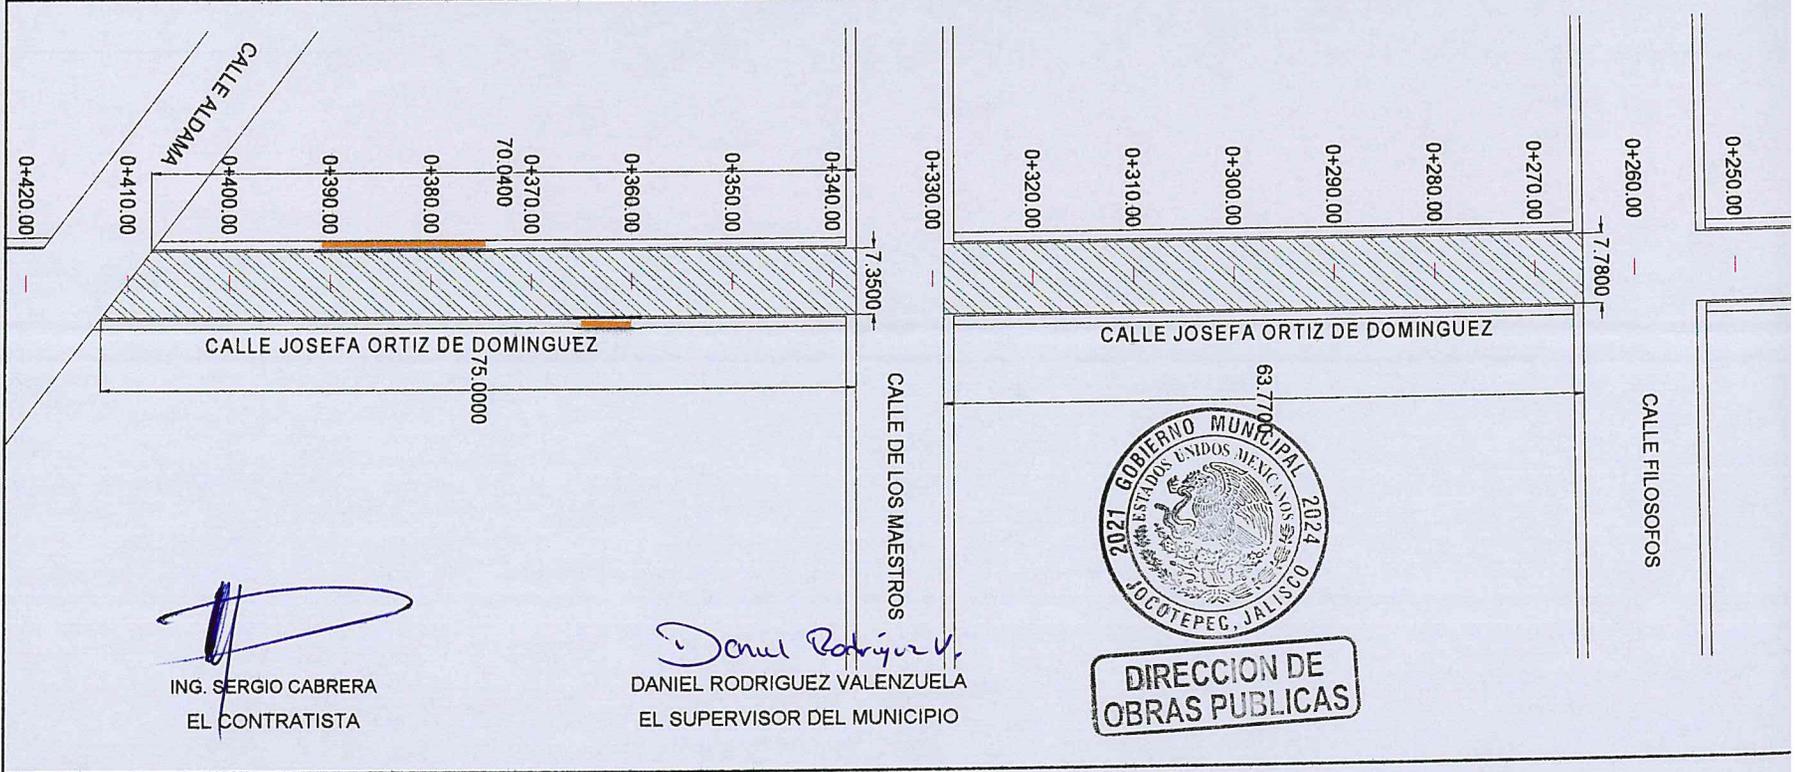


 ING. SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA


 DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO








SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1			
EXT-004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 Cm. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200 Kg/Cm2.DE RESISTENCIA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA	

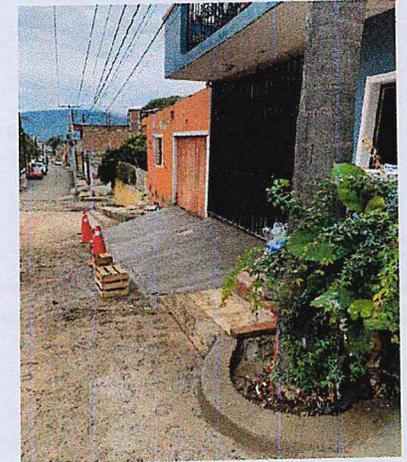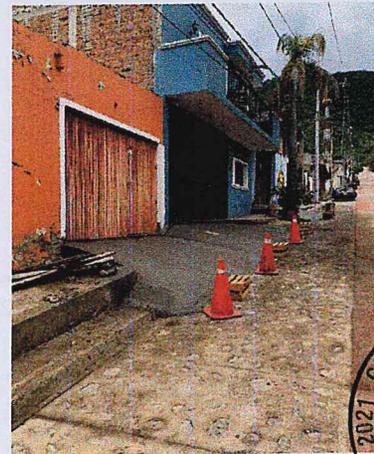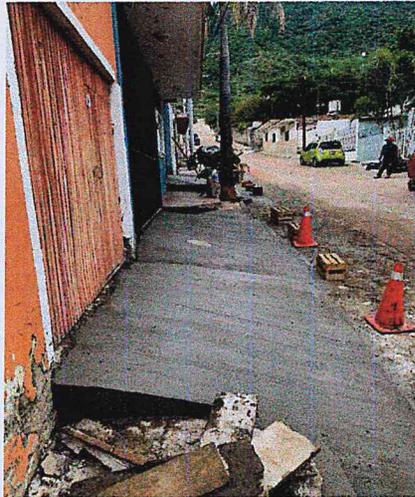

ING. SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez Valenzuela
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023

EXT-004	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 Cm. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200 Kg/Cm2. DE RESISTENCIA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS
---------	---	---------





SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1	
--	--

EXT-005	LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS.
---------	---	----------

UNIDAD	CADENAMIENTO		LONGITUD	LARGO PROMEDIO	ANCHO	PZA	TOTAL	
M2	0+252.00	0+410.00	158.00		1.77	1.00	279.79	Entre calle Aldama y calle de los Maestros
M2	0+335.00	0+415.00	80.00	74.27	2.15	1.00	159.68	Entre calle Aldama y calle de los Maestros
M2	0+335.00	0+415.00	80.00	72.40	1.00	1.00	72.40	Entre calle Aldama y calle de los Maestros
M2	0+335.00	0+415.00	80.00	70.65	1.80	1.00	127.16	Entre calle Aldama y calle de los Maestros
M2	0+258.85	0+330.00	71.15	63.77	2.20	1.00	140.29	Entre calle de de los Maestros y calle Filósofos
M2	0+258.85	0+330.00	71.15	63.77	1.00	1.00	63.77	Entre calle de de los Maestros y calle Filósofos
M2	0+258.85	0+330.00	71.15	63.77	2.18	1.00	139.02	Entre calle de de los Maestros y calle Filósofos
M2	0+335.00	0+415.00	80.00	73.14	1.20	1.00	87.77	Entre calle Aldama y calle de los Maestros
M2	0+335.00	0+415.00	80.00	71.66	1.20	1.00	85.99	Entre calle Aldama y calle de los Maestros
M2	0+258.85	0+330.00	71.15	63.77	1.20	2.00	153.05	Entre calle de de los Maestros y calle Filósofos
						SUMA	1,308.92	

BANQUETAS
 EMPEDRADO
 EMPEDRADO
 EMPEDRADO
 EMPEDRADO
 EMPEDRADO
 EMPEDRADO
 HUELLAS
 HUELLAS
 HUELLAS

ING. SERGIO CABRERA
 EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS





SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1			
EXT-005	LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA	

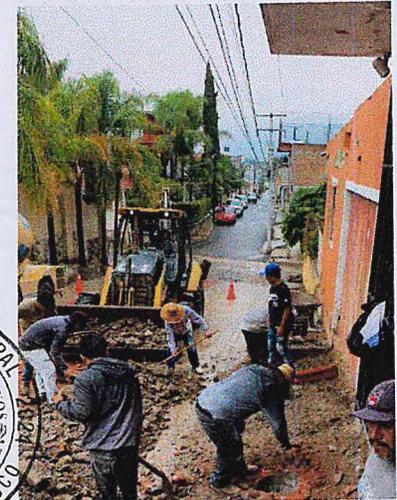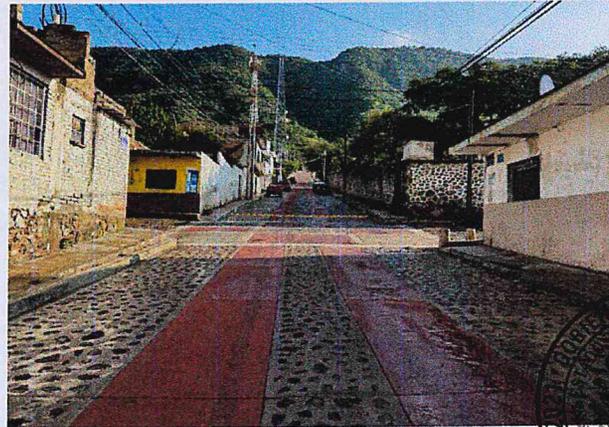

ING. SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



SERGIO CABRERA


CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023

EXT-005	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1 LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS
---------	---	---------

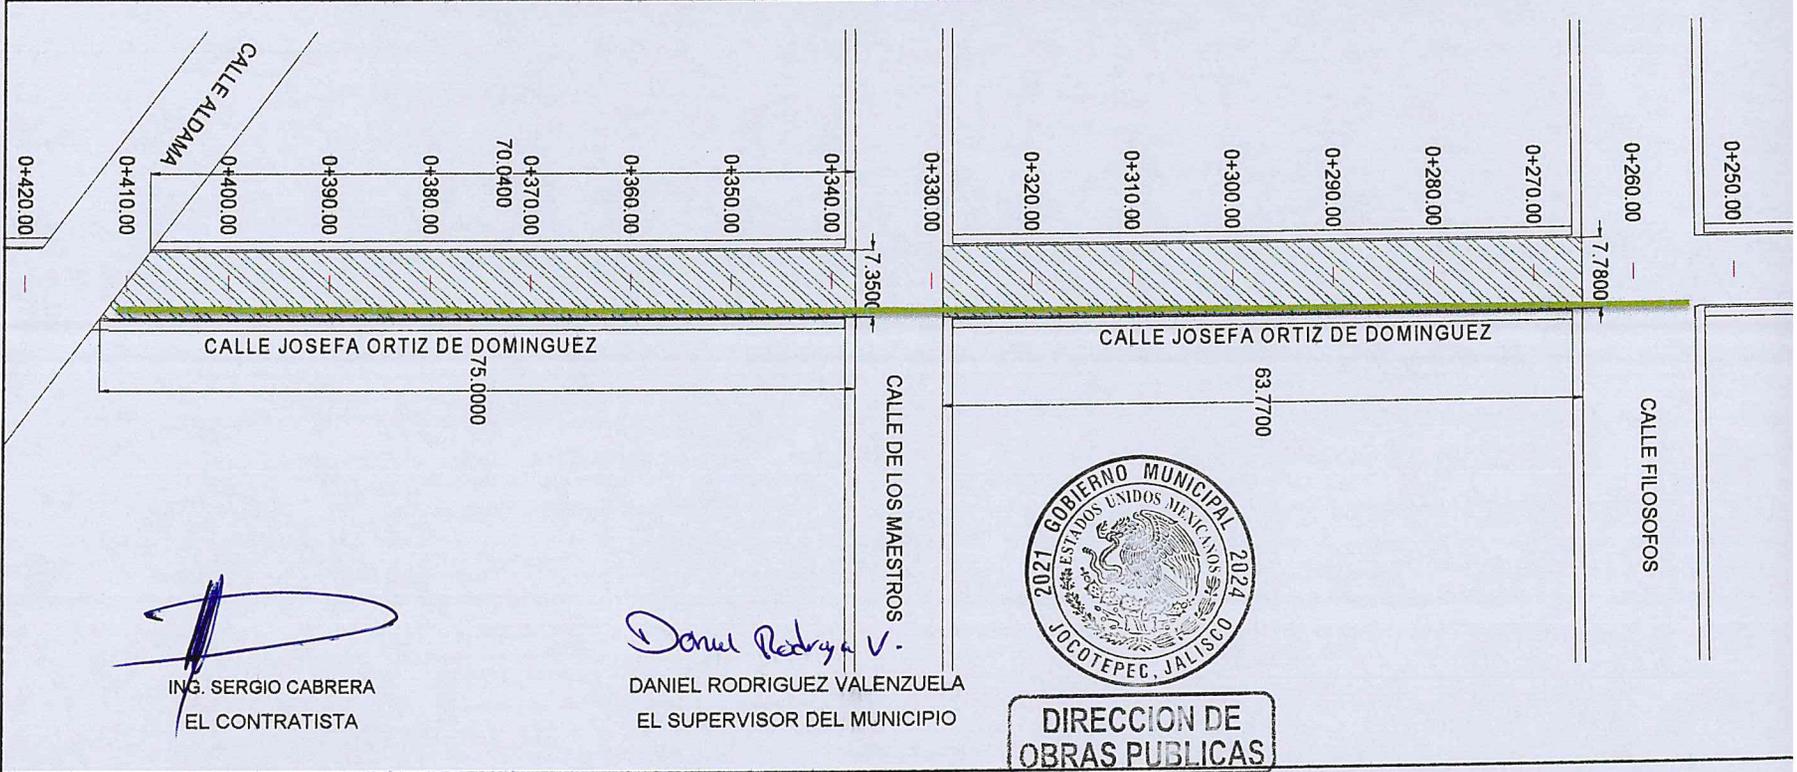








SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1			
EXT-006	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA	

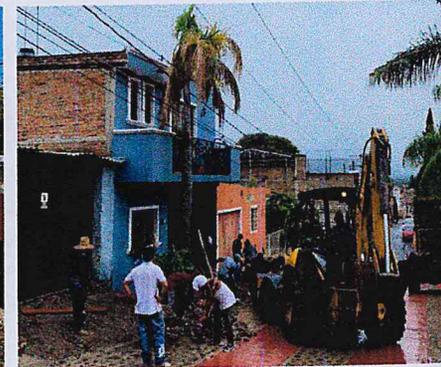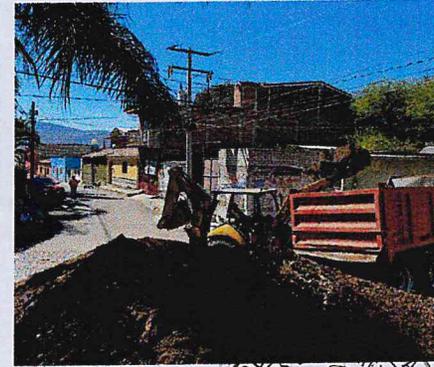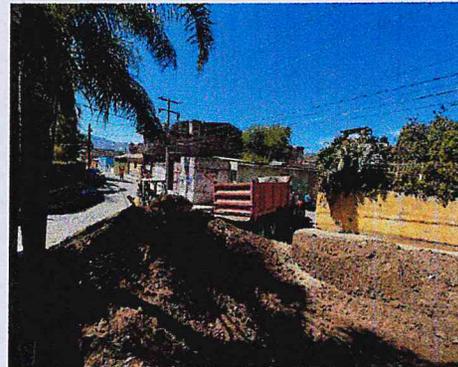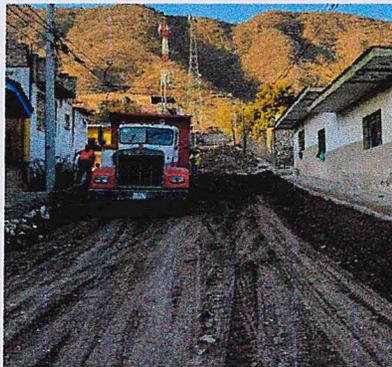


ING. SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA


DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



SERGIO CABRERA


CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	16 DE MAYO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE FILOSOFOS ETAPA 1.		

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 07 AL 15 DE MAYO DE 2023

EXT-006	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ETAPA 1 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS
---------	---	---------

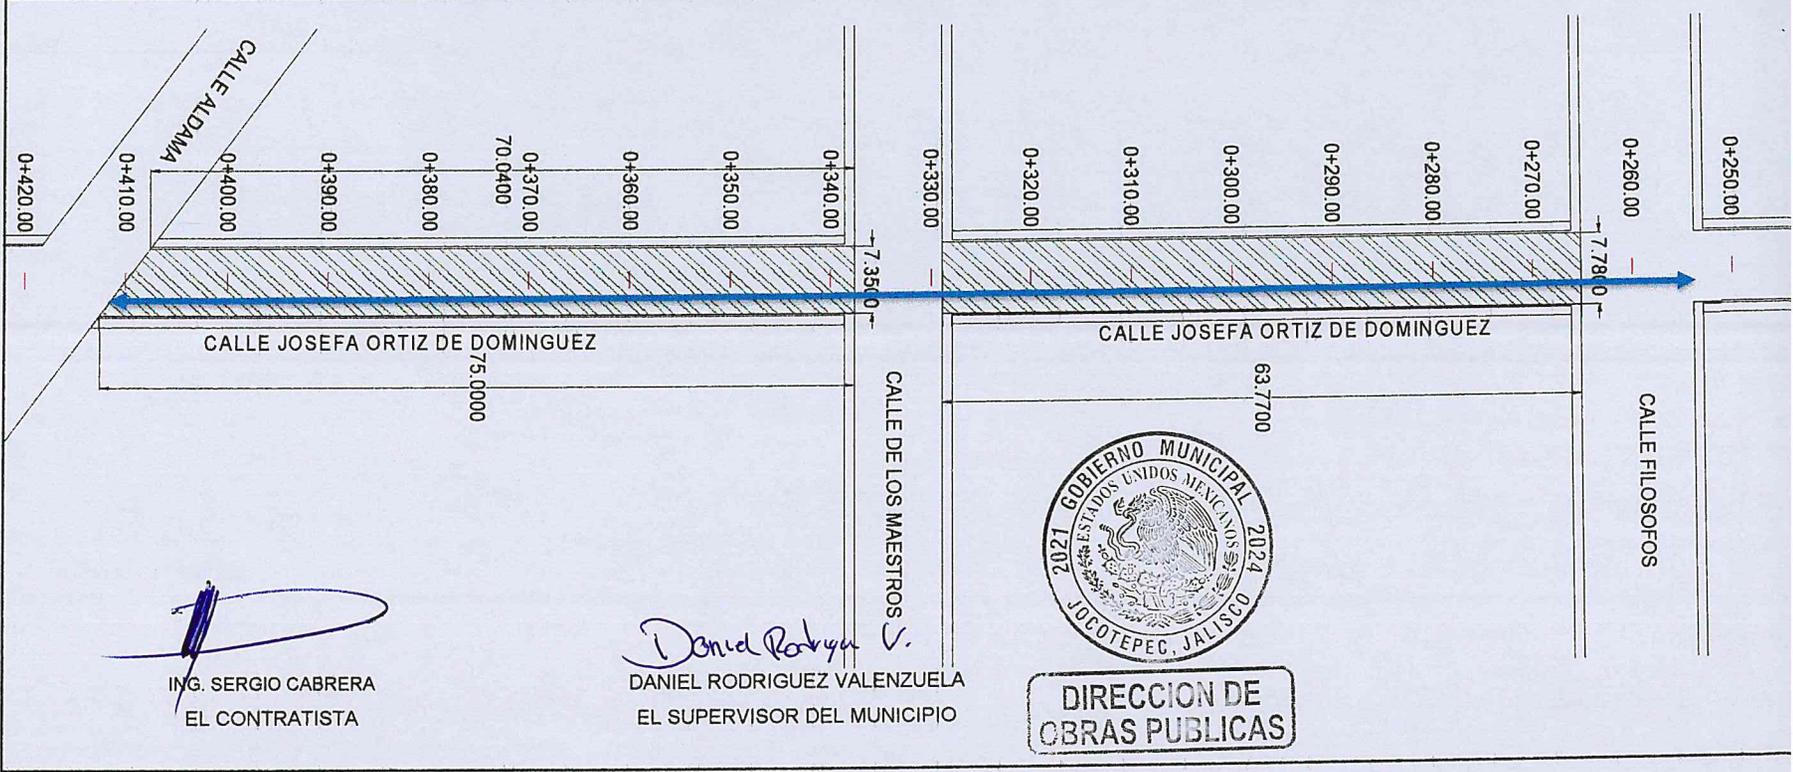

SERGIO CABRERA

Descripción del proyecto: Construcción de huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortíz de Domínguez desde la calle Aldama hasta la calle Filósofos, Etapa 1

Anexo:

Núm de concurso:

GMJ 002C-OP/2023

Página:

1/1

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Precios extraordinarios					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Construcción de huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortíz de Domínguez desde la calle Aldama hasta la calle Filósofos, Etapa 1					
EXT-001	DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES INLCUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	32.28	92.84	2,996.88
EXT-002	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO. INLCUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	32.28	26.24	847.03
EXT-003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE RESISTENCIA ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	32.28	418.99	13,525.00
EXT-004	LIMPIEZA PARA ENTREGAR OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,308.92	12.53	16,400.77
EXT-005	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	484.49	78.86	38,206.88
IMPORTE DE Construcción de huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortíz de Domínguez desde la calle Aldama hasta la calle Filósofos, Etapa 1					71,976.56
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					71,976.56

SERGIO CABRERA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. SERIO CABRERA
PERSONA FISICA

SERGIO CABRERA

SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES
JOCOTEPEC, JALISCO A 10 DE MAYO DE 2023

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE

POR ESTE MEDIO, ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITARLE LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION 02 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: **Construcción de huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez desde la calle Aldama hasta la calle Filósofos, Etapa 1**, CON NUMERO DE CONTRATO: **GMJ 002C-OP/2023**, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT-001	DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES INLCUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	32.28	92.84	2,996.88
EXT-002	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO. INLCUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	32.28	26.24	847.03
EXT-003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE RESISTENCIA ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	32.28	418.99	13,525.00
EXT-004	LIMPIEZA PARA ENTREGAR OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,308.92	12.53	16,400.77
EXT-005	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	484.49	78.86	38,206.88
				SUMA	71,976.56

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SIRVA BRINDARLE A LA PRESENTE
APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ING. SERGIO CABRERA
PERSONA FÍSICA



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

10 MAYO 2023

Dante
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

SERGIO CABRERA

Descripción del proyecto: Construcción de huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez desde la calle Aldama hasta la calle Filósofos, Etapa 1

Anexo:

Núm de concurso:

GMJ 002C-OP/2023

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página:

1/5

Análisis de precios unitarios

Clave: EXT-001

Unidad: M2

DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES INLCUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Cantidad: 32.28

Precio unitario: 92.84

Total 2,996.88

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Mano de Obra

1A1P	CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	jor	0.062500	1,160.79	72.55
------	--	-----	----------	----------	-------

Total de Mano de Obra

72.55

Herramienta

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	72.55	2.18
------	-------------------	-------	----------	-------	------

Total de Herramienta

2.18

Costo directo

74.73

Indirectos de campo

14.4500% **10.80**

Subtotal

85.53

Financiamiento

0.5000% **0.43**

Subtotal

85.96

Utilidad

8.0000% **6.88**

Subtotal

92.84

Precio unitario

92.84

(* NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN *)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. SERIO CABRERA
PERSONA FISICA

SERGIO CABRERA

SERGIO CABRERA

Descripción del proyecto: Construcción de huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez desde la calle Aldama hasta la calle Filósofos, Etapa 1

Anexo:

Núm de concurso:

GMJ 002C-OP/2023

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página:

2/5

Análisis de precios unitarios

Clave: EXT-002

Unidad: M2

AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO.

Cantidad: 32.28

INLCUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Precio unitario: 26.24

Total 847.03

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	AGUA	AGUA (MANEJO)	m3	0.020000	140.00	2.80
Total de Materiales						2.80
Mano de Obra						
	2A	CUADRILLA No. 4 (2 AYUDANTE GENERAL)	jor	0.018182	979.04	17.80
Total de Mano de Obra						17.80
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	17.80	0.53
Total de Herramienta						0.53
Costo directo						21.13
Indirectos de campo					14.4500%	3.05
Subtotal						24.18
Financiamiento					0.5000%	0.12
Subtotal						24.30
Utilidad					8.0000%	1.94
Subtotal						26.24
Precio unitario						26.24

(* VEINTISÉIS PESOS 24/100 MXN *)

SERGIO CABRERA



ING. SERIO CABRERA
PERSONA FISICA

SERGIO CABRERA

Anexo:

Núm de concurso:

GMJ 002C-OP/2023

Descripción del proyecto: Construcción de huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortíz de Domínguez desde la calle Aldama hasta la calle Filósofos, Etapa 1

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página:

3/5

Análisis de precios unitarios

Clave: EXT-003

Unidad: M2

Cantidad: 32.28

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE RESISTENCIA ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Precio unitario: 418.99

Total 13,525.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"	pza	0.122000	95.00	11.59
	AGUA	AGUA (MANEJO)	m3	0.015000	140.00	2.10
	CEMENTOG	CEMENTO GRIS	TON	0.000500	3,480.00	1.74
Total de Materiales						15.43
Mano de Obra						
	1A1P	CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	jor	0.100000	1,160.79	116.08
Total de Mano de Obra						116.08
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	116.08	3.48
Total de Herramienta						3.48
Auxiliares						
	200	CONCRETO F´C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM. RESISTENCIA NORMAL	m3	0.105000	1,926.59	202.29
Total de Auxiliares						202.29
Costo directo						337.28
Indirectos de campo					14.4500%	48.74
Subtotal						386.02
Financiamiento					0.5000%	1.93
Subtotal						387.95
Utilidad					8.0000%	31.04
Subtotal						418.99
Precio unitario						418.99

(* CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 99/100 MXN *)



SERGIO CABRERA

ING. SERIO CABRERA
PERSONA FISICA

SERGIO CABRERA

Descripción del proyecto: Construcción de huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortíz de Domínguez desde la calle Aldama hasta la calle Filósofos, Etapa 1

Anexo:

Núm de concurso:

GMJ 002C-OP/2023

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página:

4/5

Análisis de precios unitarios

Clave: EXT-004

Unidad: M2

LIMPIEZA PARA ENTREGAR OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Cantidad: 1,308.92

Precio unitario: 12.53

Total: 16,400.77

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Mano de Obra

2A	CUADRILLA No. 4 (2 AYUDANTE GENERAL)	jor	0.010000	979.04	9.79
----	--------------------------------------	-----	----------	--------	------

Total de Mano de Obra

9.79

Herramienta

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	9.79	0.29
------	-------------------	-------	----------	------	------

Total de Herramienta

0.29

Costo directo 10.08

Indirectos de campo 14.4500% 1.46

Subtotal 11.54

Financiamiento 0.5000% 0.06

Subtotal 11.60

Utilidad 8.0000% 0.93

Subtotal 12.53

Precio unitario 12.53

(* DOCE PESOS 53/100 MXN *)

SERGIO CABRERA



ING. SERIO CABRERA
PERSONA FISICA

SERGIO CABRERA

Anexo:

Núm de concurso:

GMJ 002C-OP/2023

Descripción del proyecto: Construcción de huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortíz de Domínguez desde la calle Aldama hasta la calle Filósofos, Etapa 1

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página:

5/5

Análisis de precios unitarios

Clave: EXT-005

Unidad: M3

Cantidad: 484.49

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Precio unitario: 78.86

Total 38,206.88

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Equipo

EQC990120-30	Retroexcavadora Cargador tracción 4x4 mca. Case mod. 580M 4X4 Equipada Extensión potencia neta 76 HP cucharón frontal de 82 cap. 1.0 yd3 cucharón de excavación 24 cabina Canopy Rops	hr	0.058000	412.60	23.93
--------------	---	----	----------	--------	-------

EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7M3	hr	0.058000	682.07	39.56
----------	-------------------------	----	----------	--------	-------

Total de Equipo

63.49

Costo directo

63.49

Indirectos de campo

14.4500% 9.17

Subtotal

72.66

Financiamiento

0.5000% 0.36

Subtotal

73.02

Utilidad

8.0000% 5.84

Subtotal

78.86

Precio unitario

78.86

(* SETENTA Y OCHO PESOS 86/100 MXN *)

SERGIO CABRERA



ING. SERIO CABRERA
PERSONA FISICA



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
OFICIO: 276-A/ 2023
ADM. 2021-2024
Jocotepec Jalisco, a 11 de mayo del 2023

Ing. Sergio Cabrera.
Persona Física
Ingeniería de costos, topografía, construcción y supervisión.
PRESENTE:

Asunto: Autorización conceptos fuera de catalogo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, de acuerdo a lo solicitado en para la obra: "CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS, ETAPA 1.", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". No. DE CONTRATO: GMJ 002C- OP/2023, se autorizan los siguientes conceptos fuera del catálogo para la correcta ejecución de la obra.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT-001	DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	32.28	92.84	2,996.88
EXT-002	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISÓN DE MANO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	32.28	26.24	847.03
EXT-003	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE RESISTENCIA ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	32.28	418.99	13,525.00
EXT-004	LIMPIEZA PARA ENTREGAR OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,308.92	12.53	16,400.77
EXT-005	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y LIMPIEZA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	484.49	78.86	38,206.88
				SUMA	71,976.56

Sin otro particular pongo a su consideración lo anterior, me despido enviándole un saludo.

Atentamente:

Sergio Cabrera
11-May-2023

C. Imelda Karina Pérez González
Directora de Obras Públicas.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Tú decides mejorar
