



LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de; **\$950,287.31** (Novecientos Cincuenta Mil Doscientos Ochenta y Siete Pesos 31/100 M.N.) por concepto de Estimación 03 y Finiquito, del programa CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2023 correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
105	24/08/2023	\$822,759.58	\$954,401.11	\$4,113.80	\$950,287.31

Partida Contable: 6241-2-11.1-050-379

Partida Contable: 6231-2-11.1-050-380

Partida Contable: 6151-2-11.1-050-381

Contrato: CSS-OP-CC-003/2023

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 03 y Finiquito
4. Fianza de Vicios Ocultos
5. Minuta de termino de obra
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones



HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024

06 SEP. 2023

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE
JOCOTEPEC, JAL., A 24 DE AGOSTO DEL 2023
"2023, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINÁ PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Tú decides mejorar

C.c.p. Archivo
D.O.P./cvch



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA
 RFC: TPRI806058CO
 Domicilio: MORELOS No. 67 Ng. Int E, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 105
 Fecha: 24/8/2023 13:27:19

Datos del cliente
 Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
 R.F.C.: MJJ850101KP8
 Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Uso CFDI: 101 - Construcciones

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Régimen Fiscal:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72141205 - Servicio de construcción de sistemas de drenaje	PAGO DE ESTIMACION No. 3(TRES) FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILOSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. CON No DE CONTRATO: CSS-OP-CC-003/2023. MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU): \$4,113.80 MONTO EFECTIVO A PAGAR: \$950,287.31	822,759.58	0.00	002 - IVA - 131,641.53	822,759.58



[Handwritten signature]

Importe con letra: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 11/100 M.N.

822,759.58
 131,641.53
 Total 954,401.11

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000516193795
 Folio fiscal 679FAD08-DA98-4472-8255-A14EAABA3F77
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Agosto 24 2023 - 13:27:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

N8gXG5cHkAo5SovYiKkKbcpkYd6HAgypZnggs3dwSExtA6MfPIFAsV/HFsvjEdyz14QUODDjsbjTeU1rqKLOV
 e1SbdIIJcl4VP6qwkZzyDcz+UmQby+SqKn5gIndXvq0tu4qxWyXlIjzhHCzWZOBQyVnUySvOHkbs7Qaq13fH5G
 JOAwh8s9fi6pUHirNIBwTt1Y6EYQEsX5cHvcxPxc/wnp411r+xpHKQU00qN5ajJUKxbK3OEZnE5pdO/bc4uUvz
 WEm3whxzzbSSGjWurKxUEVzOPLeRva8d8mlK9mCgOI3UL9tgr7TflxzZ5QN1FPBKAtxf7uifbfp+plCN1A==

Sello del SAT

Ox9RXhfPD/PS9YhqIKLWMA/hEnBBcqQky29A8CrAFJpuKkpgIEHkUjcvEUo81PN027hXvHtEEz4I9
 gHiqIN9J3TOTjWvRNGU6BhgxyVL3TAyie6OaVIXyO3h9pS2DwNR9LKdzotB+zL/nQ+cn8dZuCR009+u8
 i6NPFwzexPrhxQubR0X6JUC5pOu3QbF38PCyZuMIG8znBGYNG821uty67/fQ5oQ0nZrpszUDjvSMi5Qy
 JG4M+yW8sUkDPoJdq38i7AXIup6Jk8CGcdANcZrBD8swLmMIqIb90G9LWW917YO2PmDb2rczO3Sjaw
 rH4+ae2HVz8PqSMMfBaGJA==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|679FAD08-DA98-4472-8255-A14EAABA3F77|2023-08-24T13:27:20|MAS0810247C0|N8gX
 G5cHkAo5SovYiKkKbcpkYd6HAgypZnggs3dwSExtA6MfPIFAsV/HFsvjEdyz14QUODDjsbjTeU1rqKL
 OVe1SbdIIJcl4VP6qwkZzyDcz+UmQby+SqKn5gIndXvq0tu4qxWyXlIjzhHCzWZOBQyVnUySvOHkbs7Q
 aq13fH5GjOAwh8s9fi6pUHirNIBwTt1Y6EYQEsX5cHvcxPxc/wnp411r+xpHKQU00qN5ajJUKxbK3OEZ
 nE5pdO/bc4uUvzWEm3whxzzbSSGjWurKxUEVzOPLeRva8d8mlK9mCgOI3UL9tgr7TflxzZ5QN1FPBKAt
 xf7uifbfp+plCN1A==|00001000000505142236||



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="105"
Fecha="2023-08-24T13:27:19"
Sello="N8gXG5cHkAo5SovYIkkKBcpkYd6HAgypZnggs3dwSExtA6MfPlFAsV/HFsivJEdyz14QUdODj
sbjTeU1rqKL0Ve1SbdIIJcI4VP6qwKZzyDcz+UmQby+SqKn5gIndXvq0tu4qxWyXIIjzhHCZwZOBQyVn
UySVoHkbs7Qaq13fH5GjOAwH8s9fi6pUHIrNIBWt1Y6EyQEsX5cHvcxPxc/wnp411r+xpHKQUd0qN5a
jJUKxbk30EznE5pd0/bc4uUvZwEm3whxzZbSSGjWurKxUEVzOPLeRva8d8mIK9mCg013UL9tgr7TfIxz
Z5QN1FPBKAtxfY7uijFbp+IpICN1A==" FormaPago="03"
NoCertificado="00001000000516193795"
Certificado="MIIGPjCCBCagAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA1MTYxOTM3OTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQA
wggGEMSAwHgYDVQQDBdVVRPUk1EQUUgQ0VSVElGUNSRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREU
gQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQ1VUQVJQTEaMBGGA1UECwwRUFULU1FUYBBdXR0b3JpdHhKxKjAoBgk
qhkiG9w0BCQEWG2NbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08
gNzcsIENPTC4gR1VFU1JFUK8xDjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBCGA1UECAwQQ01
VREFEIERFIE1FWELDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMGMGA1UELRRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVw
wWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCEBRSBTRVJWSUN
JT1MgVFJQ1VUQVJQ1MgQUwqQ09OVFJQ1VZRU5URTAeFw0yMjExMTUwMDUzNDBaFw0yMjExMTUwMDU
3NDBaMIIBCzE4MDYGA1UEAxMvVEVSUkFRDRVJQVGMgWSBQVZJTVUVOVE9TIERFIEExBIFJQk1FUKgU0E
gREUgQ1YxODAB2BgNVBCKTL1RFU1JBJBQ0VSUFTIFkGUeFWSU1FT1RPUyBERSBMQSBSSUJRVJBIENBIER
FIENWMTgwNgYDVQQKEy9URVJSQUNFUK1BUyBZIFBBVk1NRU5UT1MgREUgTEEGUk1CSUUVSQSBTQSBERSB
DVjE1MCMGA1UELRCmVFBSMTgwNjA1OEMwIC8gQ0FTRTc4MDExM0M40TEeMBwGA1UEBRMVIC8gQ0FYUzc
4MDExM0hkQ0JYUjA5MRQwEgYDVQQLEwt0ZXJyYWN1cm1hcZCCASIdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
CAQoCggEBAJBx+5I+gY01+PNNVUEwtpE5+rgv5ayA8GbDJBv0jepOpfwasRbE7/FXIVRduW07eo1u2hh
8wTSH7udK2j0TnPVV9szVt6Rq6CCWma4+gTY4f4Bf1ff8A4gl1xCe2P8IWCxFOuVt67mVdpF++Y0ndYr
coAsZmFmuPbX2L5hWF9xz3+ANDiNe+eOfvtmse1UBacEpoaaEhxC+Zo1IGa8i2lWxUHTgx64jd9WLKd7
9aZ5ufhr/LJ52hTKsqfbb1xh3peoV6N9anDkjR284lQ2CbeEh4vus7eTrdfUgGrdCkU2RUX0X9QgTGd
cz0fq5ZmrUvsSHvFNyblW0+w1IZT/YBscAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsA
wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBALZDd3La8qKVFF/0yznXwnheSIgGqP9uDPcm3G2+yQ9K50jbf2n2iV
x7F83VRR71ojYoJm2bNTqWykaBWgXIC4CLm/LFmeFpb6URWxSADqEcTAzOuLbIFwF5+y5EH3aaI5CCB
OZSu+7rK/1ldyTTPBmcmIEsr1ZOL/Pc1ZyaQGRKPeFvHZBLwQDedUYILfGHHomD4Vg045ITXmXcqcoEo
1tTXwuFOUDHzatbvfp6Iwck4jQMt4pG1H+Enr9qMYzgpzZnhGSs7Np2aVOK3DOvhDxPzWWTj9ppvOmbR
vrLRaKnOmCu04zpVc1nnVunR1o/NEa/ub7NxCL6KHMdB3qPvbZxz1BaXz4XnoMkzCwyNn48bAUGYmMn1
Qj/APUnaj7XZas63KnCtjZgMIcrb9X/aeS2TFIrEEL9um6aaBwp0gnR86o0Sv9j9/3y+jZJ5jk9nPPkz
Xkjbqe1Iw/8z/Ca3fs6K3tXXThutJJWh88FvlnT+HEV8I3q96n0S37h0TKh1A9ZbbUMuk0q9W2K5iYa8
RKoXE023HW43YLMHfyBuNJSVb2ZgJj7f7RNd11Y7u3KrE9WFynm+vcWkvz5cbMR2CbFtLidaGsZ8RnGPP
Ml6m8g5tdHkHAAYGgukv0IEeF7nuUB5I5RProeNADeDJgsK1adYmfQbl9X7YI29HFG0VQ"
SubTotal="822759.58" Moneda="MXN" Total="954401.11" TipoDeComprobante="I"
Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45800">
 <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="TPR1806058C0" Nombre="TERRACERIAS
Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8"
Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141205" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.00" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" NoIdentificacion="SER0005"
Descripcion="PAGO DE ESTIMACION No. 3(TRES) FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE
DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILOSOFOS HASTA EL
LIBRAMIENTO"
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO.
CON NO
DE CONTRATO: CSS-OP-CC-003/2023.
MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU):
\$4,113.80
MONTA EFECTIVO A PAGAR: \$950,287.31" ValorUnitario="822759.58"
Importe="822759.58"

ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="822759.58"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="131641.53"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Conceptos></cfdi:Co
nceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="131641.53"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="131641.53"
Base="822759.58"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:Timbr
eFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital
v11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
UUID="679FAD0B-DA9B-4472-B255-A14EAABA3F77" FechaTimbrado="2023-08-24T13:27:20"
RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="N8gXG5cHKAo5SovYIkkKBcpkYd6HAgypZnggs3dwSEXtA6MFP1FAsV/HFsivJEdyz14QU
ODjsbjTeU1rqKL0Ve1SbdIIJcI4VP6qwKZzyDcz+UmQby+SqKn5gIndXvq0tu4qxWyXIIjzhHCzWZOBQ
yVnUySVoHkbS7Qaq13fH5GjOAwh8s9fi6pUHIrNIBWtt1Y6EyQEsX5cHvcxPxc/wnp411r+xpHKQUD0q
N5ajJUKxbK30EznE5pd0/bc4uUvZWEm3whxzzbSSGjWurKxUEVz0PLeRva8d8mIK9mCgO13UL9tgr7Tf
IxzZ5QN1FPBKAtxfY7uijFbp+IpICN1A==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="0x9RXhfPD/PS9Yhq1KLWma/hEnBBcqQky29A8CrAFJpuKkpg1EHkUjcVeg0Uo81PN027hI
xvHtEEz4I9gHiq1N9J3T0TjWrNGU6BhgxyVL3TAYie60aVIXy03h9pS2DwnR9LKdzotB+zLt/n0+cn8d
ZuCR009+u8i6NPFwzexPrhxQubR0X6jUC5pOu3QbF38PCyZuM1G8znBGYN821uty67/f050004770cz
UDjvSMi5QyJG4M+yW8sUKDPoJdq38i7AXIup6Jk8CGcdANCzRBD8swLmMIqIb90G9LWm91s7y02PmD0
2rcz03SjawrH4+ae2HVz8PqSMMfBaGjA==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Complemento>



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TPR1806058C0	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
679FAD0B-DA9B-4472-B255-A14EAABA3F77	2023-08-24T13:27:19	2023-08-24T13:27:20	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$954,401.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	No. DE CONTRATO: CSS-OP-CC-003/2023 TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL	HOJA DE RELACIÓN HOJA No. 1 DE 1 ESTIMACIÓN No. <u>3 (TRES) FINIQUITO</u> PERIODO DE TRABAJO: DEL: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023 FECHA: 03 DE MAYO DE 2023
---	---	--

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS	IMPORTES
	 	
	A DRENAJE	\$ -
	A01 EXCAVACIONES	\$ -
	A02 RELLENOS	\$ -
	A03 INSTALACION DE TUBERIA	\$ -
	B AGUA POTABLE 3"	\$ -
	B01 EXCAVACIONES	\$ -
	B02 RELLENOS	\$ -
	B03 INSTALACION DE TUBERIA	\$ -
	C EMPEDRADO	\$ 321,847.67
	C01 EMPEDRADO	\$ 500,911.91
	D EXTRAORDINARIOS	\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58
		\$ -
		\$ 822,759.58
		\$ 131,641.53
		\$ 954,401.11
		\$ 4,113.80
		\$ 950,287.31
		\$ 822,759.58



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO
 DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023
PERÍODO:
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
ADS-L-EMP-05	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAPA DE EMPEDRADO ASENTADO CON CONCRETO F'c=260 Kg/Cm2. DE 20 CMS ESPESOR CON PIEDRA BOLA O DE BANCO	M2	1,521.00	1,227.99	0.00	1,227.99	293.01	\$724.99	\$1,102,709.79	\$0.00	\$890,281.20	\$212,428.59	
ADS-L-EMP-06	CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 KG/CM2 DE RESISTENCIA COLOR ROJO INTEGRADO ACABADO PIEL DE EFEEANTE O SIMILAR	M2	604.80	789.52	0.00	789.52	-	\$875.43	\$529,460.06	\$0.00	\$691,169.49	-\$161,709.43	
ADS-L-EMP-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO TIPO "L" DE CONCRETO f'c=200 Kg/Cm2 DE 20 DE BASE Y 35 CMS ALTURA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	504.00	0.00	460.00	460.00	44.00	\$579.74	\$292,188.96	\$266,680.40	\$0.00	\$25,508.56	
ADS-L-EMP-08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO EN MACHUELOS, COLOR AMARILLA O BLANCA, CUMPLIENDO CON ESPESOR DE 0.36 A 0.51 MILIMETROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	599.00	0.00	460.00	460.00	139.00	\$104.27	\$62,457.73	\$47,964.20	\$0.00	\$14,493.53	
ADS-L-EMP-09	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN SISTEMA LOGARITMICO CON PINTURA TIPO TRAFICO	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	\$55,174.98	\$165,524.94	\$0.00	\$0.00	\$165,524.94	
Total:	EMPEDRADO								\$2,783,638.79	\$321,847.67	\$2,237,782.94	\$224,029.18	
D	EXTRAORDINARIOS												
EXT-001	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	0.00	0.00	542.40	542.40	-	542.40	\$26.19	\$0.00	\$14,205.46	\$0.00	-\$14,205.46
EXT-002	SUMINISTRO Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE MATERIAL DE BANCO EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACION, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	0.00	542.40	542.40	-	542.40	\$191.60	\$0.00	\$103,923.84	\$0.00	-\$103,923.84
EXT-003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 Cm. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200 Kg/Cm2. DE RESISTENCIA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	0.00	0.00	542.40	542.40	-	542.40	\$411.88	\$0.00	\$223,403.71	\$0.00	-\$223,403.71
EXT-004	LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	0.00	0.00	2,638.28	2,638.28	-	2,638.28	\$21.16	\$0.00	\$55,826.00	\$0.00	-\$55,826.00
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS METÁLICOS Y TORNILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2 1/2" POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	0.00	0.00	128.00	128.00	-	128.00	\$363.95	\$0.00	\$46,585.60	\$0.00	-\$46,585.60
EXT-006	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYO, A SU ESTRUCTURA REAL, INCLUYE FORJADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.00	0.00	270.00	270.00	-	270.00	\$210.99	\$0.00	\$56,967.30	\$0.00	-\$56,967.30
Total:	EXTRAORDINARIOS									\$0.00	\$500,911.81	\$0.00	-\$500,911.81
								SUMA	\$ 3,774,632.64	\$ 822,759.58	\$ 3,242,078.74	-\$ 280,205.79	
								IVA	\$ 803,841.21	\$ 131,841.53	\$ 618,732.60	-\$ 48,432.93	
								TOTAL	\$ 4,378,573.75	\$ 954,601.11	\$ 3,780,811.34	-\$ 338,838.71	

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL



Daniel Rodríguez V.
 DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO
 DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023
PERÍODO:
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	BALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	BALDO	
ADS-A-EXC-03	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO II Y III., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	194.04	195.08	0.00	195.08	-	1.04	\$160.42	\$31,127.90	\$0.00	\$31,294.65	-\$166.76
ADS-A-EXC-04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	194.04	195.08	0.00	195.08	-	1.04	\$79.76	\$15,476.63	\$0.00	\$15,559.54	-\$82.91
ADS-A-EXC-05	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	176.40	177.35	0.00	177.35	-	0.94	\$20.80	\$3,669.12	\$0.00	\$3,688.78	-\$19.66
Total: EXCAVACIONES										\$53,620.21	\$0.00	\$53,907.48	-\$287.25
B02	RELLENOS												
ADS-A-REL-01	PLÁNTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	176.40	177.35	0.00	177.35	-	0.94	\$98.39	\$17,356.00	\$0.00	\$17,448.97	-\$92.98
ADS-A-REL-02	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	252.00	253.35	0.00	253.35	-	1.35	\$307.32	\$77,444.64	\$0.00	\$77,859.52	-\$414.88
ADS-A-REL-03	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	123.48	88.67	0.00	88.67	34.81	\$757.40	\$93,523.75	\$0.00	\$67,160.55	\$263,363.20	
Total: RELLENOS										\$198,324.39	\$0.00	\$162,468.05	\$262,855.34
B03	INSTALACION DE TUBERIA												
ADS-A-IT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 3" HIDRAULICO DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	252.00	253.35	0.00	253.35	-	1.35	\$188.02	\$47,381.04	\$0.00	\$47,634.87	-\$253.83
ADS-A-IT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 3 A 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	18.00	13.00	0.00	13.00	5.00	\$2,144.24	\$38,596.32	\$0.00	\$27,875.12	\$10,721.20	
ADS-A-IT-03	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	-	\$14,385.17	\$28,770.34	\$0.00	\$28,770.34	\$0.00	
ADS-A-IT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 3", INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	\$808.96	\$1,617.92	\$0.00	\$0.00	\$1,617.92	
ADS-A-IT-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	-	\$5,897.85	\$11,795.70	\$0.00	\$11,795.70	\$0.00	
ADS-A-IT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FOF0 PARA CAJA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	-	\$5,529.48	\$11,058.96	\$0.00	\$11,058.96	\$0.00	
Total: INSTALACION DE TUBERIA										\$138,220.28	\$0.00	\$127,134.99	\$12,085.29
C	EMPEDRADO												
C01	EMPEDRADO												
ADS-L-EMP-01	TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA	M2	2,016.00	2,095.88	542.40	2,638.28	-	622.28	\$13.28	\$26,772.48	\$7,203.07	\$27,833.29	-\$8,263.88
ADS-L-EMP-02	EXCAVACIONES EN CAJA EN MATERIALES TIPO II Y III PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO MEDIANTE TRACTOR Y EXCAVADORA CON MARTILLO.	M3	806.40	838.35	0.00	838.35	-	31.95	\$160.42	\$129,362.69	\$0.00	\$134,488.43	-\$5,125.74
ADS-L-EMP-03	ESCARIFICACION, COMPACTACION, HUMECTACION Y CONFORMACION PARA DAR NIVELES DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PESO MAXIMO	M3	403.20	419.18	0.00	419.18	-	15.98	\$165.38	\$74,745.22	\$0.00	\$77,706.85	-\$2,961.63
ADS-L-EMP-04	FORMACION DE CAPA BASE CON MATERIAL DE BANCO EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACION	M2	2,016.00	2,095.88	0.00	2,095.88	-	79.88	\$198.62	\$400,417.92	\$0.00	\$416,283.69	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
 CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.
 R.F.C. TPR1806058C0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO
 PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023
 OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
 UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATISTA : TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
 FECHA: 03 DE MAYO DE 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO													
A	DRENAJE												
A01	EXCAVACIONES												
ADS-D-EXC-01	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	252.00	258.85	0.00	258.85	-	6.85	\$13.28	\$3,346.56	\$0.00	\$3,437.53	-\$90.97
ADS-D-EXC-03	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO II Y III, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	317.52	326.15	0.00	326.15	-	8.63	\$160.42	\$50,936.56	\$0.00	\$52,321.14	-\$1,384.59
ADS-D-EXC-04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	317.52	326.15	0.00	326.15	-	8.63	\$79.76	\$25,325.40	\$0.00	\$26,013.80	-\$688.41
ADS-D-EXC-05	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	176.40	181.20	0.00	181.20	-	4.79	\$20.80	\$3,669.12	\$0.00	\$3,768.86	-\$99.74
Total:	EXCAVACIONES									\$83,277.64	\$0.00	\$85,541.33	-\$2,263.69
A02	RELLENOS												
ADS-D-REL-01	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M2	176.40	181.20	0.00	181.20	-	4.79	\$98.39	\$17,356.00	\$0.00	\$17,827.78	-\$471.78
ADS-D-REL-02	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	ML	252.00	258.85	0.00	258.85	-	6.85	\$307.32	\$77,444.64	\$0.00	\$79,549.78	-\$2,105.14
ADS-D-REL-03	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	211.68	217.43	0.00	217.43	-	5.75	\$757.40	\$160,326.43	\$0.00	\$164,684.51	-\$4,358.08
Total:	RELLENOS									\$255,127.07	\$0.00	\$262,062.07	-\$6,935.00
A03	INSTALACION DE TUBERIA												
ADS-D-IT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	252.00	258.85	0.00	258.85	-	6.85	\$691.31	\$174,210.12	\$0.00	\$178,945.59	-\$4,735.47
ADS-D-IT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 10" X 6" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	13.00	0.00	13.00	-	5.00	\$3,399.29	\$61,187.22	\$0.00	\$44,190.77	\$16,996.45
ADS-D-IT-03	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=200 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y CAIDA ADOSADA DONDE LO REQUIERA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	5.00	0.00	5.00	-	3.00	\$18,012.91	\$36,025.82	\$0.00	\$90,064.55	-\$54,038.73
Total:	INSTALACION DE TUBERIA									\$271,423.16	\$0.00	\$313,200.91	-\$41,777.76
B	AGUA POTABLE 3"												
B01	EXCAVACIONES												
ADS-A-EXC-01	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	252.00	253.35	0.00	253.35	-	1.35	\$13.28	\$3,346.56	\$0.00	\$3,364.49	-\$17.93



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

ADS-L-EMP-01

TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO EQUIPO OPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	lado	PZA	TOTAL
M2	0+010.00	0+140.00	130.00	1.20	IZQ	1.00	156.00
	0+160.00	0+172.00	12.00	1.20	IZQ	1.00	14.40
	0+184.00	0+252.00	68.00	1.20	IZQ	1.00	81.60
	0+000.00	0+172.00	172.00	1.20	DER	1.00	206.40
	0+182.00	0+252.00	70.00	1.20	DER	1.00	84.00
						SUMA	542.40

LIBRAMIENTO
CIENTIFICOS
FILOSOFOS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA:

03 DE MAYO DE 2023

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO:

DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

ADS-L-EMP-01 TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.

FOTOGRAFÍA



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO"

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

ADS-L-EMP-01

TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

CROQUIS

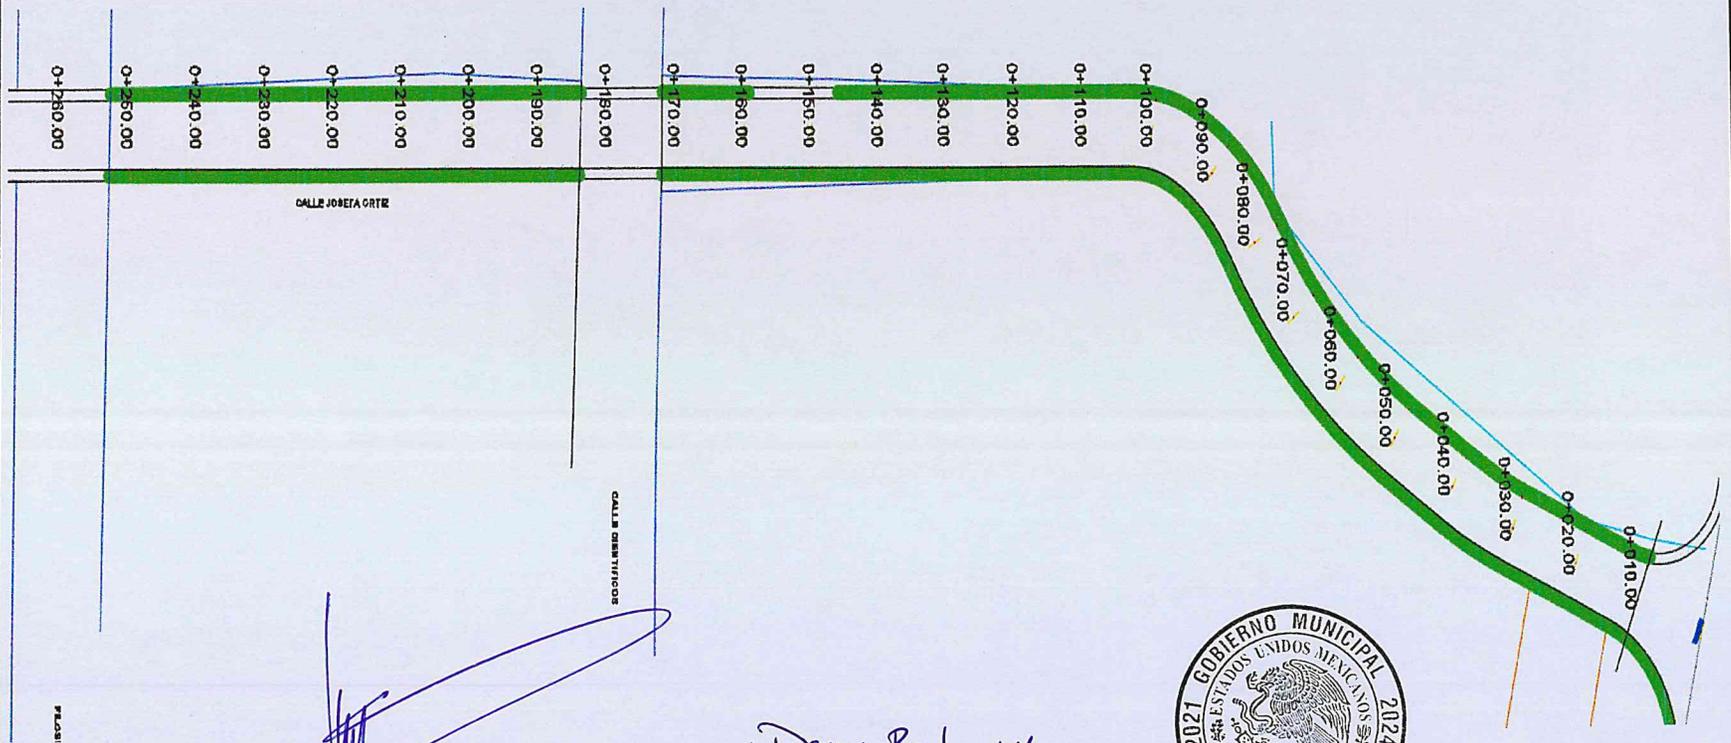

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058CO

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO




PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-002

SUMINISTRO Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE MATERIAL DE BANCO EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACION, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

FOTOGRAFÍA

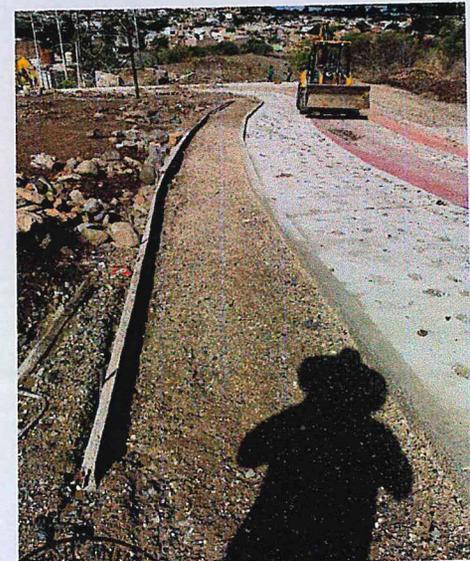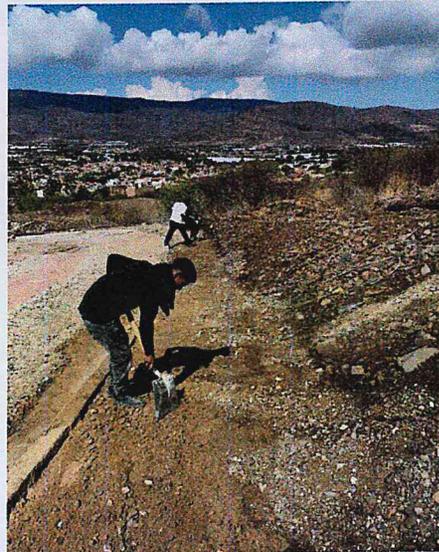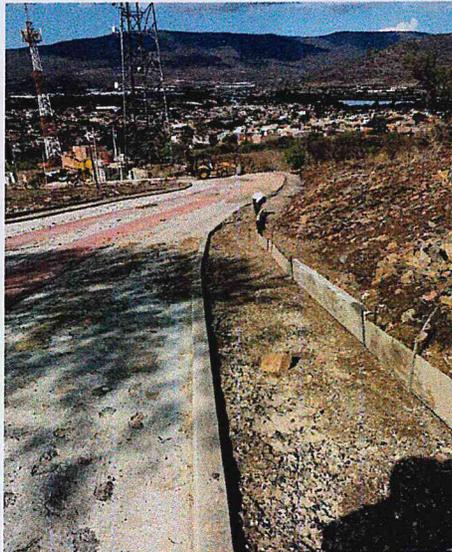

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO"

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-002

SUMINISTRO Y COMPACTACION EN FORMA MANUAL DE MATERIAL DE BANCO EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACION, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CROQUIS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-003

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 Cm. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200 Kg/Cm2.DE RESISTENCIA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	AREA PROMEDIO	PZA	TOTAL
M2	0+010.00	0+140.00	130.00	1.20	IZQ	1.00	156.00
	0+160.00	0+172.00	12.00	1.20	IZQ	1.00	14.40
	0+184.00	0+252.00	68.00	1.20	IZQ	1.00	81.60
	0+000.00	0+172.00	172.00	1.20	DER	1.00	206.40
	0+182.00	0+252.00	70.00	1.20	DER	1.00	84.00
						SUMA	542.40

LIBRAMIENTO
CIENTIFICOS
FILOSOFOS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO



PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-003

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 Cm. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200 Kg/Cm2.DE RESISTENCIA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA

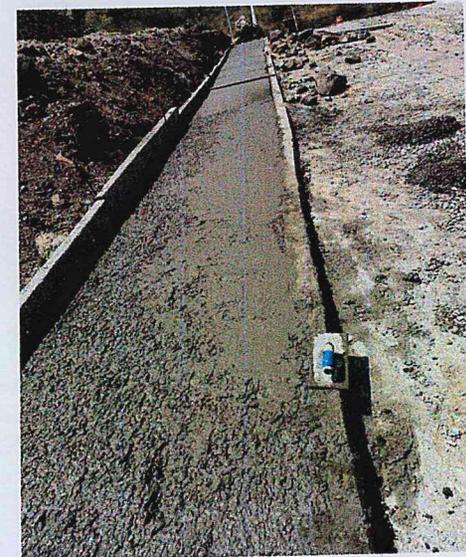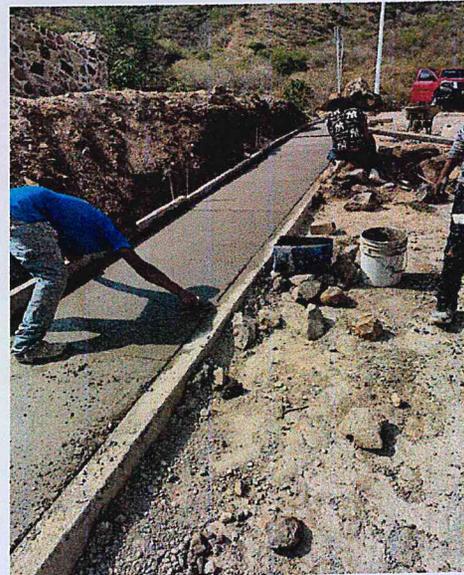

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez Valenzuela
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO"

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-003

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 Cm. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'c=200 Kg/Cm2.DE RESISTENCIA, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

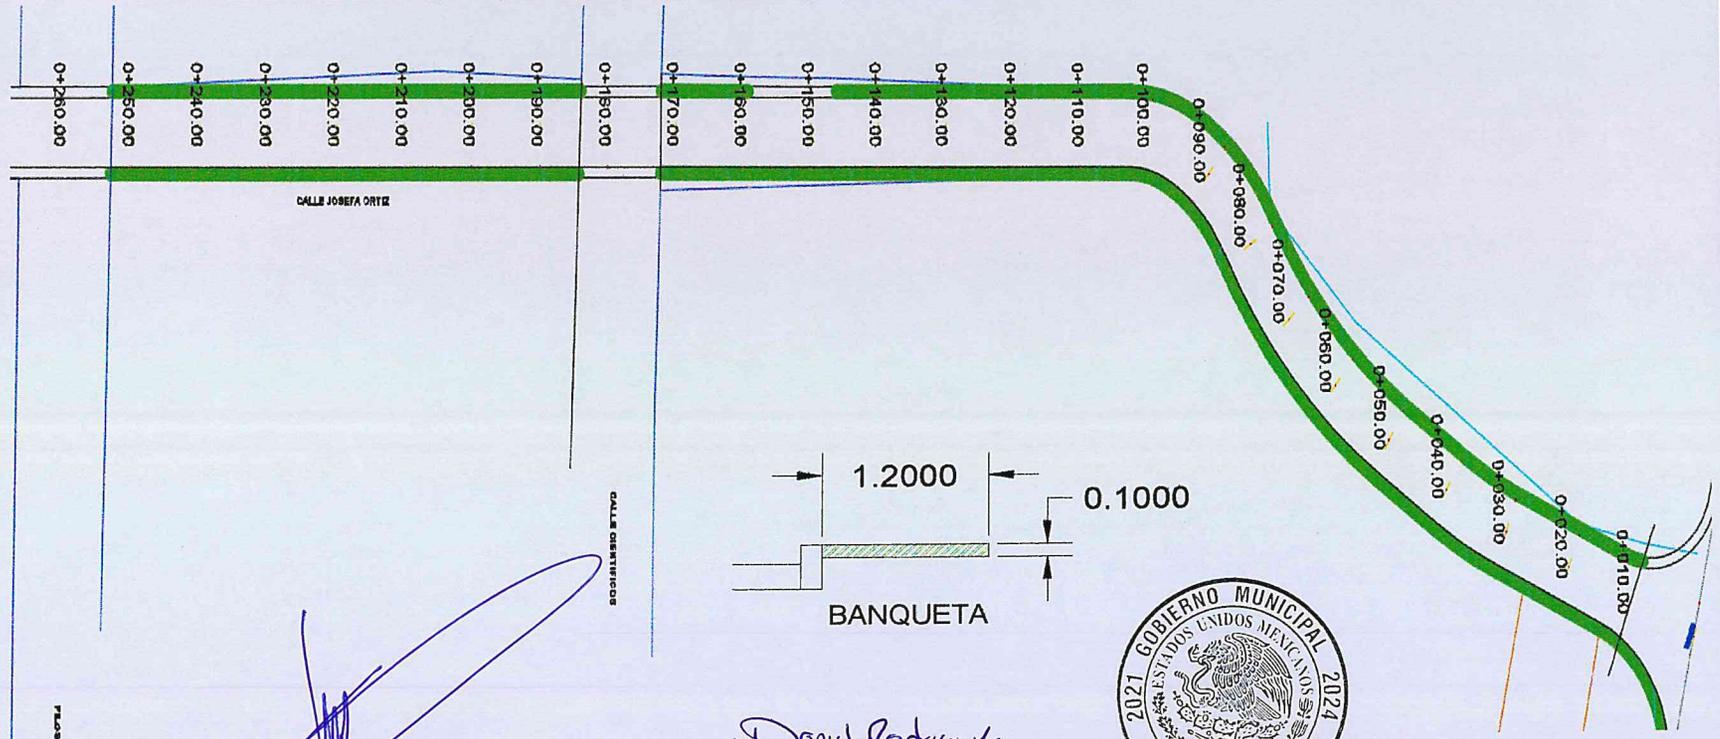

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA:

03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-004

LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	AREA PROMEDIO	PZA	TOTAL
M2	0+010.00	0+140.00	130.00	1.20	IZQ	1.00	156.00
	0+160.00	0+172.00	12.00	1.20	IZQ	1.00	14.40
	0+184.00	0+252.00	68.00	1.20	IZQ	1.00	81.60
	0+000.00	0+172.00	172.00	1.20	DER	1.00	206.40
	0+182.00	0+252.00	70.00	1.20	DER	1.00	84.00
	0+000.00	0+020.00	20.0000	1.53	30.6900	1.00	30.69
	0+000.00	0+260.00	260.0000	7.80	2028.0000	1.00	2,028.00
	0+000.00	0+020.00	20.0000	1.86	37.1900	1.00	37.19
						SUMA	2,638.28

LIBRAMIENTO BANQUETAS
 CIENTIFICOS BANQUETAS
 FILOSOFOS BANQUETAS
 EMPEDRADO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez Valenzuela
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA:

03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE
CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO




PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-004

LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFIA

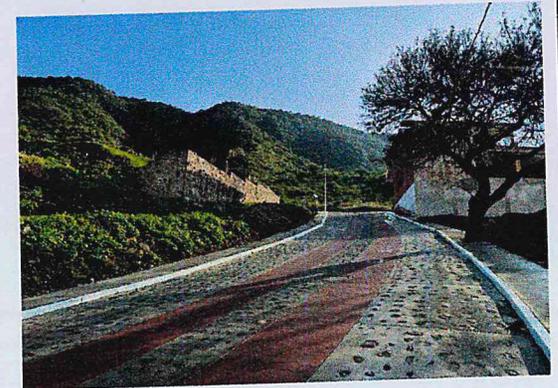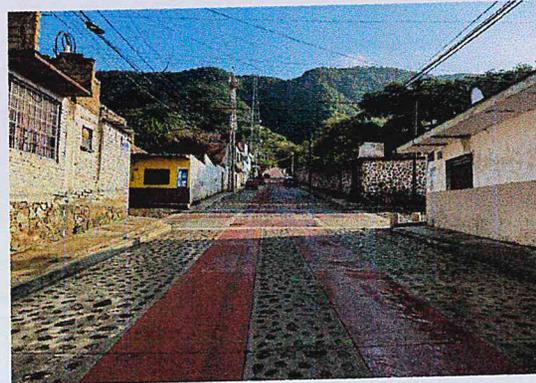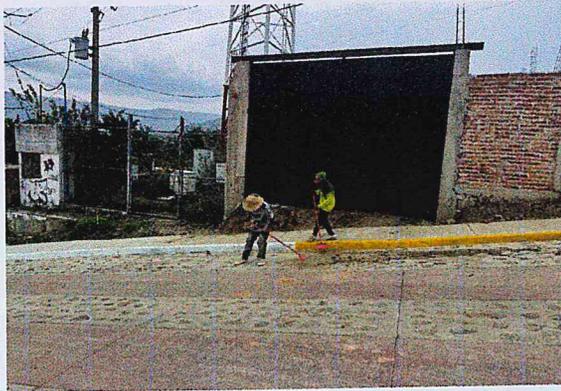

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA:

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA:

03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO". EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-004

LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

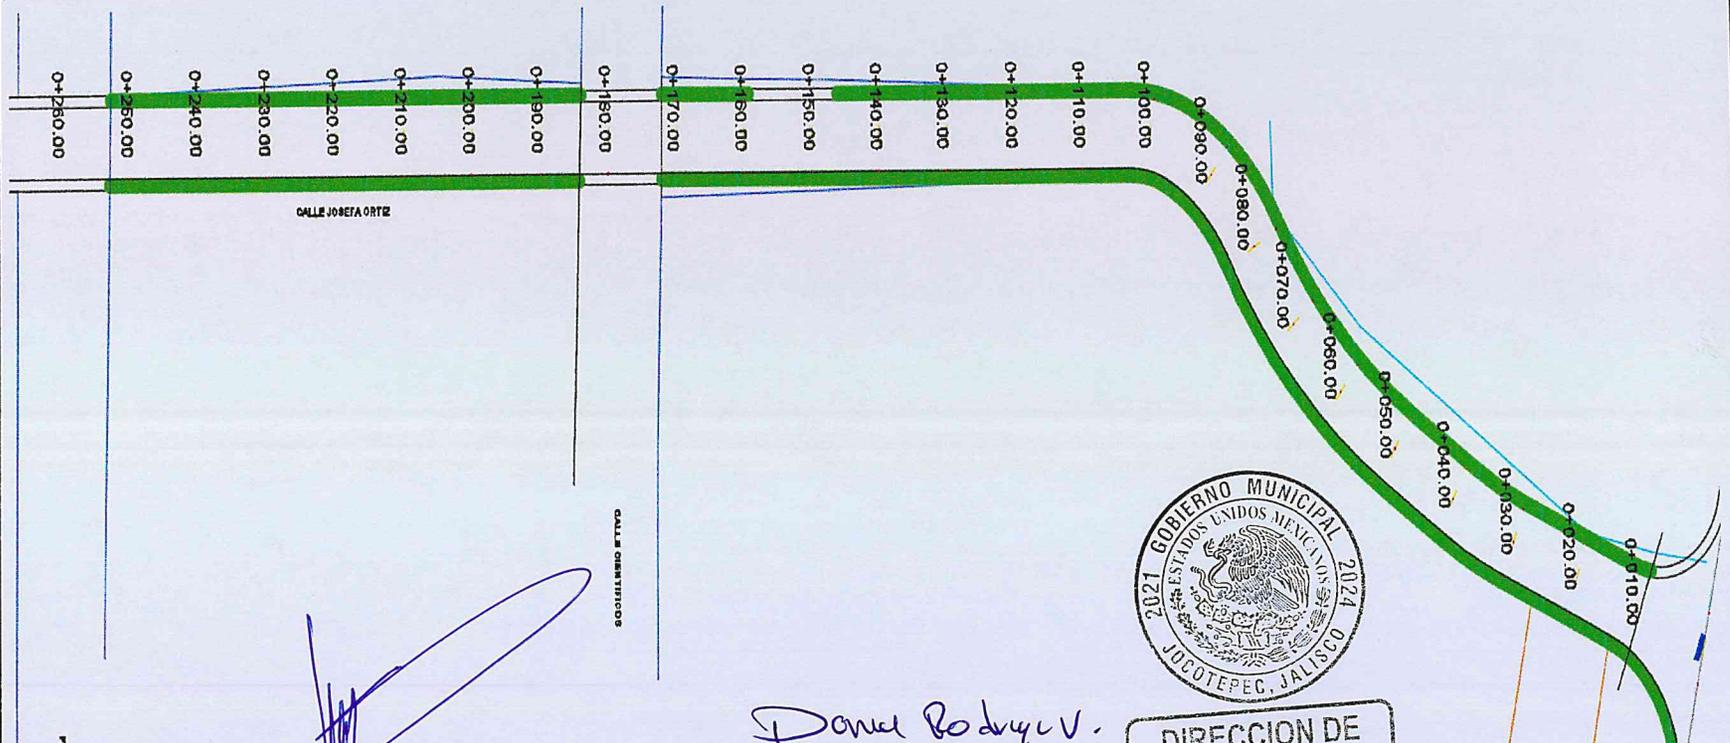

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
 EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.
 DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058CO

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-005

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS METÁLICOS Y TORNILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	AREA PROMEDIO	PZA	TOTAL
PZA	0+030.00	"3"				43.00	43.00
PZA	0+165.00	"2"				43.00	43.00
PZA	0+240.00	"1"				42.00	42.00
						SUMA	128.00

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO




PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-005

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS METÁLICOS Y TORNILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2

FOTOGRAFÍA

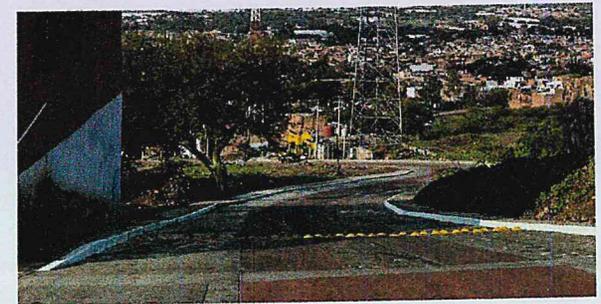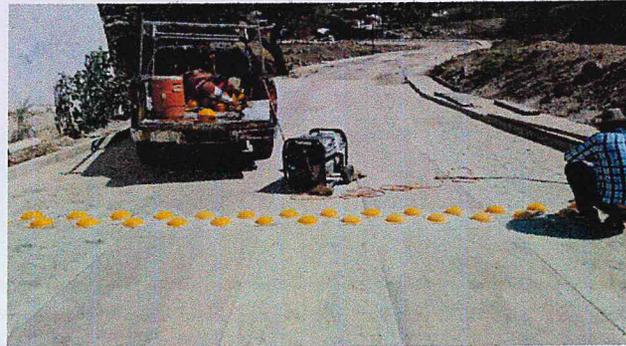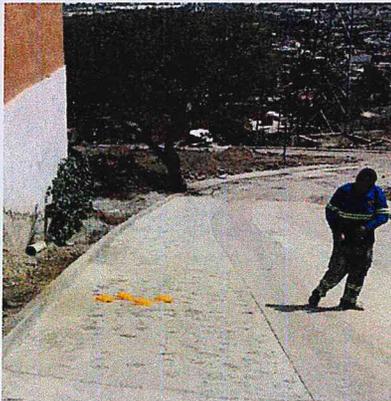

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez Valenzuela
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-005

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS METÁLICOS Y TORNILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2

CROQUIS

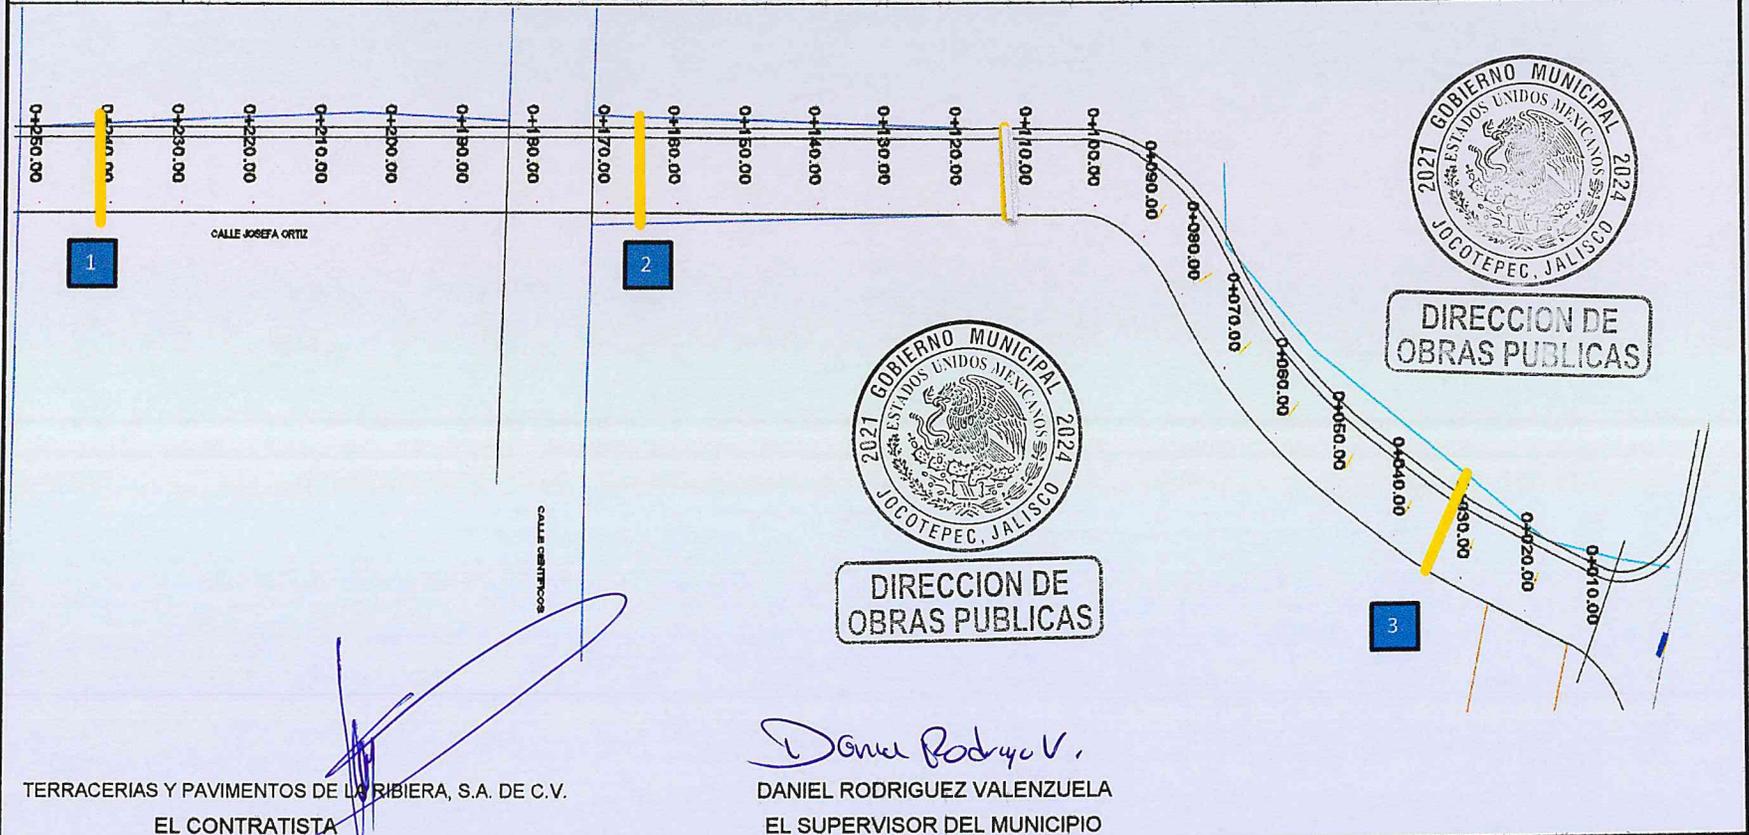

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-006

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYO, A SU ESTRUCTURA REAL, INCLUYE FORJADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

FOTOGRAFÍA

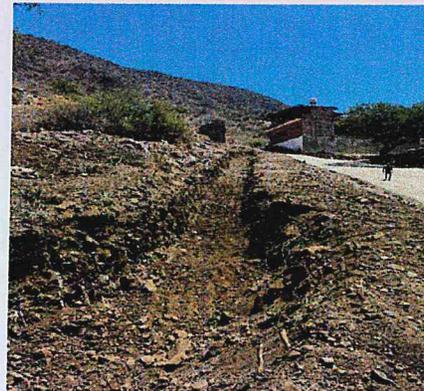

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OSRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-006

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYO, A SU ESTRUCTURA REAL, INCLUYE FORJADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

CROQUIS

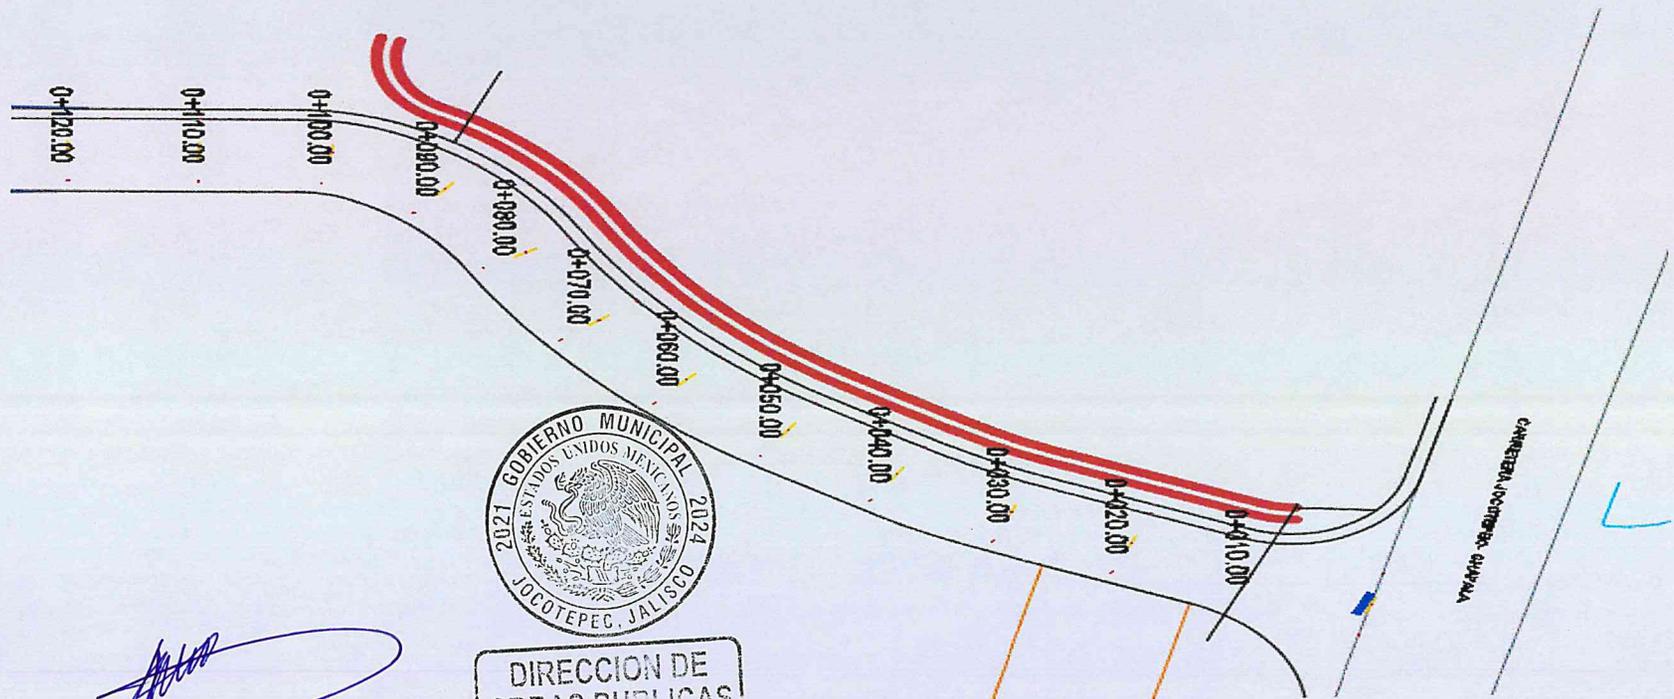

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO



MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

ADS-L-EMP-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO TIPO "L" DE CONCRETO $f_c=200$ Kg/Cm² DE 20 DE BASE Y 35 CMS ALTURA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA

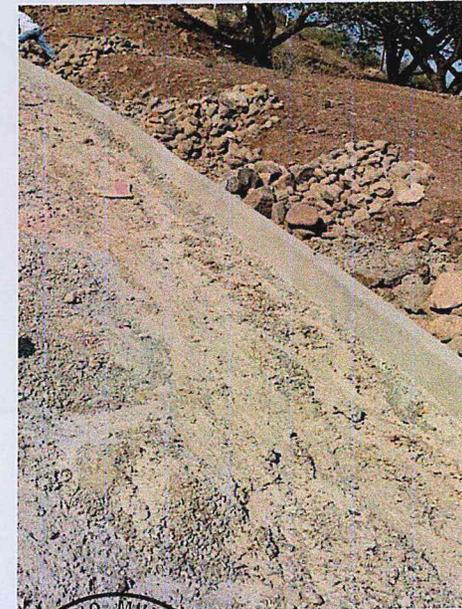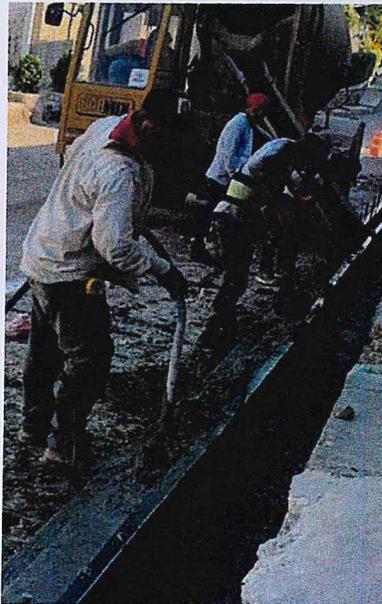

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez Valenzuela
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

ADS-L-EMP-07

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO TIPO "L" DE CONCRETO $f_c=200$ Kg/Cm² DE 20 DE BASE Y 35 CMS ALTURA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

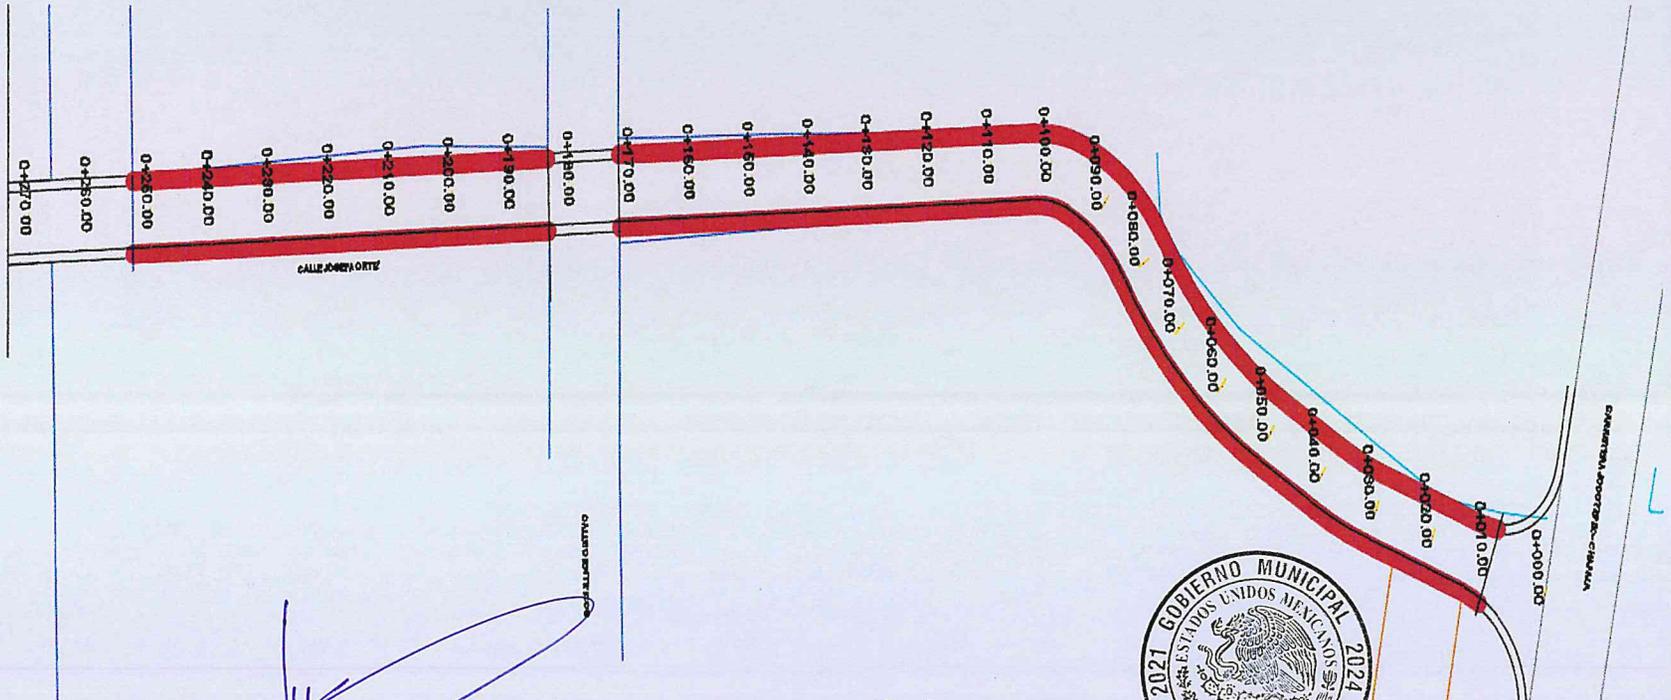

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO



PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

ADS-L-EMP-08

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN MACHUELOS,, COLOR AMARILLA O BLANCA, CUMPLIENDO CON ESPESOR DE 0.38 A 0.51 MILIMETROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFIA

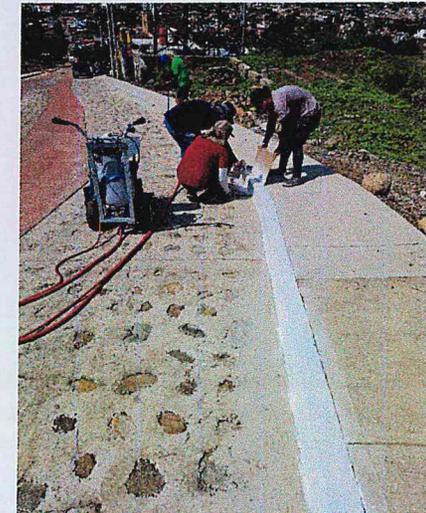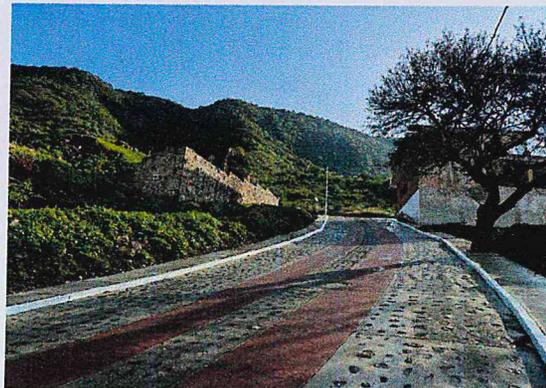

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

ADS-L-EMP-08 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN MACHUELOS,, COLOR AMARILLA O BLANCA, CUMPLIENDO CON ESPESOR DE 0.38 A 0.51 MILIMETROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

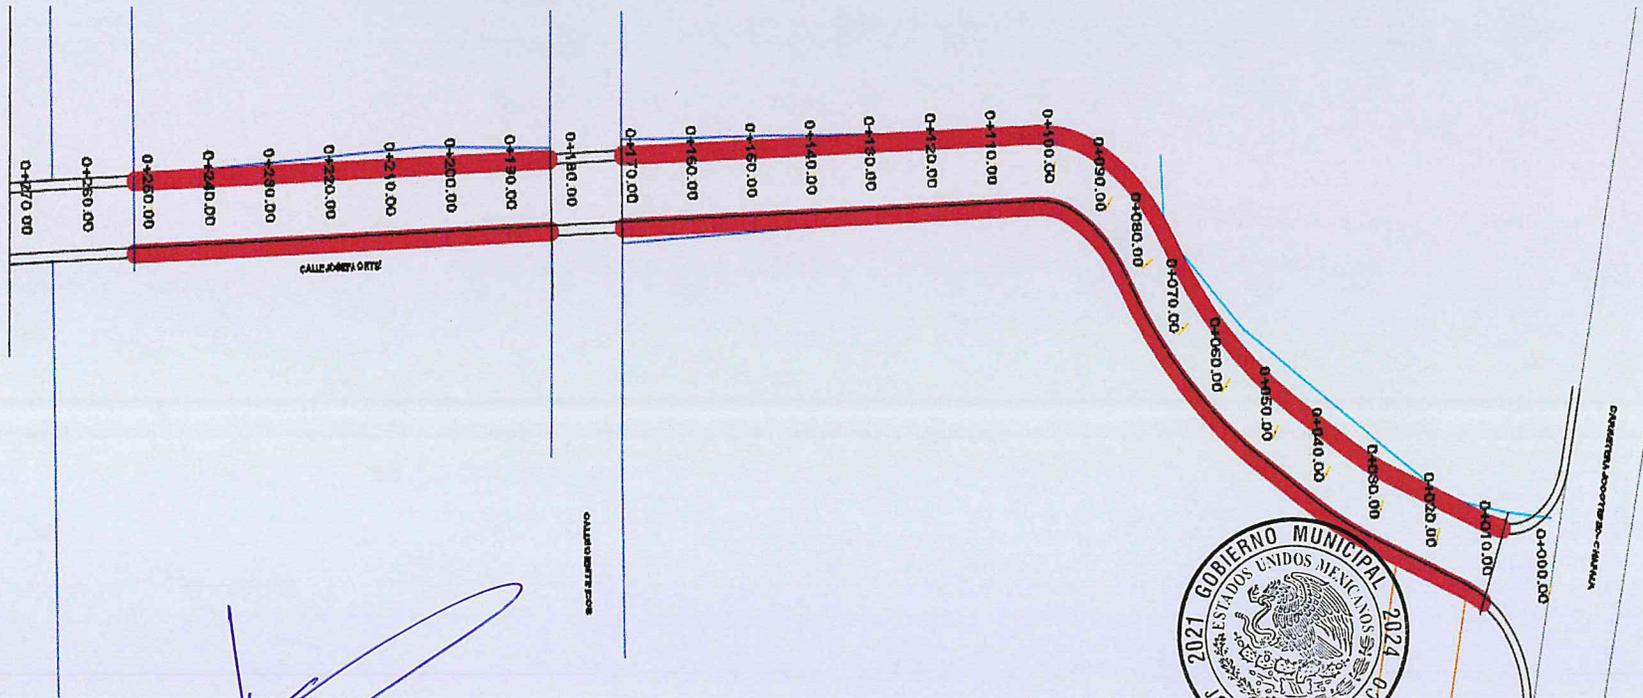

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO




PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-001

AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA

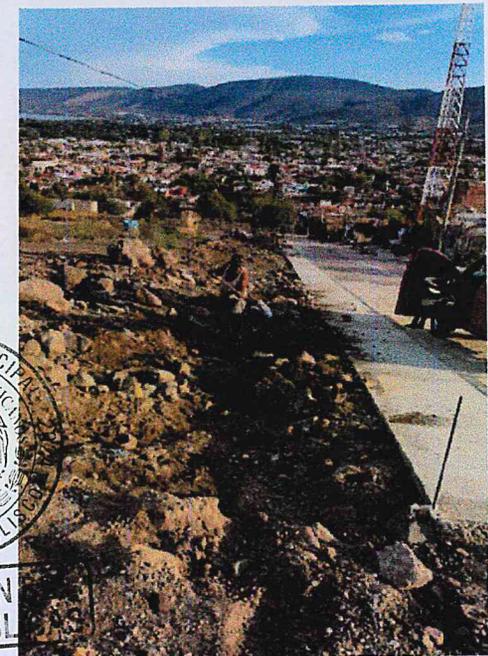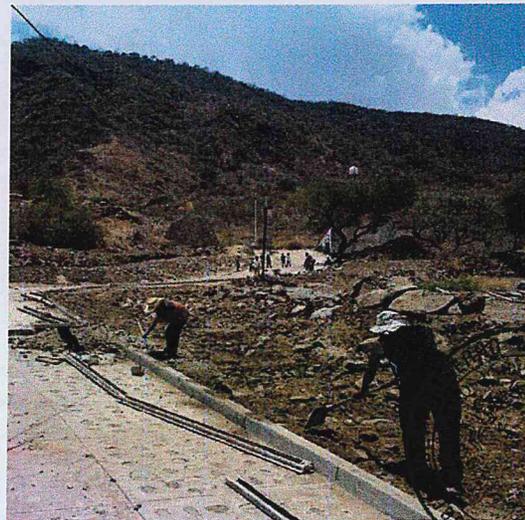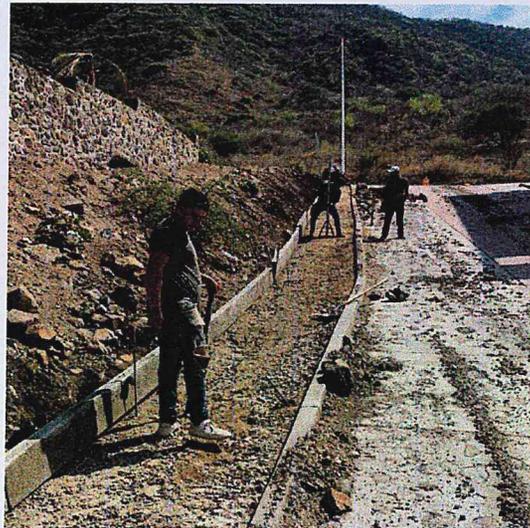

DIRECCION OBRAS PUBL

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 E, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. TPR1806058C0

EMPRESA: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2023

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO

EXT-001

AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

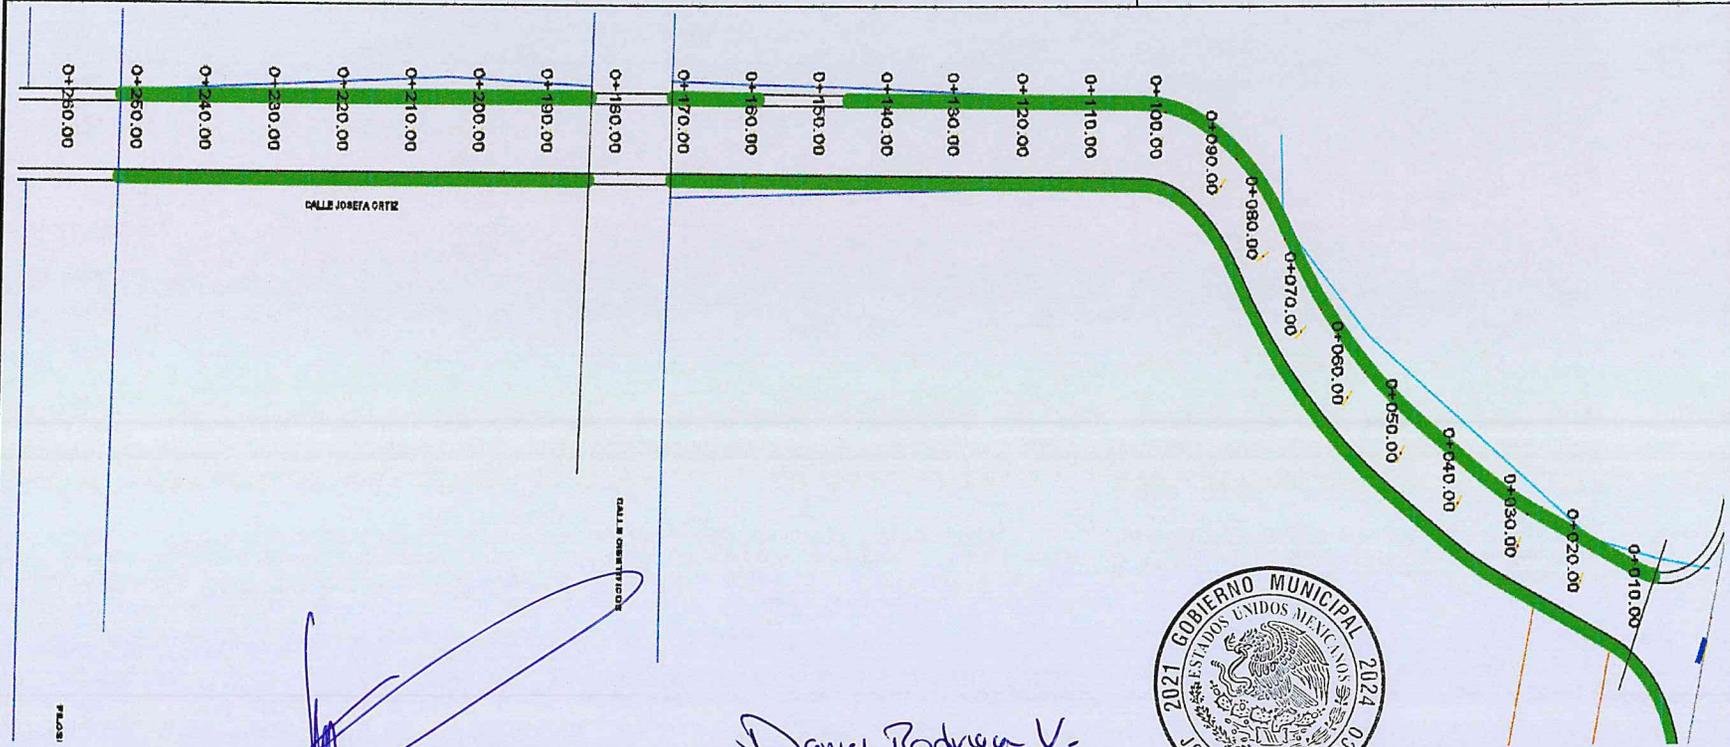

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

JOCOTEPEC, JALISCO A 28 DE ABRIL DE 2023

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE

POR ESTE MEDIO, ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITARLE LA AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION 03 (TRES) DE LA OBRA DENOMINADA: **Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco, CON NUMERO DE CONTRATO: CSS-OP-CC-003/2023, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT-001	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	542.40	\$26.19	\$14,205.46
EXT-002	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN EN FORMA MANUAL DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	M2	542.40	\$191.60	\$103,923.84
EXT-003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE RESISTENCIA ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	542.40	\$411.88	\$223,403.71
EXT-004	LIMPIEZA PARA ENTREGAR OBRA. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,638.28	\$21.16	\$55,826.00
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS METÁLICOS METÁLICOS Y TORINILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2 1/2" POR 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE	PZA	128.00	\$363.95	\$46,585.60
EXT-006	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYO A SU CAUCE NATURAL INCLUYE FORMACIÓN DE TALUD, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	270.00	\$210.99	\$56,967.30
				SUBTOTAL	\$500,911.91
				IVA	80145.9056
				TOTAL	\$581,057.82

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SIRVA BRINDARLE A LA PRESENTE APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

28 ABR. 2023

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco

Anexo:

Núm de concurso: CSS-OP-CC-003/2023

Fecha de propuesta: 28/abr./2023

Inicio de obra: 02/mar./2023

Fin de obra: 02/may./2023

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página: 1/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco					
EXT-001	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO. INLCUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	542.40	26.19	14,205.46
EXT-002	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN EN FORMA MANUAL DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACATACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	542.40	191.60	103,923.84
EXT-003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE RESISTENCIA ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	542.40	411.88	223,403.71
EXT-004	LIMPIEZA PARA ENTREGAR OBRA. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,638.28	21.16	55,826.00
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS METÁLICOS METÁLICOS Y TORINILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2 1/2" POR 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	128.00	363.95	46,585.60
EXT-006	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYO A SU CAUCE NATURAL INCLUYE FORMACIÓN DE TALUD, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	270.00	210.99	56,967.30
IMPORTE DE Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco					500,911.91
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					500,911.91



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

ING. SERIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco

Anexo:
 Núm de concurso: CSS-OP-CC-003/2023
 Fecha de propuesta: 28/abr./2023
 Inicio de obra: 02/mar./2023
 Fin de obra: 02/may./2023

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página: 2/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

IVA (16.00%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

80,145.91

581,057.82



[Handwritten signature]
 ING. SERIO CABRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco

Anexo:

Núm de concurso: CSS-OP-CC-003/2023

Fecha de propuesta: 28/abr./2023

Inicio de obra: 02/mar./2023

Fin de obra: 02/may./2023

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página: 1/6

Análisis de precios unitarios

Clave: EXT-001

Unidad: M2

AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO.

Cantidad: 542.40

INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Precio unitario: 26.19

Total 14,205.46

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	AGUA	AGUA (MANEJO)	m3	0.020000	140.00	2.80
Total de Materiales						2.80
Mano de Obra						
	2A	CUADRILLA No. 4 (2 AYUDANTE GENERAL)	jor	0.018182	1,005.40	18.28
Total de Mano de Obra						18.28
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	18.28	0.55
Total de Herramienta						0.55
Costo directo						21.63
Indirectos de campo						13.0000%
Subtotal						24.44
Financiamiento						0.9277%
Subtotal						24.67
Utilidad						5.5000%
Subtotal						26.03
Cargos adicionales						0.6046%
Subtotal						26.19
Precio unitario						26.19

(* VEINTISÉIS PESOS 19/100 MXN *)



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ING. SERIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco

Anexo:

Núm de concurso: CSS-OP-CC-003/2023

Fecha de propuesta: 28/abr./2023

Inicio de obra: 02/mar./2023

Fin de obra: 02/may./2023

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página: 2/6

Análisis de precios unitarios

Clave: EXT-002

Unidad: M2

Cantidad: 542.40

SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN EN FORMA MANUAL DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Precio unitario: 191.60

Total 103,923.84

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

	AGUA	AGUA (MANEJO)	m3	0.042000	140.00	5.88
--	------	---------------	----	----------	--------	------

	Mbase	BASE HIDRAULICA	m3	0.260000	450.00	117.00
--	-------	-----------------	----	----------	--------	--------

Total de Materiales

122.88

Mano de Obra

	2A	CUADRILLA No. 4 (2 AYUDANTE GENERAL)	jor	0.028571	1,005.40	28.73
--	----	--------------------------------------	-----	----------	----------	-------

Total de Mano de Obra

28.73

Herramienta

	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	28.73	0.86
--	------	-------------------	-------	----------	-------	------

Total de Herramienta

0.86

Equipo

	EQC990122-50	APISONADOR VIBRATORIO (BAILARINA) MODELO A-5000 CON MOTOR A GASOLINA DE 5 H.P. MCA. WACKER	hr	0.083330	69.67	5.81
--	--------------	--	----	----------	-------	------

Total de Equipo

5.81

Costo directo

158.28

Indirectos de campo

13.0000% 20.58

Subtotal

178.86

Financiamiento

0.9277% 1.66

Subtotal

180.52

Utilidad

5.5000% 9.93

Subtotal

190.45

Cargos adicionales

0.6046% 1.15

Subtotal

191.60

Precio unitario

191.60

(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 60/100 MXN *)



ING. SERIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Anexo:

Descripción del proyecto: Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco

Núm de concurso: CSS-OP-CC-003/2023

Fecha de propuesta: 28/abr./2023

Inicio de obra: 02/mar./2023

Fin de obra: 02/may./2023

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página: 3/6

Análisis de precios unitarios

Clave: EXT-003

Unidad: M2

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE RESISTENCIA ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Cantidad: 542.40

Precio unitario: 411.88

Total 223,403.71

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

	DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"	pza	0.122000	95.00	11.59
	AGUA	AGUA (MANEJO)	m3	0.015000	140.00	2.10
	CEMENTOG	CEMENTO GRIS	TON	0.000500	3,480.00	1.74

Total de Materiales

15.43

Mano de Obra

	1A1P	CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	jor	0.100000	1,189.73	118.97
--	------	--	-----	----------	----------	--------

Total de Mano de Obra

118.97

Herramienta

	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	118.97	3.57
--	------	-------------------	-------	----------	--------	------

Total de Herramienta

3.57

Auxiliares

	200	CONCRETO F´C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM. RESISTENCIA NORMAL	m3	0.105000	1,926.59	202.29
--	-----	---	----	----------	----------	--------

Total de Auxiliares

202.29

Costo directo 340.26

Indirectos de campo 13.0000% 44.23

Subtotal 384.49

Financiamiento 0.9277% 3.57

Subtotal 388.06

Utilidad 5.5000% 21.34

Subtotal 409.40

Cargos adicionales 0.6046% 2.48

Subtotal 411.88

Precio unitario 411.88

(* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 88/100 MXN *)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. SERIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco

Anexo:

Núm de concurso: CSS-OP-CC-003/2023
Fecha de propuesta: 28/abr./2023
Inicio de obra: 02/mar./2023
Fin de obra: 02/may./2023

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página: 4/6

Análisis de precios unitarios

Clave: EXT-004

Unidad: M2

LIMPIEZA PARA ENTREGAR OBRA. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Cantidad: 2,638.28

Precio unitario: 21.16

Total 55,826.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Mano de Obra						
	2A	CUADRILLA No. 4 (2 AYUDANTE GENERAL)	jor	0.010000	1,005.40	10.05
Total de Mano de Obra						10.05
Herramienta						
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	10.05	0.30
Total de Herramienta						0.30
Equipo						
	EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7M3	hr	0.010000	712.93	7.13
Total de Equipo						7.13
Costo directo						17.48
Indirectos de campo					13.0000%	2.27
Subtotal						19.75
Financiamiento					0.9277%	0.18
Subtotal						19.93
Utilidad					5.5000%	1.10
Subtotal						21.03
Cargos adicionales					0.6046%	0.13
Subtotal						21.16
Precio unitario						21.16

(* VEINTIÚNPESOS 16/100 MXN *)



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ING. SERIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco

Anexo:

Núm de concurso: CSS-OP-CC-003/2023

Fecha de propuesta: 28/abr./2023

Inicio de obra: 02/mar./2023

Fin de obra: 02/may./2023

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página: 5/6

Análisis de precios unitarios

Clave: EXT-005

Unidad: PZA

Cantidad: 128.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS METÁLICOS METÁLICOS Y TORNILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2 1/2" POR 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Precio unitario: 363.95

Total 46,585.60

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

	BOYAMET	BOYA METALICA	PIEZA	1.000000	133.75	133.75
	TORNALLEN	TORNILLO CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2 1/2" POR 1/4" DIAMETRO	PIEZA	4.000000	4.20	16.80
	TAQMET1/4	TAQUETE METALICO PARA 1/4" Ø	PIEZA	4.000000	12.00	48.00

Total de Materiales

198.55

Mano de Obra

	1A1P	CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	jor	0.083333	1,189.73	99.14
--	------	--	-----	----------	----------	-------

Total de Mano de Obra

99.14

Herramienta

	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	99.14	2.97
--	------	-------------------	-------	----------	-------	------

Total de Herramienta

2.97

Costo directo

300.66

Indirectos de campo

13.0000% 39.09

Subtotal

339.75

Financiamiento

0.9277% 3.15

Subtotal

342.90

Utilidad

5.5000% 18.86

Subtotal

361.76

Cargos adicionales

0.6046% 2.19

Subtotal

363.95

Precio unitario

363.95

(* TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 95/100 MXN *)



[Handwritten signature]

ING. SERIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

Anexo:

Descripción del proyecto: Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco

Núm de concurso: CSS-OP-CC-003/2023

Fecha de propuesta: 28/abr./2023

Inicio de obra: 02/mar./2023

Fin de obra: 02/may./2023

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

Página: 6/6

Análisis de precios unitarios

Clave: EXT-006

Unidad: M3

Cantidad: 270.00

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYO A SU CAUCE NATURAL INCLUYE FORMACIÓN DE TALUD, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Precio unitario: 210.99

Total 56,967.30

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Equipo

	EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7M3	hr	0.100000	712.93	71.29
	EQC990120-40	EXCAVADORA CATERPILLAR	hr	0.125000	824.09	103.01

Total de Equipo

174.30

Costo directo

174.30

Indirectos de campo

13.0000% 22.66

Subtotal

196.96

Financiamiento

0.9277% 1.83

Subtotal

198.79

Utilidad

5.5000% 10.93

Subtotal

209.72

Cargos adicionales

0.6046% 1.27

Subtotal

210.99

Precio unitario

210.99

(* DOSCIENTOS DIEZ PESOS 99/100 MXN *)



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ING. SERIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
OFICIO: 320-B/ 2023
ADM. 2021-2024
Jocotepec Jalisco, a 2 de mayo del 2023

Ing. Sergio Cabrera.
Edificaciones y Terracerías de la Ribiera, S.A. DE C.V.

PRESENTE:

Asunto: volúmenes y conceptos fuera de catalogo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a su solicitud recibida el día 28 de abril del 2023, el cual se **autoriza** los volúmenes y conceptos fuera de catalogo: **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, LÍNEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO**". No. de contrato: **CSS-OP-CC-003/2023**.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT-001	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES CON PISON DE MANO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	542.40	\$26.19	\$14,205.46
EXT-002	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN EN FORMA MANUAL DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	M2	542.40	\$191.60	\$103,923.84
EXT-003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE RESISTENCIA ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	542.40	\$411.88	\$223,403.71
EXT-004	LIMPIEZA PARA ENTREGAR OBRA. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,638.28	\$21.16	\$55,826.00
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METÁLICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS METÁLICOS METÁLICOS Y TORINILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2 1/2" POR 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE	PZA	128.00	\$363.95	\$46,585.60
EXT-006	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYO A SU CAUCE NATURAL INCLUYE FORMACIÓN DE TALUD, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCIÓN.	M3	270.00	\$210.99	\$56,967.30
				SUBTOTAL	\$500,911.91
				IVA	80145.9056
				TOTAL	\$581,057.82

Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido enviándole un saludo.

Atentamente:

C. Imelda Karina Pérez González
Director de Obras Publicas

Tú decides mejor



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

02 Mayo 23



SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES
JOCOTEPEC, JALISCO A 28 DE ABRIL DE 2023

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE

POR ESTE MEDIO, ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITARLE LA AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION 03 (TRES) DE LA OBRA DENOMINADA: **Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable, huella de concreto y empedrado ahogado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de calle Filósofos hasta el Libramiento, en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco, CON NUMERO DE CONTRATO: CSS-OP-CC-003/2023, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ADS-L-EMP-01	TRAZO Y NIVELACIÓN UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRÁFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIEVL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	M2	542.40	\$13.28	\$7,203.07
				Importe total	\$ 7,203.07

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SIRVA BRINDARLE A LA PRESENTE APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.


ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

28 ABR. 2023


RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.



Ing. Sergio Cabrera.
Edificaciones y Terracerías de la Ribiera, S.A. DE C.V.

PRESENTE:


Asunto: volúmenes excedentes

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a su solicitud recibida el día 28 de abril del 2023, el cual se **autoriza** el volumen excedente de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, LÍNEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO**". No. de contrato: **CSS-OP-CC-003/2023**.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ADS-L-EMP-01	TRAZO Y NIVELACIÓN UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRÁFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	M2	542.40	\$13.28	\$7,203.07
				Importe total	\$ 7,203.07

Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido enviándole un saludo.

Atentamente:


C. Imelda Karina Pérez González
Director de Obras Públicas



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

02. Mayo. 23

Tú decides mejorar



RE.01 Versión 01

Vigente a partir del 12 de abril del 2023

INFORME DE RESULTADOS

ENSAYE MUESTRAS CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA: JOCOTEPEC No de informe: 006
 UBICACIÓN: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Fecha Informe: 29 DE ABRIL 2023
 SOLICITA: ING. EDUARDO ARANDA No. De muestra: JC-05

IDENTIFICACIÓN:

ELEMENTO: GUARNICION
 LOCALIZACIÓN: CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110
 TIPO DE MUESTRA: CUBO DE 10 cm POR LADO
 Frecuencia y Plan de Muestreo:
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: PCH 161

DATOS DE LA MEZCLA: ORIGEN, TRATAMIENTO Y COLADO


Fecha de muestreo:	<u>29 DE ABRIL 2023</u>	Fecha de recepción de la muestra:	<u>30 DE ABRIL 2023</u>
Proveedor:	<u>HECHO EN OBRA</u>	Revenimiento proyecto (cm):	<u>14</u> T.M.A.(mm): <u>20</u>
Equipo de mezclado:	<u>CAMION REVOLVEDOR</u>	Revenimiento obtenido (cm):	<u>16</u> Aditivo: <u>NO</u>
Vibrado (SI)/(NO):	<u>SI</u>	Tipo de concreto:	<u>N-28 DIAS</u> Bombeado (SI)/(NO): <u>NO</u>
Marca y tipo de cemento:	<u>-</u>	# Remisión:	<u>-</u> No. unidad: <u>1</u>
f'c (kg/cm ²)	<u>200</u>	Hora de Salida:	<u>12:10</u> Hora de llegada: <u>12:20</u> Hora de vaciado: <u>12:30</u>

ESPECIMENES CURADOS EN INMERSION TOTAL EN AGUA

No. de especímenes		Temperatura ambiental al momento de la toma de muestra:						
3		28.6°c						
No de especimen	Fecha de ruptura:	Edad (días):	Carga ruptura (kgf):	Lado promedio (cm):	Área (cm ²):	RESISTENCIA (kgf/cm ²):	RESISTENCIA (MPa):	% de avance *
13	11-jul.-23	7	09 510	10	100	95.1	9.3	47.6%
14	18-jul.-23	14	10 970	10	100	109.7	10.8	54.9%
15	1-ago.-23	28	13 640	10	100	136.4	13.4	68.2%

* El porcentaje de avance se estima con base al f'c de proyecto

f'c promedio a edad especificada es de (kgf/cm²): 136.4

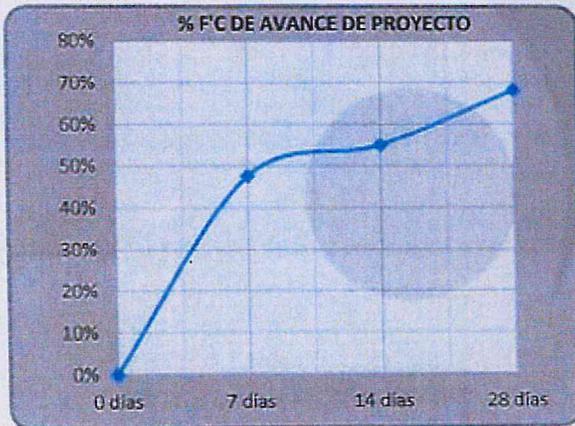

Ensayos y muestreos basadps en los siguientes estandares del ONNCE:

NMX-C-161 -ONNCE-2013 "MUESTREO DE CONCRETO FRESCO", NMX-C-156-ONNCE-2010 "DETERMINACIÓN DE REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO", NMX-C-159-ONNCE-2016, "ELABORACIÓN Y CURADO EN EL LABORATORIO DE ESPECÍMENES DE CONCRETO, NMX-C-109-ONNCE-2013 "CABECEO DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO (Unicamente con compuesto de mortero)" Y NMX-C-083-ONNCE-2014 " DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO"

Notas:

- Nota 1: kgf/cm² equivale a 0.0980665 MPa
- Nota 2: Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras ensayadas, se prohíbe la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización previa de SCP INGENIERIA S.A.de C.V. el informe no tiene validez si sus firmas no son autógrafas.
- Nota 3: Los resultados se obtuvieron con la utilización de una maquina de ensaye con una factor de cobertura k=2 que representa un nivel de confianza de 95.45%
- Nota 4: Los equipos de medición utilizados en las pruebas y para verificación interna, fueron calibrados en laboratorios acreditados por la ema, y cuentan con trazabilidad al centro nacional de metrología.
- Nota 5: Las determinaciones del revenimiento se determinarán en las instalaciones de la obra del cliente. Nota 6: Las declaraciones de conformidad se declaran como se indica en los terminos y condiciones, por lo que el presente informe debe ser interpretado por el residente de obra o quien este designe.

SCP INGENIERIA S.A. de C.V. le informa que cuenta con una política de imparcialidad la cual determina que la dirección del laboratorio y sus colaboradores están comprometidos con la imparcialidad en llevar a cabo las actividades descritas sin dar trato preferente, de esta manera evitamos el conflicto de interés y garantizamos la objetividad de nuestros resultados. por lo que cualquier violación a dicha declaración favor de reportarlo al email: scp-ingenieria@hotmail.com
 SCP INGENIERIA S.A. de C.V. le informa que dando cumplimiento a la confidencialidad el presente informe se maneja de carácter confidencial de acuerdo al nivel de prioridad vigente al momento de emisión del presente informe, el cual fue aceptado junto con el presupuesto contrato PMA-39 previo a la ejecución del servicio y se actualiza como ahí se refiere. Por lo que en lo sucesivo no se hace responsable por el informe en propiedad del cliente.
 SCP INGENIERIA S.A. de C.V. le solicita por lo que cualquier queja o sugerencia ser recibida al e-mail: scp-ingenieria@hotmail.com. Com, en caso de tratarse de una queja favor de adjuntar toda la evidencia disponible, una vez recibida la queja la gerencia administrativa la contactara en un periodo de 14 horas hábiles para indicarle el status del seguimiento, y la mantendra informada de la respuestas y acciones de su queja hasta el cierre, dicho tiempo no excedera los 10 dias hábiles posteriores a la recepción de su queja.

Ensayo muestra

 Tec. Carlos Martín Rodríguez
 Scp Ingenieria S.A. de C.V.

Revisó y aprobó:

 EUCALPTO #1340
 INGENIERIA
 GUADALAJARA,
 Jalisco
 C.P. 44910 (33) 30700359
 Ing. Edmundo Terán Aranda
 R.F.C. SIN080122GK8
 Scp Ingenieria S.A. de C.V.

Fin del documento

El presente informe consta de 1 página de 1



RE.01 Versión 01

Vigente a partir del 12 de abril del 2023

INFORME DE RESULTADOS

ENSAYE MUESTRAS CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA:	JOCOTEPEC	No de informe:	5
UBICACIÓN:	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Fecha Informe:	29 DE ABRIL 2023
SOLICITA:	ING. EDUARDO ARANDA	No. De muestra:	JC-05

IDENTIFICACIÓN:

ELEMENTO:	BANQUETA	Frecuencia y Plan de Muestreo:	
LOCALIZACIÓN:	CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110	PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:	PCH 161
TIPO DE MUESTRA:	CUBO DE 10 cm POR LADO		

DATOS DE LA MEZCLA: ORIGEN, TRATAMIENTO Y COLADO

Fecha de muestreo:	29 DE ABRIL 2023	Fecha de recepción de la muestra:	30 DE ABRIL 2023
Proveedor:	HECHO EN OBRA	Revenimiento proyecto (cm):	14
Equipo de mezclado:	CAMION REVOLVEDOR	Revenimiento obtenido (cm):	16
Vibrado (SI)/(NO):	SI	T.M.A.(mm):	20
Marca y tipo de cemento:	-	Aditivo:	NO
f'c (kg/cm ²):	200	Tipo de concreto:	N-28 DIAS
		# Remisión:	
		No. unidad:	1
		Hora de Salida:	12:10
		Hora de llegada:	12:20
		Hora de vaciado:	12:30


ESPECIMENES CURADOS EN INMERSION TOTAL EN AGUA

No. de especímenes: 3 Temperatura ambiental al momento de la toma de muestra: 28.6°C

No de especimen	Fecha de ruptura:	Edad (días):	Carga ruptura (kgf):	Lado promedio (cm):	Área (cm ²):	RESISTENCIA (kgf/cm ²):	RESISTENCIA (MPa):	% de avance *
13	11-jul-23	7	09 510	10	100	95.1	9.3	47.6%
14	18-jul-23	14	10 970	10	100	109.7	10.8	54.9%
15	1-ago-23	28	13 640	10	100	136.4	13.4	68.2%

* El porcentaje de avance se estima con base al f'c de proyecto

f'c promedio a edad especificada es de (kgf/cm²): 136.4

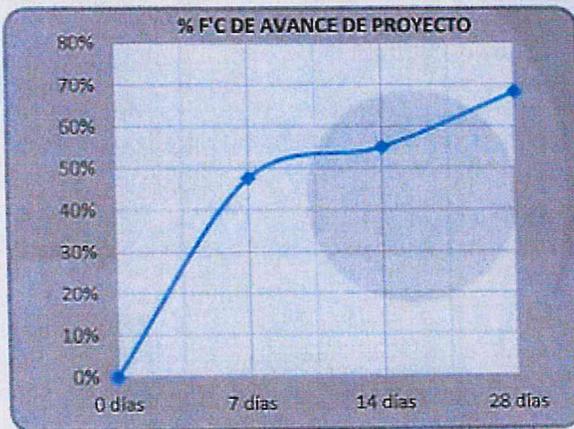

Ensayos y muestreos basados en los siguientes estándares del ONNCCCE:

NMX-C-161-ONNCCCE-2013 "MUESTREO DE CONCRETO FRESCO", NMX-C-156-ONNCCCE-2010 "DETERMINACIÓN DE REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO", NMX-C-159-ONNCCCE-2016, "ELABORACIÓN Y CURADO EN EL LABORATORIO DE ESPECÍMENES DE CONCRETO, NMX-C-109-ONNCCCE-2013 "CABECEO DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO (Unicamente con compuesto de mortero)" Y NMX-C-083-ONNCCCE-2014 "DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO"

Notas:

- Nota 1: kgf/cm² equivale a 0.0980665 MPa
- Nota 2: Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras ensayadas, se prohíbe la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización previa de SCP INGENIERIA S.A. de C.V. el informe no tiene validez si sus firmas no son autógrafas.
- Nota 3: Los resultados se obtuvieron con la utilización de una máquina de ensaye con una factor de cobertura k=2 que representa un nivel de confianza de 95.45%
- Nota 4: Los equipos de medición utilizados en las pruebas y para verificación interna, fueron calibrados en laboratorios acreditados por la emm, y cuentan con trazabilidad al centro nacional de metrología.
- Nota 5: Las determinaciones del revenimiento se determinarán en las instalaciones de la obra del cliente. Nota 6: Las declaraciones de conformidad se declaran como se indica en los terminos y condiciones, por lo que el presente informe debe ser interpretado por el residente de obra o quien este designe.

SCP INGENIERIA S.A. de C.V. le informa que cuenta con una política de imparcialidad la cual determina que la dirección del laboratorio y sus colaboradores están comprometidos con la imparcialidad en llevar a cabo las actividades descritas sin dar trato preferente de esta manera evitamos el conflicto de interés y garantizamos la objetividad de nuestros resultados, por lo que cualquier violación a dicha declaración favor de reportarlo al email: sup-ingenieria@hotmail.com

SCP INGENIERIA S.A. de C.V. le informa que dando cumplimiento a la confidencialidad el presente informe se maneja de carácter confidencial de acuerdo al aviso de privacidad vigente al momento de emisión del presente informe, el cual fue aceptado junto con el presupuesto contrato PCH 23, previendo a la ejecución del servicio y se actualiza como así se refiere. Por lo que en lo sucesivo no se hace responsable por el informe en propiedad del cliente.

SCP INGENIERIA S.A. de C.V. se reserva por lo que cualquier queja o su reclamo será atendido al e-mail: sup-ingenieria@hotmail.com. Com, en caso de tratarse de una queja favor de adjuntar toda la evidencia disponible. Una vez recibida la queja la gerencia administrativa le contactara en un periodo de 24 horas hábiles para indicarle el estatus del seguimiento, y lo mantendrá informado de la respuesta y acciones de su queja hasta el cierre, dicho tiempo no excedera los 10 días hábiles posteriores a la recepción de su queja.

Ensayo muestra

 Tec. Carlos Martín Rodríguez
 Scp Ingeniería s.a. de c.v.

Revisó EUGALPTO #1340
 INGENIERIA GUADALAJARA,
 C.P. 44910, (33) 30700359
 R.F.C. SIN080122GK8
 Scp Ingeniería S.A. de C.V.

Fin del documento.



INFORME DE RESULTADOS

Obra: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
 Ubicacion: JOCOTEPEC, JALISCO
 Empresa: TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA S. A. DE C. V.
 Plataforma: BANQUETA

Fecha: 29 DE ABRIL 2023
 Banco: DESCONOCIDO
 % Comp. 90%
 Espesor Proyecto: 20 CM

No. SONDEO	CAPA	EJE / UBICACIÓN	LADO	PROF. SONDEO	VOL.	PESO HUM	P.V.H.	%H. CAMPO	%H. OPTIMA	P.V.S.	P.V.S.M.	% DE COMPACT
S-1	BANQUETA	0+007	IZQ	20	1426	2200	1543	21.5	34.7	1270	1350	94.1%
S-2	BANQUETA	0+040	CTO	20	1538	2310	1502	18.9	34.7	1263	1350	93.6%
S-3	BANQUETA	0+080	DER	14	1391	2100	1510	20.3	34.7	1255	1350	93.0%



Cumple: TOTAL DE SONDEOS **3** No Cumple: TOTAL DE SONDEOS

Observaciones SE VERIFICO EL GRADO DE COMPACTACION EN LA BANQUETA CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON EL MINIMO REQUERIDO DE ACUERDO A PROYECTO.

Carlos
 Laboratorio
 Tec. Carlos Martín Rodríguez Pérez
 Scp Ingeniería s.a. de c.v.

SCP INGENIERIA
 EUCALIPTO # 1340
 GUADALAJARA,
 C.P. 44910 (33) 30700359
 R.F.C. SIN080422GK8
 Angelmo Yeran Arias
 Scp Ingeniería s.a. de c.v.

Norma Mexicana. > "Industria de la Construcción Muestreo de Estructuras Terreas y Metodos de Prueba; NMX-C-416-ONNCE 2003
 Norma S.C.T. > MMP. Metodos de Muestreo y Pruebas de Material, 1. Suelos y Materiales para Terracerias, M-MMP-1-08/03
