

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH

RFC: ETC220211Q32

Domicilio: MORELOS No. 67 No. Int D, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 45800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio - 27
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 16/8/2023 13:57:10
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8 Uso CFDI: 101 - Construcciones
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Régimen Fiscal:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72141205 - Servicio de construcción de sistemas de drenaje	ESTIMACION No. 2(DOS) FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPOSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO del contrato GMJ 007C-OP/2023 menos la retencion de 5 al Millar (R.I.V. SEFUPU) para contraloria del estado por \$364.90 pesos, Monto efectivo para pago \$84,291.73 pesos	72,979.85	0.00	002 - IVA - 11,676.78	72,979.85

Importe con letra:

OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.

Subtotal 72,979.85
Impuestos Traslados 11,676.78
Total 84,656.63

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000515019517

Folio fiscal

46C0B20A-926C-4AA9-9A83-7B88A559CD22

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Agosto 16 2023 - 13:57:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del SAT

LCXenk07Ilsuy02yx1/butZl/jam1LBcwKk9ijesc2rzi26fVkoQ9oufhyMC/YNUtiOxyh6v6rUINBh8WVNHEN
oNra7MgoWfAFDq2hLSTVI14js6qUX7OLBDbY7CaTDUp1Cf0j5MQPQ25FhkvyKYjd7atL/yacMvJDIhrmGjarR
ZwcQCeoOmI8OeG8q+c7Mm3dVoY88gBDP3cZgHtj81QtIbQg08lcCQhc1wzdl6Q/rIjhKTrU9JF1/LzPqKDNkl
K3ozjnZiDprYSndLRlBwP77D9ymtWJ119rfM5Anyxenbp/Y67sq9rjBOCgh9L0x882AAJxchOWtsEBa7KQQ==

Sello del SAT

B2TQFvErpThVb8/jN5yb5XYMEIjzeGk65z/f/AF257mSoVa0tWNzPQLhER136s8XQtKcc5XXGKkBdHf
UPP6wvBMCvSFzEuT0i9QhsNUJC1d8B8pmHjRZVWa4TtFNekSAfdtbrbFO0QnOelnsGKTIkfsrGHCAwv
xOMyT2yjj/B4EuTcXdv6miZ0wB0OeNedAZdgoY8JA6vpA26VnEJtbhFBpwBcGZtwLY0gxLjqzDGN0e0R

Naq1CgZf4DU74DGT4r1Bluwz9viUrnQyyy8RNTpV4LAvNVyILDENwp7ySpfczyk8E6xDDdU/SBxN+uHa
nOIOCFcn5Fw0FZA2ic14Aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|46C0B20A-926C-4AA9-9A83-7B88A559CD22|2023-08-16T13:57:11|MAS0810247C0|LCXe
nk07llsuy02yx1/butZl/jam1LBcwKk9ijesc2rziZ6fVKoQ9oufhymC/YNUtlOxyh6v6rUiNBh8WVNH
ENoNra7MgoWfAFDq2hL5TV114js6qUX7OLBDby7CaTDUp1Cf0j5MQPQ25FhkvvYKjd7atL/yacMwJDI
hrmGjarZwcQCeOml8OeG8q+c7Mm3dVoY88gBDP3cZgHtj81QtIbQg08lcCQhc1wzdl6Q/rIhjhKTrU
9JF1/LzPqKDNkIK3ozjnZiDprYSndLRibWp77D9ymtWJ1I9rfMd5Anyxenbp/Y67sq9rjBOCgh9L0x88
2AAJxchOWtsEBa7KQQ==|00001000000505142236||



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45800" MetodoPago="PUE" Exportacion="01"

TipoDeComprobante="I" Total="84656.63" Moneda="MXN" SubTotal="72979.85"

Certificado="MIIGNjCCBB6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTUwMTk1MTcwDQYJ
KoZlhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRPUkIEQUQgQ0VSVEIGSUNBRE9
SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSvkIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQIVUQVJJ
QTEaMBgGA1UECwwRU0FULUIFUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbN
RhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyUEhJREFMR08gNzcsIE
NPTC4gR1VFUIJFuk8xDjAMBGNVBBEMBTAA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBc
GA1UECAwQQ0IVREFEIERFIE1FWEDTzETMBEGA1UEBwwKQ01VBVUuURU1PQzEVM
BMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZ
TogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQIVUQVJJT1
MgQUwgQ09OVFJJQIVZRU5URTAeFw0yMjA5MDkxNTU1MDNaFw0yNjA5MDkxNTU1MD
NaMIIIBAzEwMC4GA1UEAxMnRURJRkdQUNJT05FUyBZIFRFRUIBQ0VSSUFTIENIIFNBI
ERFIENWMTAwLgYDVQQPEydfREIGSUNBQ0IPTkVTIFkgVEVSUkFDRVJJQVMgQ0ggU
0EgREUgQ1YxMDAuBgNVBAOTJ0VESUZJQ0FDSU9ORVMgWSBURVJSQUNFUKIBUyBDS
CBTQSBERSDBVjEIMCMGA1UELRMcRVRDMjIwMjE5MDkxNTU1MDNaFw0yNjA5MDkxNTU1MD
MDEeMBwGA1UEBRMVIC8gSEVIQTcyMDYxMEhERISUjAxAxMSQwIgYDVQQLExtFREIG
SUNBQ0IPTkVTIFkgVEVSUkFDRVJJQVMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwg
gEKAoIBAQC0Y1/IEblq54UukwadKtxro0IUR5IbtunZTA3X5htF0bdEURsJhPk/mh1dAEkijnv
igGzJ6AU42RW3pLp97IC08yqmB/A/JGmHFm0FUY2aA3WWJZ7rolur6/0q0RnH82qW13A6
FWMIInbqL6B6ts10Er0YhwrjLEe5u7XNjsoYdAgzhzuRfh01Xb+YVcw/xT6zDVPwfwy0tHIIKA
+EViRLFN4j2FL2U7qIYREYC6uFT/2SXdMGahLjRnh/3HPQg/ZP1SmM5p1fohd1jLfKvInhIy
SbpGkM+4ysNkb4O1NLmidjPZ/NlkT1HeNNtXYwhzdBXw5+RUw4qMmZ9fz/IV7BdAgMBAA
GjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBBCwU
AA4ICAQAnhAdaZiG+mvL24fVnQ1hUwif3hyqRjifD5DeSjpw85gz7aRd/IWuAPCFg2lbHeXw
HsgJ6P4/AHXddITza+5VObl8ol+Xh5r0f4AZElo+1YwZSw59WYxYHMey6gxhNRgK1j+ZQcj
80O/4W9db0aP2ReFzXT1sFJXfJoR56PrmORSfao6kE/j3UfMmoBkVoWGmPmo/x1kDc+n9TcT
J9GxcWfnBbiigYehTzy2X8TEM8/wRgvl2Btkhlrum5TU+DrJg1MbavVUsXWhtlLZ3s15qCDgj
DLxMZBcDGECHor/n+cpSm9957pYSdZAz6Q/sbPal3UMavuT5IzaIyTgx0+bAKefCkXAX9Ma
Zv/0oJA6cGdihQ2wBjyrzKrXbkIkRsEBVqxTTKbBToo20w8T4bZqzvN2TmvLK832RFzfv7aPc
M+odKspMmWnreviIc0WUhlLnAbHgXYHkkRzPrAouxcr88bD/IMUB2CJgflD4FpH4KRyOF
MxvJa/zKCJbfJMNNsryN1QG65YS2tC2hjP7i2/ivq/dynU57qgDT3AK1D3J+JIVtvUUX2E02sF
XBrvef6JCo7Z4mp3D3A8+DU3hffZi4OR4b94yPTqmHJXwBo1LCyZLX5y3dXIvxRyzUn+Cv
OWm35+wjNpfOrsxAlqtce0nl0zSeQU5SEHihyQBrdpADvA=="

NoCertificado="00001000000515019517" FormaPago="03"

Sello="LCXenk07Ilsuy02yx1/butZI/jam1LBcwKk9ijesc2rziZ6fVKoQ9oufhymC/YNUtiOxyhox6
rUiNBh8WVNHENoNra7MgoWfAFDq2hL5TVI14js6qUX7OLBDbY7CaTDUp1Cf0j5MOPQ25
FhkvvYKYjd7atL/yacMvJDlhrmGjarRZwcQCeOml8OeG8q+c7Mm3dVoY88gBDP3cZgHtj81
QtlbQg08IcCQhc1wzdi6Q/rIhjhKTrU9JF1/LzPqKDNklK3ozjnZiDprYSndLRibWp77D9ymtW
J1I9rfMd5Anyxenbp/Y67sq9rjBOCgh9L0x882AAJxchOWtsEBa7KQQ==" Fecha="2023-08-
16T13:57:10" Folio="27" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"



xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"><cfdi:Emisor Nombre="EDIFICACIONES Y
TERRACERIAS CH" Rfc="ETC220211Q32" RegimenFiscal="601"/><cfdi:Receptor
Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" Rfc="MJJ850101KP8" UsoCFDI="I01"
RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="45800"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto
ObjetoImp="02" Importe="72979.85" ValorUnitario="72979.85" Descripcion="ESTIMACION No.
2(DOS) FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DE 6" EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DEL LIBRAMIENTO
AL DEPOSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO del
contrato GMJ 007C-OP/2023 menos la retencion de 5 al Millar (R.I.V. SEFUPU) para
contraloria del estado por \$364.90 pesos, Monto efectivo para pago \$84,291.73 pesos"
NoIdentificacion="SER12" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Cantidad="1.00"
ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="72141205"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Importe="11676.78" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
Base="72979.85"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impu
estos TotalImpuestosTrasladados="11676.78"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="11676.78"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
Base="72979.85"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="B2TQFvErpThVb8/jN5yb5XYMELJizeGk65z/f/AF257mSoVa0tWNzPQLhER136s8X
QtKcc5XXKGkBDHfUPP6wvBMCvSSFzEuT0li9QhsNUJC1dB8pmHjRZVWa4TtFNekSAfdtbr
bFO0QnOelnsGKTIkfsrGHCAwvxOMyT2yjj/B4EUtCxDv6miZ0wB0OeNedAZdqoY8jA6vpA2
6VnEJTbhFBpwBcGZtwLY0gxLjqzDGNOeoRNaq1CgZf4DU74DGT4rIBIuwz9vIUrnQyyyBR
NtpV4LAvNVyILDENwp7ySpfczyk8E6xDDdU/SBxN+uHanOIOCfcfn5Fw0FZA2icI4Aw=="
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloCFD="LCXenk07Ilsuy02yx1/butZI/jam1LBcwKk9ijesc2rziZ6fVKoQ9oufhymC/YNUtlOxy
h6v6rUiNBh8WVNHENoNra7MgoWfAFDq2hL5TVI14js6qUX7OLBDby7CaTDUp1Cf0j5MQ
PQ25FhkvyvYKYjd7atL/yacMvJDIhrmGjarRZwcQCeOml8OeG8q+c7Mm3dVoY88gBDP3cZg
Htj81QtIbQg08IcCQhc1wzdI6Q/rIhjhKTrU9JF1/LzPqKDNklK3ozjnZiDprYSndLRlBwP77D9
ymtWJ1I9rfMd5Anyxenbp/Y67sq9rjBOCgh9L0x882AAJxchOWtsEBa7KQQ=="
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2023-08-16T13:57:11" UUID="46C0B2023-08-16T13:57:11
926C-4AA9-9A83-7B88A559CD22"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/></cfdi:Complemento></cfdi:Complemento>
e>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ETC220211Q32	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46C0B20A-926C-4AA9-9A83-7B88A559CD22	2023-08-16T13:57:10	2023-08-16T13:57:11	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$84,656.63	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



R.F.C. ETC220211Q32

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

OBRAS PUBLICAS

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 2(DOS) FINIQUITO

PERÍODO: DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2023

OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL


CONTRATISTA : EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2023

**ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA**

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ													
A	LINEA DE AGUA DE 6", DE LIBRAMIENTO A TANQUE.												
A01	EXCAVACIONES												
ADS-A-EXC-01	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	125.00	125.00	0.00	125.00	-	\$13.28	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	
ADS-A-EXC-03	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO II Y III. A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	157.50	117.60	0.00	117.60	39.90	\$160.40	\$25,263.00	\$0.00	\$18,863.04	\$6,399.96	
ADS-A-EXC-04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE	M3	157.50	117.60	0.00	117.60	39.90	\$79.76	\$12,562.20	\$0.00	\$9,379.78	\$3,182.42	
ADS-A-EXC-05	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION	M2	87.50	105.00	0.00	105.00	-	17.50	\$20.80	\$1,820.00	\$0.00	\$2,184.00	-\$364.00
Total:	EXCAVACIONES								\$41,305.20	\$0.00	\$32,086.82	\$9,218.38	
A02	RELLENOS												
ADS-A-REL-01	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICON.	M2	87.50	73.50	0.00	73.50	14.00	\$98.39	\$8,609.13	\$0.00	\$7,231.67	\$1,377.46	
ADS-A-REL-02	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVICON.	ML	125.00	105.00	0.00	105.00	20.00	\$307.32	\$38,415.00	\$0.00	\$32,268.60	\$6,146.40	
ADS-A-REL-03	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SUPERVICON.	M3	105.00	73.50	0.00	73.50	31.50	\$757.40	\$79,527.00	\$0.00	\$55,668.90	\$23,858.10	
Total:	RELLENOS								\$126,551.13	\$0.00	\$95,169.17	\$31,381.96	
A03	INSTALACION DE TUBERIA												
ADS-A-IT-03	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$14,385.02	\$14,385.02	\$0.00	\$0.00	\$14,385.02	
ADS-A-IT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FoFo PARA CAJA DE VALVULAS INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$5,529.48	\$5,529.48	\$0.00	\$0.00	\$5,529.48	
ADS-A-IT-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE 6" DE DIAMETRO DE 40 CM. DE LARGO DE FoFo., INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	4.00	0.00	4.00	-	3.00	\$3,502.76	\$3,502.76	\$0.00	\$14,011.04	-\$10,508.28
ADS-A-IT-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO DE FoFo. INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	-	\$9,034.85	\$9,034.85	\$0.00	\$9,034.85	\$0.00	
ADS-A-IT-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBALT COMPLETA DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO DE FoFo., INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	4.00	0.00	4.00	-	3.00	\$1,516.03	\$1,516.03	\$0.00	\$6,064.12	-\$4,548.09
ADS-A-IT-10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	125.00	102.00	0.00	102.00	23.00	\$946.12	\$118,265.00	\$0.00	\$96,504.24	\$21,760.76	

Daniel Rodríguez V.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 2(DOS) FINIQUITO
 PERÍODO: DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2023
 OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL
 CONTRATISTA : EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
 FECHA: 14 DE JUNIO DE 2023

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
ADS-A-IT-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	-	\$4,900.10	\$4,900.10	\$0.00	\$4,900.10	\$0.00
ADS-A-IT-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 45 POR 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	6.00	6.00	- 5.00	\$3,521.59	\$3,521.59	\$21,129.54	\$0.00	-\$17,607.95
ADS-A-IT-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 6" A 3" DE DIAMETRO DE Fo. Fo., INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$5,371.21	\$5,371.21	\$0.00	\$0.00	\$5,371.21
Total:	LINEA DE AGUA DE 6", DE FILOSOFOS A LIBRAMIENTO.								\$166,026.04	\$21,129.54	\$130,514.35	\$14,382.15
A04	EXTRAORDINARIOS											
EXT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO E-1/4" A/C A53 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.00	0.00	23.00	0.00	-	\$2,075.77	\$0.00	\$47,742.71	\$0.00	-\$47,742.71
EXT-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE FO. FO. DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	2.00	0.00	-	\$2,053.80	\$0.00	\$4,107.60	\$0.00	-\$4,107.60
Total:	EXTRAORDINARIOS								\$0.00	\$51,850.31	\$0.00	-\$51,850.31
								SUMA	\$ 333,882.37	\$ 72,979.85	\$ 257,770.33	\$ 3,132.18
								IVA	\$ 53,421.18	\$ 11,676.78	\$ 41,243.25	\$ 501.15
								TOTAL	\$ 387,303.55	\$ 84,656.63	\$ 299,013.58	\$ 3,633.33

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA: EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 2(DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2023

LINEA DE AGUA DE 6", DE LIBRAMIENTO A TANQUE.

ADS-A-IT-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 45 POR 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTURA PROM	PZA	TOTAL
PZA	0+000.00	0+005.00	5.00			2.00	2.00
PZA	0+080.00	0+100.00	20.00			2.00	2.00
PZA	0+100.00	0+120.00	20.00			2.00	2.00
						SUMA	6.00

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA:	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.	FECHA:	14 DE JUNIO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2023

LINEA DE AGUA DE 6", DE LIBRAMIENTO A TANQUE.		
ADS-A-IT-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 45 POR 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA




EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA


DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.


CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA:	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.	FECHA:	14 DE JUNIO DE 2023
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	2(DOS) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2023

LINEA DE AGUA DE 6", DE LIBRAMIENTO A TANQUE.		
ADS-A-IT-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 45 POR 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: 50 % DE TORNILLOS Y EMPAQUES, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS

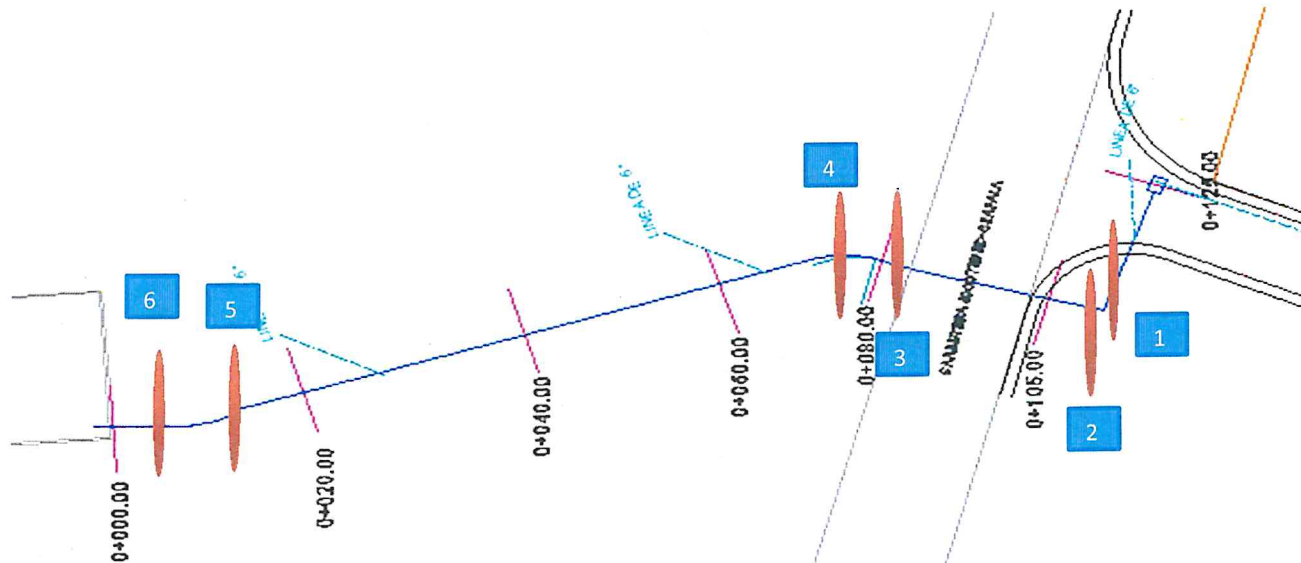


EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA


DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA: EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 2(DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2023

LINEA DE AGUA DE 6", DE LIBRAMIENTO A TANQUE.

EXT-001

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO E-1/4" A/C A53 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA PROM	PZA	TOTAL
--------	--------------	-------	-------	----------------	-----	-------

LINEA DE AGUA POTABLE DE 6"

ML	0+102.00	0+125.00	23.00	6"		23.00
----	----------	----------	-------	----	--	-------

SUMA	23.00
------	-------

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA:

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA:

14 DE JUNIO DE 2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 2(DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2023

LINEA DE AGUA DE 6", DE LIBRAMIENTO A TANQUE.

EXT-001

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO E-1/4" A/C A53 DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez V
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA:

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA:

14 DE JUNIO DE 2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 2(DOS) FINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2023

LINEA DE AGUA DE 6", DE LIBRAMIENTO A TANQUE.

EXT-001

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO E-1/4" A/C A53 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

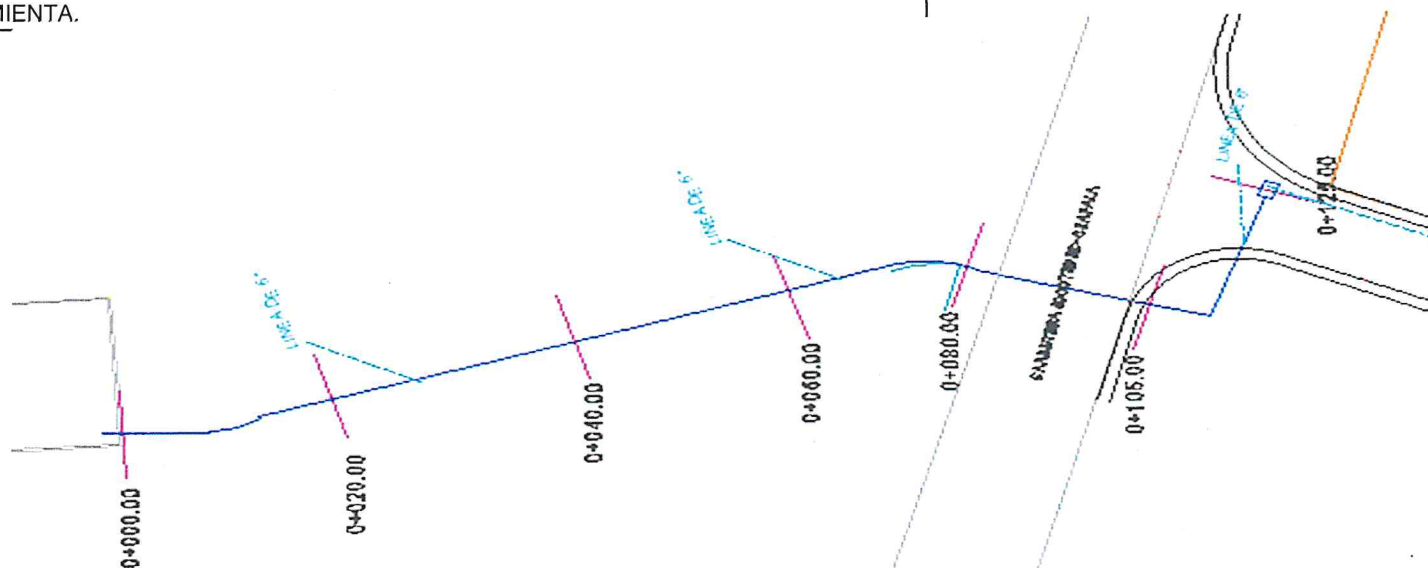

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA: EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 2(DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2023

LINEA DE AGUA DE 6", DE LIBRAMIENTO A TANQUE.

EXT-002

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE FO. FO. DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS.

UNIDAD

CADENAMIENTO

LARGO

ANCHO

ALTURA
PROM

PZA

TOTAL

PZA

0+124.00

0+125.00

2.00

2.00

PZA

SUMA

2.00

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

EL CONTRATISTA

Daniel Rodriguez V.

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA: EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 2(DOS) FINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2023

LINEA DE AGUA DE 6", DE LIBRAMIENTO A TANQUE.

EXT-002

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE FO. FO. DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
AGUAS PUBLICAS



EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.

R.F.C. ETC220211Q32

EMPRESA: EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 2(DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2023

LINEA DE AGUA DE 6", DE LIBRAMIENTO A TANQUE.

EXT-002

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD DE FO. FO. DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

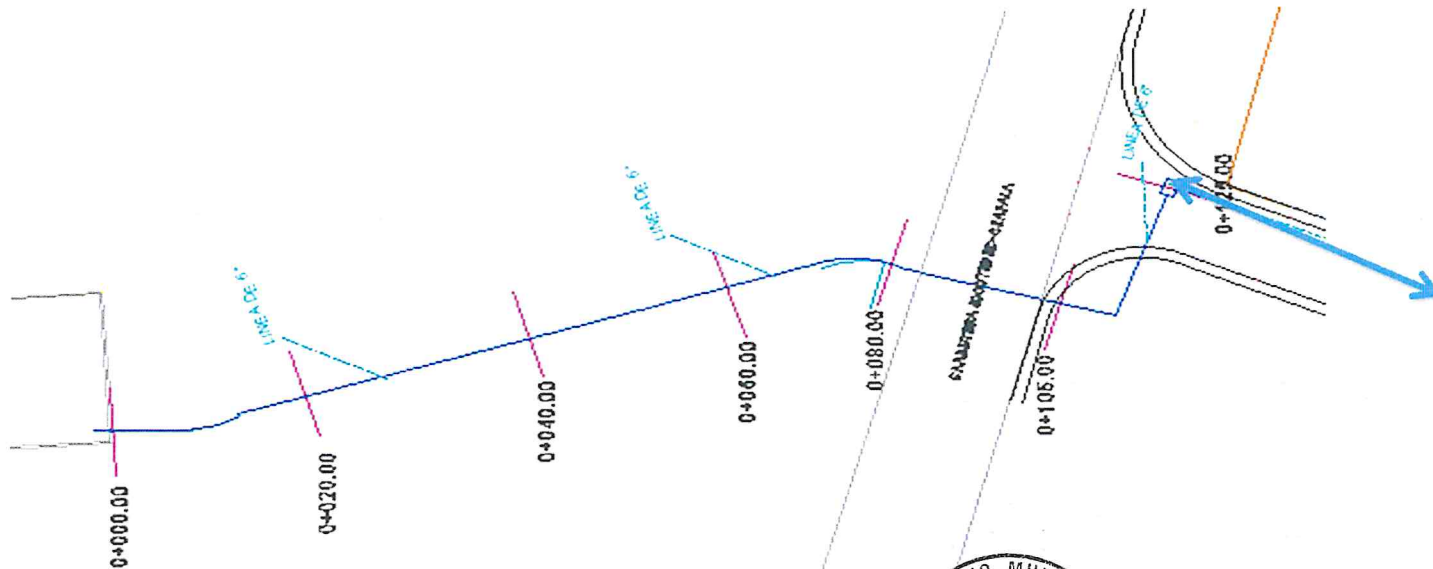

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez Valenzuela
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
