

CELSA

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL LAGO S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL LAGO

R.F.C. CEL170925T12

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

GUERRERO 138 CENTRO

CHAPALA, CHAPALA, JALISCO. Mexico. C.P. 45900

Cel. 3311296193 | Oficina. 376 76 5 51 30 | mmz_y2k@yahoo.com

FACTURA

A519

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	MJJ850101KP8	45900 2023-11-08T12:28:48 / 2023-11-08T12:29:01

Dirección	Otros datos fiscales
ALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO JOCOTEPEC, JALISCO. México. C.P. 45800	Folio fiscal: 729F11F8-54D7-4DBB-8173-0748171A2A6D Serie del certificado del emisor: 00001000000514589044 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión de CFDI: 4.0

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1.00	Servicio	ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. GMJ 005-OP/2023. MENOS 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$407.13 NETO A PAGAR \$85,400.16	73,971.80	73,971.80

Clave prod/serv	Clave unidad
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica	E48 - Unidad de servicio

IVA 16.0%: 11835.49 (02 - Si objeto de impuesto)

Importe con letra	=OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 29/100 MXN=
-------------------	--

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Subtotal

73,971.80

002-IVA 16%

11,835.49

Total

85,807.29

Sello digital del emisor:

cVNhf/FyGUI3YKrmR813PFHcx+ov0vE5x1BWmAg3Y/YGqyltqR0LaxXCgcUWm1VYPGbYxtP+Pe/dsyegSk2gdll+p4oXS8naSsbYZ0yPs/6oUGlcqbv10WbFgYvfkFTW
K8aWmplifF9BcKZVS5ziiPFEha+TH1RmhRntOb9ec3nAZPOqDfUH3U1/apncSGAa3bf4grVm7WssHqMNgp3McT7uOXJ8mX9LeOABfFBw+zCMBO2gMAMRbSPVA
7QGFvsqUDVSmtHpV4Upww6owzz8PBc7y3FGJcq1Yuru2TYEH0xE6Ny/Vjv+Ua//e2SNeYhJXcDaFwV8gqy6B6uLznA==

Sello digital del SAT:

kPwuSVxmCW11dxPd9ei3/ZmL33xepgmtP2azJVuPLpD/4zTMelkols6appUxnuUeAvDmxmJlbAPG+DkWcJn8KBADWstjTS52l+DLJsObq9Fg2QCRKNV2WiucDiCmcFS
0LPoU+Znrw4k8mx7FHnvnVrxHrxMEeBsp0Txbw6N99AEu1BD+r4BVRkRoCRI7whLJF6gg4epybwbCkWQFzkkfFimHbRtLZF9WKI3QDTJhZ4QsAuWkRjKkwmYb684D0q0
B4Tex00FTctCn6V5wVUe1/J5qULRKl3j7ooGv/n+j7prxDyhLn9dE9NUAM+oIUamKzoSF0F7GNdEoXbzyxb2Euw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|729F11F8-54D7-4DBB-8173-0748171A2A6D|2023-11-08T12:29:01|SED1102088J7|cVNhf/FyGUI3YKrmR813PFHcx+ov0vE5x1BWmAg3Y/YGqyltqR0LaxXCgcUWm1VYPGbYxtP+Pe/dsyegSk2gdll+p4oXS8naSsbYZ0yPs/6oUGlcqbv10WbFgYvfkFTW
K8aWmplifF9BcKZVS5ziiPFEha+TH1RmhRntOb9ec3nAZPOqDfUH3U1/apncSGAa3bf4grVm7WssHqMNgp3McT7uOXJ8mX9LeOABfFBw+zCMBO2gMAMRbSPVA7QGFvsqUDVSmtHpV4Upww6owzz8PBc7y3FGJcq1Yuru2TYEH0xE6Ny/Vjv+Ua//e2SNeYhJXcDaFwV8gqy6B6uLznA==|00001000000503938001||



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGijCCBAqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQ1ODkwNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBDBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFU1JFfuk8xDjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZMBCGA1UECAwQ001VREFEIERFIE1FWELDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhuRU1PQzEVMBMGA1UELMMU0FUOTcwnZAxTk4zMVwWwGyYJKoZIhvcNAQKCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1MgQUUwQ090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMjA4MTcxOTM0MjJhFw0yMjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxDRUwXNzA5MjVUMTIgLyBKSUdJNDgwMTA4TDg5MR4wHAYDVQQFEyUgLyBKSUdJNDgwMTA4SE5FTVJTMTEyXjA4MTcxOTM0MjJhMIIHwMTewLWYDVQQDEyHT05TVFJVQ1RPUKEgrUXFQ1RSSUNBIERFTCBMQUdPIFNBIERFIENWMTewLWYDVQQQEyHT

</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11835.49"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="73971.80" Importe="11835.49" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="729F11F8-54D7-4DBB-8173-0748171A2A6D" FechaTimbrado="2023-11-08T12:29:01" RfcProvCertif="SED1102088J7" SelloCFD="cVNhf/FyGUI3YKrmR813PFHcx+ov0vE5x1BWmAg3Y/YGqtyltqR0LaxXCGcUWm1VYPGbYxtP+Pe/dsyegSk2gdII+p4oXS8naSsbYZ0yPs/6oUGlcqbv10WbFgYvfKFTWK8aWMPiifF9BcKZVS5zii iPFEha+TH1RmhRNTOb9ec3nAZP0qDfUH3U1/apncSGAa3bf4grVm7WSsHqMNgp3McT7uOXjU8mX9LeOABffBw+zCMB02gMAMRbSPVA7QGFvsqUDVSmtHpV4Upww6owzz8PBc7y3FGJcq1Yuru2TYEH0xE6Ny/Vjv+Ua//e2SNeYhJXcDaFwV8gqy6B6uLznA==" NoCertificadoSAT="00001000000503938001" SelloSAT="kPwuSVxmCWi1dxPd9ei3/ZmL33xepgmtP2azJVuPLpD/4zTMeIkoIs6appUxnuUeAvDmxmJIbAPG+DkwcJn8KBADWstjTS52l+DLJsObq9Fg2QCRKNV2WiucDiCmcFS0LPoU+Znrw4k8mx7FHnvnVrxHrxMEeBsp0Txbw6N99AEu1BD+r4BVRkRoCRI7whLJF6qg4epybwbCkWFzkkfFimHBrLZF9WKI3QDTjhZ4QsAuWkrJKkwmYb684D0q0B4Tex00FTctCn6V5wxVUe1/J5qULRKI3j7ooGv/n+j7prxDyhLp9dF0NUAM+oIUamKzoSfoF7GndEoXbzyxb2Euw==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CEL170925T12	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL LAGO	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
729F11F8-54D7-4DBB-8173-0748171A2A6D	2023-11-08T12:28:48	2023-11-08T12:29:01	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$85,807.29	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Imprimir



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 005-OP/2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL LAGO S.A DE C.V

OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA No. 9, EN LA COLONIA EL CHANTE, ENTRE MOCTEZUMA Y CTRA. JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN No. 3 FINIQUITO

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN					
HOJA No.	P A R T I D A S			I M P O R T E S	
A1	GESTORIA Y PAGOS ANTE CFE			\$	24,849.00
A2	MEDIA TENSION AEREA 23 KV			\$	-
C1	COMPLEMENTARIOS			\$	56,577.50
MONTO DE ESTIMACIÓN				\$	81,426.50
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO				\$	7,454.70
S U B T O T A L .				\$	73,971.80
I . V . A . 16%				\$	11,835.49
SUMA				\$	85,807.29
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)				\$	-
MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)				\$	407.13
NETO A PAGAR				\$	85,400.16
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I . V . A .	TOTAL:	
ASIGNACIÓN		\$ 469,086.02	\$ 75,053.76	\$ 544,139.78	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN		\$ 81,426.50	\$ 13,028.24	\$ 94,454.74	
ACUMULADO ANTERIOR		\$ 444,237.02	\$ 71,077.92	\$ 515,314.94	
ACUMULADO A LA FECHA		\$ 525,663.52	\$ 84,106.16	\$ 609,769.68	
SALDO EXCEDENTE		-\$ 56,577.50	-\$ 9,052.40	-\$ 65,629.90	
AMORTIZACION DE ANTICIPO					
ANTICIPO %		\$ 140,725.81	\$ 22,516.13	\$ 163,241.94	
AMORTIZACIÓN		\$ 7,454.70	\$ 1,192.75	\$ 8,647.45	
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.		\$ 133,271.11	\$ 21,323.38	\$ 154,594.49	
AMORTIZACIÓN A LA FECHA		\$ 140,725.81	\$ 22,516.13	\$ 163,241.94	
FALTANTE POR AMORTIZAR		\$ -	\$ -	\$ -	

RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
	
ING. GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA	CELSA
SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
	
ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO


No. DE CONTRATO: GMJ 005-OP/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBRA : "COMPLEMENTO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

UBICACIÓN : Calle Playas de la laguna No. 9, col. El chante
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL LAGO S.A DE C.V
FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
A1	GESTORIA Y PAGOS ANTE CFE											
1	Solicitud de aprobacion de proyecto en la plataforma Sisproter en perfil de PROYECTISTA (Perfil registrado con cedula profesional ante CFE)	LTE.	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 12,285.20	\$ 12,285.20	\$ -	\$ 12,285.20	\$ -
2	Entrega a Comision Federal de Electricidad, contando con los procedimientos de obras construidos por terceros, proyectos definitivos georeferenciados y cartas de garantia firmados por un ing. Perito de la obra.	LTE.	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 12,285.20	\$ 12,285.20	\$ -	\$ 12,285.20	\$ -
3	Elaboracion de proyecto electromecanico, elaborado previo levantamiento topografico, elaborado previas bases de diseño de Comision Federal de Electricidad y NOM-001-SEDE-2012	LTE.	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 12,285.20	\$ 12,285.20	\$ -	\$ 12,285.20	\$ -
4	Suministro de dictamen de verificacion de instalaciones electricas (UVIE)	LTE.	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00	\$ 24,849.00	\$ 24,849.00	\$ 24,849.00	\$ -	\$ -
5	Pago por oficio de presupuesto emitido por Comision Federal de Electricidad.	LTE.	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 27,108.00	\$ 27,108.00	\$ -	\$ 27,108.00	\$ -
6	Pago por oficio de revision y aprobacion del proyecto emitido por Comision Federal de Electricidad.	LTE.	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 15,060.00	\$ 15,060.00	\$ -	\$ 15,060.00	\$ -
7	Pago del medidor tipo KL para instalaciones en media tension menores a 65 Kw.	LTE.	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 22,590.00	\$ 22,590.00	\$ -	\$ 22,590.00	\$ -
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION GESTORIA Y PAGOS ANTE CFE									\$ 126,462.60	\$ 24,849.00		



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.



ESTIMACIÓN: 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 005-OP/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBRA : "COMPLEMENTO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

UBICACIÓN : Calle Playas de la laguna No. 9, col. El chante
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL LAGO S.A DE C.V
FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
C1 COMPLEMENTARIOS												
C1	Suministro e Instalacion de Cable THW XLP CALIBRE 3/0 - 1/0 ACSR Subteraneo 3+1 AWG, 600 V. Mca. Latincasa O Similar (incluye mano de obra,equipo y herramineta para su correcta instalacion.)	MTS	0.00	0.0000	30.00	30.00	-30.00	\$ 472.7165	\$ -	\$ 14,181.50	\$ -	-\$ 14,181.50
C2	Conexion de Interruptor Termomagnetico Trifasico 125 AMP, 600 V. Mca. Square O Similar (incluye mano de obra,equipo y herramineta para su correcta instalacion.)	PZA	0.00	0.0000	1.00	1.00	-1.00	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	-\$ 4,400.00
C3	Suministro e Instalacion Poliducto con Norma CFE-S1A-PAD 2" DIAM, RD 17, Incluye Mano de Obra y Herramienta.	MTS	0.00	0.0000	25.00	25.00	-25.00	\$ 162.40	\$ -	\$ 4,060.00	\$ -	-\$ 4,060.00
C4	Excavación de cepa, por medios mecanicos de 0 a -.60 m, en material tipo A, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	MTS	0.00	0.0000	20.00	20.00	-20.00	\$ 218.40	\$ -	\$ 4,368.00	\$ -	-\$ 4,368.00
C5	Suministro e Instalacion de Transformador Tipo Seco de 5KVA, de 440 Volt a 220/127 volts 600 V. Mca. Latincasa O Similar (incluye mano de obra,equipo y herramineta para su correcta instalacion.)	PZA	0.00	0.0000	1.00	1.00	-1.00	\$ 29,568.00	\$ -	\$ 29,568.00	\$ -	-\$ 29,568.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION COMPLEMENTARIOS									\$ -	\$ 56,577.50		
TOTAL									\$ 469,086.02	\$ 81,426.50	\$ 342,623.42	-\$ 56,577.50
 CELSA CONTRATISTA  ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ SUPERVISOR DEL MUNICIPIO  C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS												

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



CELSA S.A DE C.V

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: No. 3
FINIQUITO

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: Suministro de dictamen de verificación de instalaciones electricas (UVIE)

LARGO ANCHO ALTURA PZA. TOTAL

TRAMITE ADMINISTRATIVO

1.00

1.00

DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracciones IV-A y XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 y 99 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, 112 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y demás disposiciones legales aplicables, en mi carácter de Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, aprobada con registro número: UVSEIE 560-A, con acreditación vigente de fecha: martes, 28 de julio de 2015 otorgada por una entidad de acreditación autorizada y aprobación vigente de la Secretaría de Energía otorgada en oficio No. 314000CESEV0136/2015 de fecha jueves, 24 de septiembre de 2015, y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente a las instalaciones para el uso de energía eléctrica que se describen a continuación:

Dictamen de Verificación Folio No. [] Fecha: 10/09/2023

Nombre, denominación o razón social: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Registro Federal de Contribuyentes: [] Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Actividad de la instalación conforme al SCIAN: BOMBEO

Tensión eléctrica de suministro: (entre conductores): [] Lugar de concentración pública: [] Ampliación de una instalación existente: [X] Instalación Nueva: [X]

Hasta 1000 volts () Mayor a 1000 volts (X) Áreas peligrosas (clasificadas): [X] Industria: [X] Modificación de una instalación existente: []

Capacidad de la Subestación: 75 (kVA) Subestación para cambio de tensión para la alimentación de la instalación

Carga instalada: 41.00 kW Alcance de la verificación: 41.00 kW Instalación existente construida antes de la entrada en vigor de la NOM-001-SEDE-2012

Fecha de la próxima verificación para áreas peligrosas (clasificadas): No Aplica

DATOS:

Datos del visitado: Calle: CALLE PLAYA DE LA LAGUNA No. Exterior: 8 No. Interior: A Colonia o Población: EL CHANTE Municipio o Alcaldía: JOCOTEPEC Ciudad y Estado: JOCOTEPEC JALISCO Código Postal: 45800

Teléfono: 3314100856 Celular: 3314100856 Correo Electrónico: gilberto1804@gmail.com

Asistente del servicio: Nombre: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO CURP: MUJ-850101-KPS

Teléfono: 3314100856 Celular: 3314100856 Correo Electrónico: gilberto1804@gmail.com

CERTIFICO, en los términos establecidos en los artículos 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, que las instalaciones en cuestión cumplen con las disposiciones aplicables de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que, en su caso, procedan.

EL TITULAR (O GERENTE) DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Servicios de Ingeniería y Proyectos Eléctricos de Occidente, S.A de C.V.

Domicilio: Vicente Yáñez Pinzón, No. 2800, Col. Colón Industrial, C.P. 44930, Guadalajara, Jalisco

Teléfono: 3314100876 Correo electrónico: hingenieria@hotmail.com

UVSEIE 560-A

NOTA - En caso de realizar modificaciones en la instalación, se requerirá que dicha instalación sea verificada para evaluar el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).

SEDIVER v2.0 || SERVER GUID: Versión 0.1.0

TOTAL LTE.: 1.00

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracciones IV-A y XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 y 99 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica; 112 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y demás disposiciones aplicables, en mi carácter de Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, aprobada con registro número: **UVSEIE 550-A**, con acreditación vigente de fecha **martes, 28 de julio de 2015** otorgada por una entidad de acreditación autorizada, y aprobación vigente de la Secretaría de Energía otorgada en oficio No. **DGDCEEVS/1336/2015** de fecha **jueves, 24 de septiembre de 2015**, y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente a las instalaciones para el uso de energía eléctrica que se describen a continuación:

Folio No.: DVNP12S2-2023-UVSEIE 550-A/000997		Fecha: 05/10/2023
Nombre, denominación o razón social: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101KP8		Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Tipo de instalación conforme al SCIAN: BOMBEO		
Instalación eléctrica de suministro: (entre conductores) Hasta 1000 volts () Mayor a 1000 volts (X)	* Lugar de concentración pública * Áreas peligrosas (clasificadas) * Industria * Otro POZO DE BOMBEO X	Instalación Nueva X Ampliación de una instalación existente Modificación de una instalación existente Verificación periódica de instalación con áreas peligrosas
Capacidad de la Subestación: 75.00 (kVA)	Carga instalada: 41.00 kW	Subestación para cambio de tensión para la alimentación de la instalación.
Alcance de la verificación: 41.00 kW		Instalación existente construida antes de la entrada en vigor de la NOM-001-SEDE-2012

Fecha de la próxima verificación para áreas peligrosas (clasificadas): **No Aplica**

AS:

Del visitado

PLAYAS DE LA LAGUNA	No. Exterior: 9	No. Interior:
Municipio o Población: EL CHANTE	Municipio o Alcaldía: JOCOTEPEC	
Municipio y Estado: JOCOTEPEC, JALISCO	Código Postal: 45825	
Teléfono: 3314100565	Celular: 3314100565	Correo Electrónico: gilberto.martinez@hotmail.com

Titular del servicio

Nombre: GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA	CURP: MAZG840418HJCRRL02
Teléfono: 3314100565	Correo Electrónico: gilberto.martinez@hotmail.com

DECLARACIÓN, en los términos establecidos en los artículos 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, que las instalaciones en cuestión cumplen con las disposiciones aplicables de la **Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)**.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que, en su caso, procedan.

EL TITULAR (O GERENTE) DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Servicios de Ingeniería y Proyectos Eléctricos de Occidente, S.A de C.V.

UVSEIE 550-A

Domicilio: **Vicente Yáñez Pinzón, No. 2800, Col. Colón Industrial, C.P. 44930, Guadalajara, Jalisco**
Teléfono: **3314100876** Correo electrónico: **hgingenieria@hotmail.com**

A - En caso de realizar modificaciones en la instalación eléctrica después de la emisión del presente dictamen, se requerirá que dicha instalación sea verificada y evaluada para evaluar el cumplimiento con la **Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)**.

Formato de Portada que debe anexarse a los dictámenes de verificación de instalaciones eléctricas, en los servicios de alta tensión y lugares de concentración pública.

De conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización), NOM-007-ENER-2014, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales y NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas, o los que los sustituyan

HAGO CONSTAR, en los términos establecidos artículo 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, que la instalación eléctrica ubicada en:

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Calle No: PLAYAS DE LA LAGUNA 9
Colonia y Población: EL CHANTE
Municipio o Delegación: JOCOTEPEC
Ciudad y Estado: JOCOTEPEC JALISCO
Código Postal: 45825

queda comprendida dentro del campo de aplicación de las siguientes normas oficiales mexicanas, o las que la sustituyan, emitidas por la Secretaría de Energía y deberán cumplir con las disposiciones aplicables a las mismas, presentando ante el organismo suministrador los dictámenes correspondientes para efecto de la contratación del suministro.

Norma Oficial Mexicana	Aplica (si o no)
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización).	SI
NOM-007-ENER-2014, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.	NO
NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas.	NO

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en los dictámenes de verificación anexos son verdaderos, acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que, en su caso, procedan.

EL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE VERIFICACION

SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

550-A

Domicilio: VICENTE YAÑEZ PINZON 2800, FRACC. COLON INDUSTRIAL CP 44930
Teléfono: (33) 36943915 Fax: SIN FAX
Correo electrónico: rosoga70@gmail.com Celular o localizador: (044) 33 3127 2243

De conformidad con el artículo tercero del ACUERDO que establece el formato de portada de los dictámenes de verificación de las instalaciones eléctricas, en los servicios de alta tensión y lugares de concentración pública, en caso de que exista diferencia o discrepancia en las disposiciones y especificaciones de carácter técnico y jurídico que prevén las normas oficiales mexicanas materia del presente Acuerdo, así como sus respectivos alcances, prevalecerán y se aplicarán invariablemente las prescripciones contenidas en la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización).

Ley de la Industria Eléctrica

"Artículo 40. Corresponde al Usuario Final realizar a su costa y bajo su responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, mismas que deberán satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas. Los productos, dispositivos, equipos, maquinaria, instrumentos o sistemas que utilicen para su funcionamiento y operación la energía eléctrica, quedan sujetos al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica

"Artículo 112. Todas las instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables. La Secretaría podrá verificar el cumplimiento de dichas normas oficiales mexicanas.

Cuando se trate de conexiones de instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica para servicios en Alta Tensión y de la prestación de servicios en lugares de concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Secretaría verifique en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumpla con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas instalaciones.

Se consideran lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones eléctricas a que se refiere el párrafo anterior, los destinados a actividades de esparcimiento, deportivas, educativas, de trabajo, comerciales, de salud, además de cualquier otra área en donde se reúna público en general.

La Secretaría emitirá el acuerdo que determine los lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica, conforme al párrafo anterior."

DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracciones IV-A y XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 y 99 de la Ley Federal sobre Protección y Normalización; 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica; 112 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y demás disposiciones aplicables, en mi carácter de Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, aprobada con registro número: **UVSEIE 550-A**, con acreditación vigente de a: **martes, 28 de julio de 2015** otorgada por una entidad de acreditación autorizada, y aprobación vigente de la Secretaría de Energía otorgada en oficio No. **DGDCEEVS/1336/2015** de fecha **jueves, 24 de septiembre de 2015**, y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente a las instalaciones para el uso de energía eléctrica que se describen a continuación:

Folio No.: DVNP12S2-2023-UVSEIE 550-A/000997		Fecha: 05/10/2023
Nombre, denominación o razón social: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		
Código Federal de Contribuyentes: MJJ850101KP8		Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Identidad de la instalación conforme al SCIAN: BOMBEO		
Tipo de suministro eléctrico de suministro: (entre conductores) Hasta 1000 volts () Mayor a 1000 volts (X) Capacidad de la Subestación 75.00 (kVA)	* Lugar de concentración pública * Áreas peligrosas (clasificadas) * Industria * Otro POZO DE BOMBEO X	Instalación Nueva X Ampliación de una instalación existente Modificación de una instalación existente Verificación periódica de instalación con áreas peligrosas
Carga instalada 41.00 kW	Subestación para cambio de tensión para la alimentación de la instalación.	
Alcance de la verificación 41.00 kW	Instalación existente construida antes de la entrada en vigor de la NOM-001-SEDE-2012	
Fecha de la próxima verificación para áreas peligrosas (clasificadas): No Aplica		
Observaciones:		
Datos del visitado		
Ubicación: PLAYAS DE LA LAGUNA	No. Exterior: 9	No. Interior:
Municipio o Población: EL CHANTE	Municipio o Alcaldía: JOCOTEPEC	
Ciudad y Estado: JOCOTEPEC, JALISCO	Código Postal: 45825	
Teléfono: 3314100565	Celular: 3314100565	Correo Electrónico: gilberto.martinez@hotmail.com
Identificación del servicio		
Nombre: GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA		CURP: MAZG840418HJCRRLO2
Teléfono: 3314100565	Celular: 3314100565	Correo Electrónico: gilberto.martinez@hotmail.com

DECLARACION, en los términos establecidos en los artículos 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, que las instalaciones en cuestión cumplen con las disposiciones aplicables de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que, en su caso, procedan.

EL TITULAR (O GERENTE) DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Servicios de Ingeniería y Proyectos Eléctricos de Occidente, S.A de C.V.

UVSEIE 550-A

Domicilio: Vicente Yáñez Pinzón, No. 2800, Col. Colón Industrial, C.P. 44930, Guadalajara, Jalisco

Teléfono: 3314100876 Correo electrónico: hgingenieria@hotmail.com

NOTA – En caso de realizar modificaciones en la instalación eléctrica después de la emisión del presente dictamen, se requerirá que dicha instalación sea verificada para evaluar el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).

IDENTIFIER v2.0 II SERVER GUID: 7F688A7A-0A02-4539-B3B5-F286FFC2E124

Formato de Portada que debe anexarse a los dictámenes de verificación de instalaciones eléctricas, en los servicios de alta tensión y lugares de concentración pública.

De conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización), NOM-007-ENER-2014, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales y NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas, o los que los sustituyan

HAGO CONSTAR, en los términos establecidos artículo 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, que la instalación eléctrica ubicada en:

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Calle No: PLAYAS DE LA LAGUNA 9
Colonia y Población: EL CHANTE
Municipio o Delegación: JOCOTEPEC
Ciudad y Estado: JOCOTEPEC JALISCO
Código Postal: 45825

queda comprendida dentro del campo de aplicación de las siguientes normas oficiales mexicanas, o las que la sustituyan, emitidas por la Secretaría de Energía y deberán cumplir con las disposiciones aplicables a las mismas, presentando ante el organismo suministrador los dictámenes correspondientes para efecto de la contratación del suministro.

Norma Oficial Mexicana	Aplica (si o no)
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización).	SI
NOM-007-ENER-2014, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.	NO
NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas.	NO

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en los dictámenes de verificación anexos son verdaderos, acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que, en su caso, procedan.

EL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE VERIFICACION

SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

550-A

Domicilio: VICENTE YAÑEZ PINZON 2800, FRACC. COLON INDUSTRIAL CP 44930
Teléfono: (33) 36943915 Fax: SIN FAX
Correo electrónico: rosoga70@gmail.com Celular o localizador: (044) 33 3127 2243

De conformidad con el artículo tercero del ACUERDO que establece el formato de portada de los dictámenes de verificación de las instalaciones eléctricas, en los servicios de alta tensión y lugares de concentración pública, en caso de que exista diferencia o discrepancia en las disposiciones y especificaciones de carácter técnico y jurídico que prevén las normas oficiales mexicanas materia del presente Acuerdo, así como sus respectivos alcances, prevalecerán y se aplicarán invariablemente las prescripciones contenidas en la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización).

Ley de la Industria Eléctrica

"Artículo 40. Corresponde al Usuario Final realizar a su costa y bajo su responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, mismas que deberán satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas. Los productos, dispositivos, equipos, maquinaria, instrumentos o sistemas que utilicen para su funcionamiento y operación la energía eléctrica, quedan sujetos al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica

"Artículo 112. Todas las instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables. La Secretaría podrá verificar el cumplimiento de dichas normas oficiales mexicanas.

Cuando se trate de conexiones de instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica para servicios en Alta Tensión y de la prestación de servicios en lugares de concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Secretaría verifique en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumpla con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas instalaciones.

Se consideran lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones eléctricas a que se refiere el párrafo anterior, los destinados a actividades de esparcimiento, deportivas, educativas, de trabajo, comerciales, de salud, además de cualquier otra área en donde se reúna público en general.

La Secretaría emitirá el acuerdo que determine los lugares de concentración pública para la verificación de las instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica, conforme al párrafo anterior."



CELSA S.A DE C.V

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: No. 3
FINIQUITO


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: Suministro e Instalacion de Cable THW XLP CALIBRE 3/0 - 1/0 ACSR Subterraneo 3+1 AWG, 600 V. Mca. Latincasa O Similar (incluye mano de obra,equipo y herramineta para su correcta instalacion.)

	LARGO	ANCHO	ALTURA	PZA.	TOTAL	
BASE DE MEDICION A REGISTRO MAS VUELTAS	30.0000			1.00	30.00	4 HILOS

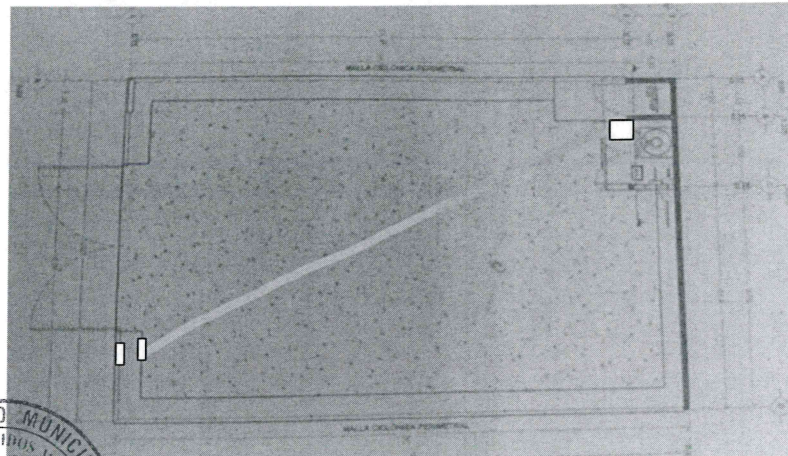

TOTAL MTS.: 30.00

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ

ING. GILBERTO MARTÍNEZ ZARAGOZA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.


LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: NO. 3
EINQUILTO

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

ARCHIVO FOTOGRAFICO

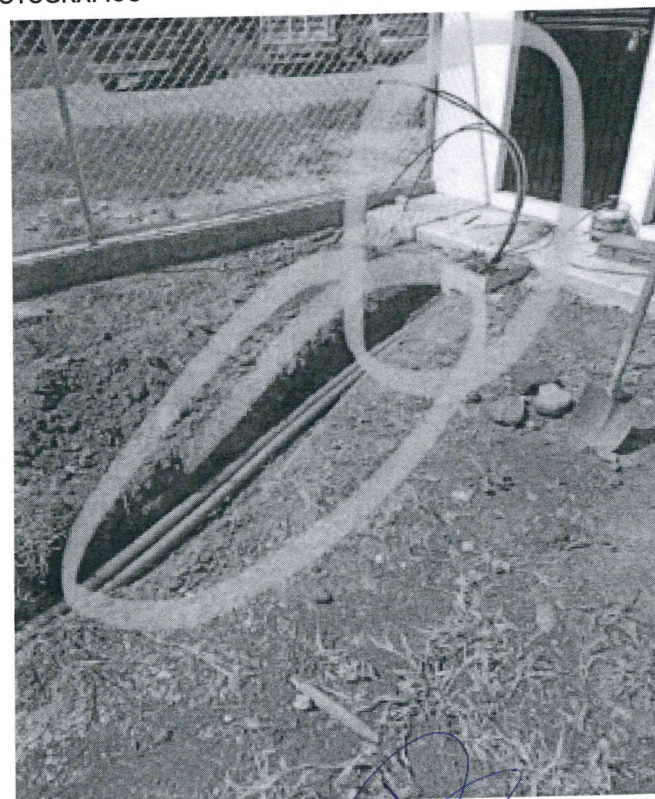

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING.J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



CELSA S.A DE C.V

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA: OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: No. 3
FINIQUITO

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: Conexion de Interruptor Termomagnetico Trifasico 125 AMP, 600 V. Mca. Square O Similar (incluye mano de obra,equipo y herramineta para su correcta instalacion.)

LARGO	ANCHO	ALTURA	PZA.	TOTAL
			1.00	1.00

BASE DE MEDICION

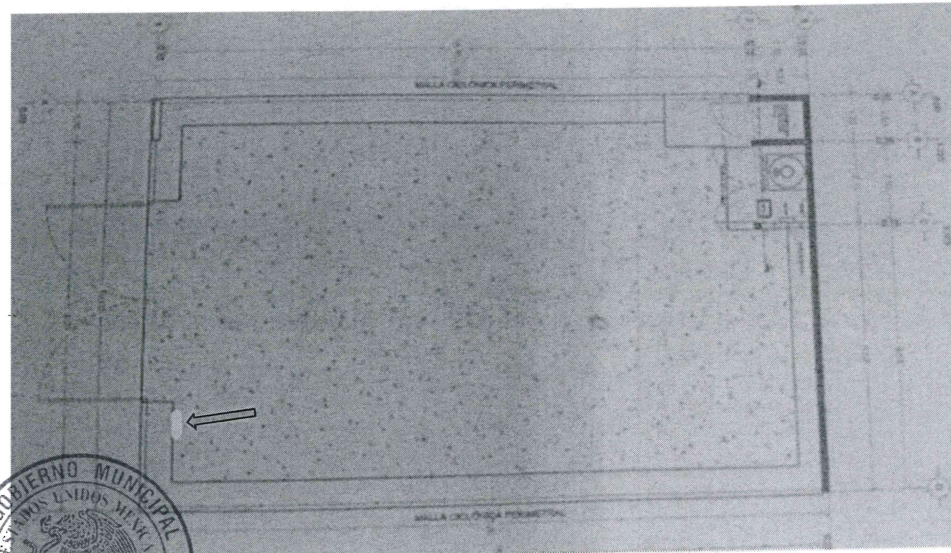

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

G. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA

RESIDENTE DE OBRA

TOTAL PZA: 1.00



CELSA S.A DE C.V

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA: OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.


LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: No. 3
FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO

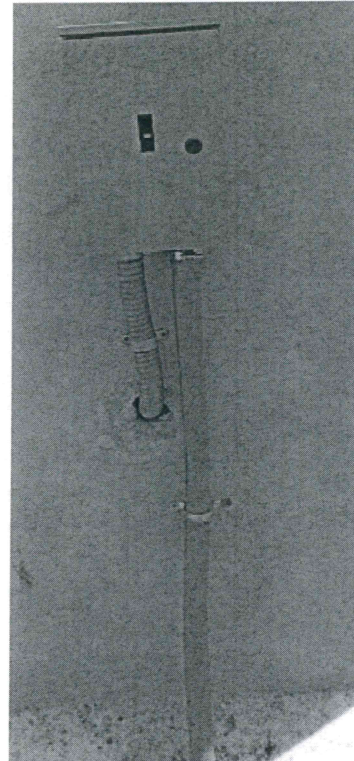

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA

RESIDENTE DE OBRA



CELSA S.A. DE C.V

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA: OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: No. 3
FINIQUITO


PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: Suministro e Instalacion Poliducto con Norma CFE-S1A-PAD 2" DIAM, RD 17, Incluye Mano de Obra y Herramienta.

	LARGO	ANCHO	ALTURA	PZA.	TOTAL	
BASE DE MEDICION A REGISTRO MAS VUELTAS	12.5000			2.00	25.00	2 LINEAS

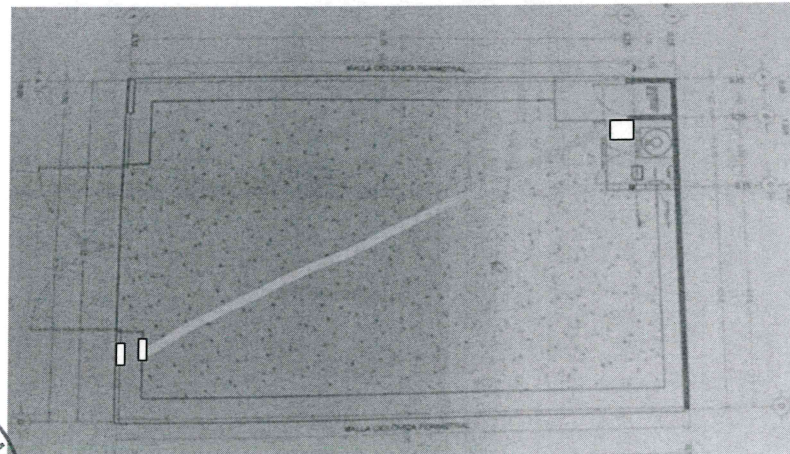

TOTAL MTS.: 25.00



C. MELBA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



CELSA S.A DE C.V

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: No. 3
FINQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO



MEYDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



CELSA S.A DE C.V

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA: OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: No. 3
FINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2023

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: Excavación de cepa, por medios mecanicos de 0 a -60 m, en material tipo A, incluye: mano de obra, equipo y herramienta

	LARGO	ANCHO	ALTURA	PZA.	TOTAL
BASE DE MEDICION A REGISTRO MAS VUELTAS	20.0000			1.00	20.00

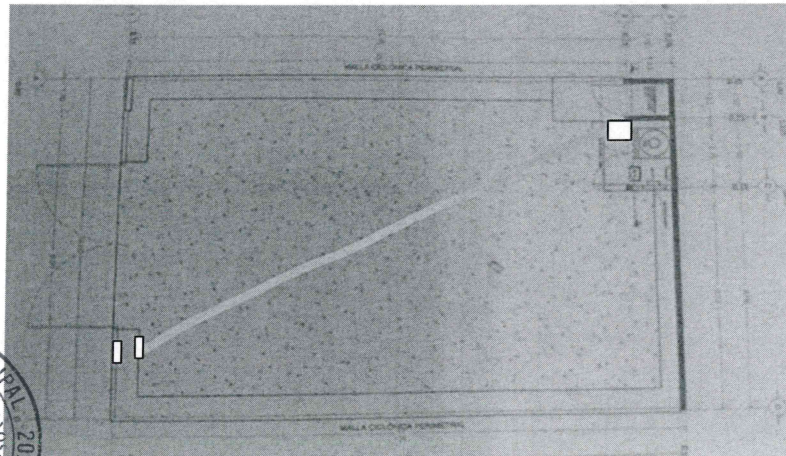

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS

G. MELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA

RESIDENTE DE OBRA

TOTAL MTS.: 20.00



CELSA S.A DE C.V

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA: OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: No. 3
FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO



 C. JIMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	



CELSA S.A DE C.V

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA: OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: No. 3
FINIQUITO


MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2023

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO: Suministro e Instalacion de Transformador Tipo Seco de 5KVA, de 440 Volt a 220/127 volts 600 V. Mca. Latincasa O Similar (incluye mano de obra, equipo y herramineta para su correcta instalacion.)

	LARGO	ANCHO	ALTURA	PZA.	TOTAL
TRANSFORMADOR 440- 220/227 VOLTS				1.00	1.00

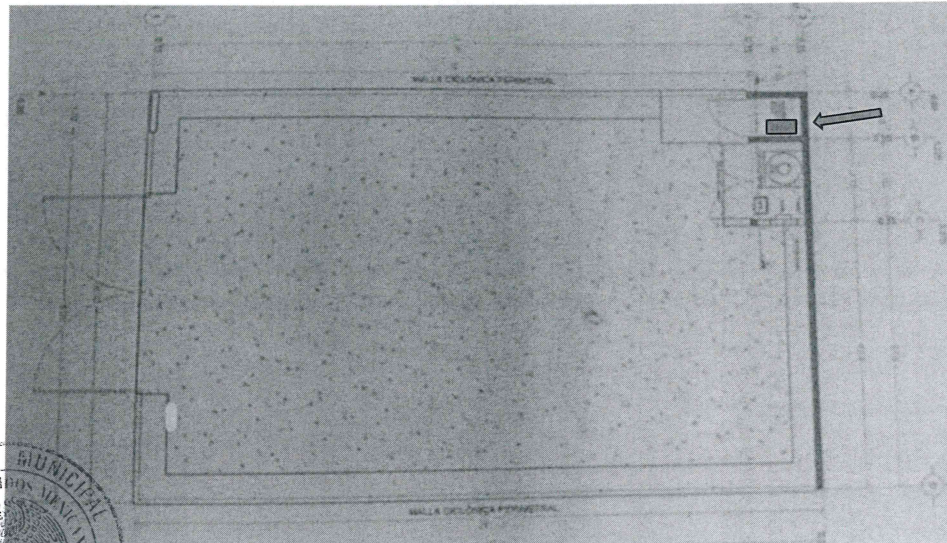

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA

RESIDENTE DE OBRA

TOTAL PZA: 1.00



CELSA S.A DE C.V

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OBRA:

OBRA: COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.



LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: No. 3
FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 28 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE
2023

ARCHIVO FOTOGRAFICO

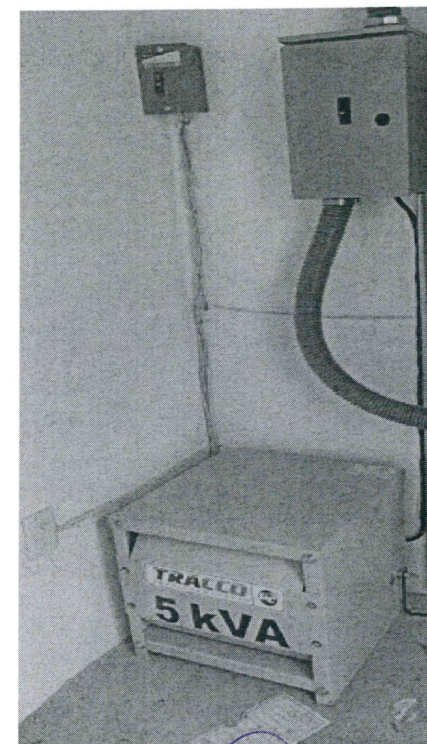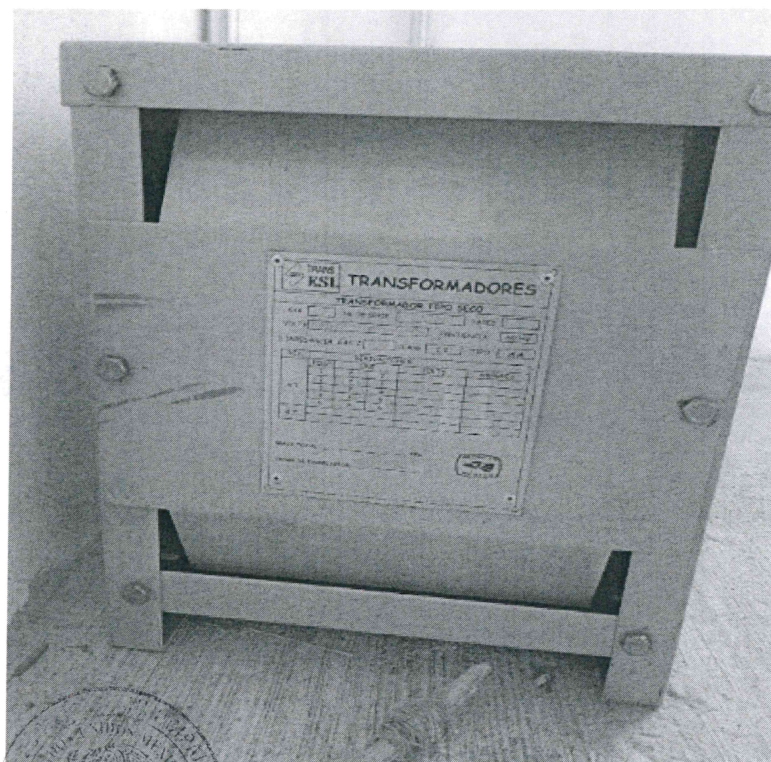

CRIMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING.J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
