



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

Dirección de Obras  
Administración 2021-2024  
Número de Oficio 1138/2023

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES**, por la cantidad de; **\$103,032.08 (Ciento Tres Mil Treinta y Dos Pesos 08/100 M.N.)** por concepto del **ESTIMACIÓN 03 y Finiquito**, del programa **FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYA AZUL", EN LA LOCALIDAD DE CHATEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
42	20/12/2023	\$130,481.89	\$151,358.99	\$619.98	\$103,032.08

Cuenta contable: 6151-2-25.1-050-389

Contrato: GMJ 019C- OP/2023

Anexo:

1. Factura, xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 03 y Finiquito
4. Minuta de Término
5. Acta Entrega Recepción
6. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones
7. Fianza de Vicios Ocultos

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes



HACIENDA MUNICIPAL  
2021 - 2024

17 ENE. 2024

**RECIBIDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE

JOCOTEPEC, JAL., A 22 DE DICIEMBRE DEL 2023  
"2023, TÚ DECIDES MEJORAR"



C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**Tú decides mejorar**

C.c.p. Archivo  
OP/c.v.ch

Hidalgo Sur No.6, Colonia Centro Jocotepec, Jalisco.  
C.P. 45800 Telefonos: 01 (387) 76 3 19 19 / 76 3 00 74

REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

RFC: GUNR770712CU1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 45600  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 99 - Por definir Folio - 42  
 Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha 20/12/2023 11:58:35  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO  
 R.F.C.: MJJ850101KP8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
 Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, , C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS EL 5 AL MILLAR \$825.61 MONTO EFECTIVO \$150,533.38 DELCONRATO: GMJ 019-OP/2023	130,481.89	0.00	002 - IVA - 20,877.10	130,481.89

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

Subtotal 130,481.89  
 Impuestos Trasladados 20,877.10  
 Total 151,358.99

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000509464119  
 Folio fiscal 4EF5F78C-4ED8-45FF-A781-F71046E446EB  
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación Diciembre 20 2023 - 11:58:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FaxZy+NYiPVVcY0ivo0lc1H+PxWS4Ex7sgLHt3q9eF/Cf8eE3XbAyLj3VMKG45t8D3UEUCpjFnMRTMsSDLaxoFHYKfnagf2+z4Fw sly4PfbwtuuG/ksZAVUANwx66Pxx+3HCikfFXGex6vs89O9owKG4J+CiQRjFSKvXiiqzNUx/fPxBrG5XFOPdnm7zv7h9RSysSw5lfn EzjwDwu0eSPdfmj6w8uhnwgWcpwnCx2GRXOGU59lIS+6uHml3qKBlRoMeZfXw/FvWzT8aenQzdinu4tc1xkLzFzqA2CMUCj64 vafPlj12fzZPhTVSHZ+ZlIaprUBGcagsVrhdt/H1aQ==

Sello del SAT

VYhW9KvqUfc6F8tXeLHLU77PKbYL0iu/S51toR4w7z2f7hdqpoNwx0DA/dQX0Uc8B6qAmWRX2VWxupp9F9ArrvEcF2w2R6KF3w3T Pl3st7AwkK8JnPheUJuGsV7UX4o2SO93gbU2ZCx83Z/JR14FmOMlaN8+fdzUVdWkRxUpQGeP2XNjq75Ason/79EV/bKgpw3AYfP fiyLYrvpiTqx1I7V0QskhT6XORPah/TVqSh79EOx6xOdmWrhwfMNSAttqisqP4n6uoR7ujxAkrHL/WoxeFS1SercSw4ra5I+u7L rPWcZP9xyomPFwf1f1dZtHBRX7C8ai+Hda/JVylg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||1.1|4EF5F78C-4ED8-45FF-A781-F71046E446EB|2023-12-20T11:58:38|MAS0810247C0|FaxZy+NYiPVVcY0ivo0lc1H+ PxWS4Ex7sgLHt3q9eF/Cf8eE3XbAyLj3VMKG45t8D3UEUCpjFnMRTMsSDLaxoFHYKfnagf2+z4Fwsly4PfbwtuuG/ksZAVUANwx6 6Pxx+3HCikfFXGex6vs89O9owKG4J+CiQRjFSKvXiiqzNUx/fPxBrG5XFOPdnm7zv7h9RSysSw5lfnEzjwDwu0eSPdfmj6w8uhnwg WcpwnCx2GRXOGU59lIS+6uHml3qKBlRoMeZfXw/FvWzT8aenQzdinu4tc1xkLzFzqA2CMUCj64vafPlj12fzZPhTVSHZ+ZlIaprUBGcagsVrhdt/H1aQ==|00001000000505142236||



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



eFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital  
v11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"  
UUID="4EF5F78C-4ED8-45FF-A781-F71046E446EB" FechaTimbrado="2023-12-20T11:58:38"  
RfcProvCertif="MAS0810247C0"  
SelloCFD="FaxZy+NYiPVVcY0ivo0Ic1H+PxWS4Ex7sgLHt3q9eF/Cf8eE3XbAyLl3VMKG45t8D3UEUC  
pjFnMRTMsSDLaxoFHYKfnagf2+z4FwsJy4PfbwtuuG/ksZAVUANwx66Px+3HCikFFXGex6vs8909owKG  
4J+CiQRjFskVXiizNUX/fPxBrG5XF0Pdnm7Zv7h9RSysSw5lfnEzjwDwu0eSPdfmj6w8uhnwgWcpwnc  
x2GRXOGU59IIS+6uHmI3qKB1RoMeZfXw/FvWzT8aenQzdinu4tc1xkLZqFzqdA2CMUCj64vafPLj12fz  
ZPhTvSHZ+ZIIaprUBGcagsVrhDT/H1aQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236"  
SelloSAT="VYhW9KvqUfc6F8tXeLHLi77PKbYL0iu/S51toR4w7z2f7hdqpoNwx0DA/dQX0UC8B6qAmW  
RX2Vwxupp9F9ArrvEcF2w2R6KF3w3TPL3st7AwkK8JnPheUJUgSv7UX4o2S093gbU2ZCx83Z/JR14Fm0  
MlaN8+fdzUVdWkRxUpQGeP2XNjq75Ason/79EV/bKgpw3AYfIPfiyLYrvpiTqx1I7V0QskhT6XORPah/  
TVqSh79E0x6x0dmWrhwfMN5AttqiSqP4n6uoR7ujxAkrHL/WoxeFS1SercSw4ra5L+u7LrPwCZP9xty  
omPFwfI1f1dZThBRX7C8ai+lDa/JVyLg==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUNR770712CU1	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4EF5F78C-4ED8-45FF-A781-F71046E446EB	2023-12-20T11:58:35	2023-12-20T11:58:38	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$151,358.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

Imprimir

REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

RFC: GUNR770712CU1

Tipo de Comprobante: E - Egreso  
 Lugar de Expedición: 45600  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio: -1  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 12/1/2024 14:08:14  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO  
 R.F.C.: MJJ850101KP8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
 Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, , C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		ACT - Actividad	84111506 - Servicios de facturación	Nota de Crédito	41,126.66	0.00	002 - IVA - 6,580.27	41,126.66

Importe con letra:

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 93/100 M.N.

Subtotal: 41,126.66  
 Impuestos Traslados: 6,580.27  
 Total: 47,706.93

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000509464119  
 Folio fiscal: ABF66737-D235-406C-9CEF-F6140A7793D6  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Enero 12 2024 - 14:08:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YPPJPz/MmmsqUxk8gzaagkbs20lyEBvAzrzSMLApYn7D2yWc0tp4eVaH6Jr3nV84MZwMQFBs7jPFjj6khQ1vozhsX/oSLX/ZE17acVRq2WhN89tY4T99XFEnC/f5/UCGgS4C0FSORsYla40DmBcJeyOREIJ/xYIWWzrQHlxK+K+dbRHibI4dglDpl1kg+Xz7DKYkY/8J+VzDDErblVnqs1Zfq193Z9+4nhHvXxgpPOQQbUMr6JjQQdY2IYg0AR244iKmoSgQfYAKKgUNI/EvdQgzvO18wSoo6HIO69JJGU CMm7sliuZnQ2a5xU7s0fv2wR/BDCw3R2DI/7TLhong==

Sello del SAT

dcZTWDu9mNRwdjzoSnbJbV3TPXITLkCIFG1sWlQDE+j10QW3yJyLYCUEU1K+y6QMruYXim0ocs7T902F5GD6otpCGyLxnOuH2HV J3XWvI2KSD0aBwkVzo6Xy6+GGMs9pA3gfWww5IdaY0bMLR2M9rHqZomDqHfGuk0dXKpTrpfJkuvBDC9a+eZlc02k37f4kAlszmv /XCwaxa7pKpYXgVoY3lxrsETROK0P0rElGeqxqwhmHbVG6cl+q+kk0tEZWocw6psolGBaNySdFGm6iF0WumINJrh5Nnrunbuw6V aNDzMHloDspB0TwbHfXiGEKEPiNQ6xn+7NKeoJ02Hw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ABF66737-D235-406C-9CEF-F6140A7793D6|2024-01-12T14:08:17|MAS0810247C0|YPPJPz/MmmsqUxk8gzaagkb s20lyEBvAzrzSMLApYn7D2yWc0tp4eVaH6Jr3nV84MZwMQFBs7jPFjj6khQ1vozhsX/oSLX/ZE17acVRq2WhN89tY4T99XFEnC/ f5/UCGgS4C0FSORsYla40DmBcJeyOREIJ/xYIWWzrQHlxK+K+dbRHibI4dglDpl1kg+Xz7DKYkY/8J+VzDDErblVnqs1Zfq193Z9 +4nhHvXxgpPOQQbUMr6JjQQdY2IYg0AR244iKmoSgQfYAKKgUNI/EvdQgzvO18wSoo6HIO69JJGU CMm7sliuZnQ2a5xU7s0fv2wR /BDCw3R2DI/7TLhong==|0000100000505142236|



*[Handwritten signature]*

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="1" Fecha="2024-01-
12T14:08:14"
Sello="YPPJPz/MmmsqUxk8gzaagkbs20IyEBvAzrzsMLApYn7D2yWc0tp4eVaH6Jr3nV84MzWmqFBs7jPFj1j6khQ1vozhsX/oSLX/ZE17acVRq2WhN89tY4T99XfEnC/f5/UCGgS4C0FSORsY1a40D
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000509464119"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk0NjQxMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQDBBQVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="41126.66" Moneda="MXN" Total="47706.93" TipoDeComprobante="E" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45600">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="GUNR770712CU1" Nombre="REFUGIO GUTIERREZ NIEVES"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" Descripcion="Nota de Crédito" ValorUnitario="41126.66" Importe="41126.66"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="41126.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6580.27"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6580.27">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6580.27" Base="41126.66"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="ABF66737-D235-406C-9CEF-F6140A7793D6"
FechaTimbrado="2024-01-12T14:08:17" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="YPPJPz/MmmsqUxk8gzaagkbs20IyEBvAzrzsMLApYn7D2yWc0tp4eVaH6Jr3nV84MzWmqFBs7jPFj1j6khQ1vozhsX/oSLX/ZE17acVRq2WhN89tY4T99XfEnC/f5/UCGgS4C0FSOR
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="dcZTWduu9mNRwdjzoSnbJbV3TPXITLkCIFG1swlQDE+j10QW3yJyLYCUEU1K+y6QMruYXim0ocs7T902F5GD6otpcGyLxnOuH2HVJ3XWw12KSD0aBwKvzo6Xy6+GGMs9pA3gfWw5ID
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```




## REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600  
R.F.C. GUNR770712CU1

<b>H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</b>  DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	No. DE CONTRATO: GMJ 019- OP/2023	HOJA DE RELACIÓN	HOJA No. 1 DE 1
	CONTRATISTA: REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
	OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	PERÍODO DE TRABAJO:	16/10/2023
	UBICACIÓN: CHANTEPEC	AL:	31/10/2023
		FECHA:	01/11/2023

### RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS	I M P O R T E S																										
	  <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		\$	32,592.52																								
	VIALIDAD		\$	57,243.34																								
	BANQUETAS		\$	7,704.26																								
	LIMPIEZA		\$	26,456.09																								
	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		\$																									
		MONTO DE ESTIMACIÓN	\$	123,996.21																								
		MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$	34,640.99																								
		SUBTOTAL	\$	89,355.22																								
		I . V . A . 16%	\$	14,296.84																								
		SUMA	\$	103,652.06																								
		MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$	619.98																								
		NETO A PAGAR	\$	103,032.08																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ESTADO CONTABLE</th> <th style="width: 15%;">IMPORTE</th> <th style="width: 15%;">I . V . A .</th> <th style="width: 15%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASIGNACIÓN</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,766,909.88</td> <td style="text-align: right;">\$ 282,705.58</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,049,615.46</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE DE ESTIMACIÓN</td> <td style="text-align: right;">\$ 123,996.21</td> <td style="text-align: right;">\$ 19,839.39</td> <td style="text-align: right;">\$ 143,835.61</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,651,439.90</td> <td style="text-align: right;">\$ 264,230.38</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,915,670.28</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO A LA FECHA</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,775,436.11</td> <td style="text-align: right;">\$ 284,069.78</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,059,505.89</td> </tr> <tr> <td>MONTO EXCEDENTE</td> <td style="text-align: right;">-\$ 8,526.23</td> <td style="text-align: right;">-\$ 1,364.20</td> <td style="text-align: right;">-\$ 9,890.43</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL	ASIGNACIÓN	\$ 1,766,909.88	\$ 282,705.58	\$ 2,049,615.46	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 123,996.21	\$ 19,839.39	\$ 143,835.61	ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,651,439.90	\$ 264,230.38	\$ 1,915,670.28	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,775,436.11	\$ 284,069.78	\$ 2,059,505.89	MONTO EXCEDENTE	-\$ 8,526.23	-\$ 1,364.20	-\$ 9,890.43	EL CONTRATISTA   C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES		
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL																									
ASIGNACIÓN	\$ 1,766,909.88	\$ 282,705.58	\$ 2,049,615.46																									
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 123,996.21	\$ 19,839.39	\$ 143,835.61																									
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,651,439.90	\$ 264,230.38	\$ 1,915,670.28																									
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,775,436.11	\$ 284,069.78	\$ 2,059,505.89																									
MONTO EXCEDENTE	-\$ 8,526.23	-\$ 1,364.20	-\$ 9,890.43																									
<b>AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO</b>		EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO   C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA																										
ANTICIPO %	\$ 530,072.97	\$ 84,811.67	\$	614,884.64																								
AMORTIZACIÓN	\$ 34,640.99	\$ 5,542.56	\$	40,183.55																								
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 495,431.97	\$ 79,269.12	\$	574,701.09																								
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 530,072.96	\$ 84,811.67	\$	614,884.63																								
FALTANTE POR AMORTIZAR	-\$ 0.00	-\$ 0.00	\$	0.00																								
		EL DIRECTOR DE...   C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ																										

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**REFUGIO GUTIERREZ NIEVES**

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600  
R.F.C. GUNR770712CU1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 3 TRES FINIQUITO AL 31/10/2023  
PERIODO: 16/10/2023

OBRA : CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : CHANTEPEC  
CONTRATISTA : REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
FECHA : 01/11/2023

**ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA**

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		
<b>PLAYA DE AZUL</b>													
<b>PDA 1</b>	<b>VIALIDAD</b>									<b>\$32,592.52</b>	<b>\$1,354,618.90</b>	<b>\$103,789.62</b>	
PU-001	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,368.00		1,256.00	112.00	\$10.71	\$14,651.28	\$0.00	\$13,451.76	\$1,199.52		
PU-002	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	547.20		503.00	44.20	\$92.26	\$50,484.67	\$0.00	\$46,406.78	\$4,077.89		
PU-003	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO QUE SEÑALE OBRAS PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M2	1,368.00		1,256.00	112.00	\$48.72	\$66,648.96	\$0.00	\$61,192.32	\$5,456.64		
PU-004	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.(NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3	752.40		691.00	61.40	\$75.48	\$56,791.15	\$0.00	\$52,156.68	\$4,634.47		
PU-005	ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00)	M3-KM	6,771.60		6,908.00	-136.40	\$12.00	\$81,259.20	\$0.00	\$82,896.00	-\$1,636.80		
PU-006	AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL ADICIONANDO EL 2% DE CAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE MECANICO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,368.00		1,256.00	112.00	\$146.94	\$201,013.92	\$0.00	\$184,556.64	\$16,457.28		
PU-007	SUB BASE CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y DESPERDICIOS. (N-CMT-4-02-002/16).	M3	273.60		251.00	22.60	\$401.28	\$109,790.21	\$0.00	\$100,721.28	\$9,068.93		
PU-008	BASE HIDRAULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACION, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y DESPERDICIOS. (N-CMT-4-02-002/16).	M3	273.60		251.00	22.60	\$477.56	\$130,660.42	\$0.00	\$119,867.56	\$10,792.86		
PU-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHUELO PREFABRICADO 12X30X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	360.00		331.00	29.00	\$215.70	\$77,652.00	\$0.00	\$71,396.70	\$6,255.30		



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

*Dani Rodru V.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 3 TRES FINIQUITO  
 PERÍODO: 16/10/2023 AL 31/10/2023  
 OBRA : CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
 UBICACIÓN : CHANTEPEC  
 CONTRATISTA : REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
 FECHA: 01/11/2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
PU-010	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CMS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE BANCO EN PROPORCION 70% DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 30% PIEDRA DE BANCO, INCLUYE: SELECCIÓN DE PIEDRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS Y ACARREOS NECESARIOS.	M2	1,314.00	38.80	1,220.80	93.20	\$498.63	\$655,199.82	\$19,346.84	\$608,727.50	\$46,472.32
PU-011	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,314.00	1,220.80	1,220.80	93.20	\$10.85	\$14,256.90	\$13,245.68	\$13,245.68	\$1,011.22
<b>PDA 2</b>	<b>BANQUETAS</b>								<b>\$57,243.34</b>	<b>\$386,656.86</b>	<b>-\$84,405.11</b>
PU-012	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	576.00		679.00	-103.00	\$10.71	\$6,168.96	\$0.00	\$7,272.09	-\$1,103.13
PU-013	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO.	M3	97.92		68.00	29.92	\$174.51	\$17,088.02	\$0.00	\$11,866.68	\$5,221.34
PU-014	AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	576.00		679.00	-103.00	\$22.14	\$12,752.64	\$0.00	\$15,033.06	-\$2,280.42
PU-015	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	57.60		68.00	-10.40	\$477.98	\$27,531.65	\$0.00	\$32,502.64	-\$4,970.99
PU-016	BANQUETA DE 7 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2., R.N., T.M.A. 10 MM ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	576.00	31.07	710.07	-134.07	\$386.95	\$222,883.20	\$12,022.54	\$274,761.59	-\$51,878.39
PU-017	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOL TIPO OLIVO NEGRO DE 1.50 M DE ALTURA PROMEDIO Y 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ABONO E INSECTICIDA, MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA	PZA	21.00	60.00	60.00	-39.00	\$753.68	\$15,827.28	\$45,220.80	\$45,220.80	-\$29,393.52
<b>PDA 3</b>	<b>LIMPIEZA</b>								<b>\$7,704.26</b>	<b>\$7,704.26</b>	<b>-\$1,454.66</b>
PU-018	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL A UNA ESTACION NO MAYOR DE 50 MTS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	576.00	710.07	710.07	-134.07	\$10.85	\$6,249.60	\$7,704.26	\$7,704.26	-\$1,454.66
<b>PDA 4</b>	<b>PRECIOS FUERA DE CATALOGO</b>								<b>\$26,456.09</b>	<b>\$26,456.09</b>	<b>-\$26,456.09</b>

Conceptos

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No.

3 TRES FINIQUITO

PERÍODO:

16/10/2023

AL

31/10/2023

OBRA :

CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN :

CHANTEPEC

CONTRATISTA :

REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FECHA:

01/11/2023

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA											
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
EXT-001	RENIVELACION DE POZO DE VISITA. EL CONCEPTO INCLUYE: EL RETIRO DE BROCAL Y TAPA EXISTENTE, DEMOLICION DE MURO A TEZON EXISTENTE PARA MANIOBRAS, ELABORACION DE MURO DE BLOCK DE JALCRETO DE 11X14X28 cms. A TEZON PEGADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO PROP. 1:4 RENIVELANDO DE 10 A 50 CMS. DE ALTURA PROMEDIO, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE TAPA CON BROCAL DE Ø64X4.5 CM FABRICADA EN CONCRETO ARMADO. MEDIDA EXTERIOR DEL BROCAL Ø72.6 CM, ALTURA DESDE LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL A LA PARTE SUPERIOR DE 20 CM. PESO APROXIMADO EN CONJUNTO DE 50 KG. RESISTENCIA 20 TON. RECIBIR BROCAL Y TAPA EN LA LOSA CON CONCRETO F'c=300 KG/CM2 RESISTENCIA A LOS 3 DÍAS, CON DIMENSIONES DE 1.50 X 1.50 MTS. DE LADO Y 0.20 MTS. DE ESPESOR, SE INCLUYE DALA PERIMETRAL DE 15 X 28 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2", CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4", LIMPIEZA INTERIOR DEL POZO, RETIRO DE ESCOMBRO Y AZOLVES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA		2.00	2.00	-2.00	\$2,859.34	\$0.00	\$5,718.68	\$5,718.68	-\$5,718.68
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2		183.75	183.75	-183.75	\$63.85	\$0.00	\$11,732.44	\$11,732.44	-\$11,732.44
EXT-003	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA RD-9 EN 6.00 M DE LONGITUD APROXIMADO UNIDOS POR 2 COPLES DE REPARACIÓN EN CADA EXTREMO, INCLUYE: EXCAVACIONES MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA		17.00	17.00	-17.00	\$274.34	\$0.00	\$4,663.78	\$4,663.78	-\$4,663.78
EXT-004	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 EN 6.00 M DE LONGITUD APROXIMADO UNIDOS POR 2 COPLES DE REPARACIÓN EN CADA EXTREMO, INCLUYE: EXCAVACIONES MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA		7.00	7.00	-7.00	\$356.98	\$0.00	\$2,498.86	\$2,498.86	-\$2,498.86
EXT-005	RESANE DE FACHADAS DE CASA IGUALANDO CRITERIOS DE APLANADO EXISTENTE, EN DIMENSIONES DE ALTURA DESDE 30 CM HASTA 50 CM, INCLUYE: LA ELABORACIÓN DE LOS MORTEROS, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y LA LIMPIEZA NECESARIA ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M		21.50	21.50	-21.50	\$85.69	\$0.00	\$1,842.34	\$1,842.34	-\$1,842.34



SUMA	\$	1,766,909.88	\$	123,996.21	\$	1,775,436.11	-\$	8,526.25
IVA	\$	282,705.58	\$	19,839.39	\$	284,069.78	-\$	1,364.20
TOTAL	\$	2,049,615.46	\$	143,835.61	\$	2,059,505.89	-\$	9,890.45

REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
REPRESENTANTE LEGAL

*Daniel Rodriguez*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

*C. Imelda Karina Perez Gonzalez*  
C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-010	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CMS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE BANCO EN PROPORCION 70% DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 30% PIEDRA DE BANCO, INCLUYE: SELECCIÓN DE PIEDRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS Y ACARREOS NECESARIOS.								OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	ALTO	VOLUMEN	
M2	0+000.00	0+020.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+020.00	0+040.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+040.00	0+060.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+060.00	0+080.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+080.00	0+100.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+100.00	0+120.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+120.00	0+140.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+140.00	0+171.40	31.40	7.00	6.95	6.98		219.02	
APROCHE			3.112			7.00		21.78	
							COBRADO	- 1,182.00	
							SUMA	38.80	

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES



FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-010	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CMS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE BANCO EN PROPORCION 70% DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 30% PIEDRA DE BANCO, INCLUYE: SELECCIÓN DE PIEDRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS Y ACARREOS NECESARIOS.	FOTOGRAFÍA
--------	--	------------

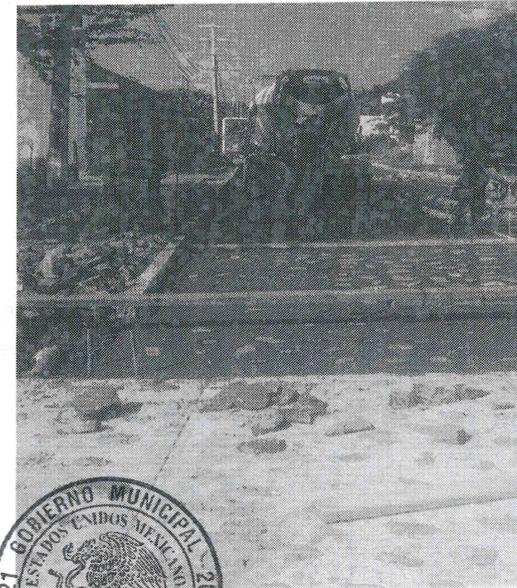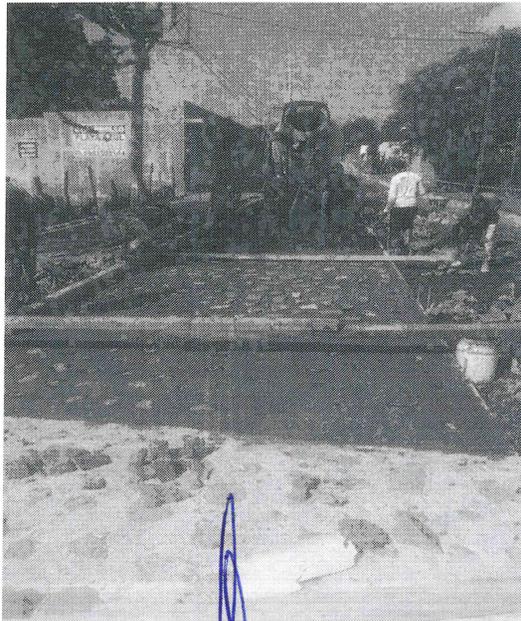

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez Valenzuela*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



**DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS**



# REFUGIO GUTIERREZ NIEVES


FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-010	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CMS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE BANCO EN PROPORCION 70% DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 30% PIEDRA DE BANCO, INCLUYE: SELECCIÓN DE PIEDRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS Y ACARREOS NECESARIOS.	CROQUIS
--------	--	---------

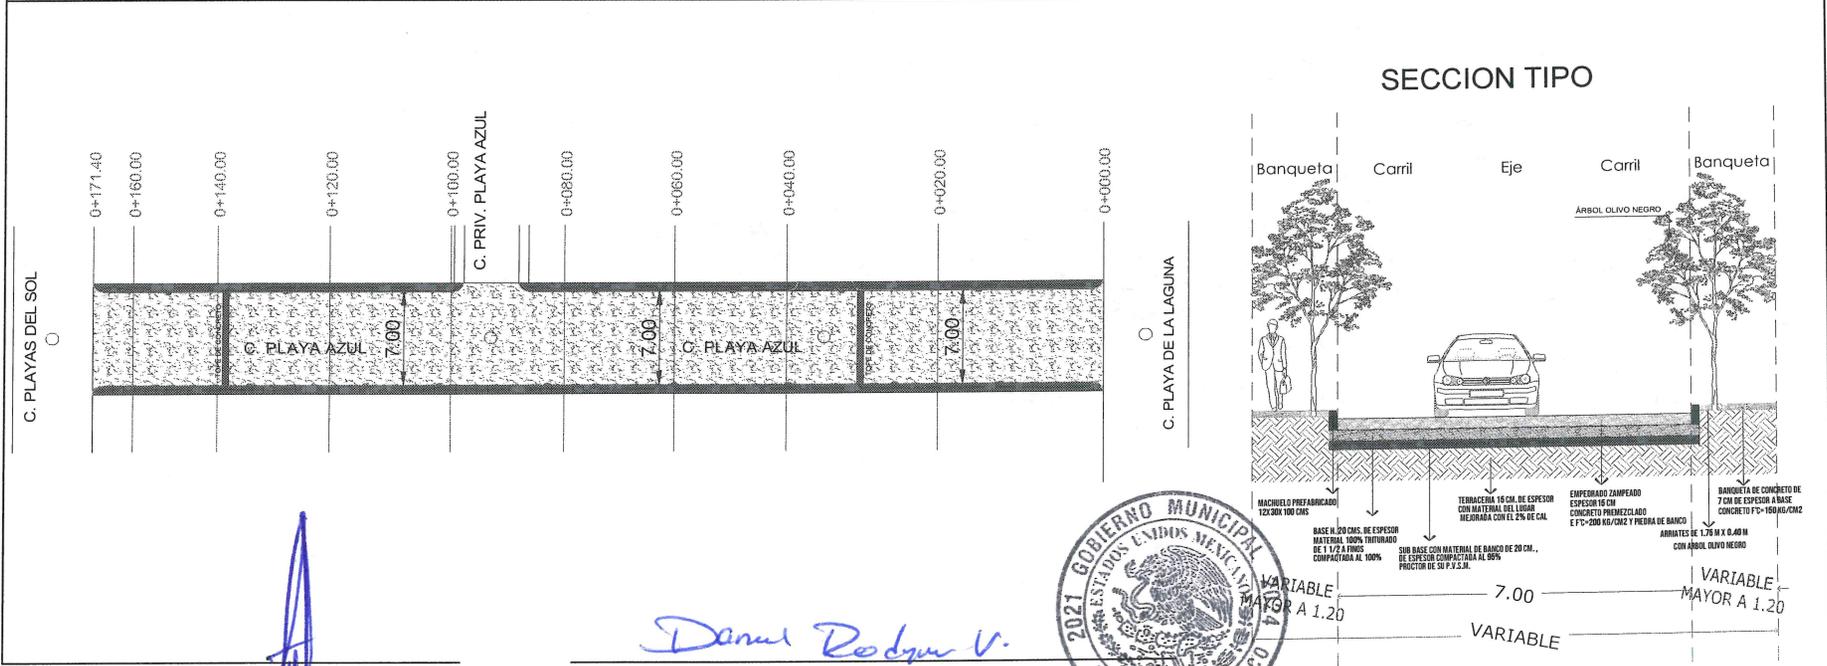

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez V.*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-011	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	ALTO	VOLUMEN	
M2	0+000.00	0+020.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+020.00	0+040.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+040.00	0+060.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+060.00	0+080.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+080.00	0+100.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+100.00	0+120.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+120.00	0+140.00	20.00	7.00	7.00	7.00		140.00	
	0+140.00	0+171.40	31.40	7.00	6.95	6.98		219.02	
APROCHE			3.112			7.00		21.78	
							COBRADO		
						SUMA		1,220.80	

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES


FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1


EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-011	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA
--------	---	------------

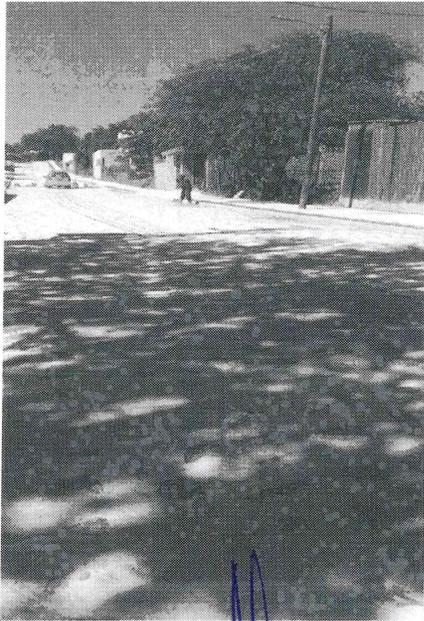

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

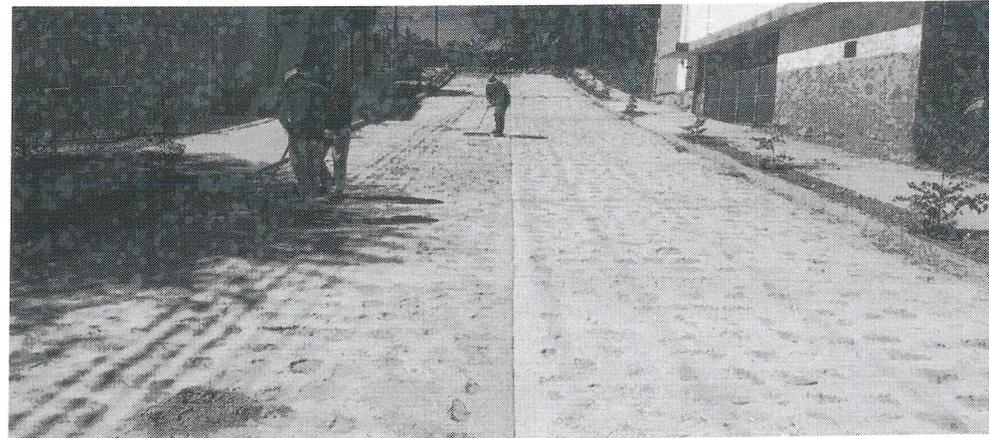

*Daniel Rodriguez*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



# REFUGIO GUTIERREZ NIEVES


FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-011	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS
--------	---	---------

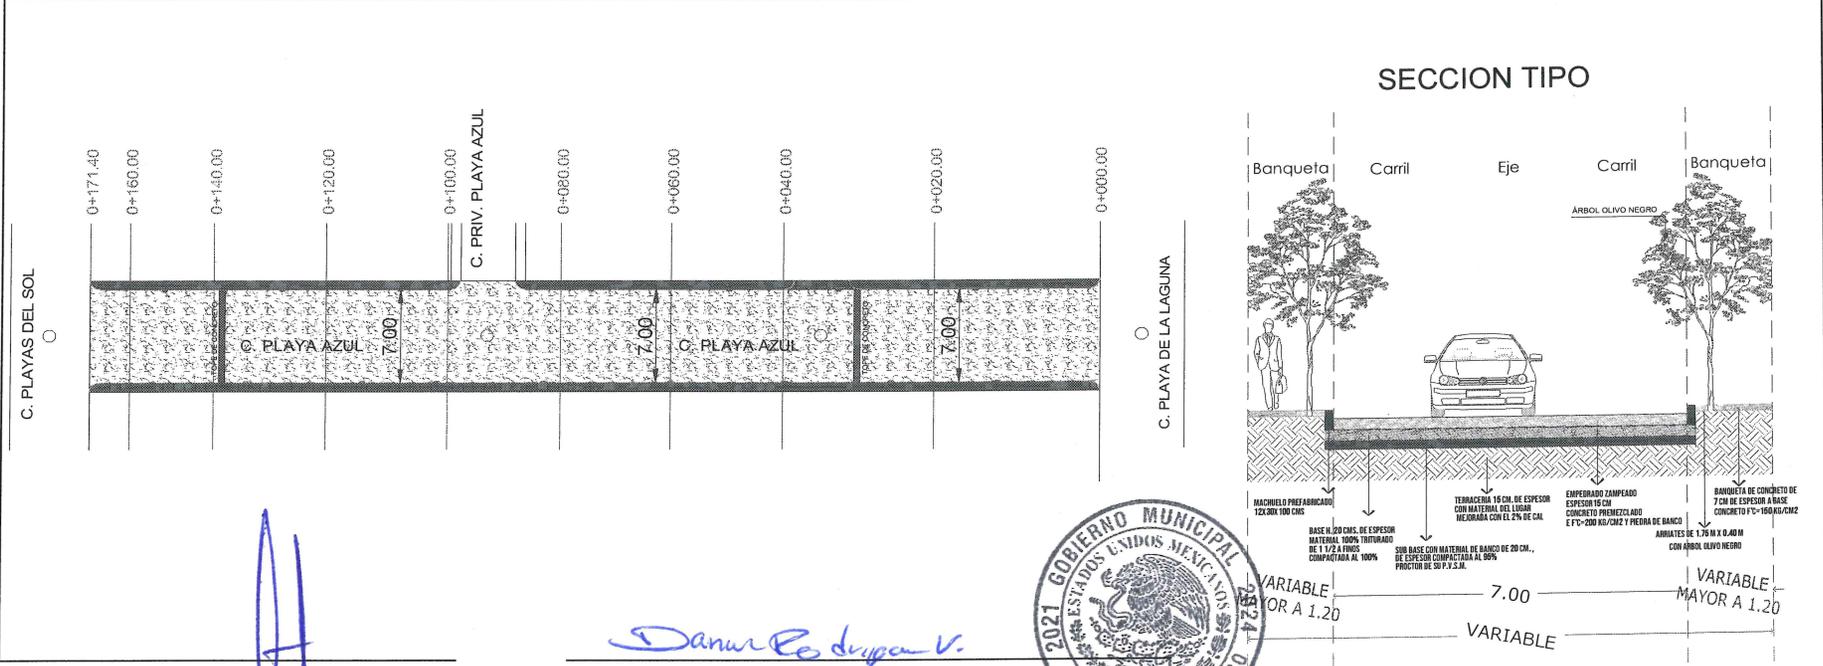

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez Valenzuela*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-016	BANQUETA DE 7 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2., R.N., T.M.A. 10 MM ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	PZAS	VOLUMEN	BANQUETAS LADO IZQUIERDO
M2									
			21.50	2.38	2.26	2.32		49.88	
			21.50	2.26	2.00	2.13		45.80	
			7.45	2.30	2.31	2.31		17.17	
			37.50	2.10	2.25	2.18		81.56	
			8.70	2.45	2.35	2.40		20.88	
			36.10	2.20	2.15	2.18		78.52	
			28.30	1.55	1.00	1.28		36.08	
		RAMPAS	12.00			0.50		6.00	
			6.15			0.50		3.08	
			6.20			0.50		3.10	
			4.50			0.50		2.25	
						SUMA		344.00	

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-016	BANQUETA DE 7 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., R.N., T.M.A. 10 MM ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	PZAS	VOLUMEN	BANQUETAS LADO DERECHO
M2								-	
			10.20	2.30	2.18	2.24		22.85	
			9.40	1.70	1.80	1.75		16.45	
			25.20	2.15	2.23	2.19		55.19	
			10.90	1.50	1.50	1.50		16.35	
			64.10	1.65	1.50	1.58		100.96	
			17.30	2.10	2.25	2.18		37.63	
			17.90	1.95	2.90	2.43		43.41	
			19.10	2.50	2.50	2.50		47.75	
		RAMPAS	8.40			0.50		4.20	
			5.25			0.50		2.63	
			10.30			0.50		5.15	
			13.20			0.50		6.60	
			7.17			0.50		3.59	
			6.66			0.50		3.33	
							COBRADO	- 679.00	
							SUMA	- 312.93	
							GRAN TOTAL	31.07	

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES


FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			


LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-016	BANQUETA DE 7 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., R.N., T.M.A. 10 MM ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA
--------	---	------------

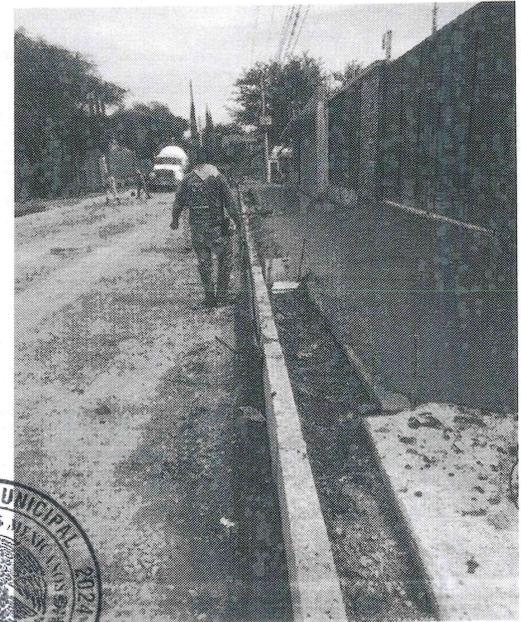

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez Valenzuela*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





# REFUGIO GUTIERREZ NIEVES


FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-016	BANQUETA DE 7 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM <sup>2</sup> , R.N., T.M.A. 10 MM ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS
--------	---	---------

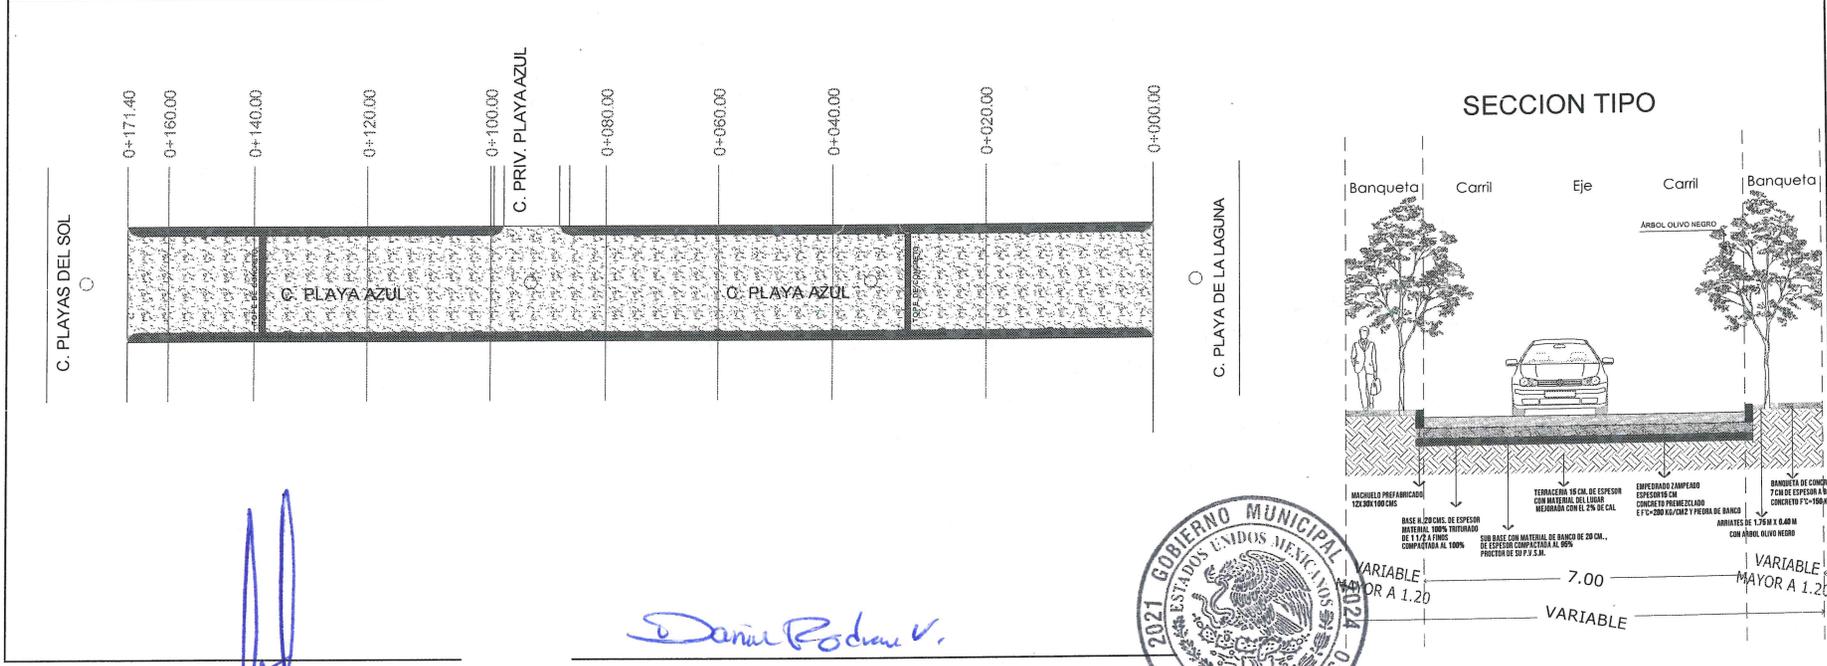

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-017	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOL TIPO OLIVO NEGRO DE 1.50 M DE ALTURA PROMEDIO y 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ABONO E INSECTICIDA, MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA								OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	PZAS	VOLUMEN	
PZAS									
							25.00	25.00	
							35.00	35.00	
							<b>SUMA</b>	<b>60.00</b>	

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
 EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-017	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOL TIPO OLIVO NEGRO DE 1.50 M DE ALTURA PROMEDIO y 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ABONO E INSECTICIDA, MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA	FOTOGRAFÍA
--------	---	------------



C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

*Daniel Rodríguez Valenzuela*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



# REFUGIO GUTIERREZ NIEVES


FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-017	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOL TIPO OLIVO NEGRO DE 1.50 M DE ALTURA PROMEDIO y 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ABONO E INSECTICIDA, MANTENIMIENTO HASTA LA ENTREGA	CROQUIS
--------	---	---------

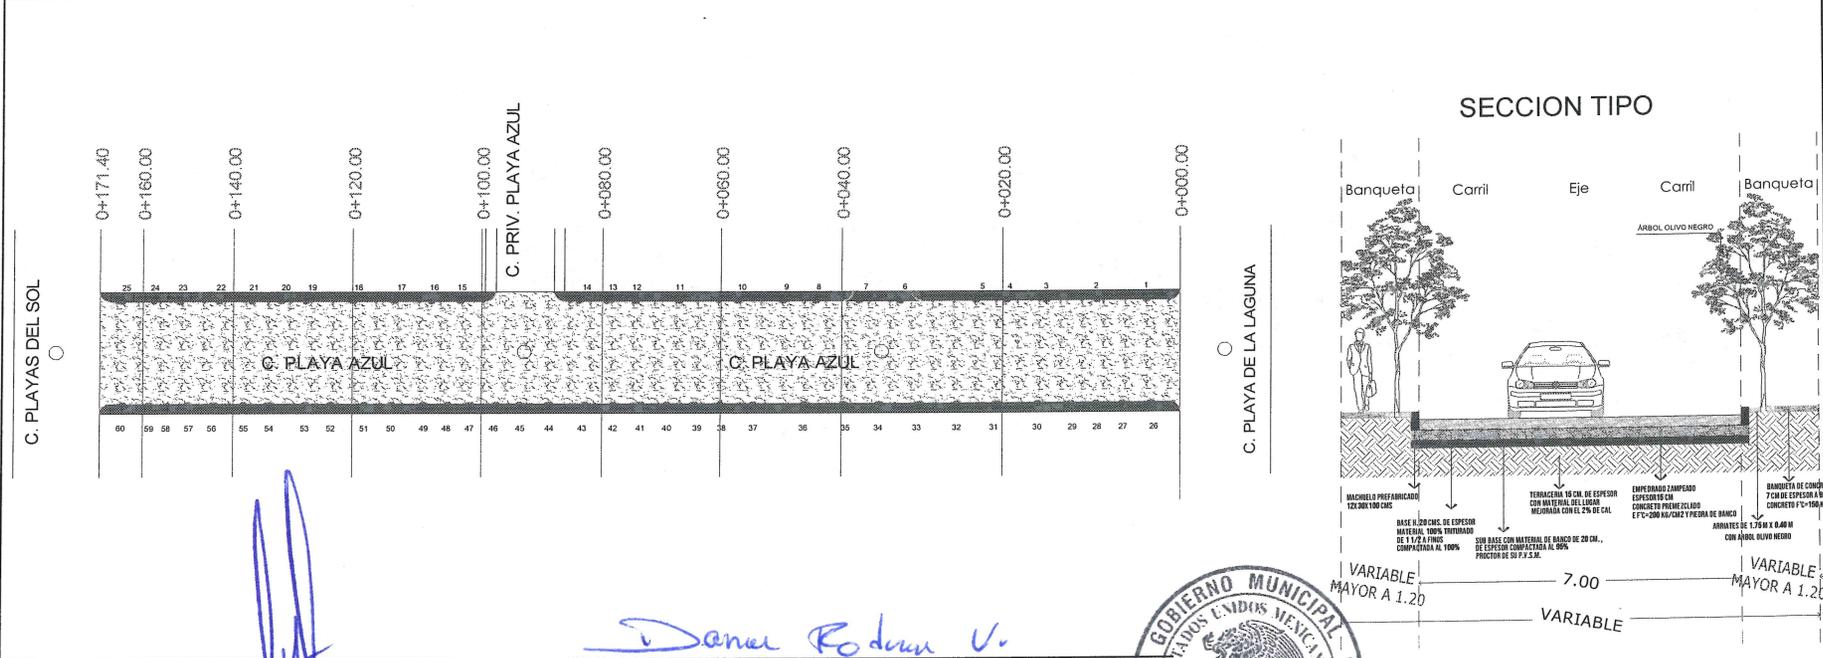

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez V.*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO







### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-018	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL A UNA ESTACION NO MAYOR DE 50 MTS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								OBSERVACIONES	
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	PZAS	VOLUMEN	BANQUETAS LADO DERECHO	
M2								-		
			10.20	2.30	2.18	2.24		22.85		
			9.40	1.70	1.80	1.75		16.45		
			25.20	2.15	2.23	2.19		55.19		
			10.90	1.50	1.50	1.50		16.35		
			64.10	1.65	1.50	1.58		100.96		
			17.30	2.10	2.25	2.18		37.63		
			17.90	1.95	2.90	2.43		43.41		
			19.10	2.50	2.50	2.50		47.75		
		RAMPAS	8.40			0.50		4.20		
			5.25			0.50		2.63		
			10.30			0.50		5.15		
			13.20			0.50		6.60		
			7.17			0.50		3.59		
			6.66			0.50		3.33		
SUMA								366.07		
GRAN TOTAL								710.07		

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-018	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL A UNA ESTACION NO MAYOR DE 50 MTS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA
--------	---	------------



C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez Valenzuela*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



# REFUGIO GUTIERREZ NIEVES



FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

PU-018	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL A UNA ESTACION NO MAYOR DE 50 MTS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS
--------	---	---------

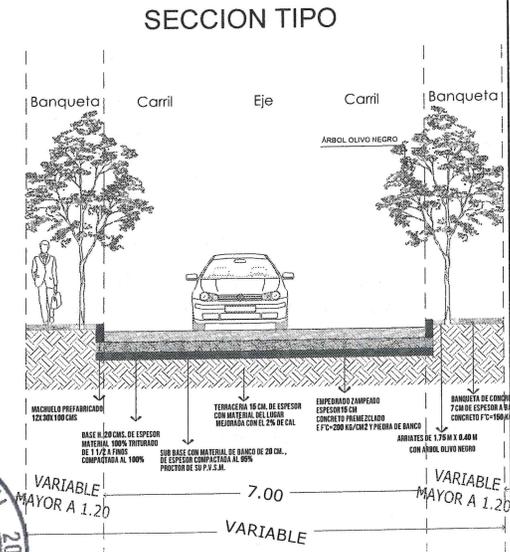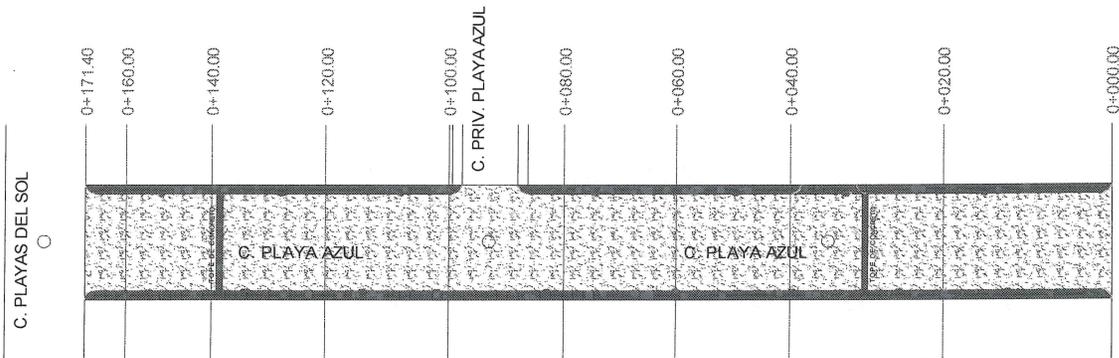


C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez V.*

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





**REFUGIO GUTIERREZ NIEVES**

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-001	<p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA. EL CONCEPTO INCLUYE: EL RETIRO DE BROCAL Y TAPA EXISTENTE, DEMOLICION DE MURO A TEZON EXISTENTE PARA MANIOBRAS, ELABORACION DE MURO DE BLOCK DE JALCRETO DE 11X14X28 cms. A TEZON PEGADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO PROP. 1:4 RENIVELANDO DE 10 A 50 CMS. DE ALTURA PROMEDIO, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE TAPA CON BROCAL DE Ø64X4.5 CM FABRICADA EN CONCRETO ARMADO. MEDIDA EXTERIOR DEL BROCAL Ø72.6 CM, ALTURA DESDE LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL A LA PARTE SUPERIOR DE 20 CM. PESO APROXIMADO EN CONJUNTO DE 50 KG. RESISTENCIA 20 TON. RECIBIR BROCAL Y TAPA EN LA LOSA CON CONCRETO F'C=300 KG/CM2 RESISTENCIA A LOS 3 DÍAS, CON DIMENSIONES DE 1.50 X 1.50 MTS. DE LADO Y 0.20 MTS. DE ESPESOR, SE INCLUYE DALA PERIMETRAL DE 15 X 28 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2", CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4", LIMPIEZA INTERIOR DEL POZO, RETIRO DE ESCOMBRO Y AZOLVES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p>	OBSERVACIONES
---------	---	---------------

UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	PZAS	VOLUMEN
PZA							2.00	2.00
						SUMA		2.00

<p>C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES EL CONTRATISTA</p>	<p><i>Daniel Rodriguez</i> C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO</p>
---	---



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES



FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			


LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-001	<p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA. EL CONCEPTO INCLUYE: EL RETIRO DE BROCAL Y TAPA EXISTENTE, DEMOLICION DE MURO A TEZON EXISTENTE PARA MANIOBRAS, ELABORACION DE MURO DE BLOCK DE JALCRETO DE 11X14X28 cms. A TEZON PEGADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO PROP. 1:4 RENIVELANDO DE 10 A 50 CMS. DE ALTURA PROMEDIO, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE TAPA CON BROCAL DE Ø64X4.5 CM FABRICADA EN CONCRETO ARMADO. MEDIDA EXTERIOR DEL BROCAL Ø72.6 CM, ALTURA DESDE LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL A LA PARTE SUPERIOR DE 20 CM. PESO APROXIMADO EN CONJUNTO DE 50 KG. RESISTENCIA 20 TON. RECIBIR BROCAL Y TAPA EN LA LOSA CON CONCRETO F'C=300 KG/CM2 RESISTENCIA A LOS 3 DÍAS, CON DIMENSIONES DE 1.50 X 1.50 MTS. DE LADO Y 0.20 MTS. DE ESPESOR, SE INCLUYE DALA PERIMETRAL DE 15 X 28 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2", CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4", LIMPIEZA INTERIOR DEL POZO, RETIRO DE ESCOMBRO Y AZOLVES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p>	FOTOGRAFÍA
---------	---	------------

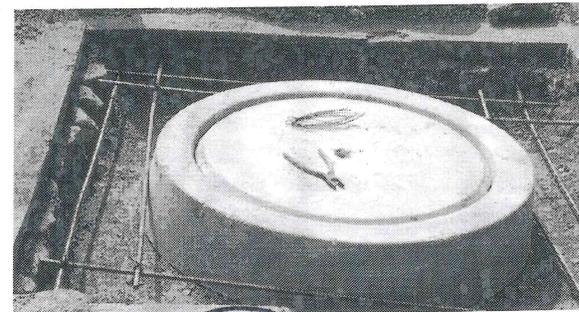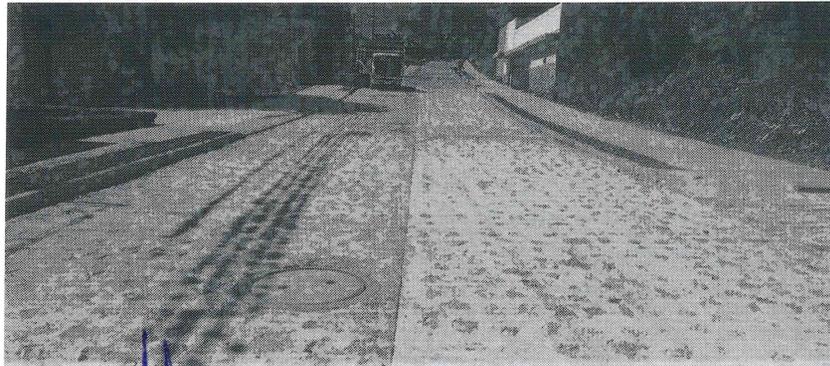

  
 C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
 EL CONTRATISTA

  
 C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES


FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-001	<p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA. EL CONCEPTO INCLUYE: EL RETIRO DE BROCAL Y TAPA EXISTENTE, DEMOLICION DE MURO A TEZON EXISTENTE PARA MANIOBRAS, ELABORACION DE MURO DE BLOCK DE JALCRETO DE 11X14X28 cms. A TEZON PEGADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO PROP. 1:4 RENIVELANDO DE 10 A 50 CMS. DE ALTURA PROMEDIO, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE TAPA CON BROCAL DE Ø64X4.5 CM FABRICADA EN CONCRETO ARMADO. MEDIDA EXTERIOR DEL BROCAL Ø72.6 CM, ALTURA DESDE LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL A LA PARTE SUPERIOR DE 20 CM. PESO APROXIMADO EN CONJUNTO DE 50 KG. RESISTENCIA 20 TON. RECIBIR BROCAL Y TAPA EN LA LOSA CON CONCRETO F'C=300 KG/CM2 RESISTENCIA A LOS 3 DÍAS, CON DIMENSIONES DE 1.50 X 1.50 MTS. DE LADO Y 0.20 MTS. DE ESPESOR, SE INCLUYE DALA PERIMETRAL DE 15 X 28 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2", CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4", LIMPIEZA INTERIOR DEL POZO, RETIRO DE ESCOMBRO Y AZOLVES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p>	CROQUIS
---------	---	---------

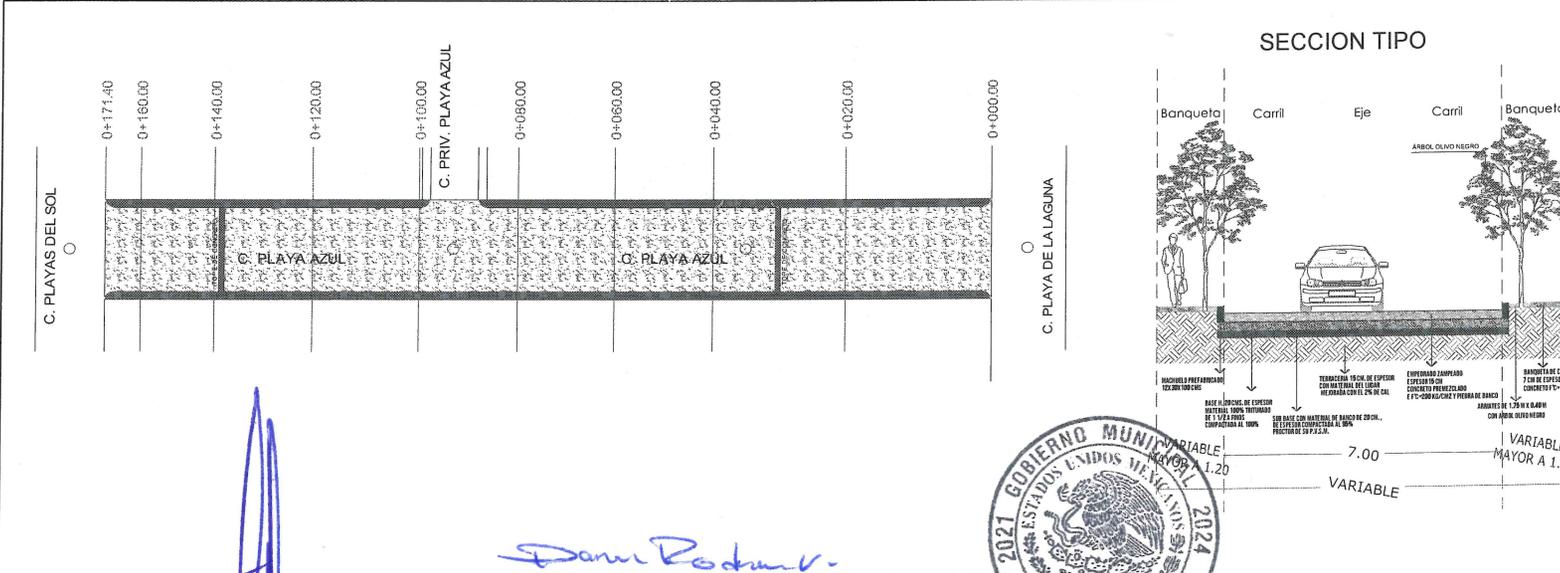

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez Valenzuela*

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	PZAS	VOLUMEN	
PZA									BANQUETAS LADO IZQUIERDO
			12.00			2.30		27.60	
			6.15			2.55		15.68	
			6.20			2.10		13.02	
			4.50			2.06		9.27	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
						SUMA		65.57	



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	PZAS	VOLUMEN	BANQUETAS LADO DERECHO
PZA			8.40			2.75		23.10	
			5.25			2.00		10.50	
			10.30			1.75		18.03	
			13.20			2.00		26.40	
			7.17			2.60		18.64	
			6.66			3.23		21.51	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
SUMA								118.18	
GRAN TOTAL								183.75	

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA
---------	---	------------



C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES


FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS
---------	---	---------

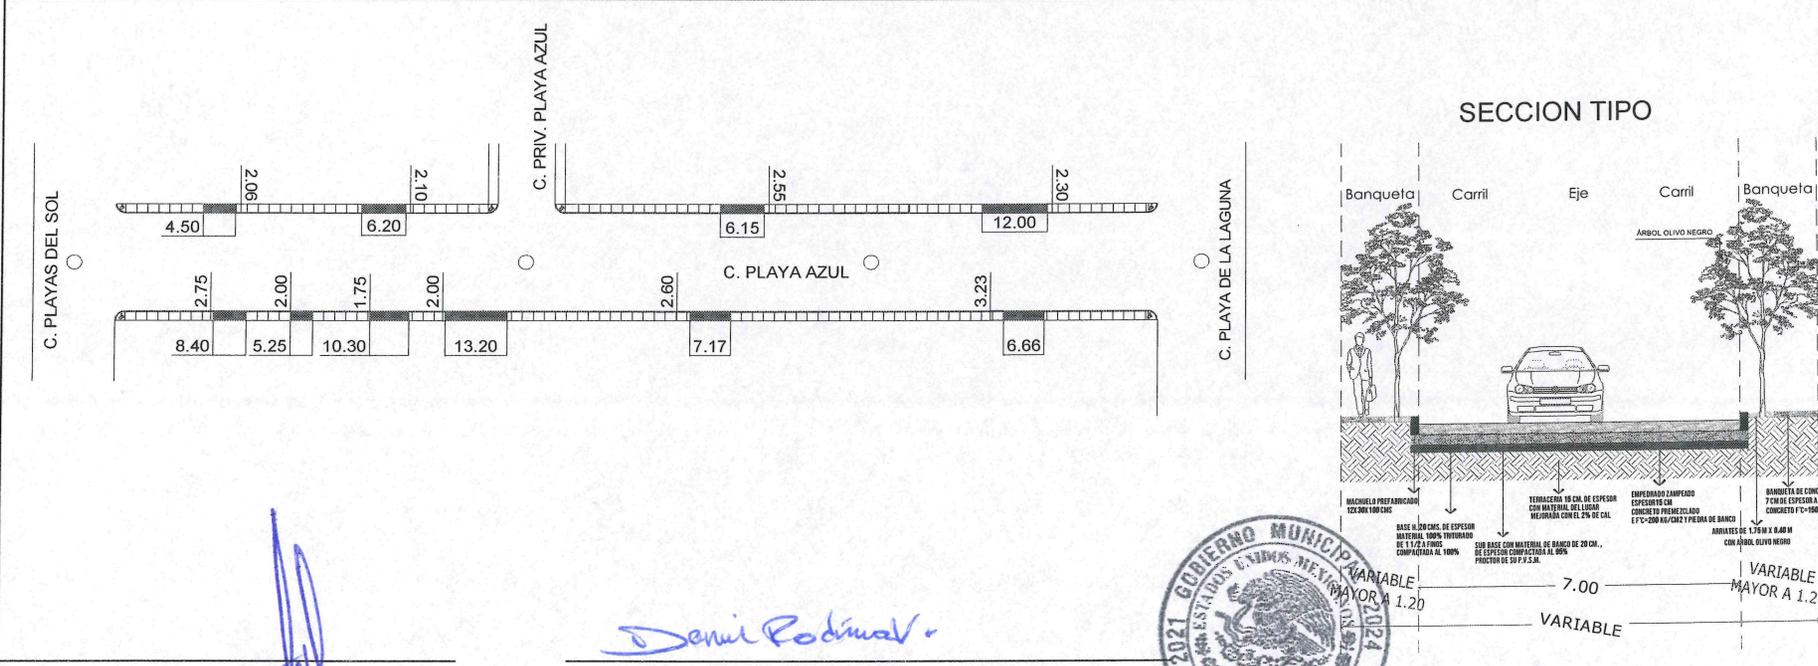

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez Valenzuela*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-003	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA RD-9 EN 6.00 M DE LONGITUD APROXIMADO UNIDOS POR 2 COPLES DE REPARACIÓN EN CADA EXTREMO, INCLUYE: EXCAVACIONES MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	PZAS	VOLUMEN	
PZA							17.00	17.00	
						SUMA		17.00	

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
 EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez V.*  
 C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-003	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA RD-9 EN 6.00 M DE LONGITUD APROXIMADO UNIDOS POR 2 COPLES DE REPARACIÓN EN CADA EXTREMO, INCLUYE: EXCAVACIONES MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA
---------	---	------------



C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez Valenzuela*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES


FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-003	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA RD-9 EN 6.00 M DE LONGITUD APROXIMADO UNIDOS POR 2 COPLES DE REPARACIÓN EN CADA EXTREMO, INCLUYE: EXCAVACIONES MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS
---------	---	---------

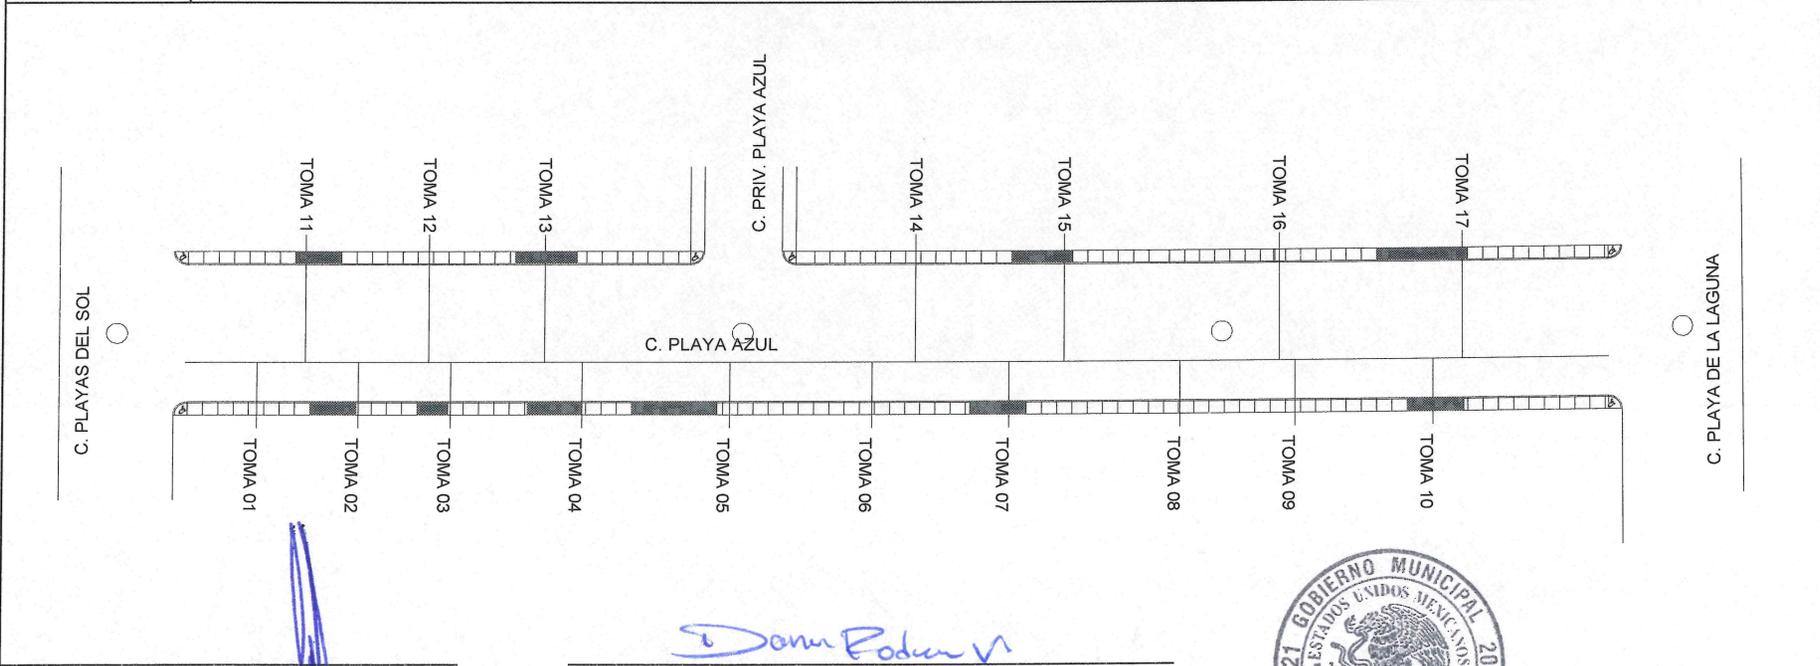

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-004	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 EN 6.00 M DE LONGITUD APROXIMADO UNIDOS POR 2 COPLES DE REPARACIÓN EN CADA EXTREMO, INCLUYE: EXCAVACIONES MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	PZAS	VOLUMEN	
PZA							7.00	7.00	
						SUMA		7.00	

<p>C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>EL CONTRATISTA</p>	<p>C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO</p>
--	--



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600


R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-004	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 EN 6.00 M DE LONGITUD APROXIMADO UNIDOS POR 2 COPLES DE REPARACIÓN EN CADA EXTREMO, INCLUYE: EXCAVACIONES MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA
---------	---	------------



  
 C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
 EL CONTRATISTA

  
 C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES


FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-004	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6" S-25 EN 6.00 M DE LONGITUD APROXIMADO UNIDOS POR 2 COPLES DE REPARACIÓN EN CADA EXTREMO, INCLUYE: EXCAVACIONES MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS
---------	---	---------

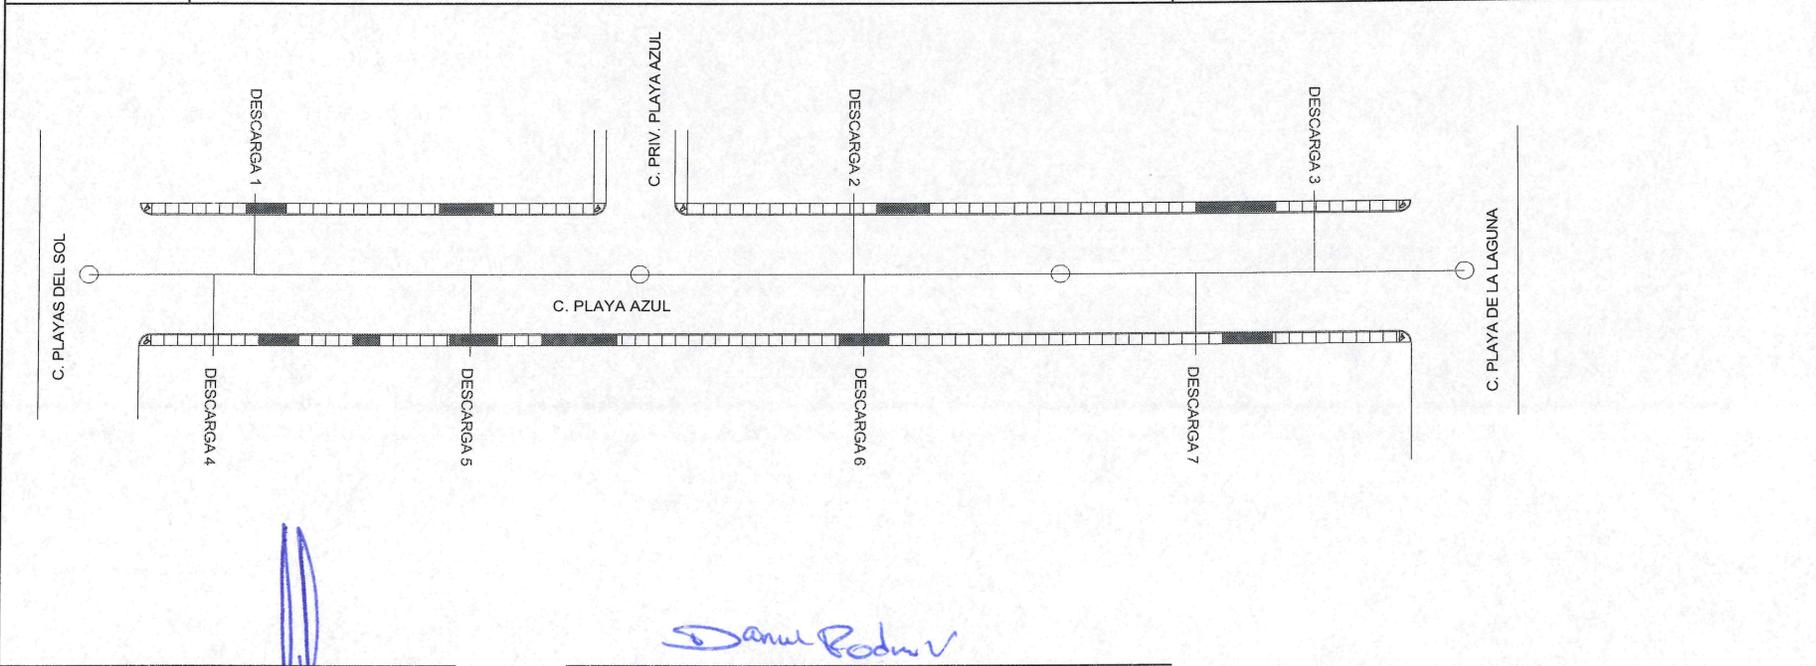

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-005	RESANE DE FACHADAS DE CASA IGUALANDO CRITERIOS DE APLANADO EXISTENTE, EN DIMENSIONES DE ALTURA DESDE 30 CM HASTA 50 CM, INCLUYE: LA ELABORACIÓN DE LOS MORTEROS, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y LA LIMPIEZA NECESARIA ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								OBSERVACIONES
UNIDAD	DE ESTACION	A ESTACION	LONGITUD	ANCHO 1	ANCHO 2	ANCHO PROMEDIO	PZAS	VOLUMEN	
ML			21.50					21.50	
						SUMA		21.50	

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

EL CONTRATISTA

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**REFUGIO GUTIERREZ NIEVES**



FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-005	RESANE DE PACHADAS DE CEMENTO IGUALANDO CRITERIOS DE AFINADO EXISTENTE, EN DIMENSIONES DE ALTURA DESDE 30 CM HASTA 50 CM, INCLUYE: LA ELABORACIÓN DE LOS MORTEROS, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y LA LIMPIEZA NECESARIA ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	FOTOGRAFÍA
---------	--	------------

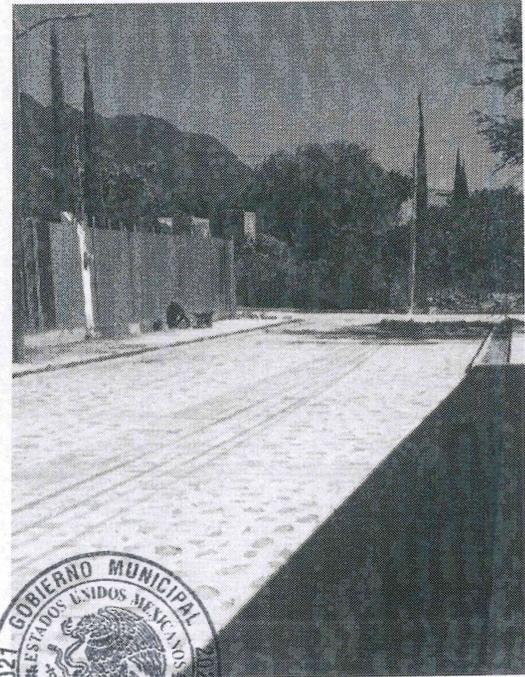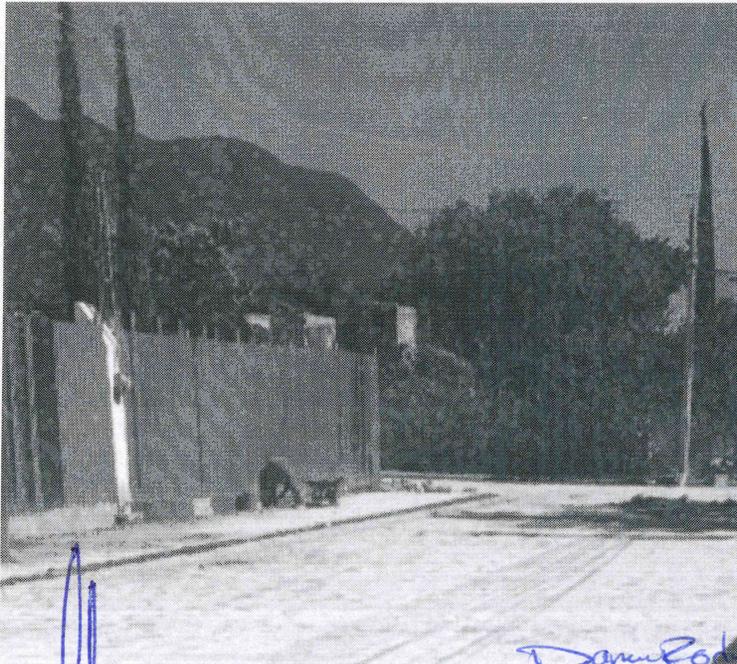

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES  
EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez Valenzuela*  
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



### REFUGIO GUTIERREZ NIEVES


FRANCISCO I MADERO # 292 COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45600

R.F.C. GUNR770712CU1

EMPRESA:	REFUGIO GUTIERREZ NIEVES	FECHA:	01/11/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE PLAYA AZUL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	3 TRES FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	16/10/2023 AL 31/10/2023

EXT-005	RESANE DE FACHADAS DE CASA IGUALANDO CRITERIOS DE APLANADO EXISTENTE, EN DIMENSIONES DE ALTURA DESDE 30 CM HASTA 50 CM, INCLUYE: LA ELABORACIÓN DE LOS MORTEROS, LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y LA LIMPIEZA NECESARIA ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CROQUIS
---------	--	---------

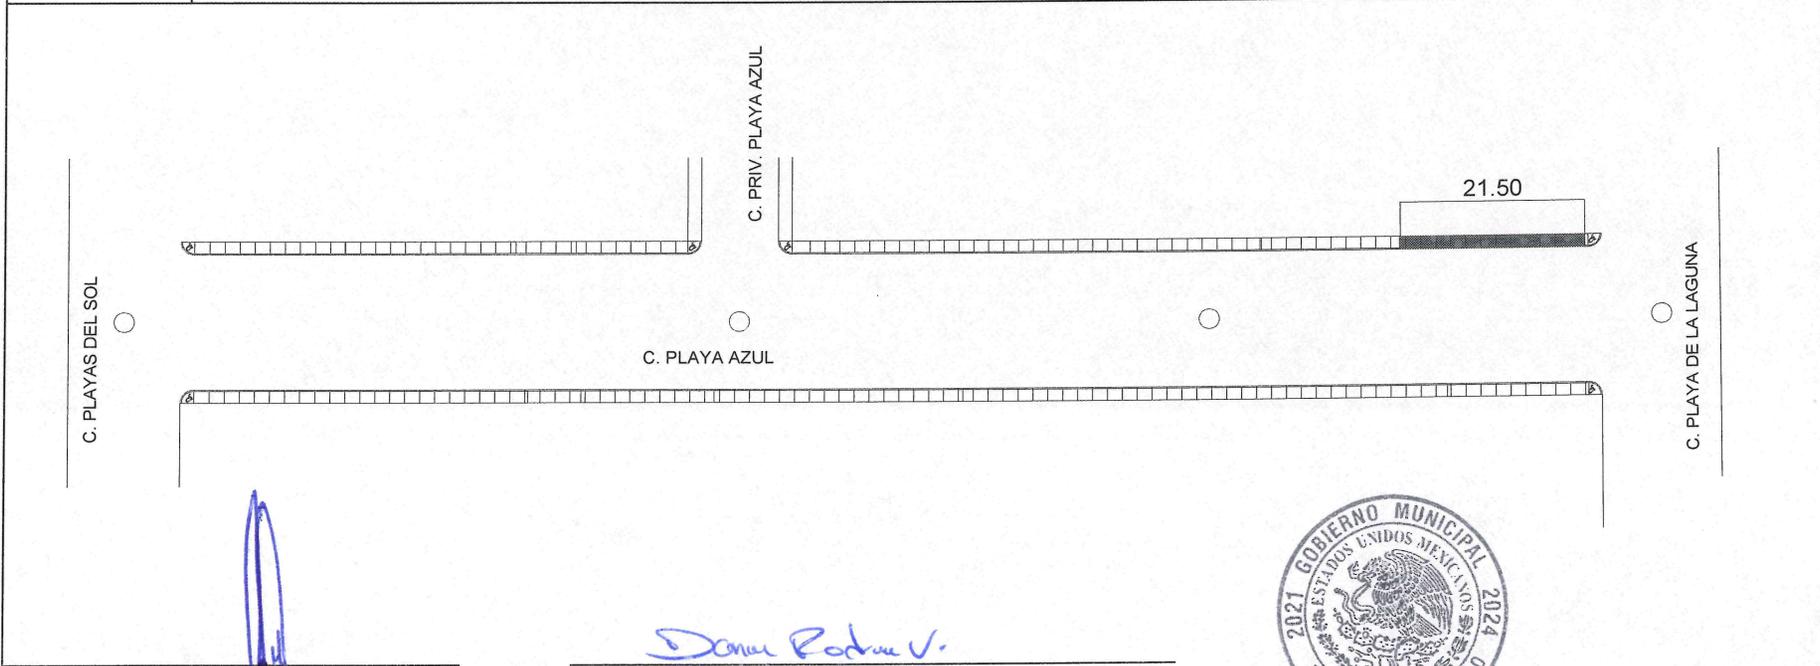

C. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES

EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez V.*

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
