



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 0543/2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ**, por la cantidad de; **\$558,568.28 (Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 28/100 M.N.)** por concepto del **ESTIMACIÓN 01 y FINIQUITO**, del programa **FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6231-2-25.1-050-418

Contrato: GMJ 014C- OP/2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
426	29/05/2024	\$484,507.80	\$562,029.05	\$3,460.77	\$558,568.28

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 01 y Finiquito
4. Fianza Vicios Ocultos
5. Minuta de Término de Obra
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE
JOCOTEPEC, JAL., A 29 DE MAYO DEL 2024
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"



HACIENDA
MUNICIPAL
2021 - 2024


21 JUN. 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

PARM811010TC7

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Guadalupe Victoria, 510 A, Guayabitos, 45530, Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México
Tel. 3334772140

CLIENTE

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

MJJ850101KP8

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 45800

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

PALACIO MUNICIPAL N° S/N, Jocotepec Centro, 45800, Jocotepec, Jocotepec, Jalisco, México

Factura 426

FOLIO FISCAL (UUID)

B1053B8C-D5CB-4662-AE86-8C4FBE8A3483

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506745966

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-29T14:24:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-29T14:04:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

45530

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	XLT - Lote	LOTE	ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (MENOS 5 AL MILLAR \$3,460.77; TOTAL A PAGAR = \$558,568.28) Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción No. Identificación - LOTE Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 484507.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 77,521.25	\$ 484,507.80	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 484,507.80

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE PESOS, 05/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 484,507.80

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 77,521.25

TOTAL

\$ 562,029.05

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

b/AjSiw5yxB+/EFPg8e/sL7GDhwguyZa32W1hoLgPIMP3tsQpTYRX2cU1JIKKT3+Xk/d9p8AdYM26wUaDds+kON1BYqLsXD+r8RuEQZxhFKY6OQ8OlnwVoXTaT9a7OxXGMKjEIPc8ILb2DrJ7yQOKIaZqdb+omsVLb0RKpHTv2lohbDMS+JU7K8KXI/285vOajyNKGcw65Z3s9qQwDPZGxahdqFTAG33aJHePPEJLbIFU1QPJuAFRvCvg/vUemtDr6wP3FCDhDVNNSx83zAKmldOlbYUqDSFOvrngs00CAsoMd3fQs5fLwbTHw+u8w+ijBWnokqWb77/FTQg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uxaMsWuwaXnm5cuY+62iUtu3KelxVaAoYgYBjtVucACHzhT1kMcbQcsupT038bQsEYHYCFIDXP2ChJtRkJwnN7yH6ZTVB+Xx1UxAljI4jxWSZakwVknmlrdlrmwytRbPMMB7ZBly0LejS5S2rQqn/dq8mL+BmRqU/qtxhpTru/WqFCuLxP21Ur/2iM0gXkz0rPNmZ/S+qL8fM56PYsBY+kNEuk/qG8q1QG97ON6wZaHajLxMAwnAoQ1Ckpu116NjK0r5f2fvocrXNGopyjOM9hHNP4Mg0a2N45qUHKW3P1ea6UgN34cioR+Y1aysjLT6WB9CQKJTVeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B1053B8C-D5CB-4662-AE86-8C4FBE8A3483|2024-05-29T14:24:52|STA0903206B9|b/AjSiw5yxB+/EFPg8e/sL7GDhwguyZa32W1hoLgPIMP3tsQpTYRX2cU1JIKKT3+Xk/d9p8AdYM26wUaDds+kON1BYqLsXD+r8RuEQZxhFKY6OQ8OlnwVoXTaT9a7OxXGMKjEIPc8ILb2DrJ7yQOKIaZqdb+omsVLb0RKpHTv2lohbDMS+JU7K8KXI/285vOajyNKGcw65Z3s9qQwDPZGxahdqFTAG33aJHePPEJLbIFU1QPJuAFRvCvg/vUemtDr6wP3FCDhDVNNSx83zAKmldOlbYUqDSFOvrngs00CAsoMd3fQs5fLwbTHw+u8w+ijBWnokqWb77/FTQg==|00001000000506204896||



Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml



Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="426"
Fecha="2024-05-29T14:04:15"
Sello="b/yAjSiw5yxB+/EFPg8e/sL7GDhwguyZa32W1hoLgPfMP3tsQpTYRX2cU1JiKKT3+Xk/jd9p8
AdYM26wUaDds+kON1BYqLSXDsr+r8RuEZQxhfKy60Q80inwVoXTaT9a70XxGMkyjElPC8tLb2DrJ7yQOK
iaZqdb+omsVLb0RKPHtV2lohbdMS+jU7K8KXI/285vOajyNKGcw65Z3s9qQwDPZGxahdqFTAG33aJHeP
PEJlLBIFU1QPJuAFRvcVg/vUemtDr6wP3FCDhDVNNSx83zAKmldOlbrYUqDSFOvrnqs00CCAsomd3fQs/
fLwbTHw+u8w+iJBwnokqWb77/FTQG==" FormaPago="99"
NoCertificado="00001000000506745966"
Certificado="MIIF9TCCA92gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY3NDU5NjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQA
wgGEMSAwHgYDVQQDBdBVVPRUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVK1DSU8gREU
gQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEuMBBgGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXR0b3JpdHhkXkJAoBgk
qhkiG9w0BCQEWEW2NbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEMmCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08
gNzcSIENPTC4GR1VFU1JFUK8xDjAMBGNVBEBEMBA2MzAwMQswCQYDVQQGEWJNWDEZMBCGA1UECAwQQ01
VREFEIERFIE1FWELDTZETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUHURU1PQzEVMBMGA1UELRMUU0FUOTcWNzAxTk4zMVw
wWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJSWS
JT1MgVFJJQ1VUQVJJT1MgQUwGQ09OVFJJQ1VZRUSURTAEfw0yMTAzMTIxNjEwMzNaFw0yNTAzMTIxNjE
wMzNaMIHDMScGwJgYDVQQDEXXNQVJDtyBBTIRPTk1PIFBBUKVERVMgUk9EUK1HVUVaMSGwJgYDVQQPEx9
NQVJDtyBBTIRPTk1PIFBBUKVERVMgUk9EUK1HVUVaMSGwJgYDVQQKEX9NQVJDtyBBTIRPTk1PIFBBUKV
ERVmgUk9EUK1HVUVaMYRwFAAYDVQQTEw1QQVJNODEXMDEwVEM3MRswGQYDVQQFExJQQVJNODEXMDEwSEp
DUKRSMdAXdjAMBGNVBASTBVVO SUNBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEahq3WYZp
rkKhs9W5k7gG18MStNKKYktlPOZSeFXSEM/1qob85IIsUp3C7nfVauItBsJBLKqOVVlmEjxq158PIx4
ymVwbAFew2p/iylCbDCLeOil+bD4DpjzS0g4/Brb1f+W/hj8D35ag1SPSA9dFqF0379OpvX+BuJPxEq
vRo598X7VHFHWMyw3zm53wpNtyKxj1IIvY3G6gS17JL2daU/uYUwKeCo+f18S/H6etvPg1tl+EHIR4LK
c32esvkyyrlrWSicJkKEOdvpBPqXAM4RmoMQV20yYFUqZFbXSeFuHVFcd4sIMA+vok/TIZHK/6R/VMWy
guwEeUOSnmEXXQIDAQABox0wGzAMBGNVHRMBAf8EAJAAMASGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQs
FAAOCAGeAK58eOVke00r4/sdTepza4l5IXL2BoaxA06EEYKI0PhR2/BvvMAPKTrnYSZbEdKnFueOPEWV
SW1+bW/DORCy5SqdxFNrr+p2KxiZ4BoZvhY+GwrQwsrR4Jj8CdIrF7BN5PVv/Ea9bb0gQTLB9mkaMc
W1xvnRpCGklui2hePlta/7okHWP+mD0cx1o4Kgobznfx406E6YIOvLeWeCDI6JDB70idVLCmaiqtzh6X
djmx2B+/lbC40ji66KMY+54ieLGoa00v73rl3atePeEsBepDEXUBq72QJ+2UIPBs9x0PbN39+z738e
0xF2RWWhIgRICo5La3wq1u8mw6Ww76D3aUMUew1V+bWA861o5NTFZ4B5WikeuFtqlb86Qyrpdvnd2teH7
I1/bp8txjtR4pIMPwa5vVF+ntEnQ+wep68AdvRh+aCIDKXjvLCL43SHttTnlY4I/y3MNpHFVbm10Sro
WOrUojxquQTvsPFTF5gWs6GGxODdfrevsIWadMEjd1/BpHQapaH/aSZLNUGCeb1X1ieUgId6hJq3WSC
6iin+dgw0r8BFu97fhZ2QFJV2VzpL3tEsycj4xQod8StjPr7e+fKvryR0ewLs8YYybboC4oAIcgqiIPR
hII8aBU8dgnvVY8NMum+Qm//jiC0Csaw0h8Cee+uS/I3rnpz5pQ=" SubTotal="484507.80"
Moneda="MXN" Total="562029.05" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="45530"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"><cfdi:Emisor Rfc="PARM8110101C7"
Nombre="MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ" RegimenFiscal="612" /><cfdi:Receptor
Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO"
DomicilioFiscalReceptor="45800" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"
/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500"
NoIdentificacion="LOTE" Cantidad="1" ClaveUnidad="XLT" Descripcion="ESTIMACIÓN 1
Y FINIQUITO DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO
EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (MENOS 5 AL MILLAR
\$3,460.77; TOTAL A PAGAR = \$558,568.28)" ValorUnitario="484507.80"
Importe="484507.80"
ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="484507.80"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="77521.248000"
/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impue


stos TotalImpuestosTrasladados="77521.25"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="484507.80" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="77521.25"
></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9"
UUID="B1053B8C-D5CB-4662-AE86-8C4FBE8A3483" FechaTimbrado="2024-05-29T14:24:52"
SelloCFD="b/yAjSiw5yxB+/EFPg8e/sL7GDhwguyZa32W1hoLgPfMP3tsQpTYRX2cU1JiKKT3+Xk/jd
9p8AdYM26wUaDds+kON1BYqLsXDs+r8RuEZQxhFkY6OQ80inwVoXTaT9a7OXxGMKyjElPC8tLb2DrJ7y
QOKiaZqdb+omsVLb0RKpHTv2lohbdMS+jU7K8KXI/285vOajyNKGcw65Z3s9qQwDPZGxahdqFTAG33aJ
HePPEJLbIFU1QPJuAFRVcVg/vUemtDr6wP3FCDhDVNNSx83zAKmld0lbrYUqDSFOvrnqs00CCAsMd3f
Qs5fLwbTHw+u8w+ijBwnokqWb77/FTQg==" NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
SelloSAT="uxaMswuwaXnm5cuY+62iUtu3KeIxixVaAoygYBjtVucACHzhjT1kMcbQcsupT038bQsEYH
YCF1DXP2ChJtRkJwnN7yH6ZTVB+Xx1UxAIjrl4jxWSZakwVknmIdrlmwnytrBpMMB7ZBIy0LejS/e5Sz
2rQqn/dq8mL+BmRqU/qtxhpTru/WqFCuLxP21Ur/2tM0gXkz0rPNmZ/S+qL8FdM56PYsBY+kNEuk/qG8
q1QG97ON6wZaHajLRxMAwnAoQ1Ckpu1I6NjK0r5f2fvocrXNGopyjOM9hHNP4Mg0a2N45qUhtkwi3P1e
a6UgN34cloR+Y1aysjLT6WB9CQkJTVEg=="
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital
v11.xsd" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>







Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PARM811010TC7	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1053B8C-D5CB-4662-AE86-8C4FBE8A3483	2024-05-29T14:04:15	2024-05-29T14:24:52	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$562,029.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

 H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	No. DE CONTRATO: GMJ 014C- OP/2024	HOJA DE RELACIÓN HOJA No. 1 DE 1
	CONTRATISTA: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	OBRA: "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	PERÍODO DE TRABAJO:
	UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL	DEL: 10 al 29 de mayo de 2024 FECHA: 29 de mayo de 2024

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN			
HOJA No.	PARTIDAS	IMPORTES	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	\$ 692,154.00	
		MONTO DE ESTIMACIÓN \$ 692,154.00 MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30% \$ 207,646.20 SUBTOTAL \$ 484,507.80 I.V.A. 16% \$ 77,521.25 SUMA \$ 562,029.05 MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) \$ - MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 3,460.77 NETO A PAGAR \$ 558,568.28	
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL
ASIGNACIÓN	\$ 692,154.00	\$ 110,744.65	\$ 802,898.64
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 692,154.00	\$ 110,744.64	\$ 802,898.64
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 692,154.00	\$ 110,744.64	\$ 802,898.64
SALDO POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			
ANTICIPO %	\$ 207,646.20	\$ 33,223.39	\$ 240,869.59
AMORTIZACIÓN	\$ 207,646.20	\$ 33,223.39	\$ 240,869.59
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 207,646.20	\$ 33,223.39	\$ 240,869.59
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ 34	\$ 240,869.36
		EL REPRESENTANTE LEGAL  C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO  ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ	
		 EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

PERÍODO: 10 al 29 de mayo de 2024

OBRA : "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, GMJ 014C- OP/2024

CONTRATO GMJ 014C- OP/2024

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA : MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

FECHA: 29/05/2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
A01	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO												
1	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 75HP AC, INOX AC 8"	PZA	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$48,158.00	\$ 48,158.00	\$ 48,158.00	\$ -	48,158.0000	\$ -
2	SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA SERIE X 75HP 3X460V	PZA	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$103,857.00	\$ 103,857.00	\$ 103,857.00	\$ -	103,857.0000	\$ -
3	SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 1000V	ML	200.0000	180.3000	0.0000	180.3000	19.7000	\$943.00	\$ 188,600.00	\$ 180,297.00	\$ -	180,297.0000	\$ 8,303.00
4	SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO NEGRO 6" X250 CON COPL Y ROSCA CÓNICO LARGO 6.20 MTS	PZA	23.0000	24.0000	0.0000	24.0000	-1.0000	\$8,303.00	\$ 190,969.00	\$ 199,272.00	\$ -	199,272.0000	-\$ 8,303.00
5	SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN 6" X250 LISO 6.20 MTS	PZA	3.0000	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	\$6,980.00	\$ 20,940.00	\$ 20,940.00	\$ -	20,940.0000	\$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN EN 6": a) trazo y nivelación, b) demolición de pavimento, corte con disco en pavimento hidráulico excavación en material tipo 2 con maquinaria, c) tendido de tubería de acero al carbón, d) encamado y acostillado de tubería con material de banco, e) relleno y compactado en capas, f) reposición de piso de concreto, g) retiro de material de producto de la excavación.	LOTE	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$26,180.00	\$ 26,180.00	\$ 26,180.00	\$ -	26,180.0000	\$ -
7	PREPARACIÓN PARA BOCA DE TORMENTA: a) trazo y nivelación, b) anclado de castillos con Armex de 4 varillas con concreto, c) construcción de planilla con concreto, d) a) desplante con 4 varillas y alambón, d) construcción de muro de block, e) aplanado con mortero, arena de río, cemento terminación forma pulida, f) colocación de parilla de ángulo de 4", g) cambiar y colocar castillo de 4 varillas tipo arnes con concreto	LOTE	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$35,800.00	\$ 35,800.00	\$ 35,800.00	\$ -	35,800.0000	\$ -
8	SUMINISTRO DE REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA PARA ALCANTARILLADO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	LOTE	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	35,000.0000	\$ -
9	SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA	LOTE	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	2,000.0000	\$ -
10	SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA REALIZAR EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PUESTO EN MARCHA EN EL POZO EL ATRIO NUEVO	LOTE	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$13,680.00	\$ 13,680.00	\$ 13,680.00	\$ -	13,680.0000	\$ -
11	SUMINISTRO DE CABEZAL DE DESCARGA Y CODO DE ARRANQUE	LOTE	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$11,970.00	\$ 11,970.00	\$ 11,970.00	\$ -	11,970.0000	\$ -
12	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ARMADO, CONEXIONES DE CABEZAL DE DESCARGA	PZA	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	\$15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	15,000.0000	\$ -
								SUMA	\$ 692,154.00	\$ 692,154.00	\$ -	\$ 692,154.00	\$ -
								IVA	\$ 110,744.64	\$ 110,744.64	\$ -	\$ 110,744.64	\$ -
								TOTAL	\$ 802,898.64	\$ 802,898.64	\$ -	\$ 802,898.64	\$ -



C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

EMPRESA: MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha: 29/05/2024

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024

NUMEROS GENERADORES

1 SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 75HP AC, INOX AC 8"

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
PZA	POZO				1.0000	1.00
					SUMA	1.00

0.5 m
0.0 m
60 m
80 m
200 m
380 m



C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ
CONTRATISTA



ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



EMPRESA:

MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha:

29/05/2024

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NUMEROS GENERADORES


2

SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA SERIE X 75HP 3X460V

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
PZA	POZO				1.0000	1.00
					SUMA	1.00

0.5 m
0.0 m
60 m
80 m
200 m
250 m



C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ
CONTRATISTA



ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

EMPRESA:

MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha:

29/05/2024

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024

NUMEROS GENERADORES

3

SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 1000V

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
ML	POZO	148.8000			1.0000	148.80
	DE POZO A TREN DE DESCARGA	8.0000			1.0000	8.00
	TREN A PASTILLA	23.4950			1.0000	23.50
					1.0000	0.00
					SUMA	180.30

0.5 m
0.0 m
60 m
80 m
200 m
350 m



C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ
CONTRATISTA



ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

EMPRESA:

MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha:

29/05/2024

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO
ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024

NUMEROS GENERADORES

3

SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 1000V

CROQUIS, FOTOGRAFÍA

UNIDAD

CADENAMIENTO


LARGO

ANCHO


ALTO

PZA

TOTAL



POZO

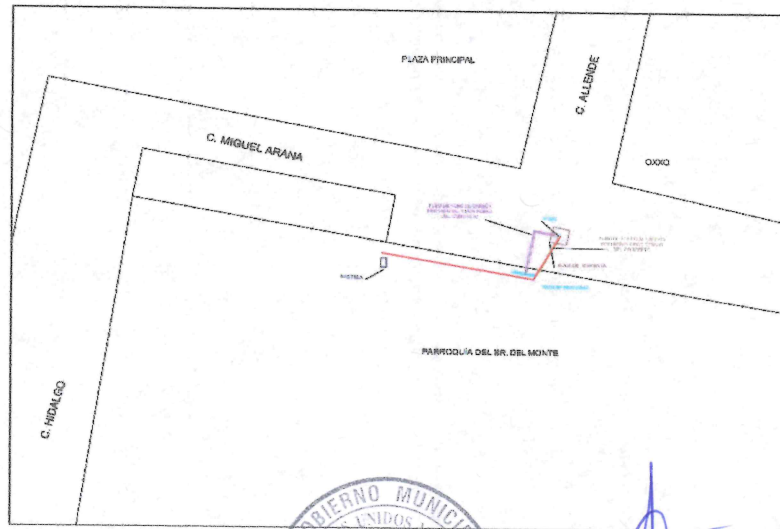


C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ

CONTRATISTA

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

EMPRESA:

MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha:

29/05/2024

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024


NUMEROS GENERADORES

4

SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO NEGRO 6" X250 CON COPLE Y ROSCA CÓNICO LARGO 6,20 MTS

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
PZA	POZO				24.0000	24.00
					SUMA	24.00

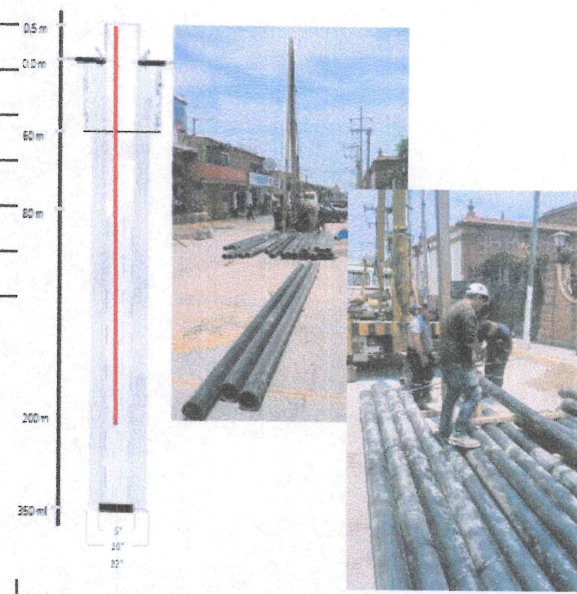

C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ
CONTRATISTA



ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

EMPRESA:

MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha:

29/05/2024

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024

NUMEROS GENERADORES

5

SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN 6" X250 LISO 6,20 MTS

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD

CADENAMIENTO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZA


TOTAL

PZA

POZO (EXTERIOR DEL
CONCRETOPOZO (INTERIOR DEL
CONCRETO)

SUMA

3.00

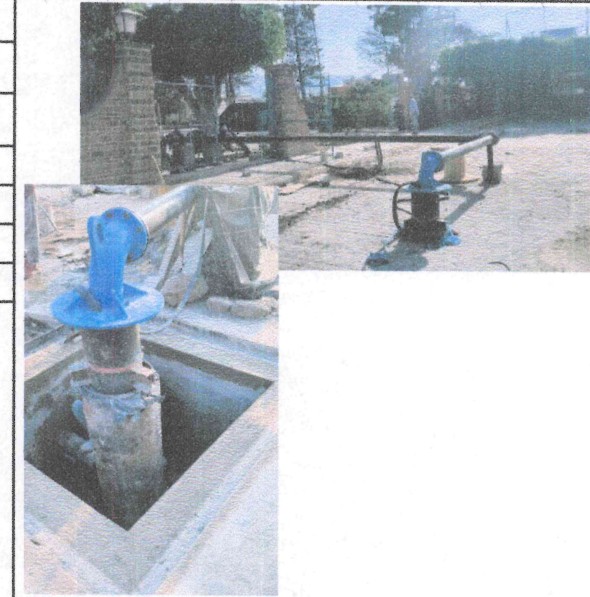

C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ
CONTRATISTA




ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



EMPRESA:	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	Fecha:	29/05/2024	
OBRA:	"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO			

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	10 al 29 de mayo de 2024

NUMEROS GENERADORES		
5	SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN 6" X250 LISO 6,20 MTS	CROQUIS

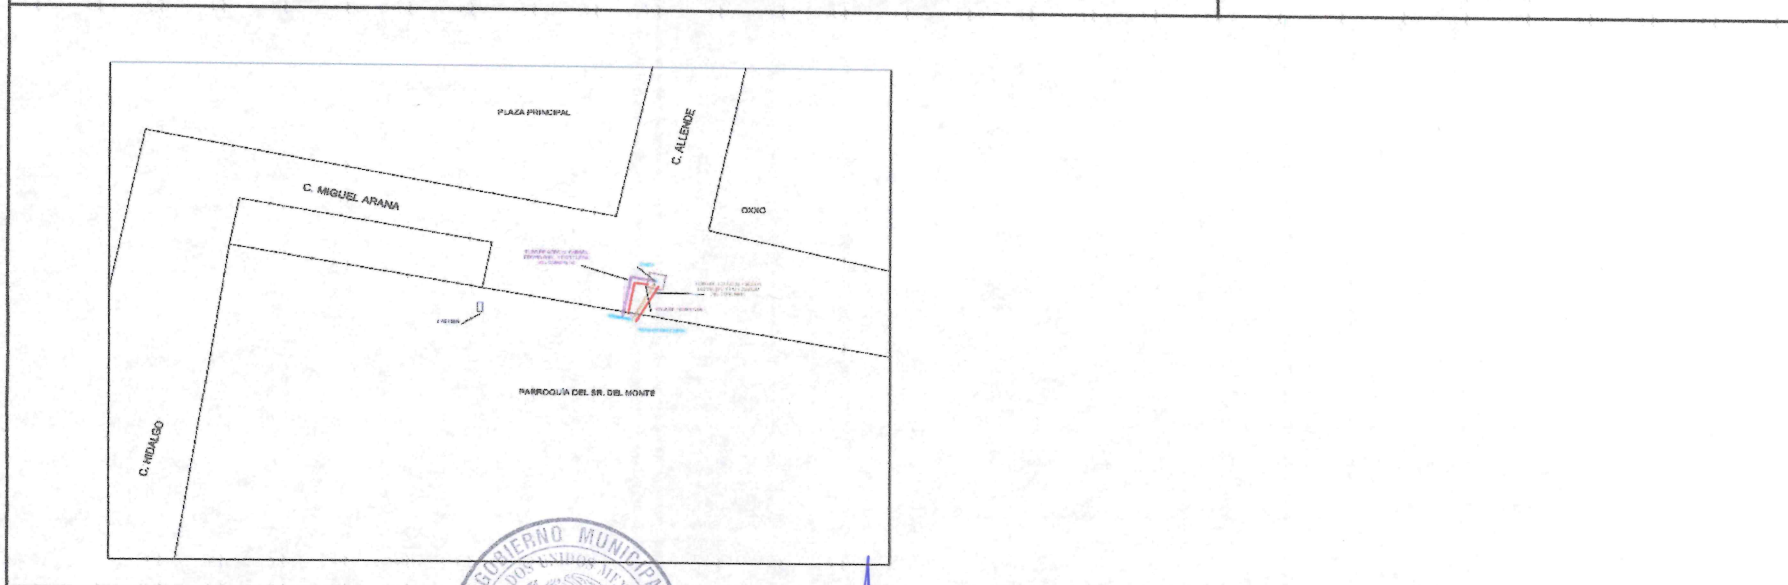

C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ
CONTRATISTA

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



EMPRESA:

MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha:

29/05/2024

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024


NUMEROS GENERADORES

6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN EN 6"; a) trazo y nivelación, b) demolición de pavimento, corte con disco en pavimento hidráulico excavación en material tipo 2 con maquinaria, c) tendido de tubería de acero al carbón, d) encamado y acostillado de tubería con material de banco, e) relleno y compactado en capas, f) reposición de piso de concreto, g) retiro de material de producto de la excavación.


CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
LOTE	POZO				1.0000	1.00
					SUMA	1.00

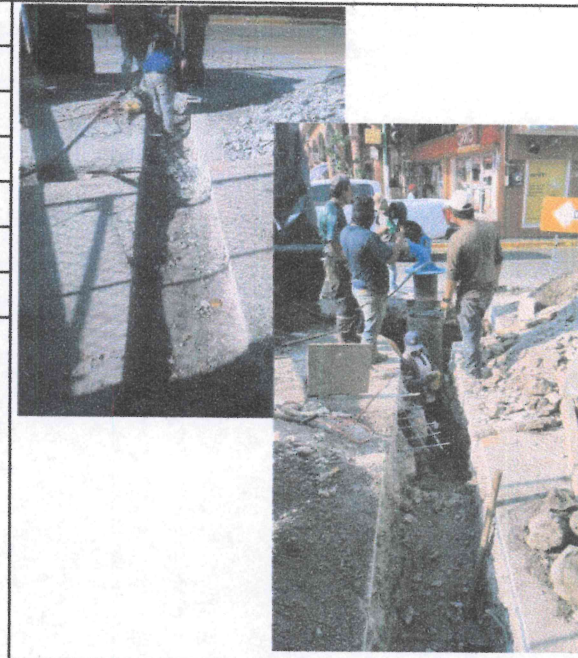


C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ



CONTRATISTA



ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



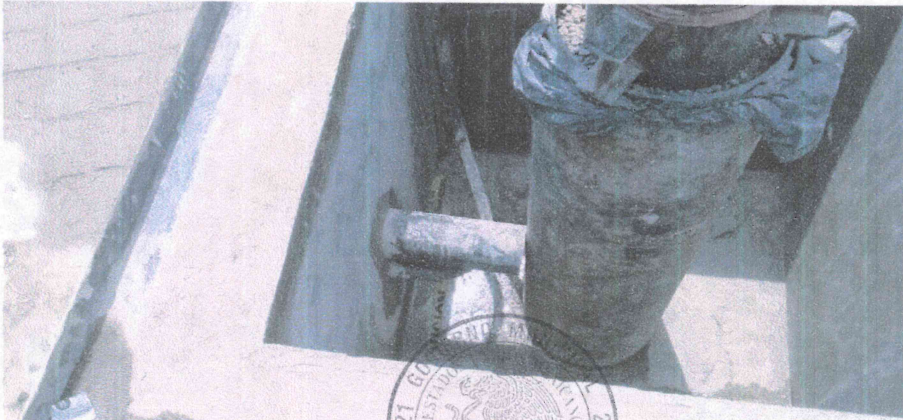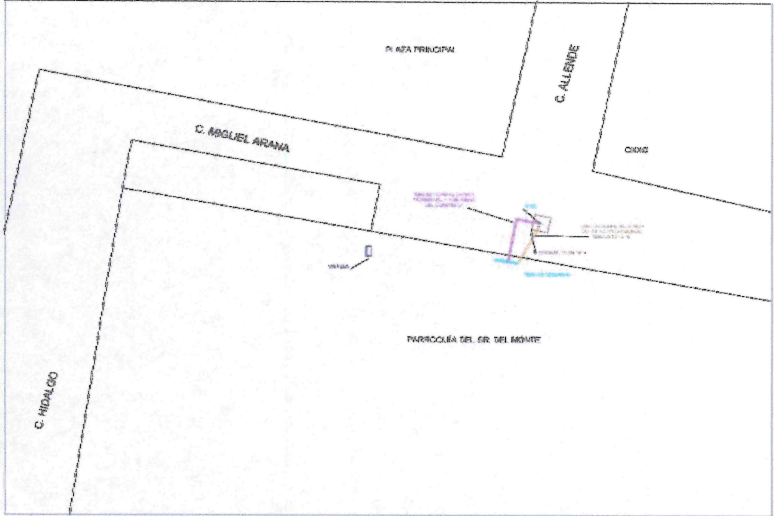EMPRESA:	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	Fecha:	29/05/2024	
OBRA:	"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO			
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO	
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	10 al 29 de mayo de 2024	
NUMEROS GENERADORES				
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN EN 6"; a) trazo y nivelación, b) demolición de pavimento, corte con disco en pavimento hidráulico excavación en material tipo 2 con maquinaria, c) tendido de tubería de acero al carbón, d) encamado y acostillado de tubería con material de banco, e) relleno y compactado en capas, f) reposición de piso de concreto, g) retiro de material de producto de la excavación.	CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES		
				
C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ		ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ		
CONTRATISTA		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO		

EMPRESA:

MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha:

29/05/2024

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024

NUMEROS GENERADORES

7

PREPARACIÓN PARA BOCA DE TORMENTA; a) trazo y nivelación, b) anclado de castillos con Armex de 4 varillas con concreto, c) construcción de planilla con concreto, dala de desplante con 4 varillas y alambón, d) construcción de muro de block, e) aplanado con mortero, arena de rio, cemento terminación forma pulida, f) colocación de parrilla de ángulo de 4", g) cambiar y colocar castillo de 4 varillas tipo arnes con concreto

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
LOTE	POZO				1.0000	1.00
					SUMA	1.00



C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

CONTRATISTA



ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




EMPRESA:	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	Fecha:	29/05/2024	
OBRA:	"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO			


LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	10 al 29 de mayo de 2024

NUMEROS GENERADORES	
7	PREPARACIÓN PARA BOCA DE TORMENTA; a) trazo y nivelación, b) anclado de castillos con Armex de 4 varillas con concreto, c) construcción de planilla con concreto, dala de desplante con 4 varillas y alambrrn, d)construcción de muro de block, e) aplanado con mortero, arena de rio, cemento terminación forma pulida, f) colocación de parrilla de ángulo de 4", g) cambiar y colocar castillo de 4 varillas tipo armes con concreto CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES






 C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ CONTRATISTA	 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	
--	---	--




EMPRESA:	MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ	Fecha:	29/05/2024	
OBRA:	"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO			

LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	10 al 29 de mayo de 2024

NUMEROS GENERADORES		CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES
8	SUMINISTRO DE REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA PARA ALCANTARILLADO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	

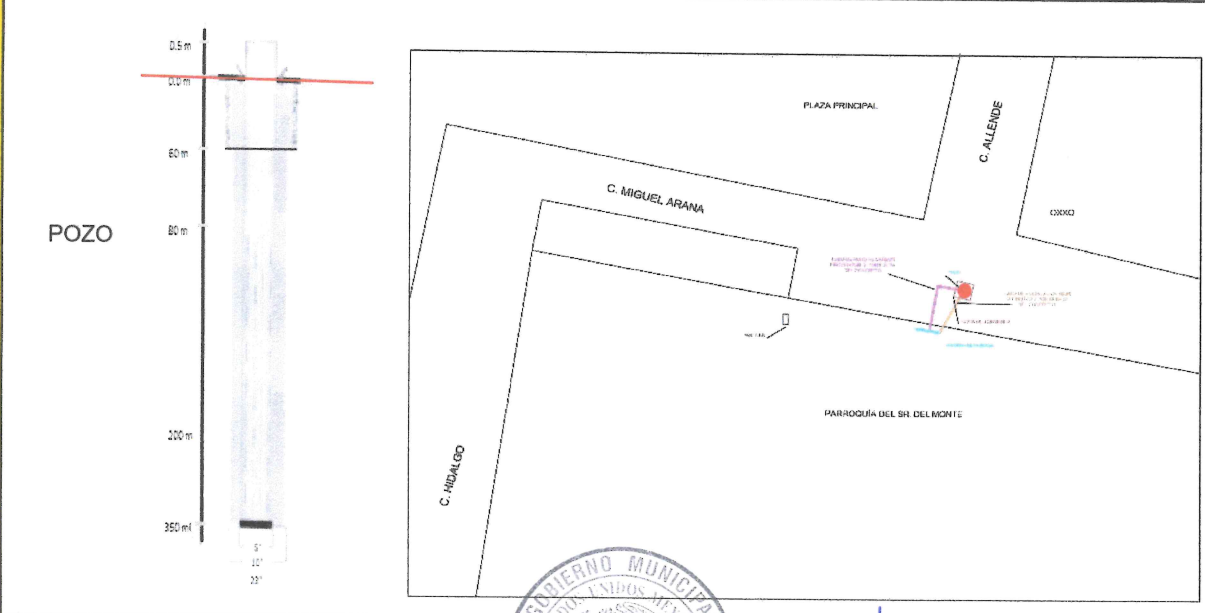

 C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ CONTRATISTA	 ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO 	
--	---	--

EMPRESA:

MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha:

29/05/2024

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024


NUMEROS GENERADORES

9

SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA


CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
LOTE	POZO				1.0000	1.00
					SUMA	1.00

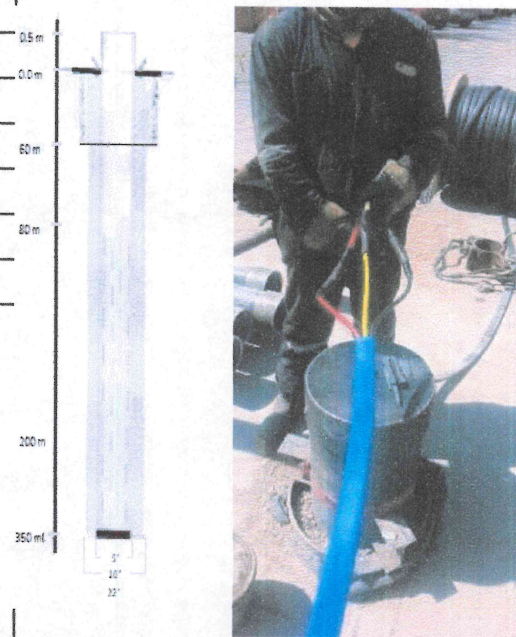

C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

CONTRATISTA



ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



EMPRESA:

MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha:

29/05/2024

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024

NUMEROS GENERADORES

10

SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA PARA REALIZAR EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PUESTO EN MARCHA EN EL POZO EL ATRIO NUEVO

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
LOTE	POZO				1.0000	1.00
					SUMA	1.00

0.5 m
0.10 m
60 m
80 m
200 m
350 m

5"
10"
12"



C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

CONTRATISTA



ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

EMPRESA:

MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha:

29/05/2024

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024

NUMEROS GENERADORES

11

SUMINISTRO DE CABEZAL DE DESCARGA Y CODO DE ARRANQUE

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
LOTE	POZO				1.0000	1.00
					SUMA	1.00

0.5 m
0.0 m
60 m
60 m
200 m
350 m



C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

CONTRATISTA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. J. GUADALUPE BARRA RAMÍREZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

EMPRESA:

MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

Fecha:

29/05/2024

OBRA:

"EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO
ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO



LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 10 al 29 de mayo de 2024


NUMEROS GENERADORES

12

SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ARMADO, CONEXIONES DE CABEZAL DE DESCARGA


CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
PZA	POZO				1.0000	1.00
					SUMA	1.00

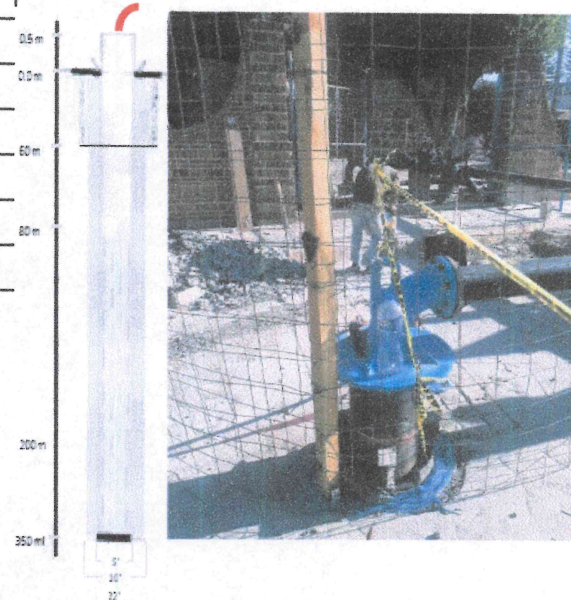

C. MARCO ANTONIO PAREDES RODRIGUEZ

CONTRATISTA



ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ

EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
