



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 0775/2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **SERGIO CABRERA**, por la cantidad de; **\$422,449.00 (Cuatrocientos Veintidós Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)** por concepto de **ESTIMACIÓN 01 y Finiquito**, del programa FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2024 correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6241-2-25.2-050-425
Contrato: GMJ 021C- OP/2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
238	10/07/2024	\$365,756.71	\$424,277.78	\$1,828.78	\$422,449.00

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 01 y Finiquito
4. Copia Contrato No GMJ 021C- OP/2024
5. Fianza de Cumplimiento
- ✓ 6. Fianza de Vicios Ocultos
7. Minuta Término de Obra
8. Acta Entrega Recepción
- ✓ 9. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones
10. Presupuesto de Obra
11. Programa de Obra
12. Proyecto de Obra

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.



HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024

26 JUL. 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE

JOCOTEPEC, JAL., A 16 DE JULIO DEL 2024
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p. Archivo
D.O.P./cvch

Hidalgo Sur No.6, Colonia Centro Jocotepec, Jalisco.
C.P. 45800 Telefonos: 01 (387) 76 3 19 19 / 76 3 00 74

SERGIO CABRERA

RFC: CASE780113C89

Domicilio: HACIENDA DE LA SABIJA No. 120 No. Int S/N, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 45425
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 238
Fecha: 10/7/2024 13:31:57

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: Palacio Municipal No. SN, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Uso CFDI: 101 - Construcciones.

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Régimen Fiscal:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	------------	-----------	---------

1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72141205 - Servicio de construcción de sistemas de drenaje	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 1(UNO) OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITLY CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, CON CONTRATO NO.: GMJ 021C- OP/2024 DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 1,828.78 MONTO PARA EFECTO DE PAGO: \$ 422,449	365,756.71	0.00	002 - IVA - 58,521.07	365,756.71
------	----------	--------------------------------	--	--	------------	------	--------------------------	------------

Importe con letra:

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.

Subtotal	365,756.71
Impuestos trasladados	58,521.07
Total	424,277.78

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor:
Folio Fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

00001000000515803161
0E2998D9-C1CE-4F11-8FDF-2CA9DE4117E3
00001000000505142236
Julio 10 2024 - 13:31:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KbGUheXOW1PK/dgSSHnPLnqq1wRveulEr5nwet37LIQZdi4nOvIktyOtOgokcybia1oz2OkvK/FO0Q48Uz3tuU
bj1PN+MLtkY2+HLA26/qABJUwwdoZVNOGvRBQyjlQSHZpkdAh7ezjME7jyzVo0S2/LAg2ByFzAOF+HEBRmXav
1VKZztUk3Z1f8DsTyayW8Lcytlod2k8aLxxVTHAHnC4SuRAmlx7fHPz5gl+xyci+HOR/FPVE/JTHIJSuxEa
spiqWUlldfw8POSz0ltgBk4H7GxuYrPwhf7wp03mAg2YsDjjiPM2GhoAdnUPCQg6roDfvcRBrExzzPclffg==

Sello del SAT

FpkmbabKTUgLMvxwkaOesD8T/GOHEZnXL4WEaUMtxl+w42MWFkSs2HnggAbhMTkFMTKeFkyVHQ/asqUK
X8PwFGc3whij/IIWTC7njVF27L7034hkUJZUnszMvISbrIGH0aRHPebdVYkoAukBlcEdjkQVb1ki/Xzb
x1564itjHXoql49e33OoOsc4geVue8/Ugl3PdqDceomCX20igi6kkhnnqMjg4CA8GxzUjXbozloP8/I



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

2mZ/ODEUxwjJovez4hGZ1y72XDeOVWf45f1ck6P8vA5PLdGZ1E6O7TkiH5nsqP1RzUgRUgvVYSa34GIJ
40vgrulnze3d9au+CdzdOw==

Cadena original del complemento de certificación digital de SAT
||1.1|0E2998D9-C1CE-4F11-8FDF-2CA9DE4117E3|2024-07-10T13:31:59|MAS0810247C0|K6GU
heXOw1PK/dgSShNPLnqq1wRveulEr5nwt37LIQZdi4n0vltkyOtOgokcybia1oz2Okvk/FO0Q48U83k
uUbj1PN+MLtkY2+HLA26/qABJUwwdoZVNOGvRBQyjiQ5HZpkdAh7ezjME7jyzxVo0S2/LAg28yFz3g
HEBRmXav1VKZzUk3Z1F8DsTyayW8Lcytlod2k8aLxxVTHAHnC45uRAmIx7fHPzSgl+xyci+IOR/FP
VE/JTtHISuxEaspiqWUilDfw8POSZs0ltgBk4H7GxuYrPwhf7wp03mAg2YsDjiipM2GhoADnUPCQ8er
oDfvcRBrExzzPclffg==|00001000000505142236||



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

CASE780113C89	SERGIO CABRERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
---------------	----------------	--------------	--------------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

0E2998D9-C1CE-4F11-8FDF-2CA9DE4117E3	2024-07-10T13:31:57	2024-07-10T13:31:59	MAS0810247C0
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$424,277.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
--------------	---------	---------	---------------------------

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

Imprimir

SERGIO CABRERA


HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		No. DE CONTRATO: GMJ 021C- OP/2024	HOJA DE RELACIÓN	HOJA No. 1 DE 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	ESTIMACIÓN No.	ESTIMACION 1 UNICA
OBRA : REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		UBICACIÓN: CHANTEPEC	PERÍODO DE TRABAJO:	28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024
			DEL:	
			FECHA:	03 DE JULIO DE 2024

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA No.	PARTIDAS	IMPORTES	
	DRENAJE LINEA DE DRENAJE DE 12"	\$	365,756.71
MONTO DE ESTIMACIÓN365,756.71 MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO - SUBTOTAL365,756.71 I. V. A. 16%58,521.07 SUMA424,277.78 MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)1,828.78 NETO A PAGAR422,449.00			
		EL CONTRATISTA	
		SERGIO CABRERA	
		EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	
		D. Omar Rodriguez V.	
		DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA	
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
		IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	



SERGIO CABRERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

RFC: CASE780113C89

ESTIMACIÓN No. 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024

PERIODO: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN : NEXTIPAC

CONTRATISTA : SERGIO CABRERA

FECHA: 03 DE JULIO DE 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


ESTIMACIÓN 1 UNICA

28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA											
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"											
A	LINEA DE DRENAJE DE 12"										
JOCO-001	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	132.00	0.00	132.00	132.00	-	\$10.84	\$1,430.88	\$0.00	\$0.00
JOCO-002	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO II Y III., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	190.08	0.00	190.08	190.08	-	\$146.07	\$27,764.99	\$0.00	\$0.00
JOCO-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	105.06	0.00	105.06	105.06	0.00	\$102.49	\$10,767.60	\$0.00	\$0.00
JOCO-004	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	105.60	0.00	105.60	105.60	-	\$18.17	\$1,918.75	\$0.00	\$0.00
JOCO-005	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO ; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M2	105.60	0.00	105.60	105.60	-	\$74.58	\$7,875.65	\$0.00	\$0.00
JOCO-006	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. 12" DIAMETRO , INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	132.00	0.00	132.00	132.00	-	\$450.99	\$59,530.68	\$0.00	\$0.00
JOCO-007	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.		132.00	0.00	132.00	132.00	-	\$275.82	\$36,408.24	\$0.00	\$0.00
JOCO-008	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	95.04	0.00	95.04	95.04	-	\$508.57	\$48,334.49	\$0.00	\$0.00
JOCO-009	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=300 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y CAIDA ADOSADA DONDE LO REQUIERA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	0.00	3.00	3.00	-	\$19,337.05	\$58,011.15	\$0.00	\$0.00
JOCO-010	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE SUMINISTRO, INSTALACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. 6" DIAMETRO , INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON TEPEPATE, MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	18.00	0.00	18.00	18.00	-	\$3,918.61	\$70,534.98	\$0.00	\$0.00





SERGIO CABRERA

RFC: CASE780113C89

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 1
PERÍODO: 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024
OBRA : REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : NEXTIPAC
CONTRATISTA : SERGIO CABRERA
FECHA: 03 DE JULIO DE 2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA										
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES			IMPORTES				SALDO
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
JOCO-011	REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 40 X 40 Y 76 CM DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. T.M.A. 19 MM., LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F C=150KG/CM2 HECHO EN OBRA Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	18.00	0.00	18.00	18.00	\$2,398.85	\$43,179.30	\$43,179.30	\$0.00
							SUMA	\$ 365,756.71	\$ 365,756.71	\$ - \$
							IVA	\$ 58,521.07	\$ 58,521.07	\$ - \$
							TOTAL	\$ 424,277.78	\$ 424,277.78	\$ - \$

SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Rodriguez Valenzuela
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

Mejda Karina Perez Gonzalez
MEJDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACION; 1 (UNO) UNICA.

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO : 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"

LINEA DE DRENAJE DE 12"

TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	AREA	TOTAL	ACUMULADO
ML	0+000.00	0+132.00	1.00	132.00	132.00	132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
						132.00
					TOTAL :	132.00
						132.00

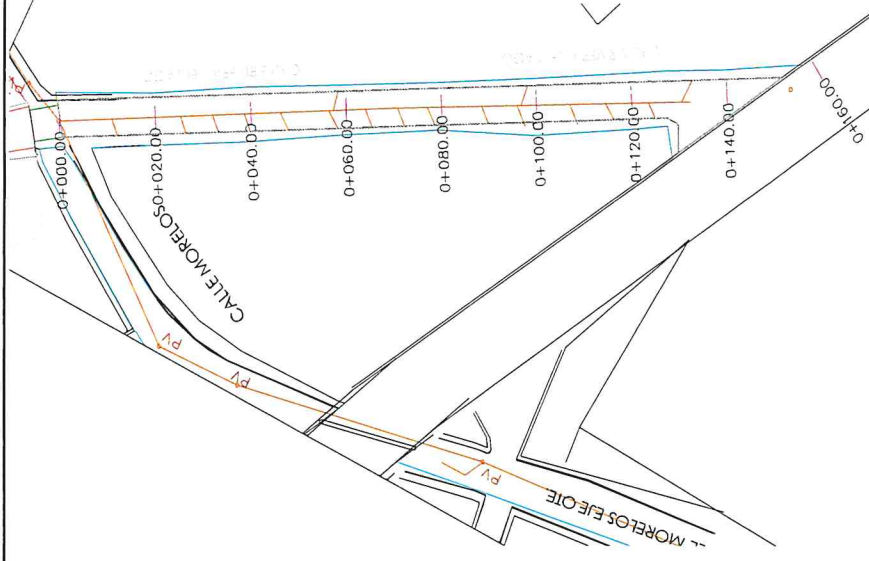

~~SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA~~

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO™



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: SERGIO CABRERA		FECHA: 03 DE JULIO DE 2024	
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE OBRA: JOCOTEPEC, JALISCO.			
ESTIMACION: 1 (UNO) UNICA.			
PERIODO : 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024			
LOCALIDAD: CHANTEPEC		LINEA DE DRENAJE DE 12"	
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO		FOTOGRAFÍA	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	
JOCO-001	FOTOGRAFÍA		







Daniel Rodriguez V

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA


EMPRESA: SERGIO CABRERA		FECHA: 03 DE JULIO DE 2024
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE OBRA: JOCOTEPEC, JALISCO.		
LOCALIDAD:	CHANTEPEC	
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		LINEA DE DRENAJE DE 12"
JOCO-002	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO II Y III., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA
   DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO  SERGIO CABRERA EL CONTRATISTA		

EMPRESA: SERGIO CABRERA		FECHA: 03 DE JULIO DE 2024
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE OBRA: JOCOTEPEC, JALISCO.		
LOCALIDAD: JOCOTEPEC, JALISCO		
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO		
ESTIMACION: 1 (UNO) UNICA.		
PERIODO : 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024		
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		LINEA DE DRENAJE DE 12"
JOCO-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA





DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OCALIDAD: CHANTEPEC

LOCALIDAD:	CHANTEPEC
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACION; 1 (UNO) UNICA.

PERIODO : 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"

LINEA DE DRENAJE DE 12"

AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


CROQUIS.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	AREA	TOTAL	ACUMULADO
M2	0+000.00	0+132.00	132.00	0.80	105.60	105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
					TOTAL :	105.60

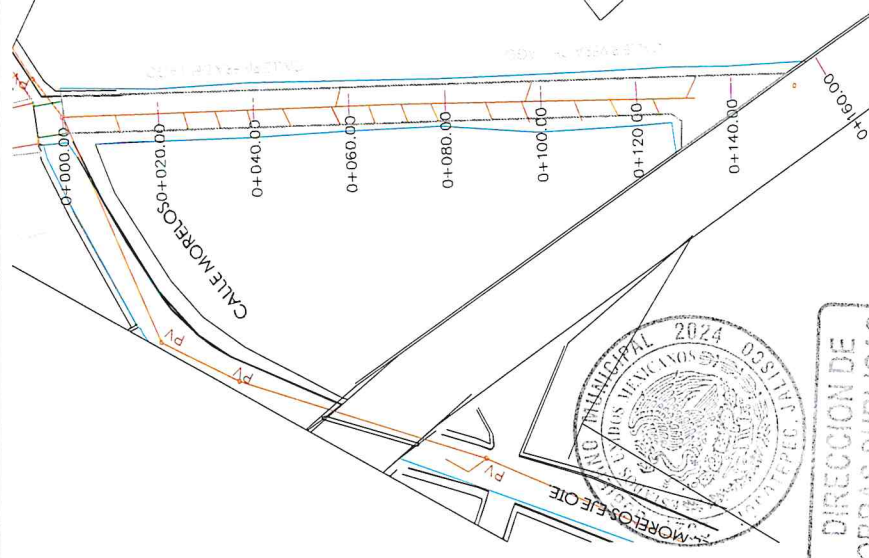

~~SERGIO CABRERA~~
~~EL CONTRATISTA~~

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

EMPRESA: SERGIO CABRERA		FECHA: 03 DE JULIO DE 2024	
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE OBRA: JOCOTEPEC, JALISCO.			
ESTIMACION: 1 (UNO) UNICA.			
PERIODO : 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024			
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		LINEA DE DRENAJE DE 12"	
JOCO-004	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA	
			
			
SERGIO CABRERA EL CONTRATISTA		DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO : 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"

LINEA DE DRENAJE DE 12"

PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO ; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISCION.

CROQUIS.


UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	ACUMULADO
M2	0+000.00	132.00	0.80		105.60	105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
						105.60
				TOTAL :		105.60

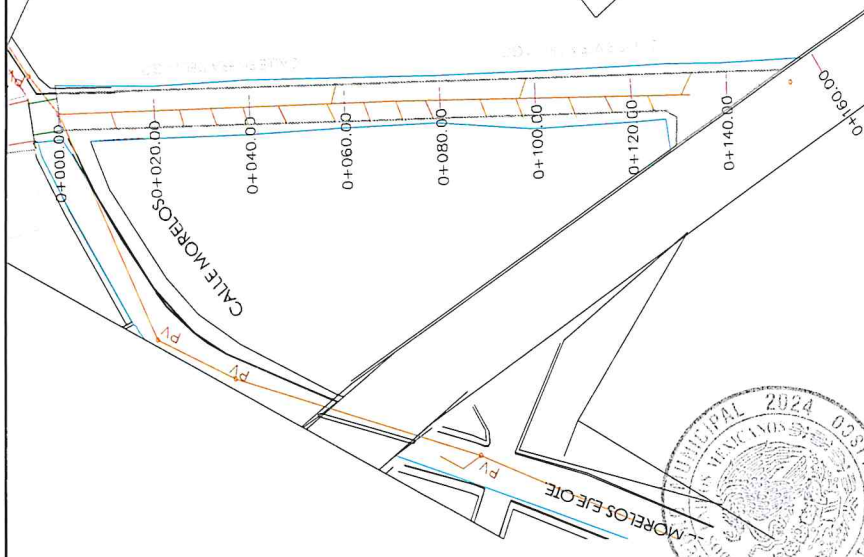

Daniel Rodriguez V.
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: SERGIO CABRERA		FECHA: 03 DE JULIO DE 2024	
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE OBRA: JOCOTEPEC, JALISCO.			
ESTIMACION: 1 (UNO) UNICA.			
PERIODO : 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024			
LOCALIDAD: CHANTEPEC		LINEA DE DRENAJE DE 12"	
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO		FOTOGRAFÍA	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		FOTOGRAFÍA	
JOCO-005	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO ; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.		




SERGIO CABRERA
EL-CONTRATISTA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

~~SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA~~


EMPRESA: SERGIO CABRERA		FECHA: 03 DE JULIO DE 2024
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE OBRA: JOCOTEPEC, JALISCO.		
OCALIDAD:	CHANTEPEC	
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		LINEA DE DRENAJE DE 12"
OCO-006	SUMINISTRO, INSTALACION DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. 12" DIAMETRO , INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA

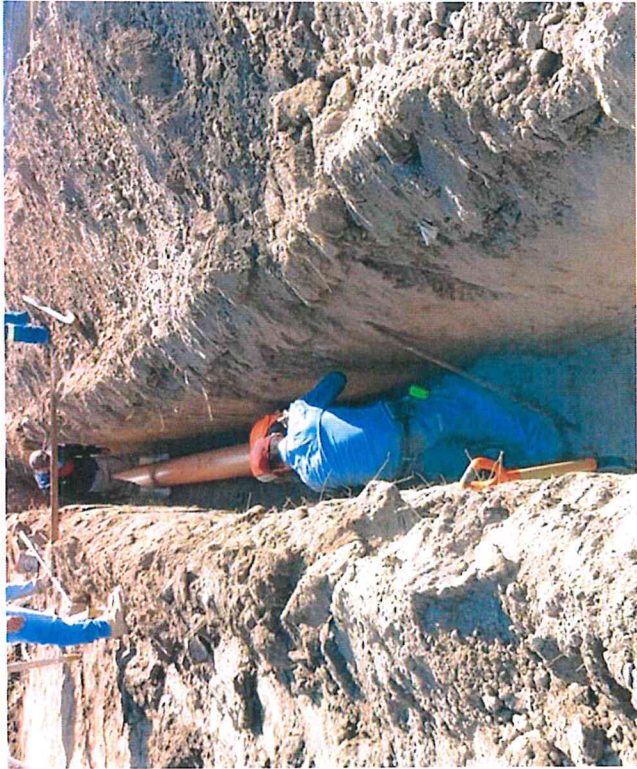

Daniel Rodriguez

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

EMPRESA: SERGIO CABRERA		FECHA: 03 DE JULIO DE 2024
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE OBRA: JOCOTEPEC, JALISCO.		
ESTIMACION: 1 (UNO) UNICA.		
PERIODO : 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024		
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		LINEA DE DRENAJE DE 12"
JOCO-007	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	FOTOGRAFÍA
		
		
SERGIO CABRERA EL CONTRATISTA		DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
		RECEPCION DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: SERGIO CABRERA		FECHA: 03 DE JULIO DE 2024
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE OBRA: JOCOTEPEC, JALISCO.		
LOCALIDAD:	CHANTEPEC	
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		LINEA DE DRENAJE DE 12"
JOCO-008	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	FOTOGRAFÍA



[Handwritten signature of Sergio Cabrera]

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA



[Handwritten signature of Daniel Rodriguez Valenzuela]

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



EMPRESA:

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

LOCALIDAD:	CHANTEPEC
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACION; 1 (UNO) UNICA.

PERIODO : 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"

LINEA DE DRENAJE DE 12"

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=300 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y CAIDA ADOSADA DONDE LO REQUIERA Y MANO DE OBRA.

CROQUIS:

[illegible]

~~SERGIO CABRERA~~
~~EL CONTRATISTA~~


DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: SERGIO CABRERA		FECHA: 03 DE JULIO DE 2024
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE OBRA: JOCOTEPEC, JALISCO.		
LOCALIDAD:	CHANTEPEC	
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		LINEA DE DRENAJE DE 12"
IOCO-009	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=300 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y CAIDA ADOSADA DONDE LO REQUIERA Y MANO DE OBRA.	FOTOGRAFÍA






SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA



DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



EMPRESA: SERGIO CABRERA		FECHA: 03 DE JULIO DE 2024
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE OBRA: JOCOTEPEC, JALISCO.		
LOCALIDAD: CHANTEPEC	ESTIMACION: 1 (UNO) UNICA.	
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO : 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		LINEA DE DRENAJE DE 12"
JOCO-010	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. 6" DIAMETRO , INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON TEPETATE, MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA
 SERGIO CABRERA EL CONTRATISTA   DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DE JALISCO 		

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	03 DE JULIO DE 2024
LOCALIDAD:	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		
MUNICIPIO:	CHANTEPEC	ESTIMACION:	1 (UNO) UNICA.
	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO :	28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		LINEA DE DRENAJE DE 12"			
JOCO-011	REGISTRO SANITARIO FORIADO DE 40 X 40 Y 76 CM DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM, COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA DE	CROQUIS.			
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	PZA	LADO	TOTAL ACUMULADO
PZA	0+011.00	0+011.00	1.00	DERECHO	1.00
PZA	0+025.37	0+025.37	1.00	DERECHO	2.00
PZA	0+032.02	0+032.02	1.00	DERECHO	3.00
PZA	0+038.72	0+038.72	1.00	DERECHO	4.00
PZA	0+046.12	0+046.12	1.00	DERECHO	5.00
PZA	0+056.36	0+056.36	1.00	DERECHO	6.00
PZA	0+064.11	0+064.11	1.00	DERECHO	7.00
PZA	0+070.85	0+070.85	1.00	DERECHO	8.00
PZA	0+076.99	0+076.99	1.00	DERECHO	9.00
PZA	0+088.39	0+088.39	1.00	DERECHO	10.00
PZA	0+095.99	0+095.99	1.00	DERECHO	11.00
PZA	0+107.02	0+107.02	1.00	DERECHO	12.00
PZA	0+114.51	0+114.51	1.00	DERECHO	13.00
PZA	0+123.43	0+123.43	1.00	DERECHO	14.00
PZA	0+028.47	0+028.47	1.00	IZQUIERDO	15.00
PZA	0+057.24	0+057.24	1.00	IZQUIERDO	16.00
PZA	0+096.74	0+096.74	1.00	IZQUIERDO	17.00
PZA	0+130.52	0+130.52	1.00	IZQUIERDO	18.00
		TOTAL :		18.00	

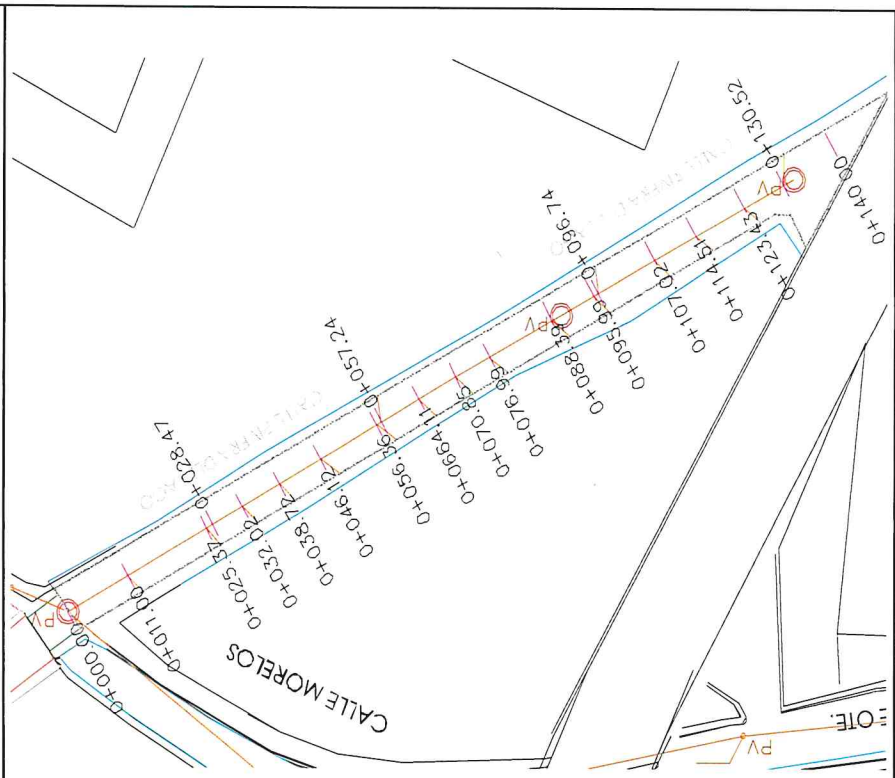

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA


Daniel Rodriguez Valenzuela
DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA: SERGIO CABRERA		FECHA: 03 DE JULIO DE 2024
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE OBRA: JOCOTEPEC, JALISCO.		
LOCALIDAD: CHANTEPEC	ESTIMACION: 1 (UNO) UNICA.	
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO : 28 DE JUN AL 03 DE JUL 2024	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 12"		LINEA DE DRENAJE DE 12"
JOCO-011	REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 40 X 40 Y 76 CM DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM, COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. T.M.A. 19 MM., LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F C=150KG/CM2 HECHO EN OBRA Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA







SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA



DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

LABORATORISTA  JOSE ADRIAN ZEPEDA MENDOZA	JEFE DE LABORATORIO  JOSE MIGUEL AGUILAR PEREZ	Vo. Bo. Pedro Morales H03. ING. PEDRO MORALES HERNANDEZ
--	---	--

LABORATORISTA  JOSE ADRIAN ZEPEDA MENDOZA	JEFE DE LABORATORIO  JOSE MIGUEL AGUILAR PEREZ	Vo. Bo. Pedro Morales Hdz. ING. PEDRO MORALES HERNANDEZ
--	---	--
