



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 0886/2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **SERGIO CABRERA.**, por la cantidad de: **\$29,300.80 (Veintinueve Mil Trescientos Pesos 80/100 M.N.)** por concepto de **ESTIMACIÓN 04 y FINIQUITO**, del programa **CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6241-2-11.1-050-416
Contrato: GMJ 005C- OP/2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
241	06/08/2024	\$25,415.81	\$29,482.34	\$181.54	\$29,300.80

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 04 y Finiquito
4. Fianza de Vicios Ocultos
5. Minuta Terminó de Obra
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.



HACIENDA MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL., A 06 DE AGOSTO DEL 2024
2021 - 2024

ATENTAMENTE
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

SERGIO CABRERA
Ingeniería de costos
Topografía
Construcción
Supervisión

SERGIO CABRERA

RFC: CASE780113C89

Domicilio: HACIENDA DE LA SABILA No. 120 No. Int 5/N, C.P. 45425, Tonalá, Jalisco, México
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45425
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio - 241
Fecha 6/8/2024 09:58:55

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: Palacio Municipal No. SN, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Uso CFDI: 101 - Construcciones.

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Régimen Fiscal:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72141205 - Servicio de construcción de sistemas de drenaje	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4(CUATRO) FINIQUITO "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN- GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO PROGRAMA FAIS RAMO 33 2024 CONTRATO NO. GMJ 005C-OP/ 2024 MENOS RETENCION 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO POR \$181.54 PESOS MONTO EFECTIVO PARA PAGO \$29,300.80 PESOS	25,415.81	0.00	002 - IVA - 4,066.53	25,415.81

Importe con letra:
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.

Subtotal 25,415.81
Impuestos Trasladados 4,066.53
Total 29,482.34

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000515803161
Folio fiscal 328C916A-EC70-4D0A-9D80-21F2961F9127
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Agosto 6 2024 - 09:58:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Sello Digital del CFDI

tP4ES8bBPQdgyakv6bNerdOFd0ZSG1g4tOlmn6L0dEYKYM8ivISY+jGeLUUnGrjJKqqlrMzwNtJkQIP7YbuAeq

80sRzQvB570mlBhKYotJvNyUfoAcPRYZ9mnZxa7ExB0+qgXJt9zw/NR+88SSWHs6b6SV34ItNJISBdJEJS49v
NT9hTWIQUjrDdRAD+HH+HnfgAs0H6MqX9NKZ/4vBtH9AG+OclZyokBKLRIwrWPlxQswZxR+c+F8VpX+NfeWOC1
VcDRQEBHAoBdKJ99U3bnNAwBWUkG7/A5F+LHVX9Tt/PyvB1WQ8SoEa37/FNE5vCp6xgfMvzJls/M9edGB+w==

Sello del SAT

PS0f6XIRI2hcDQ8RQ35TGZfaEujFiGQ6IqABG0IWqHmSFpLADa/kQ14evUogBDIYJ4Bt/CQfepo3+J0
v3KWY12QqN+oQNI5caEO7HZlPdBelVOnNqrny9mxE2mqRtV8yJfNwcVwxbvEE4eOYcd2xSrPhWvK2z
o7CAHU+SgyQWvar63Yw1nqOcBS9yJNfDlcz/e0yJ9nyL+mGplQQQuDPaNNKKQBy2gM/xJtL9u8LISbOANS
m1Y4YJ494jMB62neMPJO2OCTrMpgUt8mBaNYbZjesF0qYbLsfk2J3rCLjyHBXddfcx1VXxoQ8wE22fx
RTuGTR2z1h/txr5oJ5/afa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|328C916A-EC70-4D0A-9D80-21F2961F9127|2024-08-06T09:58:57|MAS0810247C0|tp4E
S8bBPQdgyakv6bNerdOFd0ZSG1g4tOlmn6L0dEYkYM8ivISY+jGeLUUnGrjJKqqrMzwNtJkQIP7YbuA
eq8OsRzQvB570mlBhKYotJvNyUfoAcPRYZ9mnZxa7ExB0+qgXJt9zw/NR+88SSWHs6b6SV34ItNJISB
dJEJS49vNT9hTWIQUjrDdRAD+HH+HnfgAs0H6MqX9NKZ/4vBtH9AG+OclZyokBKLRIwrWPlxQswZxR+c
+F8VpX+NfeWOC1VcDRQEBHAoBdKJ99U3bnNAwBWUkG7/A5F+LHVX9Tt/PyvB1WQ8SoEa37/FNE5vCp6
xgfMvzJls/M9edGB+w==|00001000000505142236||




```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi=
  "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation =
  "http://www.sat.gob.mx/cfd/4
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio=
  "241" Fecha="2024-08-06T09:58:55" Sello=
  "tP4ES8bBPQdgyakv6bNerd0Fd0ZSG1g4t0lmn6L0dEYkYM8ivlSY+jGeLUUngGrjJKqQIrMzWntJkQIP
  7YbuAeq80sRzQvB570mIBhKYotJVnYUfoAcPRYZ9mnZxa7ExB0+qgXJt9zw/NRxx+8SSWHs6b6SV34It
  nJLSBdJES49vNT9hTWIQUjrDdRad+HH+HnfGAs0H6MqX9NKZ/4vBtH9AG+OcLzYokBKLRIwrWPIxQs
  ZxR+c+F8VpX+Nfew0C1VcDRQEBHAoBdKj99U3bnNAwBWUkJg7/A5F+LHVX9Tt/PyvB1WQ8SoEa37/FNE
  5vCp6xgfMvzJIs/M9edGB+w==" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000515803161"
  Certificado=
  "MIIFyzCCA70gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTU4MDMxNjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgY
  DVQQDDbBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1R
  SQUNJT04gVFJJQ1VUQUVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUYBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQE
  W62NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwQVYyIEhJREFMR08gNzc s IENPTC4
  gR1VFU1JFUK8xXjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNDEZMBGGA1UECAwQQU01VREFEIERFIE1
  FWE1DTZETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUHUURU1PQzEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcwnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvc
  NAQKCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VFBTCBERSBTRVJSUNJT1MgVFJJQ1V
  UQVJJT1MgQUwQ09OVFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMjEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAw
  wFQYDVQQDEw5TRVJHSU8gQ0FCUKVSQTEuMCwGA1UEKRMOU0VSU01PIENBQ1JFUKExFzAVBgNVBAoTD1N
  FUKdJTYBDQUJSRVJBMRyWfAYDVQQTEw1DQVNFNzgwMTEzZzQ5SMRswGQYDVQQFExJDU0VhTNzgwMTEzSEp
  DQ1hSMDkxXzAVBgNVBASD1NFUKdJTYBDQUJSRVJBMRyWfAYDVQQTEw1DQVNFNzgwMTEzZzQ5SMRswGQYDVQQFExJDU0VhTNzgwMTEzSEp
  CAQEA3pViS0e6rf8GhXkvdr44J9FxTlQW17TsrlACJuGWSwV127/KSODANqhrLWgt58maA9lwKME4cse
  j6XXTZ0LU4t9LNQw1eioM+LbzNkzLtJ8Hu99LyTy6mqyxvaXQNfDRI9TW57m49XSQJhWl/uxPfprnOK
  VGIsw/ljyGTQDQBgmh1/+7zquqKqRcEGSXs0sChPuoHh1H1GGJN+7Dvt0K8vnk9X53+PszWRWDvrDLZW
  Sa1KBugpLN1Noyh/Gd8E/hDjlo7vSz/CCrGz6Yok+usXQe/Oa5VkoYRg66jPXj0lXBuM/LYM24QWivNG
  /0tU4kHKEoJi9EBZT7/3wYz0FSQIDAQABox0wGzAMBGNVHRMBAf8EAJAAMASGA1UdDwQEAwIGwDANBgk
  qhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAC0fbShunrJyXooHN14xnz+EbLf/4d8XJJtsfvHHTM6TK9XrTQyEnHZsBwax
  PXauqws2t+pe4QTuDKZ6SzohWx32et11yvi6lltkYNq2k1w1dEGdaa7ng/aJufCW3ZiL5/+RUFduOcJW
  gutW3Hr6SsUv2UAp24wtoRckBQ4oYx0P6WJhQ+6FxsarcR4jxVxcqTv5VS7P5PYMx1wk4yFFw+fpR++a
  S+NwxxwpgotvTA/qIzd5Q2odp28w3A9Rqpk1TAD0Wa/7hjCjeHR/e53tJSpE26Tsaa09M2FwNkg5/a7p
  Fe1UtmcvdSJGzdXUWHWP+owmIXMRMwtUZLFrpJlZZ/Wy6jy0OKXZk+Y7RtkEdoDXmH03DBzJhDEE01bT
  mSwETqTpibaPlZl1DCrJyrb32z4h4RwoMi3CdBpR/TltjDsyk9zLau1sBtHo14Y5B1ra4wsKDPe330hG
  y4+P4IoGxm1Ef88zYPtyNM6hC+HpFCPhsbgwwy5Wkb6I+9m1Vq+sS3SUZrxYhcu/BuUut6580IEQxW
  EsAHnmzGWHnf4a4rpfRGMzAH59u6UHCXxoJpsLzNWS/ItkvwvZHDz+K8qmF9fVffdlYmLUtHCBRIcfCKK
  JkmLIg31NjX9Fh153hR4TYc7GJRnFpdETfJq69GMiW1fuyGtC13IMjRRNIMdQ5x0=" SubTotal=
  "25415.81" Moneda="MXN" Total="29482.34" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
  MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="45425">
3 <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="CASE780113C89" Nombre="SERGIO
  CABRERA"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO DE
  JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="I01"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>
4 <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141205" ClaveUnidad="E48" Cantidad=
  "1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="SER0005" Descripcion="PAGO DE LA
  ESTIMACIÓN NO. 4(CUATRO) FINIQUITO &#xA;&quot;REHABILITACIÓN DE LÍNEAS
  HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y
  CALLE PINO SUAREZ&#xA;&quot;, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE
  JOCOTEPEC, JALISCO PROGRAMA FAIS RAMO 33 2024 &#xA;CONTRATO NO. GMJ 005C-OP/
  2024&#xA; MENOS RETENCION 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) PARA LA CONTRALORIA DEL
  ESTADO POR $181.54 PESOS &#xA;MONTO EFECTIVO PARA PAGO $29,300.80 PESOS"
  ValorUnitario="25415.81" Importe="25415.81" ObjetoImp="02"
  ><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="25415.81" Impuesto="002"

```




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CASE780113C89	SERGIO CABRERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
328C916A-EC70-4D0A-9D80-21F2961F9127	2024-08-06T09:58:55	2024-08-06T09:58:57	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$29,482.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

RFC: CASE780113C89

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SERGIO CABRERA
HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.
RFC: CASE780113C89

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO
PERÍODO: DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024.
OBRA : REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA : SERGIO CABRERA
FECHA: 31 DE MARZO DE 2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
CALLE RAMON CORONA												
A	DRENAJE SANITARIO											
JOCO-001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LA LINEDA DE DRENAJE, CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M2	286.00	286.00	0.00	286.00	-	\$12.18	\$3,483.48	\$0.00	\$3,483.48	\$0.00
JOCO-002	EXCAVACIÓN PARA LINEA PRINCIPAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INC, CARGA Y A ACARREO A TIRO LIBRE 10 KM	M3	858.00	427.68	0.00	427.68	430.32	\$258.80	\$222,050.40	\$0.00	\$110,683.58	\$111,366.82
JOCO-003	PLANTILLA CON GRAVA DE 1 1/2", EXTENDIDA Y APISONADA EN UNA CAPA DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA PRIMERA ESTACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M3	44.00	34.32	0.00	34.32	9.68	\$760.38	\$33,456.72	\$0.00	\$26,096.24	\$7,360.48
JOCO-004	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. 12" DIAMETRO , INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	286.00	286.00	0.00	286.00	-	\$453.63	\$129,738.18	\$0.00	\$129,738.18	\$0.00
JOCO-005	RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	134.00	93.53	0.00	93.53	40.47	\$456.89	\$61,223.26	\$0.00	\$42,733.70	\$18,489.56
JOCO-006	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA , EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	679.00	278.96	0.00	278.96	400.04	\$499.26	\$338,997.54	\$0.00	\$139,273.57	\$199,723.97
JOCO-007	EXCAVACIÓN PARA POZOS DE VISITA EN FORMA MANUAL O MECANICA, A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, TRASPALCOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y TALUDES, MANO DE OBRA	M3	24.00	71.25	0.00	71.25	- 47.25	\$325.89	\$7,821.36	\$0.00	\$23,219.66	-\$15,398.30
JOCO-008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA , EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	24.00	42.24	0.00	42.24	- 18.24	\$499.26	\$11,982.24	\$0.00	\$21,088.97	-\$9,106.73



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SERGIO CABRERA
HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.
RFC: CASE780113C89

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO
PERÍODO: DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024.
OBRA : REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA : SERGIO CABRERA
FECHA: 31 DE MARZO DE 2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
CALLE RAMON CORONA												
JOCO-009	EXCAVACIÓN PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS EN FORMA MANUAL O MECANICA, A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, TRASPALCOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y TALUDES, MANO	M3	187.00	126.60	0.00	126.60	60.40	\$325.89	\$60,941.43	\$0.00	\$41,258.33	\$19,683.10
JOCO-010	PLANTILLA CON TEPETATE, EXTENDIDA Y APISONADA EN UNA CAPA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA PRIMERA ESTACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M3	18.00	14.98	0.00	14.98	3.02	\$739.05	\$13,302.90	\$0.00	\$11,070.97	\$2,231.93
JOCO-011	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. 6" DIAMETRO , INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	42.00	37.00	0.00	37.00	5.00	\$2,507.81	\$105,328.02	\$0.00	\$92,788.97	\$12,539.05
JOCO-012	RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	47.00	13.03	0.00	13.03	33.97	\$456.90	\$21,474.30	\$0.00	\$5,952.57	\$15,521.73
JOCO-013	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA , EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	122.00	96.64	0.00	96.64	25.36	\$499.26	\$60,909.72	\$0.00	\$48,249.48	\$12,660.24
JOCO-013-B	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=200 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y CAIDA ADOSADA DONDE LO REQUIERA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	-	\$15,000.90	\$90,005.40	\$0.00	\$90,005.40	\$0.00
Total DRENAJE SANITARIO									\$1,160,714.95	\$0.00	\$785,643.11	\$375,071.84
B	AGUA POTABLE											
JOCO-001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LA LINEDA DE DRENAJE, CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M2	286.00	200.20	0.00	200.20	85.80	\$12.18	\$3,483.48	\$0.00	\$2,438.44	\$1,045.04
JOCO-002	EXCAVACIÓN PARA LINEA PRINCIPAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INC, CARGA Y A	M3	242.00	217.14	0.00	217.14	24.86	\$258.80	\$62,629.60	\$0.00	\$56,195.83	\$6,433.77



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO

PERÍODO: DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024.

OBRA : REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA : SERGIO CABRERA

FECHA: 31 DE MARZO DE 2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
CALLE RAMON CORONA												
JOCO-010	PLANTILLA CON TEPETATE, EXTENDIDA Y APISONADA EN UNA CAPA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA PRIMERA ESTACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M3	24.00	20.02	0.00	20.02	3.98	\$739.05	\$17,737.20	\$0.00	\$14,795.78	\$2,941.42
JOCO-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PVC HIDRÁULICO RD 26 ANGER 3" DE DIAMETRO , INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	286.00	286.00	0.00	286.00	-	\$130.06	\$37,197.16	\$0.00	\$37,197.16	\$0.00
JOCO-005	RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	60.00	48.75	0.00	48.75	11.25	\$456.89	\$27,413.40	\$0.00	\$22,271.44	\$5,141.96
JOCO-006	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA , EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	158.00	147.07	0.00	147.07	10.93	\$499.26	\$78,883.08	\$0.00	\$73,426.17	\$5,456.91
JOCO-015	EXCAVACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN FORMA MANUAL O MECANICA, A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, TRASPALCOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y TALUDES, MANO DE OB	M3	90.00	74.54	0.00	74.54	15.46	\$325.89	\$29,330.10	\$0.00	\$24,292.82	\$5,037.28
JOCO-013	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA , EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	92.00	74.53	0.00	74.53	17.47	\$499.26	\$45,931.92	\$0.00	\$37,209.48	\$8,722.44
JOCO-016	TOMA DOMICILIARIA EN LÍNEA DE 3" A BASE DE TUBERÍA FLEXIBLE PAD RD-9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE 6.50 M DE LONGITUD, CONSIDERANDO 1 ABRAZADERA DE BRONCE DE 3" X 1/2", 1 VÁLVULA DE INSERCIÓN DE BRONCE DE 1/2", 3 CONECTORES DE BRONCE DE 1/2"	PZA	42.00	36.00	0.00	36.00	6.00	\$2,328.65	\$97,803.30	\$0.00	\$83,831.40	\$13,971.90
JOCO-016-B	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X 90X97 CM (MEDIDAS INTERIORES) INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	4.00	0.00	4.00	- 1.00	\$15,000.02	\$45,000.06	\$0.00	\$60,000.08	-\$15,000.02
Total AGUA POTABLE									\$445,409.30	\$0.00	\$411,658.60	\$33,750.70



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SERGIO CABRERA
HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.
RFC: CASE780113C89

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO
PERÍODO: DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024.
OBRA : REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL
CONTRATISTA : SERGIO CABRERA
FECHA: 31 DE MARZO DE 2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
CALLE RAMON CORONA													
C	EXTRAORDINARIOS												
EXT-001	REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 40 X 40 Y 76 CM DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. T.M.A. 19 MM., LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	27.00	0.00	27.00	- 27.00	\$2,183.75	\$0.00	\$0.00	\$58,961.25	-\$58,961.25	
EXT-002	REGISTRO PARA TOMADOMICILIARIA, INCLUYE: LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	15.00	0.00	15.00	- 15.00	\$767.76	\$0.00	\$0.00	\$11,516.40	-\$11,516.40	
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 0:3 INCLUYE: COLOCACION, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	6.00	6.00	- 6.00	\$2,008.33	\$0.00	\$12,049.98	\$0.00	-\$12,049.98	
EXT-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 50X50CM (COMERCIAL DE110KG) ESTANDAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	0.00	4.00	4.00	- 4.00	\$6,064.58	\$0.00	\$24,258.32	\$0.00	-\$24,258.32	
	Total EXTRAORDINARIOS								\$0.00	\$36,308.30	\$70,477.65	-\$106,785.95	
								SUMA	\$ 1,606,124.25	\$ 36,308.30	\$ 1,267,779.36	\$ 302,036.59	
								IVA	\$ 256,979.88	\$ 5,809.33	\$ 202,844.70	\$ 48,325.85	
								TOTAL	\$ 1,863,104.13	\$ 42,117.63	\$ 1,470,624.05	\$ 350,362.45	
 SERGIO CABRERA REPRESENTANTE LEGAL									 C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS SUPERVISOR DEL MUNICIPIO				
									 IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				





HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89

EMPRESA:

SERGIO CABRERA

FECHA:

31 DE MARZO DE 2024

OBRA:

REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD:

SAN PEDRO TESISTAN

ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024.

CALLE RAMON CORONA

DRENAJE SANITARIO

EXT-003

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA



SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	31 DE MARZO DE 2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	SAN PEDRO TESISTÁN	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024.

CALLE RAMON CORONA		DRENAJE SANITARIO
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	CROQUIS

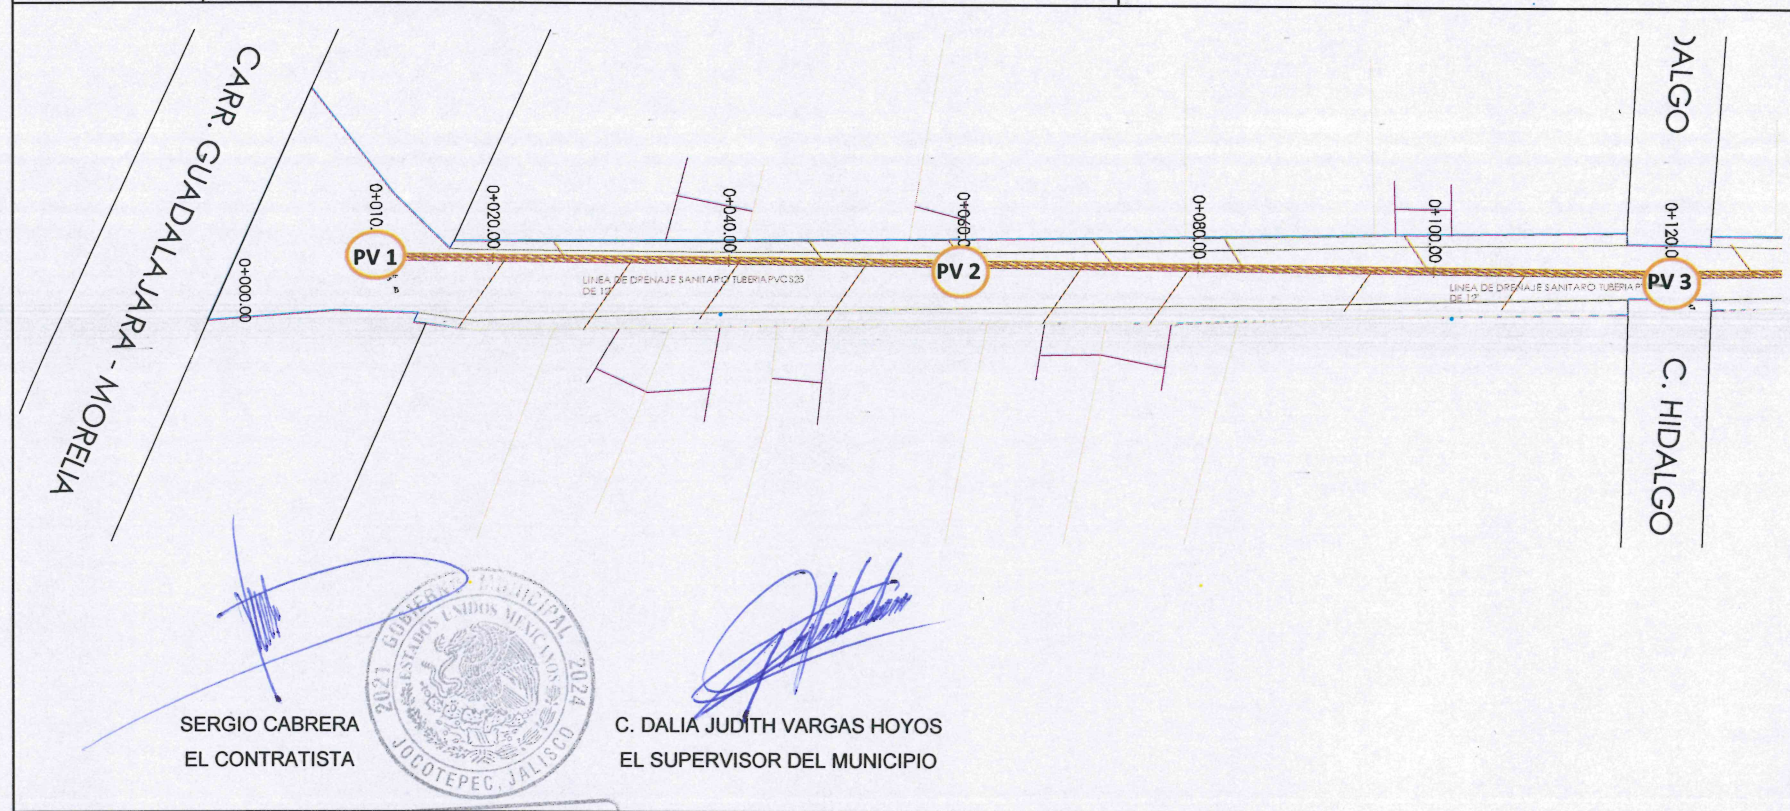

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS




HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	31 DE MARZO DE 2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	SAN PEDRO TESISTAN	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024.

CALLE RAMON CORONA		DRENAJE SANITARIO
JOCO-002	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: COLOCACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	CROQUIS

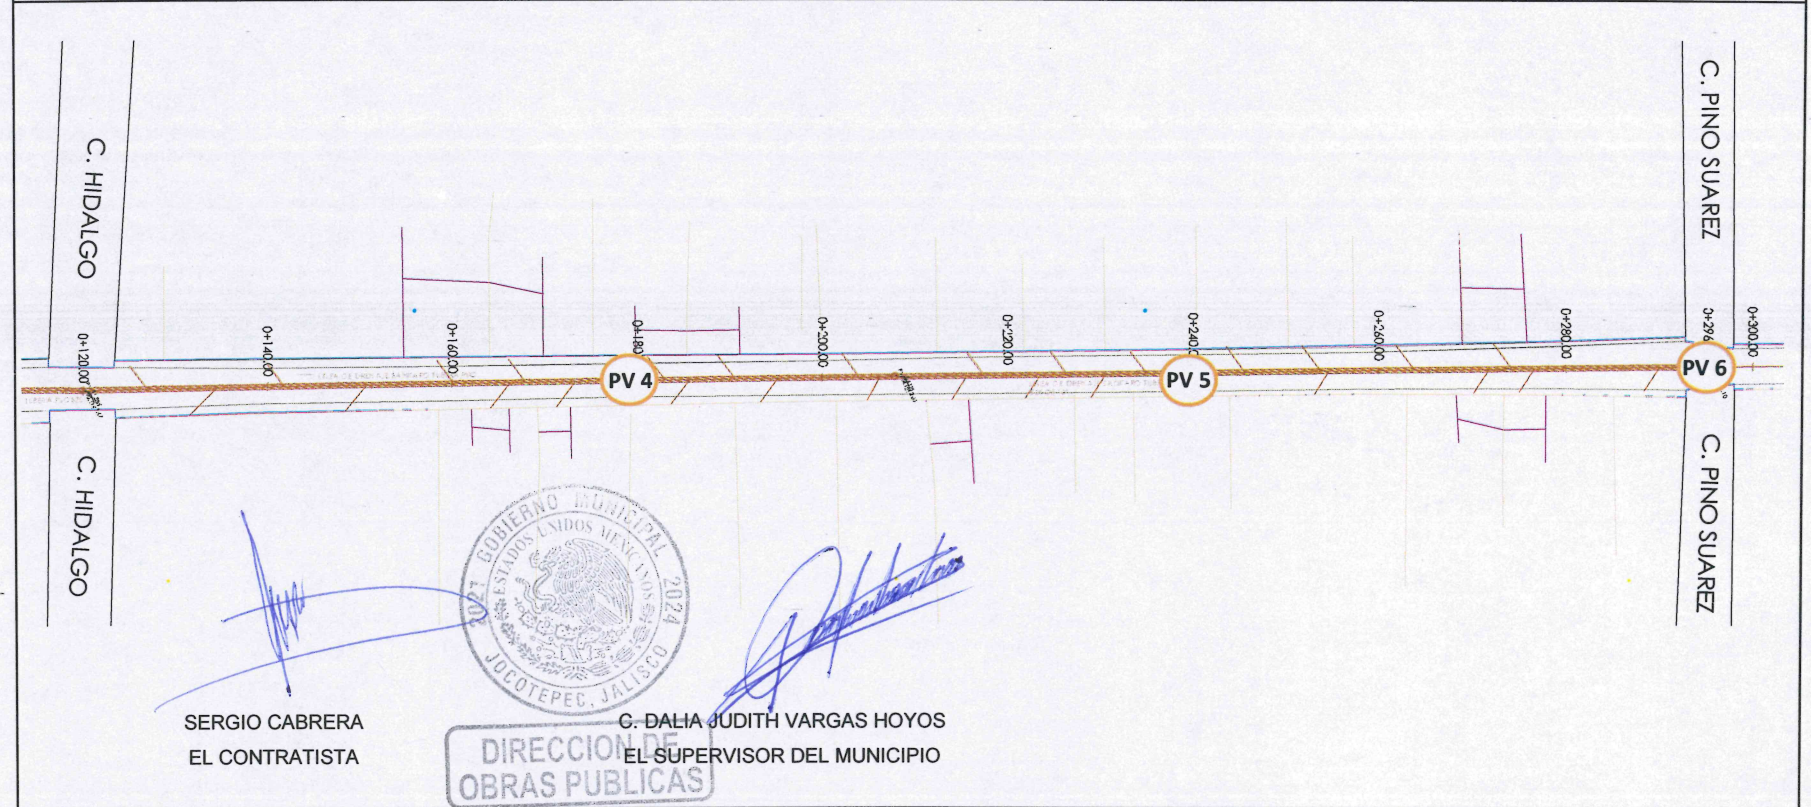




RFC: CASE780113C89

FECHA: 31 DE MARZO DE 2024


ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO

PERIODO: DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024.

CALLE RAMON CORONA								DRENAJE SANITARIO
EXT-004	SUMIISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 50X50CM. (COMERCIAL DE 110 KG.) ESTÁNDAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.							CROQUIS.
UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTURA	PZA	ACUMULADO	
PZA	0+014.00	0+014.00				1.00	1.00	CAJA DE VALVULA
PZA	0+110.00	0+110.00				1.00	2.00	CAJA DE VALVULA
PZA	0+125.00	0+125.00				1.00	3.00	CAJA DE VALVULA
PZA	0+285.00	0+285.00				1.00	4.00	CAJA DE VALVULA
						ESTA ESTIMACION:	4.00	PZA



SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA



C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA
FECHA: 31 DE MARZO DE 2024
OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: SAN PEDRO TESISTAN
ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO
PERIODO: DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024.

CALLE RAMON CORONA		DRENAJE SANITARIO
EXT-004	SUMIISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE 50X50CM. (COMERCIAL DE 110 KG.) ESTÁNDAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	FOTOGRAFÍA



SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



SERGIO CABRERA


HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	31 DE MARZO DE 2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	SAN PEDRO TESISTÁN	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024.

CALLE RAMON CORONA		DRENAJE SANITARIO
EXT-004	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS DE 50X50CM. (COMERCIAL DE 110KG.) ESTÁNDAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	CROQUIS

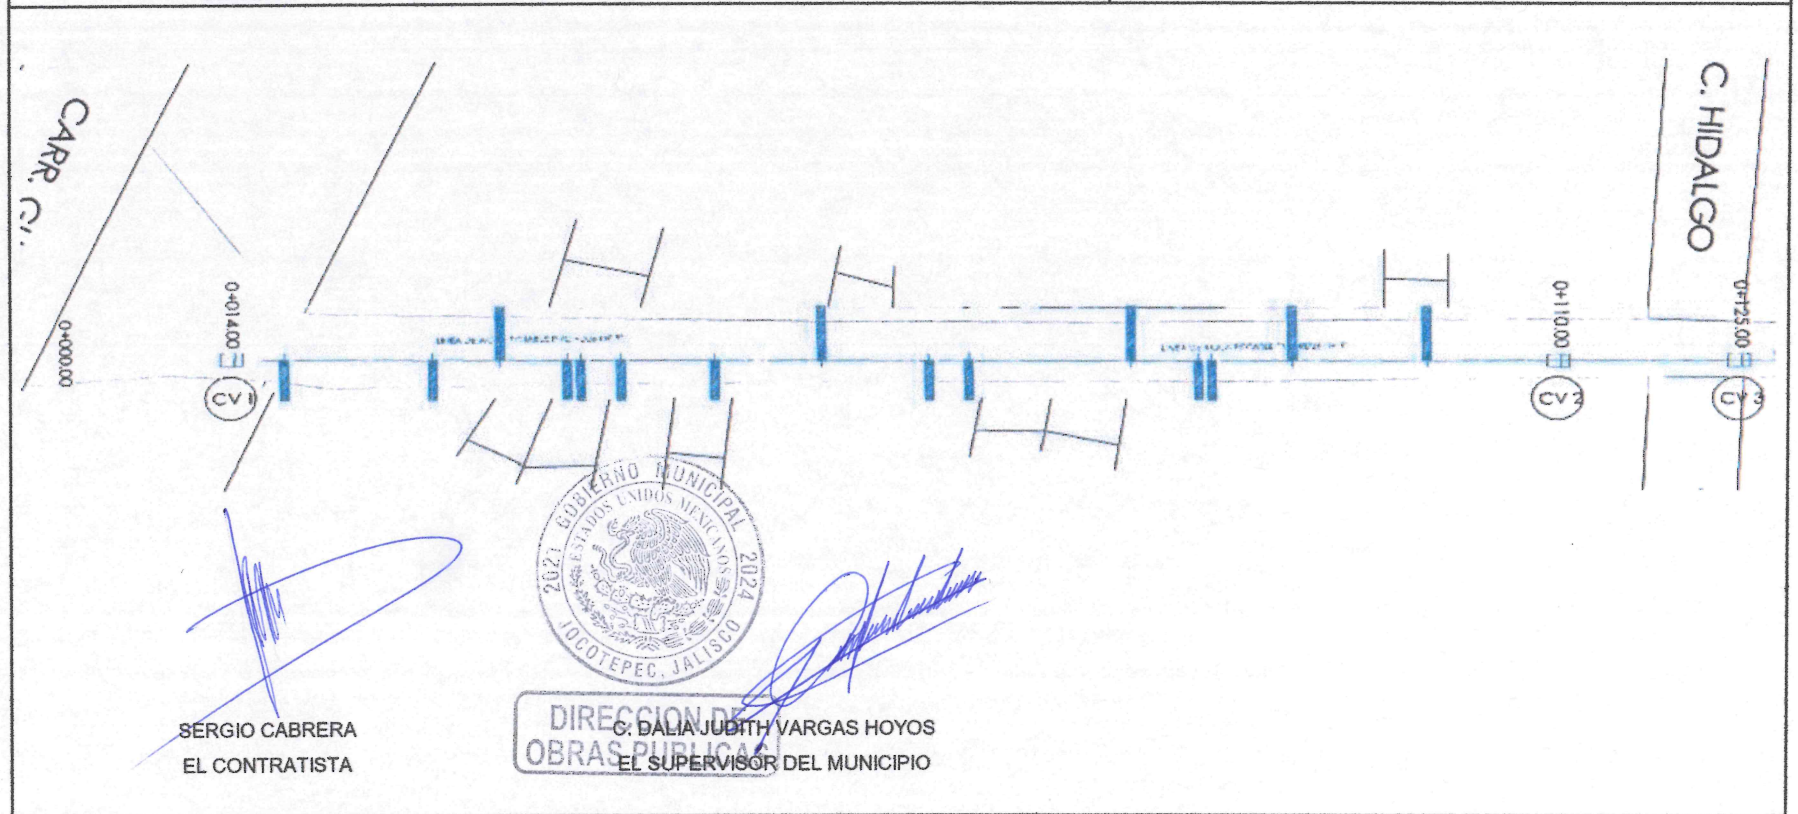



SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	31 DE MARZO DE 2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		
LOCALIDAD:	SAN PEDRO TESISTAN	ESTIMACIÓN No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024.
CALLE RAMON CORONA		DRENAJE SANITARIO	
EXT-004	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS DE 50X50CM. (COMERCIAL DE 110KG.) ESTÁNDAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	CROQUIS	
SERGIO CABRERA EL CONTRATISTA		C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	
