



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 0212/2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **SERGIO CABRERA**, por la cantidad de; **\$36,590.20 (Treinta y Seis Mil Quinientos Noventa Pesos 20/100 M.N.)** por concepto de Estimación 02 y Finiquito, del programa CUENTA CORRIENTE, EJERCICIO FISCAL 2024 correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6151-2-11.1-050-403

Contrato: GMJ 003C- OP/2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
213	03/03/2024	\$31,679.82	\$36,748.59	\$158.40	\$36,590.20

Anexo:


1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 02 y Finiquito
4. Fianza de Vicios Ocultos
5. Minuta de Terminó
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE
JOCOTEPEC, JAL., A 07 DE MARZO DEL 2024
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"



C. JIMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



HACIENDA
MUNICIPAL
2021 - 2024

02 MAYO 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

C.c.p. Archivo
D.O.P./cvch

SERGIO CABRERA
Ingeniería de Costos
Topografía
Construcción
Supervisión

SERGIO CABRERA

RFC: CASE780113C89

Domicilio: HACIENDA DE LA SABA No. 120 No. Int S/N, C.P. 45425, Tonalá, Jalisco, México
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45425
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 213
Fecha: 6/3/2024 13:54:30

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: Palacio Municipal No. SN, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México

Uso CFDI: 101 - Construcciones.

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Régimen Fiscal:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	PAGO DE LA ESTIMACIÓN # 2 (DOS) FINQUITO OBRA: "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC- CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. CON NO. DE CONTRATO: GMJ003C.OP/2024 MENOS LA RETENCION 5 AL MILLAR(R.I.V. SEFUPU) para Contraloría del estado por \$158.40 pesos, Monto efectivo para pago \$36,590.20 pesos	31,679.82	0.00	002 - IVA - 5,068.77	31,679.82

Importe con letra:
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.

Subtotal: 31,679.82
Impuestos trasladados: 5,068.77
Total: 36,748.59

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000515803161
Folio fiscal: B54FOCCB-ECBB-4152-83F1-450CAA0FBA6
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 6 2024 - 13:54:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Sello Digital del CFDI

vlw+sd6LXwv1dzmsUOfxhZSekVrdg55XXbai8LUXzPuCjxALEHsYquKUCRpkBwoTMSlrrkA8TftGHePDJAHm
FSaUgiC7mPDFg4sNsx7tw1z9tOUfJaT2t6dGtKZz9b5MYqb8SQX5FGOR4EHyZsn6K0fjLvV2TccCnxQwUwVHvi
Nju3lBkk0e/OjsvzWxEQ8acvuNMZbcdICVURMkxNUbdgkTDZvtWATCrhpd0k0XqE5dUoXCLW4NbZF6MrXOoze
VO3Ussk1EYNY6LXOXOKtkLxPyRNzoM2a1yaWIMQxDzg8WEJbE8zc9jVoINDy8Vnam8WpMQBQF9Y7MiZabulg==

Sello del SAT

XVYqekSmAaeTFvuU29ZjyIHfuXZblRrTEX3CcUDfw+Z4MK+872nGW7aI4hvtmT9qxO8GqDHowzr3ZEkd
k82cmFcnWkVSLPqLfUBV1ioRENJ68o9yM1sbp866BENVJIQU8nuBcl+fuHv70XiA4ofAcie3QF3FB23R
7w0DPNPHMr46+sfNom52AfMEzEmVsgH77VNdWRLWrT84axRWIIO4IZoX0YpEt18KxpIAkgfyUDdUoalZ
O8MOY8jeRXD7ThzOOAe3gHLD6ESE1bCW/8F9yPM45bSSZQ7T3962CPeBvLnAbkkOEjfrz9Z+jLMAAdTib
vK5CWtj/+gZbB/oToVbbbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||1.1|B54F0CCB-ECBB-4152-83F1-450CAA40FBA6|2024-03-06T13:54:32|MAS0810247C0|vIw+
sd6LXwv1dzmzUOfxhzSekVrdgS5XXbai8LUXzPuCjxALEHsIsYquKUCRpkBwoTMSlrkA8TftGHePDJA
HmFSaUgiC7mPDFg4sNSx7tw1z9t0UFJaT2t6dGtKZz9b5MYqb85QX5FGOR4EHYzsn6K0fjLbV2TccCnx
QwUwVHviNju3Ibkk0e/OjsvzWxEQ8acvuNMZbcdICVURMlxNUbdgkTDZvtWATCrhopd0k0XqE5dUoXCL
W4Nbzf6MrXOozeVO3Ussk1EYNY6LXOXOKtkLxPyRNzoM2a1yaWIMQoDzg8WEJbE8zc9jVoiNDy8Vnam8
WpMQBQF9Y7MiZabulg==|00001000000505142236||



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="213"
Fecha="2024-03-06T13:54:30"
Sello="vlw+sd6LXwv1dzmzUOfxhzSekVrdgS5XXbai8LUXzPuCjxALEHslsYquKUCRpkBwoTMSlrrkA8Tf
tGHePDjAHmFSaUgiC7mPDFg4sNSx7tw1z9t0UFJaT2t6dGtkZz9b5MYqb8SQX5FGoR4EHyZsn6K0fjlBv2T
ccCnxQWUwVHVInju3lbkk0e/OjsvzWxEQ8acvuNMZbcdICVURMkxNUbdgkTDZvtWATCrhopd0k0XqE5dUoX
CLW4Nbzf6MrXOozeVO3Uskk1EYNy6LXOXOkTKLxPyRNzoM2a1yaWIMQoDzg8WEjbE8zc9jVoINDy8Vnam8W
pmQBQF9Y7MiZabuIg==" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000515803161"
Certificado="MIIFyzCCA70gAwIBAgIUMDAwMDEwMDEwMTU4MDMxNjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVPRUK1EQUQGQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1DSU8gREUGQRURNS
U5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VUVVJJQTEaMBBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0B
CQEWG2NvbRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4
gr1VFULJFUK8xDjAMBGNVBEBEMBTAMZAwMQswCQYDVQQGEWNWDEZMBcGA1UECAwQ0LVREFEIERFIE1FW
1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQKCE
01yZXNwb25zYWJsZTogQRURNSU5JU1RSQUJNT04gQ0V0VFBTCBERSBTRVJSUNJT1MgVFJJQ1VUVVJJT1Mg
QUwgQ09OVFJJQ1VZRUSURTAEfW0yMjEwMDNaFw0yNjEwMDNaIGZMRcWFQYDVQQDEw5TRVJHSU8gQ0FCUKVSQT
EXMBUGA1UEKRMOU0VSR01PIENBQ1JFUKExFzAVBGNVBAoTDlNFUkdJTyBDQUJSRVJBMRyWfAYDVQQtEw1DQVNFNzgwMTEzQzgzSMRswGQYDVQQEFExJDQVhTNzgwMTEzSEpDQlhSMdkxFzAVBGNVB
AsTDlNFUkdJTyBDQUJSRVJBMRIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA3pViS8o6rf8GhXkv
dr44J9FxTlQW17TsrlACJuGSwsv127/KSoDANqhrLWGT58maA9lwME4csej6XTZ0LU4t9LNQwleioM+Lb
zNkzLtJ8hGu99LyTy6mqyxvaXQNFDRI9TW57m49XSQJhwl/uxPfprnOKVGIsW/ljyGTQDQBgmhl/+7zquqK
qRcEGSXs0scHPuoHh1H1GGJN+7Dvt0K8vnk9X53+PsZWWRWDvrDLZWSa1KBugPLN1Noyh/Gd8E/hDjlo7vsSz
/CCrGz6Yok+usXQe/Oa5VkoYRG66jPXjoLXBuM/LYM24QWiVNG/0tU4kHKEoJi9EBZT7/3wyZOFsqIDAQAB
ox0wGzAMBGNVHRMBAF8EAJAAMASGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAC0fbShunrJyXooH
N14xnz+Eblf/4d8XJJtsfvHHtM6TK9XrtQyEnHZSBwaxPXauqwvs2t+pe4QTuDKZ6Szohwx32et1lyvi6ll
tkYNq2kw1dEGdaa7ng/aJufCW3ziL5/+RUFduOcJWgutW3Hr6SSuv2UAp24wtorckBQ4oYx0P6WjhQ+6Fxs
arcR4jxVxcqTv5VS7P5PYMX1wk4yFFw+fpR++aS+NwxxwpgotvTA/qIzd5Q2odp28w3A9Rqpk1TADOWa/7h
jCjeHR/e53tJSPE26Tsaa09M2FwNkg5/a7pFe1UtmcvdSJGzdXUWHWP+owmIXMRMwtUZLFrpJ1zz/Wy6jy0
OKXZk+Y7RtkEdoDXmH03DBzJhDEE01bTmsWETqTpibaPlZl1DCRjyrB32z4h4RwoMi3CdBr/TltjdSyk9z
Lau1sbTh014Y5Blra4WsKDPe330hGy4+p4IoGXm1Ef88zYPytmyNM6hC+HpFCPhsbgwWy5Wkb6I+9mlVq+s
S3SUZrxYhcu/BuUut6580IEQxWESAHnmzgWHnf4a4rpfRGMZAHS9u6UHCXXoJpsLzNWS/ItkvwvZHDz+K8q
mf9fvffdlYmLUtHCBRIfcKKJkmLiG31NjX9Fh153hR4TYc7GJRnFpdETfJq69GMiW1fuyGtC13TMjRRNIMd
Q5x0=" SubTotal="31679.82" Moneda="MXN" Total="36748.59" TipoDeComprobante="E" Exportacion="01"
Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="45425">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="CASE780113C89" Nombre="SERGIO CABRERA"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="SER0005" Descripcion="PAGO DE DE LA ESTIMACIÓN # 2 (DOS) FINIQUITO OBRA: "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ". EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
CON NO. DE CONTRATO: GMJ003C.OP/2024
MENOS LA RETENCION 5 AL MILLAR(R.I.V. SEFUPU) para Contraloría del estado por \$158.40 pesos,
Monto efectivo para pago \$36,590.20 pesos" ValorUnitario="31679.82" Importe="31679.82" ObjetoImp="02"></cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="31679.82"

Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="5068.77"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Concept
os><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="5068.77"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="5068.77"
Base="31679.82"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFis
calDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
UUID="B54F0CCB-ECBB-4152-83F1-450CAA40FBA6" FechaTimbrado="2024-03-06T13:54:32"
RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="v1w+sd6LXwv1dzmzU0fxhzSekVrdgS5XXbai8LUXzPuCjxALEHslsYquKUCRpkBwoTMSlrrkA
8TftGHePDjAHmFSaUgiC7mPDFg4sNSx7tw1z9t0UFJaT2t6dGtkZz9b5MYqb8SQX5FGor4EHyZsn6K0fjLb
V2TccCnxQwUwVHviNju3lbbk0e/OjsvzWxEQ8acvuNMZbcdICVURMkxNUbdgkTDZvtWATCrhopd0k0XqE5d
UoXCLW4Nbzf6MrX0ozeV03Uskk1EYNY6LX0xOKtkLxPyRNzoM2a1yaWIMQoDzg8WEjbe8zc9jVoINDy8Vna
m8WpMQBQF9Y7MiZabuIg==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="XVyqekSmAaeTFvuU29ZjyIHFuXZblRrTEX3CcUDfw+Z4MK+B72nGW7aI4hvtmT9qx08GqDHow
zr3ZEkdKb2cmFcnWkV5LPqLfUBV1ioRENJ6Bo9yM1sbpB66BENVJIQU8nuBcI+fuHv70XiA4oFAcde3QF3F
B23R7w0DPNPHMr46+sfnom52AfMEzEmVsgH77VNdWRLWrT84axRWI1041ZoX0YpEt18Kxp3AkgfyUbdUoal
Z08M0Y8jeRXD7Thz00Ae3gHLD6ESE1bCW/8F9yPM4SbSSZQ7T3962CPeBvLnAbkkOEjFnz9Z+jLMAdT1byK
5CWtj/+gZbB/oToVbbbQ==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CASE780113C89	SERGIO CABRERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B54F0CCB-ECBB-4152-83F1-450CAA40FBA6	2024-03-06T13:54:30	2024-03-06T13:54:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$36,748.59	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.


R.F.C. CASE780113C89

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.						No. DE CONTRATO: GMJ003C.OP/2024	HOJA DE RELACIÓN ESTIMACIÓN No. PERÍODO DE TRABAJO:	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						CONTRATISTA: SERGIO CABRERA	HOJA No. 1 DE 1 2 (DOS) FINIQUITO	
						OBRAS:"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOYCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"	DEL: Del 16 al 22 de febrero del 2024	
						UBICACIÓN: SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.	FECHA: 22 de Febrero del 2024	
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN								
HOJA No.	PARTIDAS						IMPORTES	
	PRELIMINARES CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES SUPERFICIE DE RODAMIENTO IMAGEN URBANA LIMPIEZA						\$ - \$ 6,608.15 \$ 8,257.15 \$ 14,644.82 \$ 2,169.71	
							MONTO DE ESTIMACIÓN \$ 31,679.82	
							MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO % -	
							SUBTOTAL \$ 31,679.82	
							I.V.A. 16% 5,068.77	
							SUMA \$ 36,748.59	
							MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) 158.40	
							NETO A PAGAR \$ 36,590.20	
							EL CONTRATISTA	
							SERGIO CABRERA	
							EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	
							C. Daniel Rodríguez Valenzuela.	
							C. Imelda Karina Pérez González.	

SERGIO CABRERA

CALLE MORELOS 67 D, COLONIA CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO.
R.F.C. ETC220211Q32

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
PERÍODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C.
MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE
SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
CONTRATISTA : SERGIO CABRERA
FECHA: 22 de Febrero del 2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PAVIMENTOS												
PRELIMINARES												
1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referenci bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	M2	151.41	151.410	0.00	151.41	-	\$9.65	\$1,461.11	\$0.00	\$1,461.11	\$0.00
2	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	50.86	43.67	0.00	43.67	7.19	\$71.00	\$3,611.06	\$0.00	\$3,100.57	\$510.49
3	Carga mecánica y acarreo en camión 1 er. kilometro, de material producto excavación y/o demolición, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, medido en sección de proyecto	M3	50.86	43.67	0.00	43.67	7.19	\$54.05	\$2,748.98	\$0.00	\$2,360.36	\$388.62
TOTAL DE PRELIMINARES									\$7,821.15	\$0.00	\$6,922.04	\$899.11
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES												
4	Mejoramiento de material de corte adicionando 2% de cal, compactado 95% de su pvs m con equipo mecánico, incluye: escarificado, extendido de material, homogenizado y compactado en capas de 20 cm de espesor, maquinaria, mano de obra y herramienta.	M2	127.14	0.00	129.47	129.47	- 2.33	\$51.04	\$6,489.23	\$6,608.15	\$0.00	-\$118.92
5	Formación y compactación de sub-rasante con material de banco, al 90 % su pvs m, incluye: acamellonado, extendido del material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de 20 cm de espesor, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	25.43	21.84	0.00	21.84	3.59	\$422.89	\$10,754.09	\$9,235.92	\$1,518.18	



Donel Rodriguez



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL


ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
PERÍODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
CONTRATISTA : SERGIO CABRERA
FECHA: 22 de Febrero del 2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA											
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	
6	Base hidráulica de 100% producto de trituración, en capas no mayores de cm. de espesor compactada al 95% proctor de su p.v.s.m., incluye: materiales, agua, mano de obra, equipo para mezclado de materiales, extendido, conformación, compactación y desperdicios. (N-CMT-4-02-002/16).	M3	25.43	21.84	0.00	21.84	\$503.00	\$12,791.29	\$0.00	\$10,985.52	\$1,805.77
	TOTAL DE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES							\$30,034.61	\$6,608.15	\$20,221.44	\$3,205.02
	SUPERFICIE DE RODAMIENTO										
7	Pavimento de empedrado ahogado en concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 de espesor asentado con concreto premezclado, piedra para empedrado 30%, concreto f'c=200 kg/cm2, 70%, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de los materiales a 1ra estación 20.00 m, terminado entrasado	M2	127.14	93.78	18.53	112.31	\$445.61	\$56,654.86	\$8,257.15	\$41,789.31	\$6,608.40
	TOTAL DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO							\$56,654.86	\$8,257.15	\$41,789.31	\$6,608.40
	IMAGEN URBANA										
8	Aline y conformación de terreno natural compactado en capas no mayo de 20 cm de espesor con equipo de impacto, incluye: conformación, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	24.27	0.00	20.42	20.42	\$17.96	\$435.89	\$366.74	\$0.00	\$69.15
9	Suministro e instalación de machuelo prefabricado de 12x30x100 cm	M	22.00	0.00	20.42	20.42	\$297.70	\$6,549.40	\$6,079.03	\$0.00	\$470.37
10	Banqueta de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	24.27	0.00	20.42	20.42	\$401.52	\$9,744.89	\$8,199.04	\$0.00	\$1,545.85
11	Suministro y aplicación de pintura para trafico base solvente color amar con microesferas, en guariciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	22.00	0.00	0.00	0.00	\$44.39	\$976.58	\$0.00	\$0.00	\$976.58
	TOTAL IMAGEN URBANA							\$17,706.76	\$14,644.82	\$0.00	\$3,061.94



DIRECCION DE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
PERÍODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
CONTRATISTA : SERGIO CABRERA
FECHA: 22 de Febrero del 2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
12	LIMPIEZA limpieza gruesa durante y al final de la obra, incluye: mano de obra, equ y herramienta.	M2	151.41	0.00	151.41	151.41	-	\$14.33	\$2,169.71	\$0.00	\$0.00	
	TOTAL DE LIMPIEZA								\$2,169.71	\$0.00	\$0.00	
								SUMA	\$ 114,387.08	\$ 31,679.83	\$ 68,932.79	\$ 13,774.48
								IVA	\$ 18,301.93	\$ 5,068.77	\$ 11,029.25	\$ 2,203.92
								TOTAL	\$ 132,689.02	\$ 36,748.60	\$ 79,962.03	\$ 15,978.39

SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

EMPRESA: SERGIO CABRERA

22 de Febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO "

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO


Mejoramiento de material de corte adicionando 2% de cal, compactado 95% de su pvs m con equipo mecánico, incluye: escarificado, extendido de material, homogenizado y compactado en capas de 20 cm de espesor, maquinaria, mano de obra y herramienta.

CROQUIS.

Daniel Rodríguez Valenzuela
C. Daniel Rodríguez Valenzuela
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



Gobierno Municipal de
JOCOTEPEC
2021 - 2024

SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

FECHA:

22 de Febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

Mejoramiento de material de corte adicionando 2% de cal, compactado 95% de su psvm con equipo mecánico, incluye: escarificado, extendido de material, homogenizado y compactado en capas de 20 cm de espesor, maquinaria, mano de obra y herramienta.


Reporte Fotográfico



SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez

C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 2024

SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

FECHA: 22 de Febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO


PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

4

Mejoramiento de material de corte adicionando 2% de cal, compactado 95% de su psvm con equipo mecánico, incluye: escarificado, extendido de material, homogenizado y compactado en capas de 20 cm de espesor, maquinaria, mano de obra y herramienta.

CROQUIS

CARRETERA JOCOTEPEC - CHAPALA

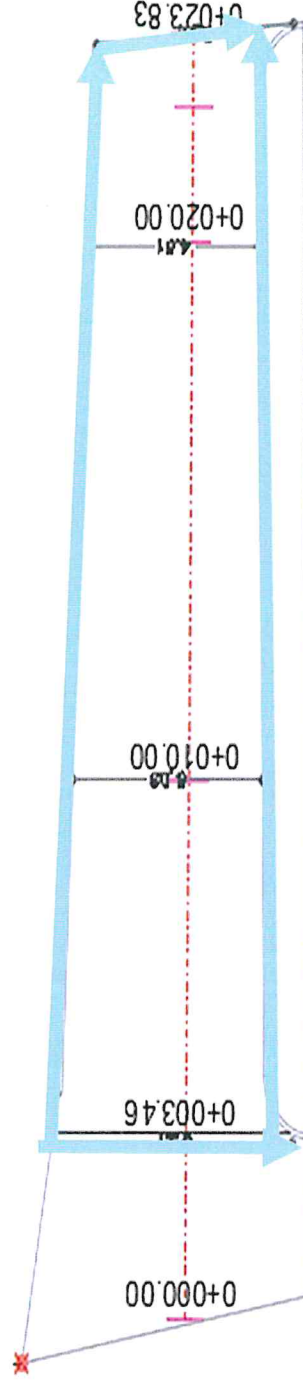

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Daniel Rodríguez V

C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA



CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.


EMPRESA: SERGIO CABRERA

22 de Febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO."

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
PERIODO: Del 16 al 22 de feb

[illegible]



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021-2024

SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

FECHA:

22 de Febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

7 Pavimento de empedrado ahogado en concreto $f'c=200$ kg/cm² de 15 de espesor asentado con concreto premezclado, piedra para empedrado 30%, concreto $f'c=200$ kg/cm², 70%, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de los materiales a 1ra estación 20.00 m, terminado enrasado

Reporte Fotográfico




SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez Valenzuela
C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



CABEZA DE MUNICIPIO DE
JOCOTEPEC
2021

SERGIO CABRERA

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

22 de Febrero del 2024

FECHA:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO


PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

7

Pavimento de empedrado ahogado en concreto $f'c=200$ kg/cm² de 15 de espesor asentado con concreto premezclado, piedra para empedrado 30%, concreto $f'c=200$ kg/cm², 70%, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreo de los materiales a 1ra estación 20.00 m, terminado entrasado

CROQUIS

CARRETERA JOCOTEPEC - CHAPALA

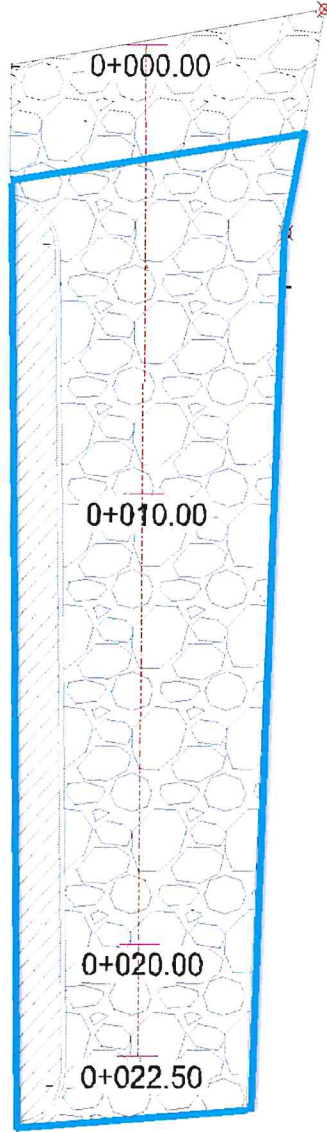

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Daniel Rodríguez V
C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


Sergio Cabrera
SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO."

PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA



GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO
2023 2024

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

22 de Febrero del 2024

FECHA:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO."

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

8

Afine y conformación de terreno natural compactado en capas no mayo de 20 cm de espesor con equipo de impacto, incluye: conformación, mano de obra, equipo y herramienta.

Reporte Fotográfico




SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez Valenzuela
C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

FECHA: 22 de Febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.


ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

8

Afine y conformación de terreno natural compactado en capas no mayo de 20 cm de espesor con equipo de impacto, incluye: conformación, mano de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS

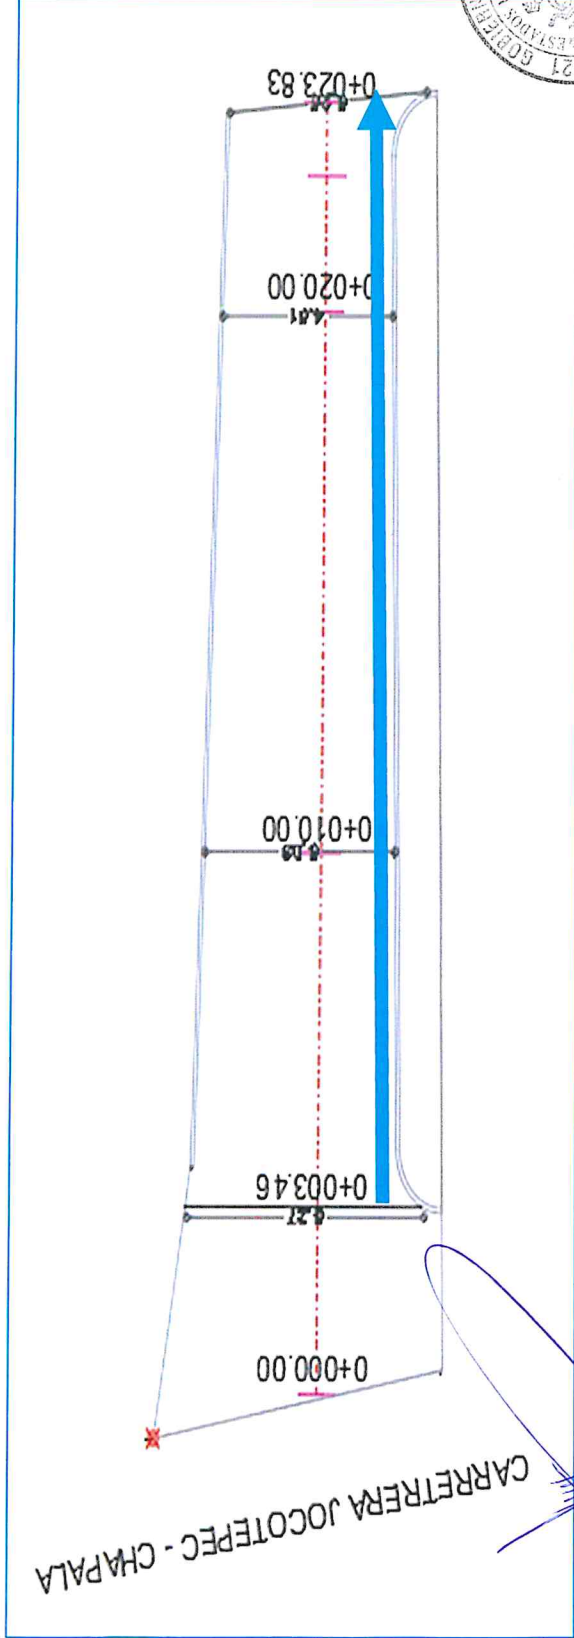


CARRETERA JOCOTEPEC - CHAPALA

Daniel Rodríguez V

C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

22 de Febrero del 2024

FECHA:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocatepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO


PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

9	Suministro e instalación de machuelo prefabricado de 12x30x100 cm											CROQUIS.
UNIDAD		CADENAMIENTO				LARGO	ANCHO	ALTURA	PZA	TOTAL		
M		0+000.00	0+003.36	3.4600					-	-		
M		0+003.46	0+010.00	6.5400					1.00	6.540		
M		0+010.00	0+020.00	10.0000					1.00	10.000		
M		0+020.00	0+023.88	3.8800					1.00	3.880		

~~SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA~~

Daniel Rodríguez V
C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[illegible]



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 2024

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

FECHA: 22 de febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

9	Suministro e instalación de machuelo prefabricado de 12x30x100 cm
Reporte Fotográfico	




SERGIO CABRERA
EL CONTRANSTA

C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

FECHA: 22 de febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"


LOCALIDAD: SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

9	Suministro e instalación de machuelo prefabricado de 12x30x100 cm	CROQUIS

CARRETERA JOCOTEPEC - CHAPALA

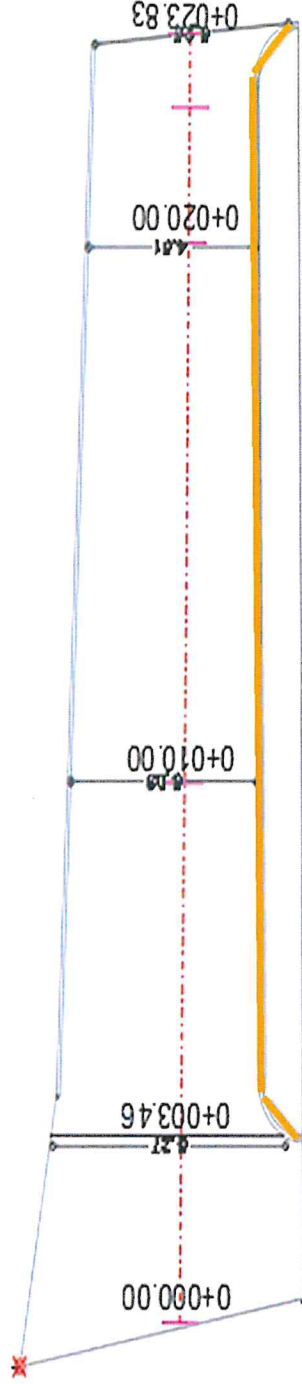

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez V
C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

22 de Febrero del 2024

FECHA:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

10	Banqueta de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.						
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	PZA	TOTAL	
M	0+000.00	0+003.36	3.4600		-	-	
M	0+003.46	0+010.00	6.5400	1.00	1.00	6.5400	
M	0+010.00	0+020.00	10.0000	1.00	1.00	10.0000	
M	0+020.00	0+023.88	3.8800	1.00	1.00	3.8800	
					SUMA	20.4200	


SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Donna Rodriguez

C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

FECHA: 22 de Febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO."

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO


PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

10

Banqueta de 10 cm. de espesor de concreto premezclado $f_c=150$ kg/cm²., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Reporte Fotográfico





SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA


C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC

2021 2024

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

FECHA: 22 de Febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO."

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.


ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO
PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

10

Banqueta de 10 cm. de espesor de concreto premezclado $f'_c=150$ kg/cm²., R.N., T.M.A. 19 mm, con acabado escobillado, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

CROQUIS

CARRETERA JOCOTEPEC - CHAPALA

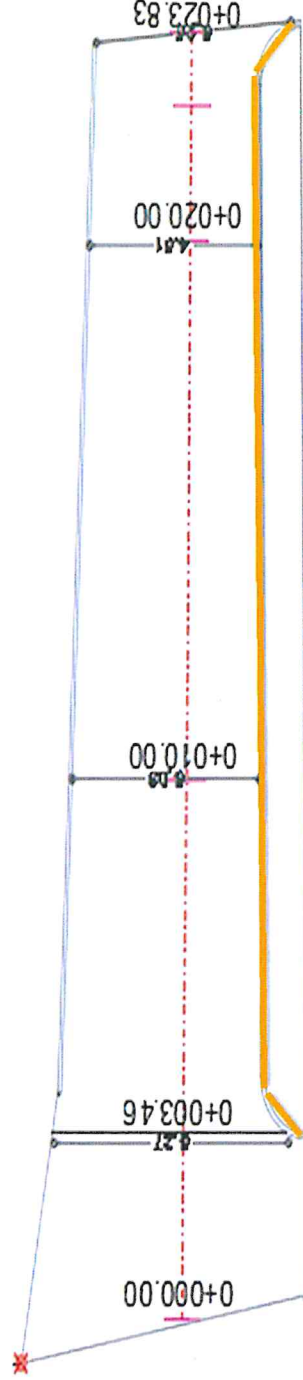

Daniel Rodríguez V

C. Daniel Rodríguez Valenzuela,
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



R.F.C. CASE780113C89

FECHA:

22 de Febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.


ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

12	Limpieza gruesa durante y al final de la obra, incluye: mano de obra, equ y herramienta.										CROQUIS.	
UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTURA	PZA	TOTAL					
M2	0+000.00	0+003.36	3.4600	6.34				21.936				
M2	0+003.46	0+010.00	6.5400	6.34				41.464				
M2	0+010.00	0+020.00	10.0000	6.34				63.405				
M2	0+020.00	0+023.88	3.8800	6.34				24.601				

Daniel Rodríguez V
C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC

2021 - 2024

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

FECHA:

22 de Febrero del 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.


ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

12

Limpieza gruesa durante y al final de la obra, incluye: mano de obra, equ y herramienta.


Reporte Fotográfico

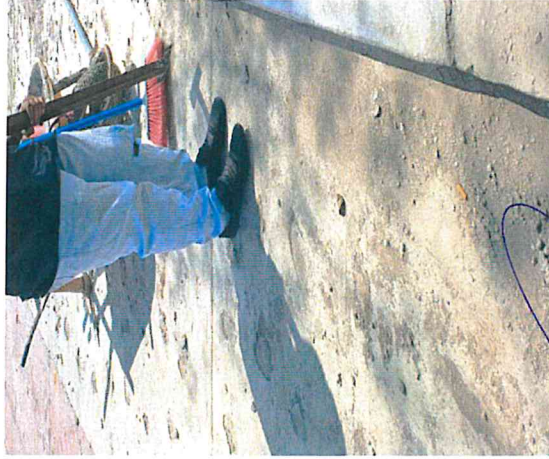

SERGIO CABRERA
EL CONTRATISTA

Daniel Rodríguez Valenzuela

C. Daniel Rodríguez Valenzuela.
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 2024

CALLE HACIENDA DE LA SABILA No. 120, COL. HACIENDA REAL, C.P. 45425, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

EMPRESA: SERGIO CABRERA

FECHA: 22 de Febrero del 2024


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO."

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
MUNICIPIO: Jocotepec, Jalisco.

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) FINIQUITO

PERIODO: Del 16 al 22 de febrero del 2024

12	Limpeza gruesa durante y al final de la obra, incluye: mano de obra, equ y herramienta.	CROQUIS
----	---	---------

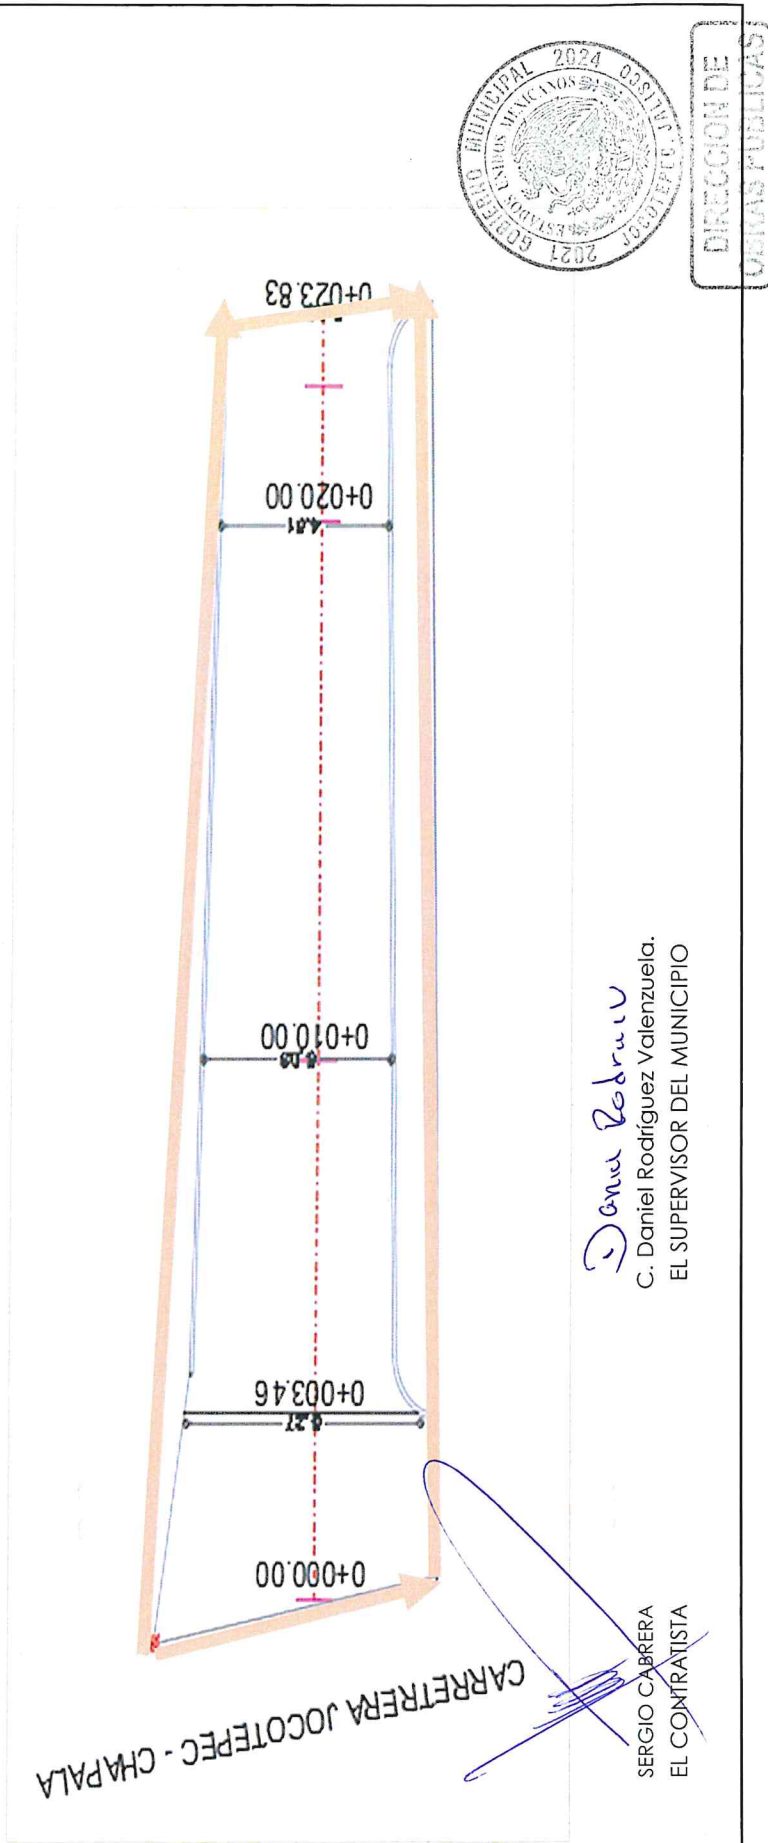

JOCOTEPEC, JALISCO A 22 DE FEBRERO DE 2024.

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
P R E S E N T E

Me refiero al contrato No. GMJ003C.OP/2024, relativo a **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO´.**

Yo **C. SERGIO CABRERA, PERSONA FISICA,** le hago la solicitud de volúmenes adicionales para la **ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO** de la obra antes mencionada; que a continuación se enlistan:

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPOTES
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				
4	Mejoramiento de material de corte adicionando 2% de cal, compactado 95% de su pvsm con equipo mecánico, incluye: escarificado, extendido de material, homogenizado y compactado en capas de 20 cm de espesor, maquinaria, mano de obra y herramienta.	M2	2.33	\$51.04	\$118.92
	TOTAL DE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				\$118.92
				SUMA	\$ 118.92
				IVA	\$ 19.03
				TOTAL	\$ 137.95

Sin otro particular pongo a su consideración el anterior.

ATENTAMENTE

ING. SERGIO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL





GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: 164-A/ 2024
ADM. 2021-2024
Jocotepec Jalisco, a 22 de febrero del 2024

Ing. Sergio Cabrera.

PRESENTE:

Asunto: volúmenes excedentes

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a su solicitud recibida el día 16 de marzo del 2023, el cual se autoriza el volumen excedente de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, JALISCO". No. DE CONTRATO: GMJ 003C- OP/2024.

No.	Concepto	Unidad	Cantidades	Precio Unitario	Importe
1	Mejoramiento de corte adicional 2% de cal compactado 95% de su PVSM con equipo mecánico, incluye: esclarioficacdo, extendido de material, homogenizado y compactado en capas de 20cm de espesor, maquinaria, mano de obra y herramienta	M2	2.33	\$ 51.04	\$ 118.92
				Suma	\$ 118.92
				IVA	\$ 19.03
				Total	\$ 137.95


Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido enviándole un saludo.

Atentamente:


C. Imelda Karina Pérez González
Directora de Obras Públicas



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


Recibi original
