



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas  
Administración 2021-2024  
Número de Oficio 0964/2024

*Acude*

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de: **\$296,150.69** (Doscientos Noventa y Seis Mil Ciento Cincuenta Pesos 69/100 M.N.) por concepto de **ESTIMACIÓN 03 y FINIQUITO** del programa **FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto

**OBRA:** "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6151-2-25.2-050-427  
Contrato: GMJ 023C- OP/2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
202	21/08/2024	\$256,407.52	\$297,432.72	\$1,282.04	\$296,150.69

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 3 y Finiquito
4. Copia Convenio Modificadorio
5. Fianza Vicios Ocultos
6. Minuta Termino de Obra
7. Acta Entrega Recepción
8. Acta Extinción Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE  
JOCOTEPEC, JAL., A 21 DE AGOSTO DEL 2024  
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"

*[Signature]*  
C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



HACIENDA MUNICIPAL  
2021 - 2024

21 AGO. 2024

**RECIBIDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JOCOTEPEC, JAL.

C.c.p. Archivo  
D.O.P./cvch



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA

RFC: TPR1806058CO

Domicilio: MORELOS No. 67 No. Int E, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: - 202
Fecha: 21/8/2024 14:53:23

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México
Uso CFDI: I01 - Construcciones.

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Régimen Fiscal:

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe

Main table row with 9 columns. Description: PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITLY CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. CON CONTRATO NO.: GMJ 005COP/ 2024 DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$1,282.04 MONTO PARA EFECTO DE PAGO: \$296,150.69

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.



Importe total: 256,407.52
Impuestos Traslados: 41,025.20
Total: 297,432.72

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000516193795
Folio fiscal: 3512702-3098-41B4-9937-1B2D9C216662
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 21, 2024 - 14:53:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI


+LKfXdmy4ugTKtyKZrfUHM6SrZzd31NpvVRGqc3DUby122RwINEAI6wKcAlDbol+dBtQNV/PSCW6gotI/ag==

Sello del SAT

Yb0tEPHGsrnnNG0x0Fq/lg1YfHHzFdZWXQ8qcXQAFUbp3LNWRIEuqdYmYv5+vWp11JQ+TpwgwBfvUg  
019I/U7814COURA3AiXBlk/pEmY5hzjBwMWJZ/7ETglwG88Ja+KemN5oFic7DD5h6DT5V5hW/CAgf7cA  
vMOugyqvBgAqRnRV/InUE9NcHllkXQp83ocMsbrubykGAgHsw9HuWnmQhtVAWstWWvS90RrmwdV7/T  
+Vo/t27wYPBEhICAkwZ3vi9jtxJZfhie3LQvKoBEF/sT7Z/ozCX3AUqypogziTRT3XualQGODS2QyDG  
Gz5g7Et4RUwTCKhfueYNIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|34E4A702-309B-41B4-9937-1B2D9C216662|2024-08-21T14:53:24|MAS0810247C0|gieh  
d5+x38ofJfOz/CvQ9wnL0GuSIsxuXOWJfsgUH2C4gJspfm+TuIEUExCDkD5NxXy9i5vdAxPAbezrUfRx  
M48vxwZDj9Qc07I/EL2Nsw47GFVbv8ylueGe/bk9Pz8YB0Z+WfCm3W7H5eOxMTEE2RZ9pF14shQTzX6  
1meNRkteT9M+P6KO+2JfJOePe2QzheFpyEPvJ8xCF+kAPbPZctnkHKE1rkda8Ein7Bw5FDYkNx9WfP3  
Ng9ICKwrv0Gme2+LKfXdmy4ugTKtyKZrfUHM6SrZzd31NpvVRGqc3DUby122RwINEAI6wKcAlDbol+d  
BtQNV/PSCW6gotI/ag==|00001000000505142236||



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"  
Version="4.0" Folio="202" Fecha="2024-08-21T14:53:23"  
Sello="giehd5  
+x38ofJfOzLcVQ9wnL0GuSIsxuXOWJfsgUH2C4gJspfm+TuIEUEXCDkD5NxXy9  
i5vdAxPabezrUfRxM48vxwZDj9Qc07I/EL2Nsw47GFVbv8yIueGe/bk9Pz8YB0  
Z+WFcHm3W7H5eOxMTEE2RZ9pF14shQTzX6lmeNRkteT9M+P6KO+  
2JFjOePe2qZheFFpyEPvJ8xCF+kAPBPzctnKHE1rkda8Ein7Bw5FDYkNx9WfP  
3Ng9ICKwrv0Gme2  
+LKfXdmy4ugTKtyKZRfiUHM6SrZzd31NpvVRGqc3DUby122RwINEAI6wKc  
oI+dBtQNV/PSCW6gotJ/ag==" FormaPago="03"  
NoCertificado="00001000000516193795"  
Certificado="MIIGPjCCBCagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYxOTM3OTUw  
QYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVoQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElG  
BRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSvskLDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVfJ  
1VUQVJjQTEaMBGGA1UECwwRU0FULULFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w  
BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdvY  
EhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFU1JFUk8xDjAMBGNVBBEMBTA2MzAwMQSw  
DVQQGEwJNWDEZMBCGA1UECAwQQ01VREFEIERFIE1FWELDTzETMBEGA1UEBwwKQ  
1VBVUHURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQk  
CE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWS  
UNJT1MgVfJjQ1VUQVJjQ1MgQUwgQ09OVfJjQ1VZRU5URTAeFw0yMjExMTUwMDU  
3NDBaFw0yNjExMTUwMDU3NDBaMIIBCzE4MDYGA1UEAxMvVEVSUkFRDRVJjQVMgW  
SBQOVZJTVUVOVE9TIERFIEExBIFJjQk1FUkEgU0EgREUgQ1YxODA2BgNVBCKTL1R  
FULJBQ0VSSUFTIFkgUEFWSU1FTlRPUyBERSBMSBSSUJJRVJBIENBIERFIENWM  
TgwNgYDVoQKEy9URVJSQUNFUk1BUyBZIFBBVklNRU5UT1MgREUgTEEGUklCSUV  
SQSBTQSBERSBDVjElMCMGA1UELRMcVFBSMTgwNjA1OEMwIC8gQ0FTRTc4MDExM  
0M4OTEeMBwGA1UEBRMVIC8gQ0FYUzc4MDExM0hKQ0JYUjA5MRQwEgYDVoQLEwt  
0ZXJyYWN1cm1hc3CCASIdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJBx+  
5I+gY01+PNNVUEwtpe5  
+rgv5ayA8GbDJBv0jepOpfwasRbE7/FXIVRduW07eolu2hh8wTSH7udK2jOTnP  
VV9szVt6Rq6CCWma4  
+gTY4f4Bf1ff8A4g1lxCe2P8IWCxFOuVt67mVdpF++Y0ndYrcoAsZmFmuPbX2L  
5hWF9xz3  
+ANDiNe+eOftvmselUBacEpoaaEhxC+ZolIGa8i2lWxUHTgx64jd9WLKd79aZ5  
ufhr/LJ52hTKsqfbb1xh3peoV6N9andKjhr284lQ2CbeEh4vus7eTrdfUgGrdC  
kU2RUX0X9QgTGdcz0fq5ZmrUvsSHvFNyBLWO+w1IZT/YBsCAwEAAAMdMBswDAY  
DVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBALZDd  
3La8qKVFF/0yznXwnheSigGqPJ9uDPCm3G2  
+yQ9K50jbf2n2iVx7F83VRR71ojYoJm2bNTqWykaBWgxIC4CLm/LFmeFpb6UR  
WxSADqEcTAzOuLbIFwF5+y5EH3aaI5CCBOZSu+  
7rK/1ldyTTPBMcmIEsr1ZCL/PclZyaQGRKPeFvHZBLwQDedUYILfGHHomD4VgO  
45ITXmXcqcoEoltTXwufODHizatbvfp6IwcK4jQMt4pG1H+Enr9qMYzgpzZnhG  
Ss7Np2aVok3DOvhDxPzWWTj9ppvOmbRvrLRaKnOmCu04zpVclnnVunR1o/NEa/  
ub7NxCL6KHMdB3qPvbZxz1BaXz4XnoMkzCwyNn48bAUGYmMn1Qj/APUnaj7XZa  
s63KnCtjZgMIcrb9X/aes2TFIreEL9um6aaBwp0gnR86o0Sv9j9/3y+jZJ5jk9  
nPPkzXkJbqelIw/8z/Ca3fs6K3tXXThutJJWh88FvlnT+HEv8I3q96n0S37h0T  
Kh1A9ZbbUMuk0q9W2K5iYa8RkoXE023HW43YLMHfyBuNJSVb2ZgJjf7RNd11Y7  
u3KrE9WFynm+vcWKvz5cbMR2CbFtLidaGsZ8RnGPPm16m8g5tdHkHAAyGgukv0  
IEeF7nuUB5I5RProenADeDJgsKladYmfQbl9X7YI29HFG0VQ"  
SubTotal="256407.52" Moneda="MXN" Total="297432.72"  
TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"  
LugarExpedicion="45800">  
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="TPR1806058C0"

*[Handwritten signature]*



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

Nombre="TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA"></cfdi:Emisor>  
<cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO DE  
JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800"  
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"></cfdi:Receptor>  
<cfdi:Conceptos>  
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141103"  
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"  
NoIdentificacion="SER0005" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION  
3 (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION  
SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE  
ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA EN LA IRRIGACION  
DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. &#xA;CON CONTRATO NO. 005COP/  
GMJ 005COP/ 2024&#xA;DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR (R.I.V. SELLADO EN  
\$1,282.04&#xA;MONTO PARA EFECTO DE PAGO: \$296,150.69"  
ValorUnitario="256407.52" Importe="256407.52" ObjetoImp="PAGO DE  
<cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Base="256407.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"  
TasaOCuota="0.160000" Importe="41025.20"/></cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos>  
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41025.20">  
<cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"  
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="41025.20"  
Base="256407.52"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/T  
imbreFiscalDigitalv11.xsd"  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
Version="1.1" UUID="34E4A702-309B-41B4-9937-1B2D9C216662"  
FechaTimbrado="2024-08-21T14:53:24"  
RfcProvCertif="MAS0810247C0" SelloCFD="giehd5  
+x38ofJfOzlCvQ9wnL0GuSIsxuXOWJfsgUH2C4gJspfm+TuIEUExCDkD5NxXy9  
i5vdAxPAbeszrUfrxM48vxwZDj9Qc07I/EL2Nsw47GFVbv8yIueGe/bk9Pz8YB0  
Z+WFcHm3W7H5eOxMTEE2RZ9pF14shQTzX6lmeNRkteT9M+P6KO+  
2JFjOePe2qZheFFpyEPvJ8xCF+kAPbPZctnkHKE1rkda8Ein7Bw5FDYkNx9Wfp  
3Ng9ICKwrv0Gme2  
+LKfXdmy4ugTKtyKZRfiUHM6SrZzd31NpvVRGqc3DUby122RwINEAI6wKcALdb  
oI+dBtQNv/PSCW6gotJ/ag=="  
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"  
SelloSAT="Yb0tEPHGsrnnNGg0xFq/lg1YfHHzFdzWJXQ8qcgXQAFUbp3LNWRI  
EuqDYmYv5  
+vWpI1JQ+TpwgwbFvUg019I/U7814COURA3AiXBLk/pEmY5hzjBwMWJZ/7ETgI  
wG88Ja+KemN5oFic7DD5h6DT5V5hW/CAgf7cAvMOugyqvBgAqRnRV/lnUE9NcH  
lI1xJQXp83ocMsbrubykGAgHSW9HuWnmQhtVAWsTWWvS90RrmwdV7/T+Vo/t27  
wYPBEhlCAKwZ3vI9IjtXjZfhie3LQvKoBEF/st7Z/ozCX3AUqypogziTRT3Xua  
lQGODS2QyDGGz5g7Et4RUwTCKhfueYNiA==" /></cfdi:Complemento>  
</cfdi:Comprobante>





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TPR1806058C0	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certifica
34E4A702-309B-41B4-9937-1B2D9C216662	2024-08-21 14:53:23	2024-08-21T14:53:24	MAS0810247
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$297,432.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

*[Handwritten signature]*



Imprimir



## TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV



Jocotepec

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RFC: TPR180605 8C0

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES ) FINIQUITO

PERÍODO: 25 AL 29 DE JULIO DE 2024

OBRA : REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA : TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV

FECHA: 29 DE JULIO DE 2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA														
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLE RIVERA DEL LAGO														
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>													
JOCO-001	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	950.00	1,102.44	0.00	1,102.44	-	152.44	\$11.07	\$10,516.50	\$0.00	\$12,204.04	-\$1,687.54	
JOCO-002	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO II Y III., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	380.00	421.14	0.00	421.14	-	41.14	\$136.48	\$51,862.40	\$0.00	\$57,477.36	-\$5,614.96	
JOCO-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	380.16	661.47	0.00	661.47	-	281.31	\$102.49	\$38,962.60	\$0.00	\$67,793.63	-\$28,831.03	
JOCO-004	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO QUE SEÑALE OBRAS PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3	109.15	220.49	0.00	220.49	-	111.34	\$266.78	\$29,119.04	\$0.00	\$58,821.95	-\$29,702.91	
<b>B</b>	<b>PAVIMENTOS</b>									<b>\$130,460.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,296.98</b>	<b>-\$65,836.45</b>	
JOCO-005	AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.M.S. CON MAQUINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	950.40	1,102.44	0.00	1,102.44	-	152.04	\$18.17	\$17,268.77	\$0.00	\$20,031.34	-\$2,762.62	
JOCO-006	FORMACION DE CAPA SUBRASANTE DE 30 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	146.52	210.66	0.00	210.66	-	64.14	\$423.51	\$62,052.69	\$0.00	\$89,215.45	-\$27,162.91	
JOCO-007	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	97.68	118.09	0.00	118.09	-	20.41	\$518.28	\$50,625.59	\$0.00	\$61,201.20	-\$10,575.81	
JOCO-008	EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRAULICO 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	488.40	170.32	464.00	634.32	-	145.92	\$507.18	\$247,706.71	\$235,331.52	\$86,380.21	-\$74,005.17	
<b>C</b>	<b>BANQUETAS</b>									<b>\$377,653.76</b>	<b>\$235,331.52</b>	<b>\$256,828.21</b>	<b>-\$114,506.52</b>	
JOCO-009	DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS POR MEDIO MANUALES INCLUYE ACARREO DE MATERIALES A 6 KM DE DISTANCIA A BANCO DE DESPERDICIO.	M3	65.00	84.56	0.00	84.56	-	19.56	\$266.78	\$17,340.70	\$0.00	\$22,559.45	-\$5,218.80	
JOCO-010	EXCAVACIÓN PARA BANQUETAS EN FORMA MANUAL O MECÁNICA, A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y TALUDES, MANO DE OBRA.	M3	65.00	84.56	0.00	84.56	-	19.56	\$136.48	\$8,871.20	\$8.00	\$11,540.45	-\$2,669.30	

Dani Rodri



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

## TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

RFC: TPR180605 8C0

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES ) FINIQUITO

PERÍODO: 25 AL 29 DE JULIO DE 2024

OBRA : REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA : TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV

FECHA: 29 DE JULIO DE 2024

### ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLE RIVERA DEL LAGO</b>													
JOCO-011	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADA CON EQUIPO LIGERO (BAILARINA) PARA DESPLANTE DE BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, FLETES, AFINES, TENDIDO,	M3	65.00	84.56	0.00	84.56	-	19.56	\$508.57	\$33,057.05	\$0.00	\$43,003.61	-\$9,946.71
JOCO-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHUELO PREFABRICADO 12X30X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	264.00	289.90	0.00	289.90	-	25.90	\$343.23	\$90,612.72	\$0.00	\$99,502.23	-\$8,889.66
JOCO-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	325.00	422.79	0.00	422.79	-	97.79	\$40.28	\$13,091.00	\$0.00	\$17,029.94	-\$3,939.02
JOCO-014	BANQUETA DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, A TIRO DIRECTO, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	325.00	422.79	0.00	422.79	-	97.79	\$454.29	\$147,644.25	\$0.00	\$192,069.57	-\$44,425.47
<b>D</b>	<b>VEGETACION</b>									<b>\$310,616.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,705.26</b>	<b>-\$75,088.95</b>
JOCO-015	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL DE LA REGION CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 2.00 M. A PARTIR DE N.P.T., INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR EL PERIODO DE LA OBRA, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	20.00	0.00	20.00	20.00	-	\$1,053.80	\$21,076.00	\$21,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
									<b>\$21,076.00</b>	<b>\$21,076.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
									<b>SUMA</b>	<b>\$ 839,807.21</b>	<b>\$ 256,407.52</b>	<b>\$ 838,830.45</b>	<b>-\$ 255,430.74</b>
									<b>IVA</b>	<b>\$ 134,369.15</b>	<b>\$ 41,025.20</b>	<b>\$ 134,212.87</b>	<b>-\$ 40,868.92</b>
									<b>TOTAL</b>	<b>\$ 974,176.36</b>	<b>\$ 297,432.72</b>	<b>\$ 973,043.32</b>	<b>-\$ 296,299.66</b>

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV	FECHA:	29 DE JULIO DE 2024
OBRA:	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		

LOCALIDAD:	LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	<b>GENERADOR</b>

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLE RIVERA DEL LAGO		PAVIMENTOS
JOCO-008	EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRAULICO 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	FOTOGRAFIA

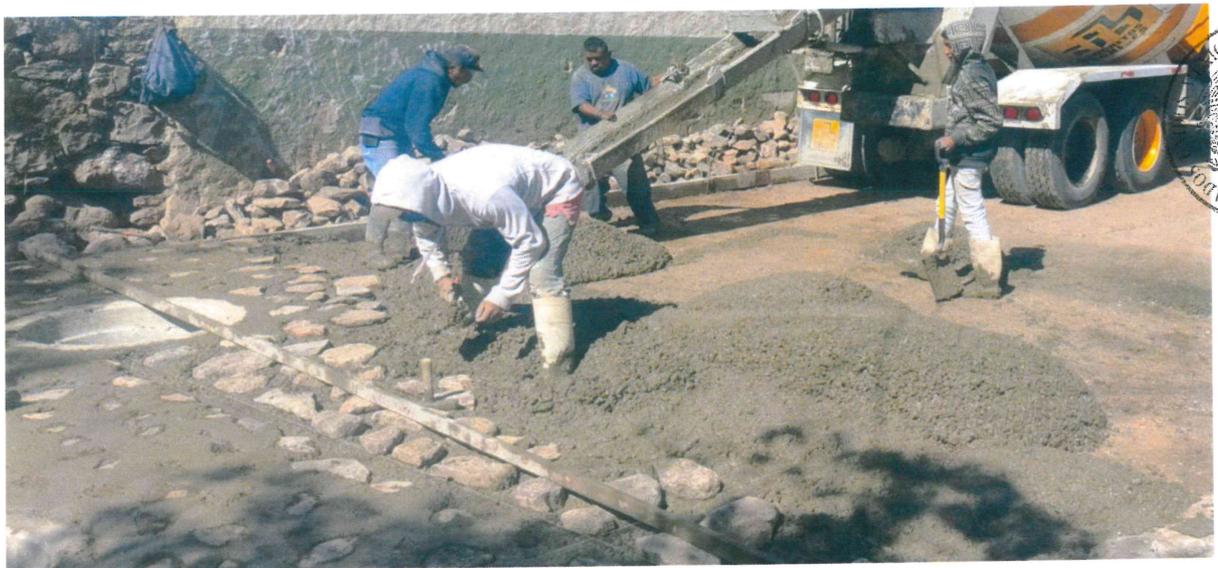

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
2021 - 2024  
ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
JOCOTEPEC, JALISCO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV

*Daniel Rodriguez Valenzuela*

DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




**DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS**

**OPERADO  
FORTAMUN**

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV	FECHA:	29 DE JULIO DE 2024
OBRA:	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		

LOCALIDAD:	LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	<b>GENERADOR</b>

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLE RIVERA DEL LAGO		PAVIMENTOS
JOCO-008	EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRAULICO 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CROQUIS

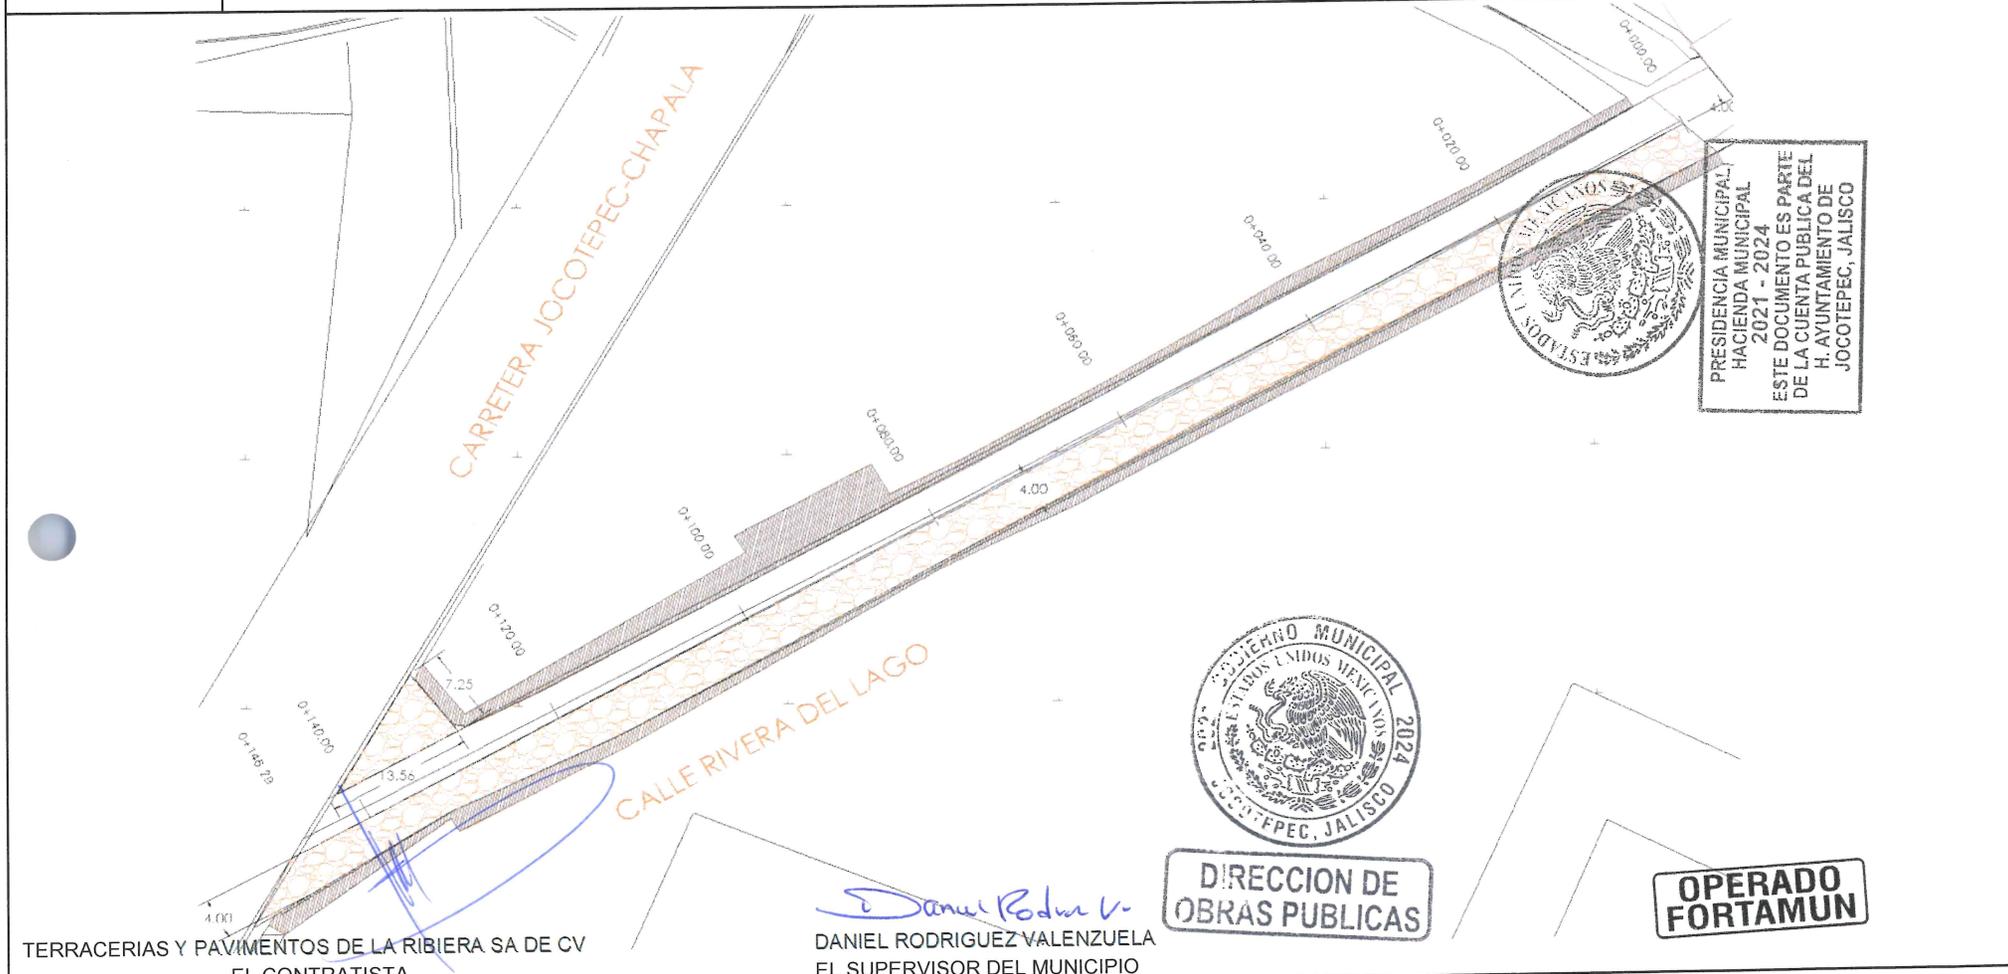

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 JOCOTEPEC, JALISCO



**DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS**

**OPERADO  
FORTAMUN**

  
 DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV  
EL CONTRATISTA



EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV	FECHA:	29 DE JULIO DE 2024
OBRA:	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		

LOCALIDAD:	LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	<b>GENERADOR</b>

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLE RIVERA DEL LAGO		BANQUETAS
JOCO-015	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL DE LA REGION CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 2.00 M. A PARTIR DE N.P.T., INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR EL PERIODO DE LA OBRA, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	FOTOGRAFÍA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
2021 - 2024  
ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
JOCOTEPEC, JALISCO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

**OPERADO  
FORTAMUN**

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV	FECHA:	29 DE JULIO DE 2024
OBRA:	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.		

LOCALIDAD:	LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	<b>GENERADOR</b>

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLE RIVERA DEL LAGO		BANQUETAS
JOCO-014	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL DE LA REGION CON UNA ALTURA MINIMA DE 2.00 M. A PARTIR DE N.P.T., INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR EL PERIODO DE LA OBRA, FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	CROQUIS

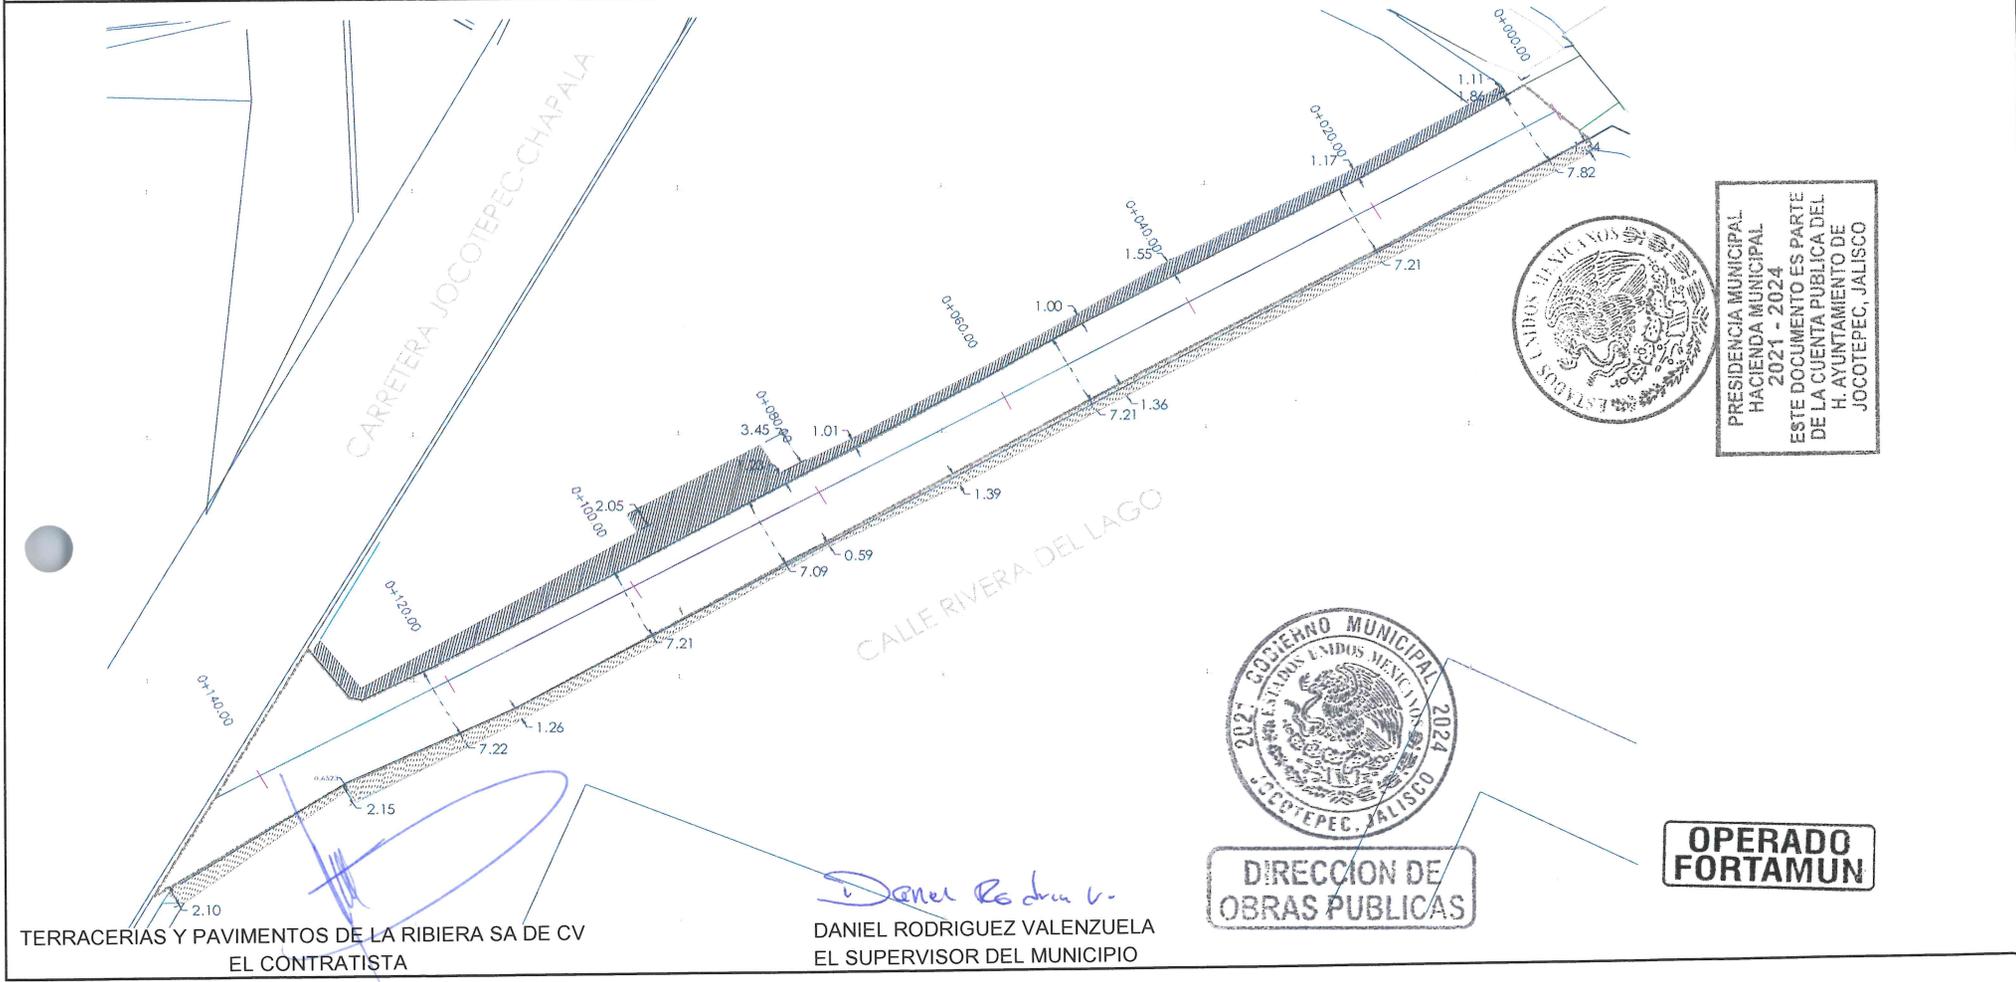

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA SA DE CV  
 EL CONTRATISTA

*Daniel Rodriguez v.*  
 DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 JOCOTEPEC, JALISCO

**OPERADO  
 FORTAMUN**

JOCOTEPEC, JALISCO A 12 DE JULIO DE 2024.

Solicitud de convenio

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
P R E S E N T E


Me refiero al contrato No. **GMJ 023C- OP/2024**, relativo a **REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.**

Sobre el particular y en recorrido de obra se observa que al tener nuevo alineamiento y por tanto nuevo ancho de superficie de rodamiento se han generado volúmenes adicionales de los conceptos de obra. Además que se han recuperado áreas que estaban fuera del proyecto y se están integrando a la nueva vialidad.

De lo cual le hago la solicitud de convenio adicional en monto por un importe de **\$ 296,299.66 (doscientos noventa y seis mil doscientos noventa y nueve pesos 66/100 m.n.)**, por las razones arriba mencionadas.

Sin otro particular pongo a su consideración el anterior.

**ATENTAMENTE**  
ING. SERGIO CABRERA



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS  
2021 - 2024

12 JUL. 2024

**RECIBIDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JOCOTEPEC, JAL.

JOCOTEPEC, JALISCO A 22 DE JULIO DE 2024.

Solicitud de prórroga.

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
P R E S E N T E


Me refiero al contrato No. **GMJ 023C- OP/2024**, relativo a **REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.**

Sobre el particular y en recorrido de obra se observa que al tener nuevo alineamiento y por tanto nuevo ancho de superficie de rodamiento se han generado volúmenes adicionales de los conceptos de obra. Además que se han recuperado áreas que estaban fuera del proyecto y se están integrando a la nueva vialidad.

De lo cual le hago la solicitud de prórroga en tiempo por **5 (cinco) días naturales del 25 al 29 de Julio de 2024**, por las razones arriba mencionadas.

Sin otro particular pongo a su consideración el anterior.

**ATENTAMENTE**  
ING. SERGIO CABRERA



TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS  
2021 - 2024

22 JUL. 2024

**RECIBIDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JOCOTEPEC, JAL.

JOCOTEPEC, JALISCO A 15 DE JULIO DE 2024.

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.  
 PRESENTE:

Yo C. Sergio Cabrera, representante legal de la empresa TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., le hago la solicitud de volúmenes adicionales para la ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO de la obra: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC.; que a continuación se enlistan:

VOLUEMENS ADICIONALES					
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLE RIVERA DEL LAGO</b>					
<b>B</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
JOCO-008	EMPEDRADO CON CONCRETO HIDRAULICO 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	145.92	\$507.18	\$74,007.71
				<b>SUMA</b>	<b>\$ 74,007.71</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$ 11,841.23</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 85,848.94</b>

Sin otro particular pongo a su consideración el anterior.

ATENTAMENTE  
 ING. SERGIO CABRERA

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.  
 NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FISICA.



DIRECCION DE  
 OBRAS PUBLICAS  
 2021 - 2024

15 JUL. 2024 *Briana G.R.*

**RECIBIDO**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 JOCOTEPEC, JAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 JOCOTEPEC, JALISCO

**OPERADO  
 FORTAMUN**



Dirección de obras públicas.  
Oficio: 763-A/ 2024  
ADM. 2021-2024  
Jocotepec Jalisco, a 15 de julio del 2024

Ing. Sergio Cabrera.  
Terracerías y pavimentos de la Riviera S.A. de C.V.

PRESENTE:


Asunto: Autorización de volumen excedente

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a su solicitud recibida el día 15 de julio del 2024, el cual se autoriza el volumen excedente de la obra: "Rehabilitación de superficie de rodamiento en calle Rivera del lago entre andador Xochitl y carretera Jocotepec Chapala" en la localidad de Nextipac, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Con contrato: GMJ 023C-OP/2024.

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
JOCO-001	Empedrado con concreto hidráulico 20 cms de espesor con material de banco incluye; materiales, mano de obra, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	152.44	\$ 507.18	\$ 74,007.71
				Suma	\$ 74,007.71
				I.V.A.	\$ 11,841.23
				Total	\$ 85,848.94

Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido enviándole un saludo.

Atentamente:

  
C. Imelda Karina Pérez González  
Directora de Obras Públicas



**DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS**

*Recibi original  
15 Julio 2024*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
2021 - 2024  
ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
JOCOTEPEC, JALISCO

**OPERADO  
FORTAMUN**
