



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 0627/2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **ALSERCON, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de; **\$159,485.64 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 64/100 M.N.)** por concepto de **ESTIMACIÓN 02 y FINIQUITO**, del programa **FAIS RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6151-2-25.2-050-301

Contrato: No GMJ 010C- OP/2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
271	17/06/2024	\$138,125.03	\$160,225.03	\$739.40	\$159,485.64

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 02 y Finiquito
4. Copia Convenio Modificadorio
5. Fianza Vicios Ocultos
6. Minuta Término de Obra
7. Acta Entrega Recepción
8. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.



HACIENDA
MUNICIPAL
2021 - 2024

27 JUN. 2024

RECIBIDO

GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE
JOCOTEPEC, JAL., A 17 DE JUNIO DE 2024
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p. Archivo
D.O.P./cvch

Hidalgo Sur No.6, Colonia Centro Jocotepec, Jalisco.
C.P. 45800 Telefonos: 01 (387) 76 3 19 19 / 76 3 00 74



ALSERCON
ALS040828T32
Régimen Fiscal 626
Régimen Simplificado de
Confianza

Factura
Serie Folio 271
Tipo de Comprobante I - Ingreso
Lugar de Expedición 45655
Fecha de Expedición 17/6/2024 13:44:25

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	MJJ850101KP8
CLIENTE	R.F.C.
Palacio Municipal No. S/N	Jocotepec Centro
DOMICILIO	COLONIA
Jocotepec	Jalisco
México	45800
CIUDAD	ESTADO
PAÍS	C.P.
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
REGIMEN FISCAL DEL CLIENTE	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	Unidad de Medida: SERVICIOS E48 Unidad de servicio 72141107 Servicio de construcción y reparación de puentes SERVICIO PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA: "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. CONTRATO No. GMJ 010C-OP/2024 PROGRAMA FAM RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2024. FIANZA DE CUMPLIMIENTO 087425-00000 FIANZA DE ANTICIPO 087416-00000 RETENCION 5 AL MILITAR (R.I.V. SEFUPU) \$739.40 NETO A PAGAR \$159,485.64	138,125.03	138,125.03
Impuestos Traslados: Tipo de Impuesto 002 - IVA Tipo de Factor Tasa Tasa de Impuesto 0.160000 Importe del Impuesto 22,100.00			

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 03/100 M.N.

SUBTOTAL: 138,125.03
IVA TRASLADADO: 22,100.00
TOTAL: 160,225.03



Este Documento es una
Representación Impresa de un CFDI

Folio Fiscal: E27A3ED0-035F-4427-A8AB-67FBEC2ADB03
Serie Certificado del SAT: 00001000000505142236
Serie Certificado del Emisor: 00001000000508610421
Fecha y Hora de Certificación: Junio 17 2024 - 13:44:29
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Número Cuenta de Pago:
Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.0000
Uso del CFDI: G03 Gastos en general.
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:
Versión CFDI: 4.0



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Sello Digital del CFDI
TJLROSXQDPFETkHjXWcWmYHpKqAcYXZwbzSawrVEl4h9FoObGsvYkiRdx8D5bN1mR7o1vWvANAGokh0HWRhKSP MksvIUUBvrQzcnt3w+i1bjmSo9X1ST8I4M1awA7Rce0AFkS+8IF7BZ5/olQE3Z8E3w4YwE3dqmHmMnyL3O5Gn3 eHLuTb3yWTZ+E3+3BGRhXhSSXQ/yOBRX+kou3gdLxhMd1vM26Q9igLDHpb91Nkhc2FDLDxOe/pdz2EAnJ6L uktUxRTeffdyQwBW37yK+gflIHQc/XONUJaK1MFX7u9RV6Tg35d1+e2VJAwAkpirDhmzT7Q2TIGNFkgurQ==

Sello del SAT
g4NZHglPwXZ85ZnmJi1qYlJM3oxK/gnKnKyyECaX59wC3tV+yRMw2zAsCqjdKTAJsm4jc5z156Kr3cg isuqVdksyWA7X7D5SeWk23YQECiAW6HMHGAZhpGsmlelhDJRIE+3x3OXF5KOa4cZA2a7l0SOLDRqsE DSJUpi2laxylKyHxOfzHwBwk8VY39PwDzghY47poP1s5xo/3md67HBKoBc/dLIXOZArMTkvawJueSNX hfvBtTIKXx+rYcxqy/UJISKEqM22rqvLlW0n5Uz71h95d5IltSOHdu7Feqk5AJAlmJzUxhH7+Hmf5e OI6yEBwnkSOMuMu7Jiz8CQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1.1 E27A3ED0-035F-4427-A8AB-67FBEC2ADB03 2024-06-17T13:44:29 MAS0310247C0 TJLR OSKXQDPFETkHjXWcWmYHpKqAcYXZwbzSawrVEl4h9FoObGsvYkiRdx8D5bN1mR7o1vWvANAGokh0HWRhK 8PMksvIUUBvrQzcnt3w+i1bjmSo9X1ST8I4M1awA7Rce0AFkS+8IF7BZ5/olQE3Z8E3w4YwE3dqmHmMnyL3O5Gn3 eHLuTb3yWTZ+E3+3BGRhXhSSXQ/yOBRX+kou3gdLxhMd1vM26Q9igLDHpb91Nkhc2FDLDxOe/pdz2EAnJ6L uktUxRTeffdyQwBW37yK+gflIHQc/XONUJaK1MFX7u9RV6Tg35d1+e2VJAwAkpirDhmzT7Q2TIGNFkgurQ==

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="271"
Fecha="2024-06-17T13:44:25"
Sello="TjLR0SKXQDPFETHKJxWcWmYHpKqAcyXZwbzSawrVE14h9FoObGsvYkiRdx8D5bN1mR7o1vwANAGo
kh0HWRhK8PMksvIUUBvrQzcnt3w+i1bjmSo9X1ST8I4M1awA7Rce0AFkS+81F7BZ5/oLQE3Z8E3w4YwE3dq
mHmMnyL305Gn3eHLuTb3yWTZ+E8+38GRhxHSSxQ/yOBrX+kou3gdLxhMd1ivM26Q9igLDHpbg91Nkhec2fD
LDxOe/pdz2EAnJ6LukTFuXRTEfFdyQwBW37yK+gFLiHqC/X0NUJAK1MfX7u9RV6Tg35d1+e2VJAwAkpirdh
mzxT7Q2TIGNFkgurQ==" FormaPago="03" NoCertificado="00001000000508610421"
Certificado="MIIF2jCCA8KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg2MTA0MjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUGQURNS
U5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0B
CQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECwdQVYyIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4
gR1VFU1JFUK8x0dJAMBGNVBBEMBTAMZAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZMBCGA1UECAwQQ00LVREFEIERFIE1FWE
1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE
01yZXNwb25zZWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1Mg
QUwgQ090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMTA4MTQxOTQ0NTFAw0yNTA4MTQxOTQ0NTFAmIGoMR0wGAYDVQQDExF
BTFNFUKNPTiBTQSBERSDVjEaMBGGA1UEKRMQUxTRVJDT04gU0EgREUGQ1YxGjAYBgNVBAoTEUFMU0VSQ0
90IFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxBTFMwNDA4MjhmZjUyY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECwdQVYyIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4
yBTQVRBNjgwMzA5SE1OT1JSMDCxZAJBgNVBAStAKZDZMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
AQEAjZaISY9nShlN7KbyZQb41TVSGKnGuakI44m28TkC8avS4hV2dF4xDC2MrGhY+qnHnOB561BfQdMGwGL
iJBSKbLYU+pznb9YVhoBMWwjmft/LMVYnSwrXwv9/Xro81A0hyQWmWlHkbQ9KmisipgawNCP1+VHhoJNe1
663FDEr7EVf0544UG9+YsSNGXKfuTE95VRVPNkskF0ckFPkYxkgm7uf1RJnNf4VNha5Mu0VIONqZNLs+B8e
cvnzbtUU8czaBzOwfAgpqhD10tiXSxjiwvYUQAYX6Ltzk4i58kLrpxH2d719nMJyIYhEebFguygC+TJHSL
kv7ziqIufCHU3QIDAQABox0wGzAMBGNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAO
CAGEAH0SD9whQgv88qjU2Wpf7ogMSuPBr+fZXCz01+EVdZAZ4nRx5XQOXcqzFWHe0WwJYUCWrtuv1kZFAq4
vBpGmxszW74x3uKoJhTe4+XibamD7Xn9Sm42NkN7gSNvRnUvUvVozC95dhHJjNUYBVA6w5YdJyoZrtIfyoam
JtPxOU4mSUujKDS4yOca6PQB1e+9/JXHks9lcTuid/SQgAYESob7fJGdN7Kxn1Ggd4jcVW0WmoBe+cTrnu8
oERAKgsExc4stZ/AMS2+Ds3yqfEemqLbk7w5ulGZJowXkkLR/gjP08TaGuzlXZTVGONWWEvj3o1K80UxC2
40HxWKRuzF3660kYnfnzZ9NadnHvTpQOE5a+AwLHAFbiqC04ewKbFziJd3a88p2UVn/BK7jWVek8j3Uf3Ag
LAXQQ2MOIY141B96kscgm1VLTzxjXs0aFYZBmnNoyuwilG3qHXmG2wRtTT5A5ychZpdkbEuc1C53WyeQ
JWkyI1SeTTXaiY5ZtFagv1ZWLI6C7ChjssQeEpD1jJuNiMQ7cFqJ+1Jp4cJvR5g0xKFD8A3jjGCwTShNLB5
wQfgLzWt6u57ka2R7KqTnTS3SKbetPgKdx/TVv8b03jxcRMGMAYelsEmvi8HLkoWp+oOLklTHix9qUBJyY4
lm1ByEHZLULxEsvzbhuD812w=" SubTotal="138125.03" Moneda="MXN" Total="160225.03"
TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45655">
 <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="ALS040828T32"
Nombre="ALSERCON"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8" Nombre="MUNICIPIO
DE JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141107" ClaveUnidad="548"
Cantidad="1" Unidad="SERVICIOS" NoIdentificacion="106" Descripcion="Servicio de
construcción y reparación de puentes SERVICIO PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA
OBRA PUBLICA:
"CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD" EN
LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
"CONTRATO
No. GMJ 010C-OP/2024
"PROGRAMA FAM RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2024.
"FIANZA DE
CUMPLIMIENTO 087425-00000
"FIANZA DE ANTICIPO 087416-00000
"RETENCION 5 AL
MILITAR (R.I.V. SEFUPU) \$739.40
"NETO A PAGAR \$159,485.64"
ValorUnitario="138125.03" Importe="138125.03"

ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="138125.03"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="22100.00"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Concep
tos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="22100.00"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="22100.00"
Base="138125.03"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFi
scalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
UUID="E27A3ED0-035F-4427-A8AB-67FBEC2ADB03" FechaTimbrado="2024-06-17T13:44:29"
RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="TjLROskXQDPFETHkJxWcWmYHpKqAcyXZwbzSawrVEl4h9FoObGsvYkiRdx8D5bN1mR7o1vwAN
AGokh0HWRhK8PMksvIUUBvrQzcnt3w+i1bjmSo9X1ST8I4M1awA7Rce0AFkS+8lF7BZ5/oLQE3Z8E3w4YwE
3dqmHmMnyL305Gn3eHLuTb3yWTZ+E8+38GRhxHSSxQ/yOBrX+kou3gdLxhMd1ivM26Q9igLDHpbg91Nkhec
2fDLdxOe/pdz2EAnJ6LukTfUxRTefFdyQwBW37yK+gFLiHQc/X0NUJaK1MfX7u9RV6Tg35d1+e2VJAwAkpi
rdhmzxT7Q2TIGNFkgurQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="g4NZHgJPwXZ85zJnmJi1qYIjM3oxK/gnKnKyyECaX59wC3tV+yRMw2zAsCqjdKTAjsm4jc5z1
56Kr3cgisuqVdkSyWA7X7D8SeWk23YQeciAW6HMHGaAZhOPgsmIelhdJRlE+3x30XF5K0a4cZA2a7l080LD
rqsED8jUpi2Iaxy1KyHx0frzHwBwk8VY39PwDzghY47poP1s5xo/3md67HBKoBC/dLIXOZArMTkvawJueSN
XhfVBtTiKXx+rYcxqu/UJlSkEqM22rqvVlLw0nSUz71h95d5IItSOHdu7Feqk5Aja1mJz1UxhH7+Hmf5e0l
6yEBwnkSOMmu7JizJ8QQ==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>






Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ALS040828T32	ALSERCON	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E27A3ED0-035F-4427-A8AB-67FBEC2ADB03	2024-06-17T13:44:25	2024-06-17T13:44:29	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160,225.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No. 2 DOS Y FINIQUITO
PERÍODO: DEL 13 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024
OBRA : CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD

UBICACIÓN : ZAPOTITAN DE HIDALGO
CONTRATISTA : ALSERCON S.A. DE C.V.
FECHA: 06/05/2024

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL													
1	Estructura metalica (vigas I.P.R. 21"x 6 1/2" 74.40 kg/m) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta	Kg	3,571.20	3,571.20	0.00	3,571.20	0.00	\$ 83.38	\$297,766.66	\$ 297,766.66	0.00	297,766.66	\$0.00
2	Estructura metalica (perfiles P.T.R. 2 1/2" x 2 1/2" 3.67 kg/m) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta	Kg	146.80	146.80	0.00	146.80	0.00	\$ 83.38	\$12,240.18	\$ 12,240.18	0.00	12,240.18	\$0.00
3	Estructura metalica (vigas I.P.S. 4" 11.46 kg/m) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta	Kg	573.00	573.00	0.00	573.00	0.00	\$ 83.38	\$47,776.74	\$ 47,776.74	0.00	47,776.74	\$0.00
4	losa acero seccion 4 de 0.95 x6.10 mts calibre 22 con 3 conectores a base de canal 3" de 7.5 cm de longitud soldados en los apoyos de la lamina, incluye: suministro de los materiales, cortes, traslapes y desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	Pza	21.00	9.00	7.00	16.00	5.00	\$ 3,300.00	\$69,300.00	\$ 29,700.00	23,100.00	52,800.00	\$16,500.00
5	Losa de concreto de 16 cms de espesor en el valle, 8 cms en la cresta. concreto F'c= 200 kg/cm2, T.M.A. 3/4", acabado escobillado, incluye: colado, juntas con volteador a cada 1.5 m. curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	43.20	45.60	42.56	88.16	-44.96	\$ 464.99	\$20,087.57	\$ 21,203.54	19,789.97	40,993.52	-\$20,905.95
6	Malla electrosoldada 66-88 (5.22 kg/m2), en losas incluye materiales, desperdicio, mano de obra y herramienta.	M2	43.20	45.60	42.56	88.16	-44.96	\$ 82.40	\$3,559.68	\$ 3,757.44	3,506.94	7,264.38	-\$3,704.70
7	Estructura metalica (canal monten) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta	Kg	182.40	182.40	0.00	182.4000	0.00	\$ 58.61	\$10,690.46	\$ 10,690.46	0.00	10,690.46	\$0.00
8	Perfil zintro (pasamanos) cal 20 litame de 6.61 kg/pza. incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta	Pza	8.00	8.00	0.00	8.0000	0.0000	\$ 925.00	\$7,400.00	\$ 7,400.00	0.00	7,400.00	\$0.00
9	Estructura metalica (perfiles P.T.R. 2 1/2" x 2 1/2" 3.67 kg/m) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta	Kg	34.40	34.40	0.00	34.4000	0.00	\$ 65.03	\$2,237.03	\$ 2,237.03	0.00	2,237.03	\$0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Firma]


[Firma]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 2 DOS Y FINIQUITO
PERÍODO: DEL 13 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024
OBRA : CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD
UBICACIÓN : ZAPOTITAN DE HIDALGO
CONTRATISTA : ALSERCON S.A. DE C.V.
FECHA: 06/05/2024


ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
10	Perfil comercial redondo de 1/2"x 0.994 kg/m incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta	Kg	226.63	247.22	0.00	247.2200	-20.59	\$ 65.03	\$14,737.75	\$ 16,076.72	0.00	16,076.72	-\$1,338.97
11	Solera 1/4" x 1" 1.276 kg/m incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta	Kg	61.25	129.41	0.00	129.4100	-68.16	\$ 65.03	\$3,983.09	\$ 8,415.53	0.00	8,415.53	-\$4,432.44
1 CONVENIO ADICIONAL	Estructura metálica para rampas y soportes de vigas (PTR 4", canal 4" y 6") incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	kg	0.00	0.00	1,008.94	1,008.9400	-1,008.94	\$ 83.38	\$0.00	\$ -	84,125.42	84,125.42	-\$84,125.42
2 CONVENIO ADICIONAL	Suministro, fabricación y colocación de barandal peatonal para rampas de acceso a base de herrería estructural con perfil redondo de 3/4" a 1 1/2", incluye: cortes, soldadura, taladros, pintura de taller, ajustes y detalles realizados en obra de acuerdo a lo construido, acarreo, materiales, desperdicios, herramientas y equipo necesarias, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	0.00	0.00	266.91	266.9100	-266.91	\$ 65.03	\$0.00	\$ -	17,357.16	17,357.16	-\$17,357.16
								SUMA	\$ 489,779.16	\$ -	\$ 147,879.49	\$ 605,143.80	\$ -
								IVA	\$ 78,364.67	\$ -	\$ 23,660.72	\$ 96,823.01	\$ -
								TOTAL	\$ 568,143.83	\$ -	\$ 171,540.21	\$ 701,966.81	-\$ 115,364.64
 ING. ARMANDO SANTOS TORRES REPRESENTANTE LEGAL								 ARQ. JAIME CONDE GOMEZ SUPERVISOR DEL MUNICIPIO					
								 C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS					



GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 010C-OP/2024	CONTRATISTA:				
OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO	TRABAJO:	GENERADOR:	1	EST.	2 Y FINQ
		PERIODO:	DEL 13 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	RAMPA	LONG			PZAS		TOTAL
4	losa acero seccion 4 de 0.95 x6.10 mts calibre 22 con 3 conectores a base de canal 3" de 7.5 cm de longitud soldados en los apoyos de la lamina, incluye: suministro de los materiales, cortes, traslapes y desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.		#						
		RAMPA RECTA	2	6.00			2		2.00
		RAMPA RECTA INICIO	1	9.00			3		3.00
		RAMPA CONECTA PUENTE	1	5.90			2		2.00
									TOTAL


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL





DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


GENERADOR DE OBRA (CROQUIS)

CONTRATO:	GMJ 010C-OP/2024	CONTRATISTA:				
OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD		TRABAJO:	GENERADOR:	1	EST.
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO	PERIODO:	DEL 13 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.			

CLAVE	CONCEPTO								
4	losa acero seccion 4 de 0.95 x6.10 mts calibre 22 con 3 conectores a base de canal 3" de 7.5 cm de longitud soldados en los apoyos de la lamina, incluye: suministro de los materiales, cortes, traslapes y desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	 RAMPA 2	 RAMPA 1	 VISTA COMPLETA PUENTE					

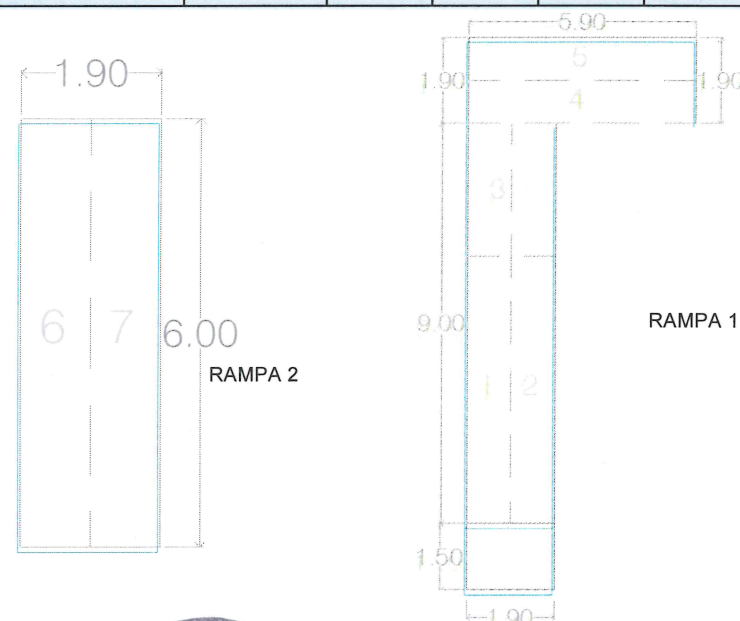

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL





ARQ. JAIME CONDE GÓMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GENERADOR DE OBRA (CROQUIS)

CONTRATO:	GMJ 010C-OP/2024	CONTRATISTA:				
OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO	TRABAJO:	GENERADOR:	2	EST.	2 Y FINQ
		PERIODO:	DEL 13 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.			

CLAVE	CONCEPTO								
5	Losa de concreto de 16 cms de espesor en el valle, 8 cms en la cresta. concreto F'c= 200 kg/cm2, T.M.A. 3/4", acabado escobillado, incluye: colado, juntas con volteador a cada 1.5 m. curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.								


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL






ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 010C-OP/2024	CONTRATISTA:				
OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO	TRABAJO:	GENERADOR:	3	EST.	2 Y FINQ
		PERIODO:	DEL 13 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.			

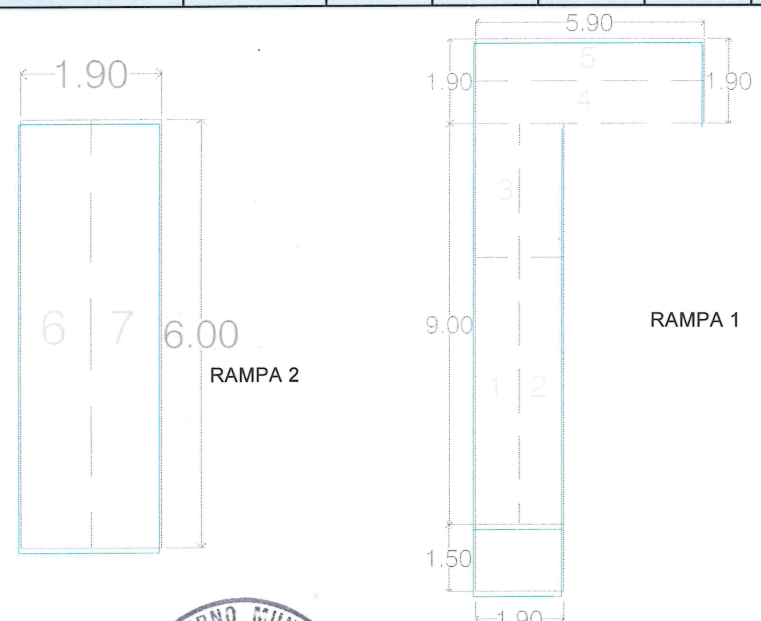
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LONG	ANCHO				TOTAL
6	Malla electrosoldada 66-88 (5.22 kg/m2), en losas incluye materiales, desperdicio, mano de obra y herramienta.	RAMPA RECTA	NORTE	6.00	1.90				11.40
		RAMPA RECTA INICIO	SUR	9.00	1.90				17.10
		RAMPA CONECTA PUENTE	SUR	5.90	1.90				11.21
		ARRANQUE RAMPA	SUR	1.50	1.90				2.85
		TOTAL							


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

GENERADOR DE OBRA (CROQUIS)

CONTRATO:	GMJ 010C-OP/2024	CONTRATISTA:				
OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO	TRABAJO:	GENERADOR:	3	EST.	2 Y FINQ
		PERIODO:	DEL 13 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.			

CLAVE	CONCEPTO									
6	Malla electrosoldada 66-88 (5.22 kg/m2), en losas incluye materiales, desperdicio, mano de obra y herramienta.	 RAMPA 2 RAMPA 1								


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 010C-OP/2024	CONTRATISTA:				
OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO	TRABAJO:	GENERADOR:	10	EST.	2 Y FINQ
		PERIODO:	DEL 13 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	UBICACIÓN	CANT	LONG	KG/MT	ANCHO	TOTAL
1 CONVENIO ADICIONAL	Estructura metálica para rampas y soportes de vigas (PTR 4", canal 4" y 6") incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.	CANAL 6 (15.63)	RAMPA SUR	2.00	6.00	15.63		187.56
			RAMPA NORTE	2.00	9.000	15.63		281.34
			RAMPA NORTE	1.00	3.000	15.63		46.89
			RAMPA NORTE	1.00	1.30	15.63		20.32
			RAMPA NORTE	1.00	1.90	15.63		29.70
			RAMPA NORTE	1.00	0.64	15.63		10.00
			NORTE	1	0.35	15.63		5.47
		ATIESADOR ENTRE VIGA 21"		3	1.35	15.63		63.30
								0.00
		CANAL 4" (8.49)	SUR	5.00	1.9	6.69		63.56
			NORTE	10	1.9	6.69		127.11
			NORTE	1	2.3	6.69		15.39
			NORTE	1	0.65	6.69		4.35
		PTR 8X8"	EXT NORTE	2	0.25	56.09		28.05
		TUBO 8" CED 40	EXT SUR	2	0.3	42.65		25.59
		PTR 3X3" CAL 11	RAMPA N.	2	1.8	7.11		25.60
				2	1.4	7.11		19.91
				1	0.7	7.11		4.98
				1	1	7.11		7.11
				1	1.4	7.11		9.95
		PTR 2X2 BARANDAL	PUENTE	1	1.25	4.71		5.89
		PLACA 3/4"	EXT. PUENTE	2	0.3	149.4	0.3	26.89
								1008.94

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO:	GMJ 010C-OP/2024	CONTRATISTA:				
OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO	TRABAJO:	GENERADOR:		EST.	2 Y FINQ
		PERIODO:	DEL 13 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	UBICACIÓN	CANT	LONG	KG/M			TOTAL
2 CONVENIO ADICIONAL	Suministro, fabricación y colocación de barandal peatonal para rampas de acceso a base de herrería estructural con perfil redondo de 3/4" a 1 1/2", incluye: cortes, soldadura, taladros, pintura de taller, ajustes y detalles realizados en obra de acuerdo a lo construido, acarreos, materiales, desperdicios, herramientas y equipo necesarias, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	TUBERIA 1 1/2" CED 30							
		RAMPA NORTE	PASAMANOS	2.00	6.00	3.07			36.84
		RAMPA SUR	PASAMANOS	2.00	9.000	3.07			55.26
		RAMPA SUR	PASAMANOS	1.00	1.90	3.07			5.83
				1.00	3.00	3.07			9.21
				1.00	1.3	3.07			3.99
				1.00	1.9	3.07			5.83
		TUBERIA 1" CED 30							
		RAMPA NORTE	POSTES	8.00	1.25	1.80			18.00
		RAMPA SUR	POSTES	18.00	1.25	1.80			40.50
		TUBERIA 3/4" CED 30							
			INTERMEDIO	4	6	1.20			28.80
			INTERMEDIO	4	9	1.20			43.20
			INTERMEDIO	2	3	1.20			7.20
			INTERMEDIO	2	1.3	1.20			3.12
			INTERMEDIO	2	1.9	1.20			4.56
				2	1.9	1.20			4.56
									266.91

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL




ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GENERADOR DE OBRA (FOTOGRAFIAS)

CONTRATO:	GMJ 010C-OP/2024	CONTRATISTA:				
OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD					
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO	TRABAJO:	GENERADOR:	11	EST.	2 Y FINQ
		PERIODO:	DEL 13 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.			

CLAVE	CONCEPTO										
2 CONVENIO ADICIONAL	Suministro, fabricación y colocación de barandal peatonal para rampas de acceso a base de herrería estructural con perfil redondo de 3/4" a 1 1/2", incluye: cortes, soldadura, taladros, pintura de taller, ajustes y detalles realizados en obra de acuerdo a lo construido, acarreos, materiales, desperdicios, herramientas y equipo necesarias, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución.										
											


ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
