



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 1118/2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **VICTOR SAUL RAMOS MORALES**, por la cantidad de; **\$876,802.24 (Ochocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Dos Pesos 24/100 M.N.)** por concepto de **ESTIMACIÓN 02 y FINIQUITO**, del programa **CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6231-2-11.1-050-413

Contrato: CSS-OP-CC-012/2024

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
516	11/09/2024	\$ 759,136.14	\$880,597.92	\$3,795.68	\$876,802.24

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 2 Finiquito
4. Fianza de Vicios Ocultos
5. Minuta de Terminación de obra
6. Acta de Entrega - Recepción
7. Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.



HACIENDA
MUNICIPAL
2021 - 2024

13 SEP. 2024

RECIBIDO

GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE

JOCOTEPEC, JAL., A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"



C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

VICTOR SAUL RAMOS MORALES

RFC: RAMV630428122

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45800
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 516
Fecha: 11/9/2024 14:42:42

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: Palacio Municipal No. SN, Jocotepec Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 -	72152800 -	SERVICIO DE PERFORACION PAGO ESTIMACION NO. 02 (DOS FINIQUITO) RELATIVO AL CONTRATO N° CSS-OP-CC- 012/2024, DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: "PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZALEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$3,795.68 NETO A PAGAR \$876,802.24	759,136.14000	0.00	002 - IVA - 121,461.78	759,136.14

Importe con letra:
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.

Subtotal: 759,136.14
Impuestos Traslados: 121,461.78
Total: 880,597.92

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000707122248
Folio fiscal: CBDA0808-00D6-4C13-810E-21E9DD75E26A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Septiembre 11 2024 - 14:42:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iO8mGls5sF5rFPD35/SLGSL9kR33ZSF5ydlizwqDbc+ulvUCS2i4kBUflqgrt5bdNEgqB3xeYH0cHiA9IJar
kD+icJ3PB6ASLHhL+ag7uHopHajddOIW9VO7qNdS1AX/QYUNCU2F67tISIUMdY2xqBldMDeehPz+Vvd4r3shd
KREqPRAUe3ZFnhpiMpglajq7UFA11NQVwGbu+ivlpjaUwUU7WgT2/BKeHggOQGhbwNOTtK0In2iefbKZafeAS
vdoAxng9l+BrNUG6mWzi3Xp0577avIXOZZxadMnULD1+QkLnD/+ukb3MyK8Ldg9STdG39h5wGXsRNOFmz5g==

Sello del SAT

IutmGhoX2Bdfds0tQrD946XsUUBJr826rRVQ6036pUE7x9Ywc4PG8Buj1AotRCYWWvHPQwdmLiGrD1q
Ho2gMdVGso7UysES4KxddPoBZY5Q1MRjtVHbYUOAhsI9IZh4IBDsB+yKwEr++UCOPbpqLX1+BYIS2u7t
EqjGp1/8mqUck/NziUByUEDVcXK86FBZ810BSpnH5Fe3jRZeW/HZcr8esAR7yPrxXS3xAqKrW9rFQEk
zonvAlf4DjpThW/iOECCPOBpq1aCb302bFxFh4zUYEA9G7EYDuoWQ/dGzdyMAz+nff3LP0eJWtHE1a9CA
f+ukyKTKXcIGI105zOWDlQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CBDA0808-00D6-4C13-810E-21E9DD75E26A|2024-09-11T14:42:46|MAS0810247C0|iO8m
Gls5sF5rFPD35/SLGSL9kR33ZSF5ydlizwqDbc+ulvUCS2i4kBUflqgrt5bdNEgqB3xeYH0cHiA9IJ
aRkD+icJ3PB6ASLHhL+ag7uHopHajddOIW9VO7qNdS1AX/QYUNCU2F67tISIUMdY2xqBldMDeehPz+V
vd4r3shdKREqPRAUe3ZFnhpiMpglajq7UFA11NQVwGbu+ivlpjaUwUU7WgT2/BKeHggOQGhbwNOTtK0
In2iefbKZafeASvdoAxng9l+BrNUG6mWzi3Xp0577avIXOZZxadMnULD1+QkLnD/+ukb3MyK8Ldg9STd
G39h5wGXsRNOFmz5g==|00001000000709182898||




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="121461.78"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos></cfdi:Impuestos>
TotalImpuestosTrasladados="121461.78"></cfdi:Traslados></cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="121461.78"
Base="759136.14"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
UUID="CBDA0B08-00D6-4C13-810E-21E9DD75E26A" FechaTimbrado="2024-09-11T14:42:46"
RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="i08mGIssF5rFPD35/5LGSL9kR33ZSF5ydIizwqDbc+uIkvUCS2I4kBUFIqgrrt5bdNEgqB3xeYH0cHiA9IJaRKD+IcJ3PB6ASLHhL+ag7uHopHaJdd0iW9V07qNdS1AX/QYUNCU2F67tISIULMdY2xqBldMDeehPz+Vvd4r3shDKREqPRAuJe3ZFnhpiMpgIajq7UFA11NQVwGbu+iVipjaUwUU7WgT2/BKeHggoQGhbwnOtTKOIn2iefbKZdfeASvdoAxng9l+BrNUG6mWzi3Xp0577avlXOZZxadMnULD1+QkLnD/+ukb3MyK8Ldg9STdG39hI5wGXsRN0Fmz5g==" NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="IutmGhoX2Bfdfs0t0qrD946XsUUBJr826rRVQ6036pUE7x9Ywc4PG8Buj1AotRCYwWvHPQwdmLiGrD1qHo2gMdVGso7UysES4KxddPoBYZ5Q1MRjtVHbYUOAhsi9IZh4IBDsB+yKwEr++UC0PbpqLX1+BY1S2u7tEqjGp1/8mqUck/NziuByUEDVcXK86FBZ810BSpnH5Fe3jRZew/HZcr8esAR7yPrxZXS3xAqKrW9rFQEKzonvAIF4DjpThw/iOECCPOBpq1aCb302bFxH4zUYEA9G7EYDuowQ/dGzdyMAz+nff3LP0eJWtHE1a9CAf+ukyKTKxCiGi105z0WDJQ==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAMV630428122	VICTOR SAUL RAMOS MORALES	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CBDA0B08-00D6-4C13-810E-21E9DD75E26A	2024-09-11T14:42:42	2024-09-11T14:42:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$880,597.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



CALLE NIÑOS HÉROES NÚMERO 159, COLONIA CENTRO EN JOCOTEPEC, JALISCO, C.P. 45800
RAMV630428122.

EL CONTRATISTA	EL DIR.	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
		
C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES		
DEL MUNICIPIO		
		
		Olmedo Navarro

C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES
CALLE NIÑOS HÉROES NÚMERO 159, COLONIA CENTRO EN JOCOTEPEC, JALISCO, C.P. 45800
RAMV630428122.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



ESTIMACIÓN No. **2 (DOS FINIQUITO)**
PERÍODO: **16/05/2024**
OBRA: **"PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO"**

30/06/2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN: **CABECERA MUNICIPAL**
CONTRATISTA: **C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES**
FECHA: **02/07/2024**


ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA														
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA ACTUAL		SALDO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA ANTERIOR	ESTIMACIÓN ACUMULADA ACTUAL	SALDO	
A. PERFORACIÓN SISTEMA DE INYECCIÓN DE TUBERÍA														
JOCO-001	MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 M HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM. INCLUYE: MOVIMIENTOS, TRASLADOS, MANIOBRAS, CARGAS Y DESCARGAS, EQUIPO.	lote	1.00	1.00			\$ 11,500.00	\$ 0.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 526,777.44
JOCO-002	PERFORACIÓN DE POZO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA Y A UNA PROFUNDIDAD DE LOS 0.00 A 250.00 MTS POR EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN PARA ADEME DE POZO DE 20" A 18". INCLUYE: INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA, NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA.	m	250.00	300.00			\$ 11,400.00	-50.00	\$ 2,850,000.00	\$ -	\$ 3,420,000.00	\$ 3,420,000.00	- \$	570,000.00
JOCO-003	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 20"x14" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA.	m	18.00				\$ 4,100.00	18.00	\$ 73,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	73,800.00
JOCO-004	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 14"x14" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA.	m	250.00	230.00			\$ 2,700.00	20.00	\$ 675,000.00	\$ -	\$ 621,000.00	\$ 621,000.00	\$	54,000.00
JOCO-005	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE GRAVA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M3	25.00		43.39	43.39	\$ 4,600.00	-18.39	\$ 115,000.00	\$ 199,577.44	\$ -	\$ 199,577.44	- \$	84,577.44



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTIMACIÓN No.
PERÍODO:
OBRA :

2 (DOS FINIQUITO)
16/05/2024

30/06/2024

"PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO."

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CABECERA MUNICIPAL
C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES
02/07/2024


UBICACIÓN:
CONTRATISTA:
FECHA:

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA											
No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL		ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR		
JOCO-008	24 HORAS DE AFORO, PRUEBA DE BOMBEO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, DE 6" DE DIAMETRO Y HASTA 300.00 MTS. DE LONGITUD HORAS ADICIONALES.	LOTE	1.00		1.00	0.00	\$ 92,000.00	\$	92,000.00	\$	-
B. PRECIOS FUERA DE CATALOGO							\$	-	\$ 467,558.70	\$	467,558.70
EXT-001	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 18"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLOGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCION DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M			18.00	-18.00	\$ 4,008.15	\$	72,146.70	\$	72,146.70
EXT-002	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 12"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLOGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCION DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M			150.00	-150.00	\$ 2,636.08	\$	395,412.00	\$	395,412.00

SUMA \$ 3,817,300.00 \$ 759,136.14 \$ 4,052,500.00 \$ 4,811,636.14 \$ 994,336.14
IVA \$ 610,768.00 \$ 121,461.78 \$ 648,400.00 \$ 769,861.78 \$ 159,093.78
TOTAL \$ 4,428,068.00 \$ 880,597.92 \$ 4,700,900.00 \$ 5,581,497.92 \$ 1,153,429.92

C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


CONTRATISTA:
C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES

GENERADORES DE CONTRATISTA

	TOTAL EJECUTADO
	COBRAR EN ESTA ESTIMACION

Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro

C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO: CSS-OP-02-07/2024

OBRA: PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZALEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.*

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No.

2 (DOS FINIQUITO)

FECHA DE PRESENTACIÓN:

02/07/2024

PERIODO DEL TRABAJO DEL:

16/05/2024

AL:

30/06/2024

CONTRATISTA:


C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES



CROQUIS

SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE GRAVA INCLUYE, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA

JOCO-005

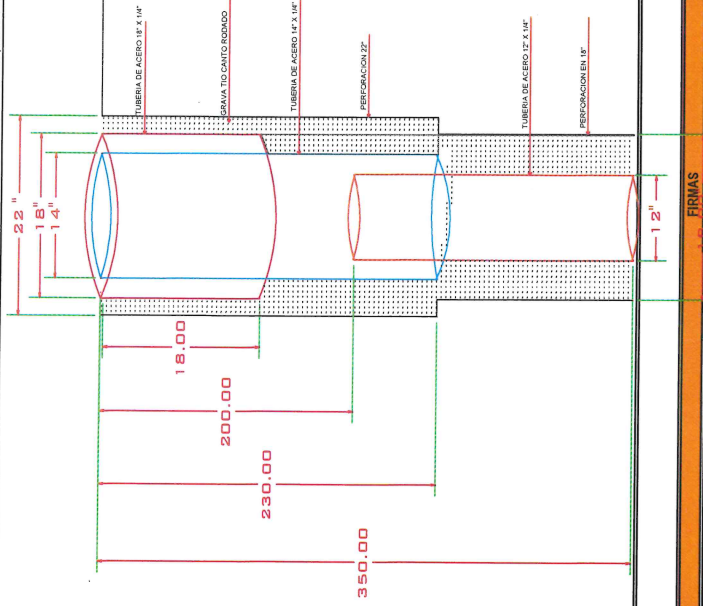


SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Luis Riquelme Ojeda Navarro

CONTRATISTA:

C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO: CSS-OP-CC-012/2024

OBRA: PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML. EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.*

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No.

2 (DOS FINIQUITO)

FECHA DE PRESENTACIÓN:

PERIODO DEL TRABAJO DEL:

AL:

CONTRATISTA:


C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES



IMÁGENES

SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE GRAVA INCLUYE, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA

JOCO-005



FIRMAS

SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA:

Ing. Luis Roberio Olmedo Navarro

C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES

[illegible]

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO: CSS-OP-CC-012/2024

OBRA: PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML. EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.*

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No.

2 (DOS FINIQUITO)

FECHA DE PRESENTACIÓN:

02/07/2024

PERIODO DEL TRABAJO DEL:

16/05/2024

AL:

30/06/2024

CONTRATISTA:



C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES



CROQUIS

JCCC-006

24 HORAS DE AFORO, PRUEBA DE BOMBEO CON BOMBA VERTICAL, TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, DE 6" DE DIAMETRO Y HASTA 300.00 MTS. DE LONGJITUD HORAS ADICIONALES.

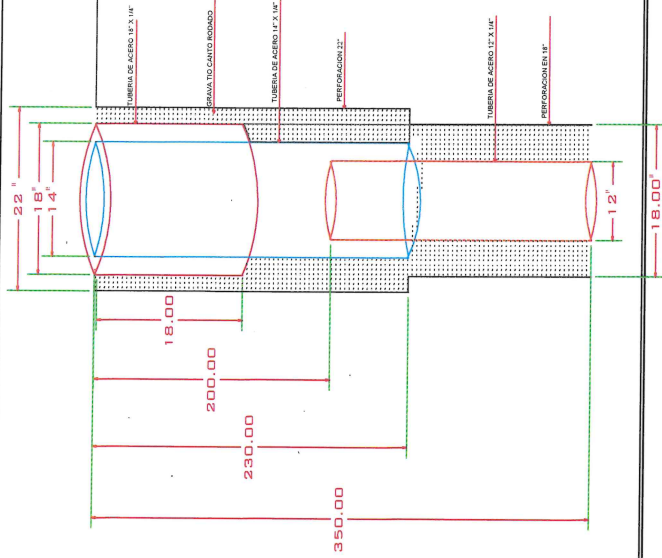

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

FIRMAS

SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA:

Ing. Luis Roberto Olmedo Navarro

C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO: CSS-OP-CC-012/2024

OBRA: PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS FINIQUITO)

FECHA DE PRESENTACIÓN: 02/07/2024
PERIODO DEL TRABAJO DEL: 16/05/2024
AL: 30/06/2024



CONTRATISTA: C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES



IMÁGENES

24 HORAS DE AFORO, PRUEBA DE BOMBEO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE 6" DE DIÁMETRO Y HASTA 300.00 MTS. DE LONGITUD HORAS ADICIONALES.

JOCO-006

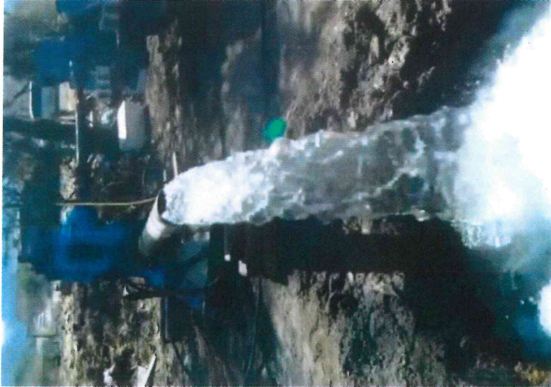

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


FIRMAS

SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA:

Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro

C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES



PERFORACIONES TEPATITLÁN, S.A. DE C.V.

R.F.C. PTE-020712-342

Tel. 378 781 1884 / 715 3181

TERRERITO No. 100 FRACC. INDUSTRIAL LA PUERTA

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Mex.

PROPIEDAD DE: VICTOR SAUL RAMOS MORALES

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

ESTADO JALISCO

ADEME: 12"

NIVEL ESTATICO: 32 MTS.

NIVEL DINAMICO: 149 MTS.

BOMBA: SUMERG. KOR25R1000-13 100 HP

LONG. COLUMNA: 275.20 MTS.

DESCARGA: 4"

DURACION: 24 HRS.

FECHA INICIO: 25/07/2024

F. DE TERMINO: 26/07/2024

FECHA	HORA	NIVEL DINAMICO EN METROS	L.P.S.	RPM	OBSERVACIONES
25-07-24	12:51	32	28	3200	AGUA SUCIA
25-07-24	13:51	33	28	3200	AGUA TURBIA
25-07-24	14:51	34	28	3200	AGUA LIMPIA
25-07-24	15:51	35	27	3200	AGUA LIMPIA
25-07-24	16:51	35	26	3200	AGUA LIMPIA
25-07-24	17:51	35	26	3200	AGUA LIMPIA
25-07-24	18:51	35	26	3200	AGUA LIMPIA
25-07-24	19:51	35	26	3200	AGUA LIMPIA
25-07-24	20:51	35	26	3200	AGUA LIMPIA
25-07-24	21:51	35	26	3200	AGUA LIMPIA
25-07-24	22:51	35	26	3200	AGUA LIMPIA
25-07-24	23:51	35	26	3200	AGUA LIMPIA
26-07-24	00:51	46	26	3200	AGUA LIMPIA
26-07-24	01:51	57	26	3200	AGUA LIMPIA
26-07-24	02:51	68	26	3200	AGUA LIMPIA
26-07-24	03:51	79	26	3200	AGUA LIMPIA
26-07-24	04:51	90	26	3200	AGUA LIMPIA
26-07-24	05:51	101	26	3200	AGUA LIMPIA
26-07-24	06:51	112	26	3200	AGUA LIMPIA
26-07-24	07:51	123	26	3200	AGUA LIMPIA
26-07-24	08:51	134	26	3200	AGUA LIMPIA
26-07-24	09:51	145	26	3200	AGUA LIMPIA
26-07-24	10:51	149	33	3720	AGUA LIMPIA
26-07-24	11:51	149	33	3720	AGUA LIMPIA
26-07-24	12:51	149	33	3720	AGUA LIMPIA

Nota: Se adjunta grafica de aforo.

ATENTAMENTE

ANTONIO MALDONADO GUTIERREZ



PERFORACIONES TEPATITLÁN, S.A. DE C.V.


R.F.C. PTE-020712-342

Tel. 378 781 1884 / 715 3181

TERRERITO No. 100 FRACC. INDUSTRIAL LA PUERTA

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Mex.

GRAFICA DE AFORO

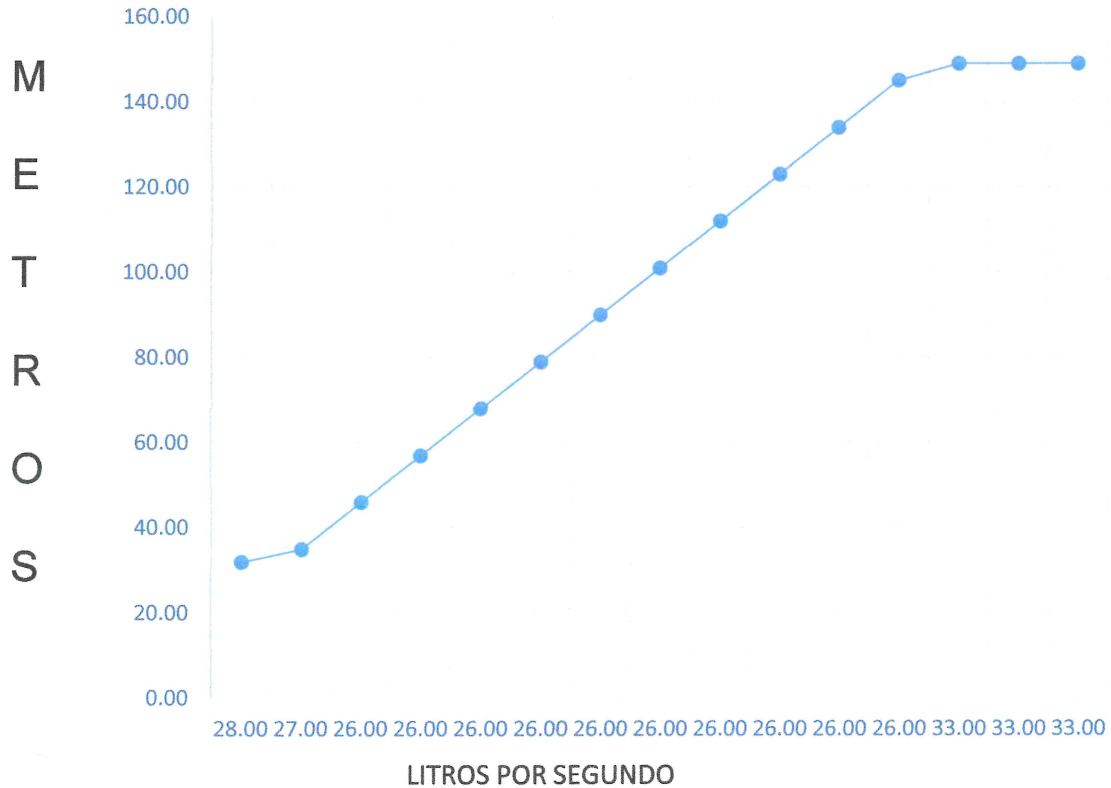



L.P.S	METROS
28.00	32.00
27.00	35.00
26.00	46.00
26.00	57.00
26.00	68.00
26.00	79.00
26.00	90.00
26.00	101.00
26.00	112.00
26.00	123.00
26.00	134.00
26.00	145.00
33.00	149.00
33.00	149.00
33.00	149.00

[illegible]

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO: CSS-OP-CC-012/2024 OBRA: PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML. EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.*		ESTIMACIÓN No. 2 (DOS FINIQUITO)	
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 02/07/2024 PERIODO DEL TRABAJO DEL: 16/05/2024 AL: 30/06/2024 CONTRATISTA: C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES	

EXT-001		CROQUIS	
SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 18"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLOGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA			

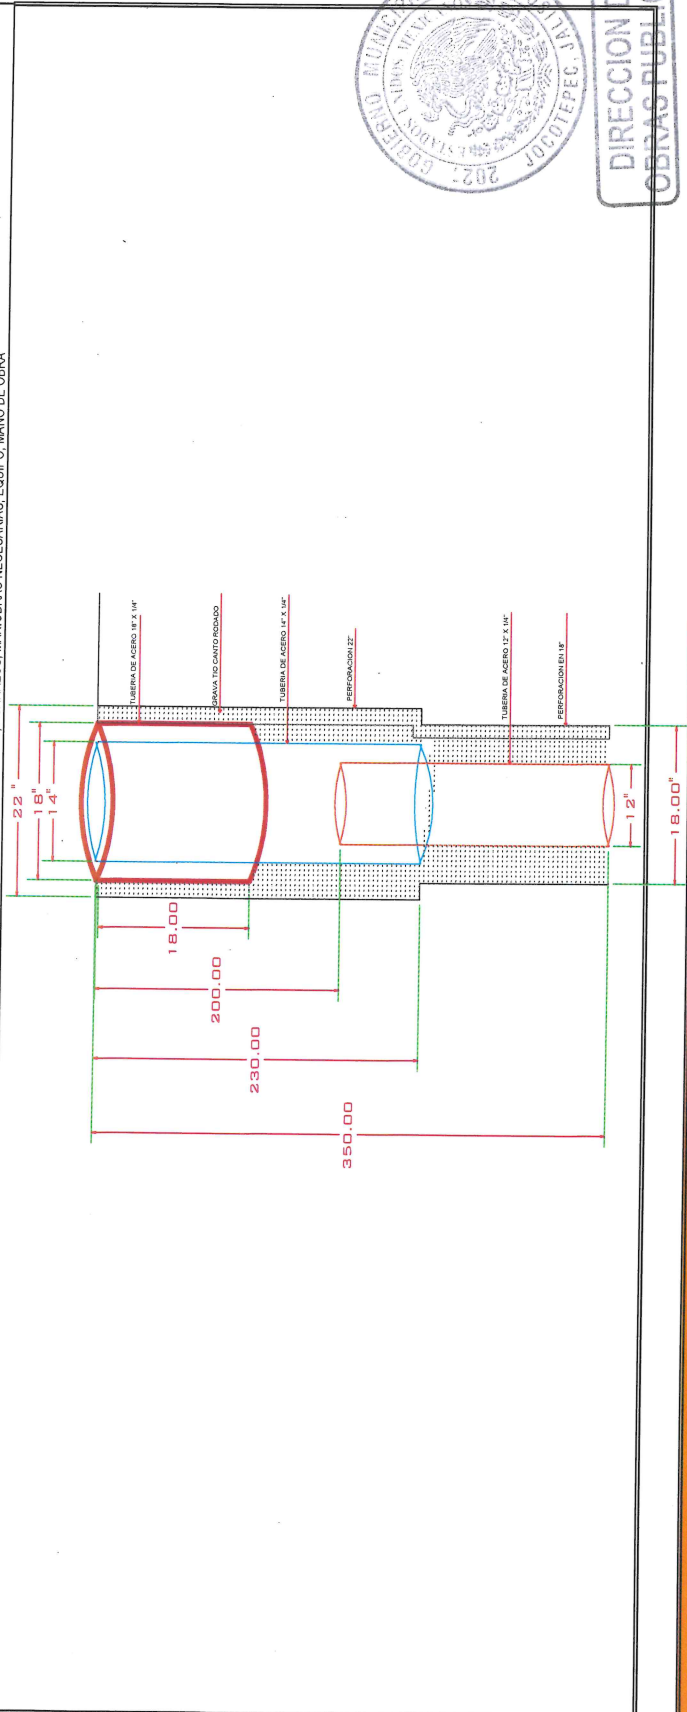


DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

FIRMAS	
SUPERVISOR DE OBRA Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro	CONTRATISTA: C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO: CSS-OP-CC-012/2024 OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZALEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO."		ESTIMACIÓN No. 2 (DOS FINIQUITO)	
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO		FECHA DE PRESENTACIÓN: PERIODO DEL TRABAJO DEL: AL: CONTRATISTA: C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES	

IMÁGENES	
EXT-001	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 18"x14" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLOGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

FIRMAS	
SUPERVISOR DE OBRA  Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro	CONTRATISTA:  C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

INFORMACIÓN GENERAL


CONTRATO: CSS-OP-CC-012/2024 OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML. EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO."		ESTIMACIÓN No. 2 (DOS FINIQUITO)	
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO		FECHA DE PRESENTACIÓN: 02/07/2024 PERIODO DEL TRABAJO DEL: 16/05/2024 AL: 30/06/2024 CONTRATISTA: C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES	

PARTIDA				DESCRIPCION	
PDA B				PRECIOS FUERA DE CATALOGO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIDAD	UBICACION	
EXT-002	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 12"x14" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUÍFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	m	CABECERA MUNICIPAL	CALLE MORELOS	

GENERADORES DE CONTRATISTA

CADENAMIENTO	UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TON/M3	PIEZAS	KMS	TOTAL
0+200.00								
0+210.00		10.00						10.00
0+220.00		10.00						10.00
0+230.00		10.00						10.00
0+240.00		10.00						10.00
0+250.00		10.00						10.00
0+260.00		10.00						10.00
0+270.00		10.00						10.00
0+280.00		10.00						10.00
0+290.00		10.00						10.00
0+300.00		10.00						10.00
0+310.00		10.00						10.00
0+320.00		10.00						10.00
0+330.00		10.00						10.00
0+340.00		10.00						10.00
0+350.00		10.00						10.00

TOTAL EJECUTADO 155.00	
COBRAR EN ESTA ESTIMACION 150.00	
CONTRATISTA:	
FIRMAS	
SUPERVISOR DE OBRA	
Ing. Luis Roberto Omedo Navarro	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO: CSS-OP-CC-012/2024

OBRA: PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML. EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.*

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No.


2 (DOS FINIQUITO)

FECHA DE PRESENTACIÓN:
PERIODO DEL TRABAJO DEL:

02/07/2024
16/05/2024
30/06/2024

AL:
CONTRATISTA:



C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES



CROQUIS

SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 12"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN. INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUÍFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA

EXT-002

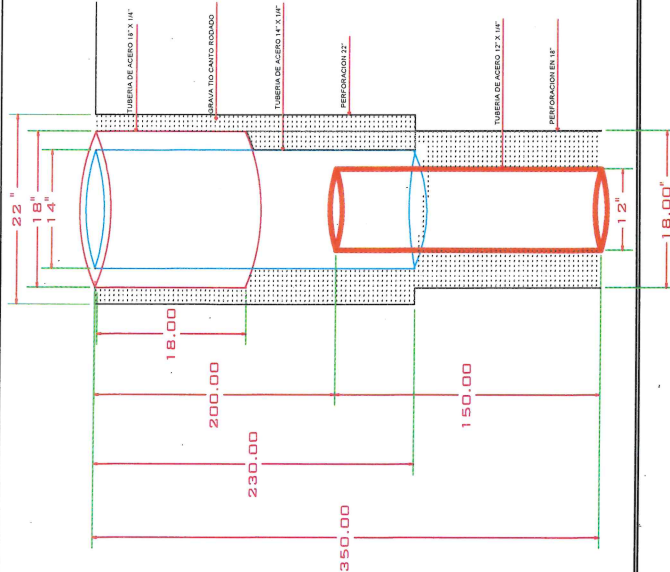

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

FIRMAS

SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA:

Ing. Luis Roberto Olmedo Navarro

C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO: CSS-OP-CC-012/2024

OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO."

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


ESTIMACIÓN No. 2 (DOS FINIQUITO)

FECHA DE PRESENTACIÓN:
PERIODO DEL TRABAJO DEL:

02/07/2024
16/05/2024
30/06/2024

AL:
CONTRATISTA:



C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES



IMÁGENES

SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 12"x14" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUÍFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA:

EXT-002

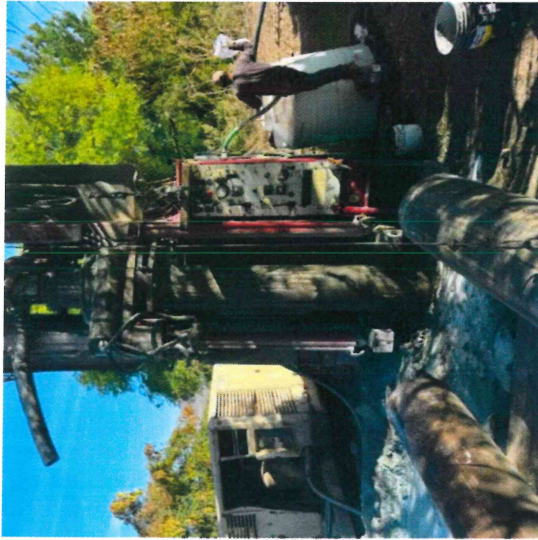

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

FIRMAS

SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA:

Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro

C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES

JOCOTEPEC, JALISCO, A 30 DE MAYO DEL 2024

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE

ME REFIERO AL CONTRATO CSS-OP-CC-012/2024, DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.", CORRESPONDIENTE A LA CONTRATISTA: C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES, LE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE LA COLOCACION DE LA TUBERÍA DE 12"X1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN DE COLOCAR 30.00 ML TRASLAPADOS AL INTERIOR DE LA TUBERIA DE DE 14"X1/4" DE ESPESOR DE ACERO COMO SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE DISEÑO , ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR QUE SE INTRODUZCA GRAVA Y PUEDA CAUSAR CONTRATIEMPOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL POZO.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASION PARA SALUDARLO Y QUEDO EN ESPERA DE SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE


C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES
CONTRATISTA




**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**
2021 - 2024

30 MAYO 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

DISEÑO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA

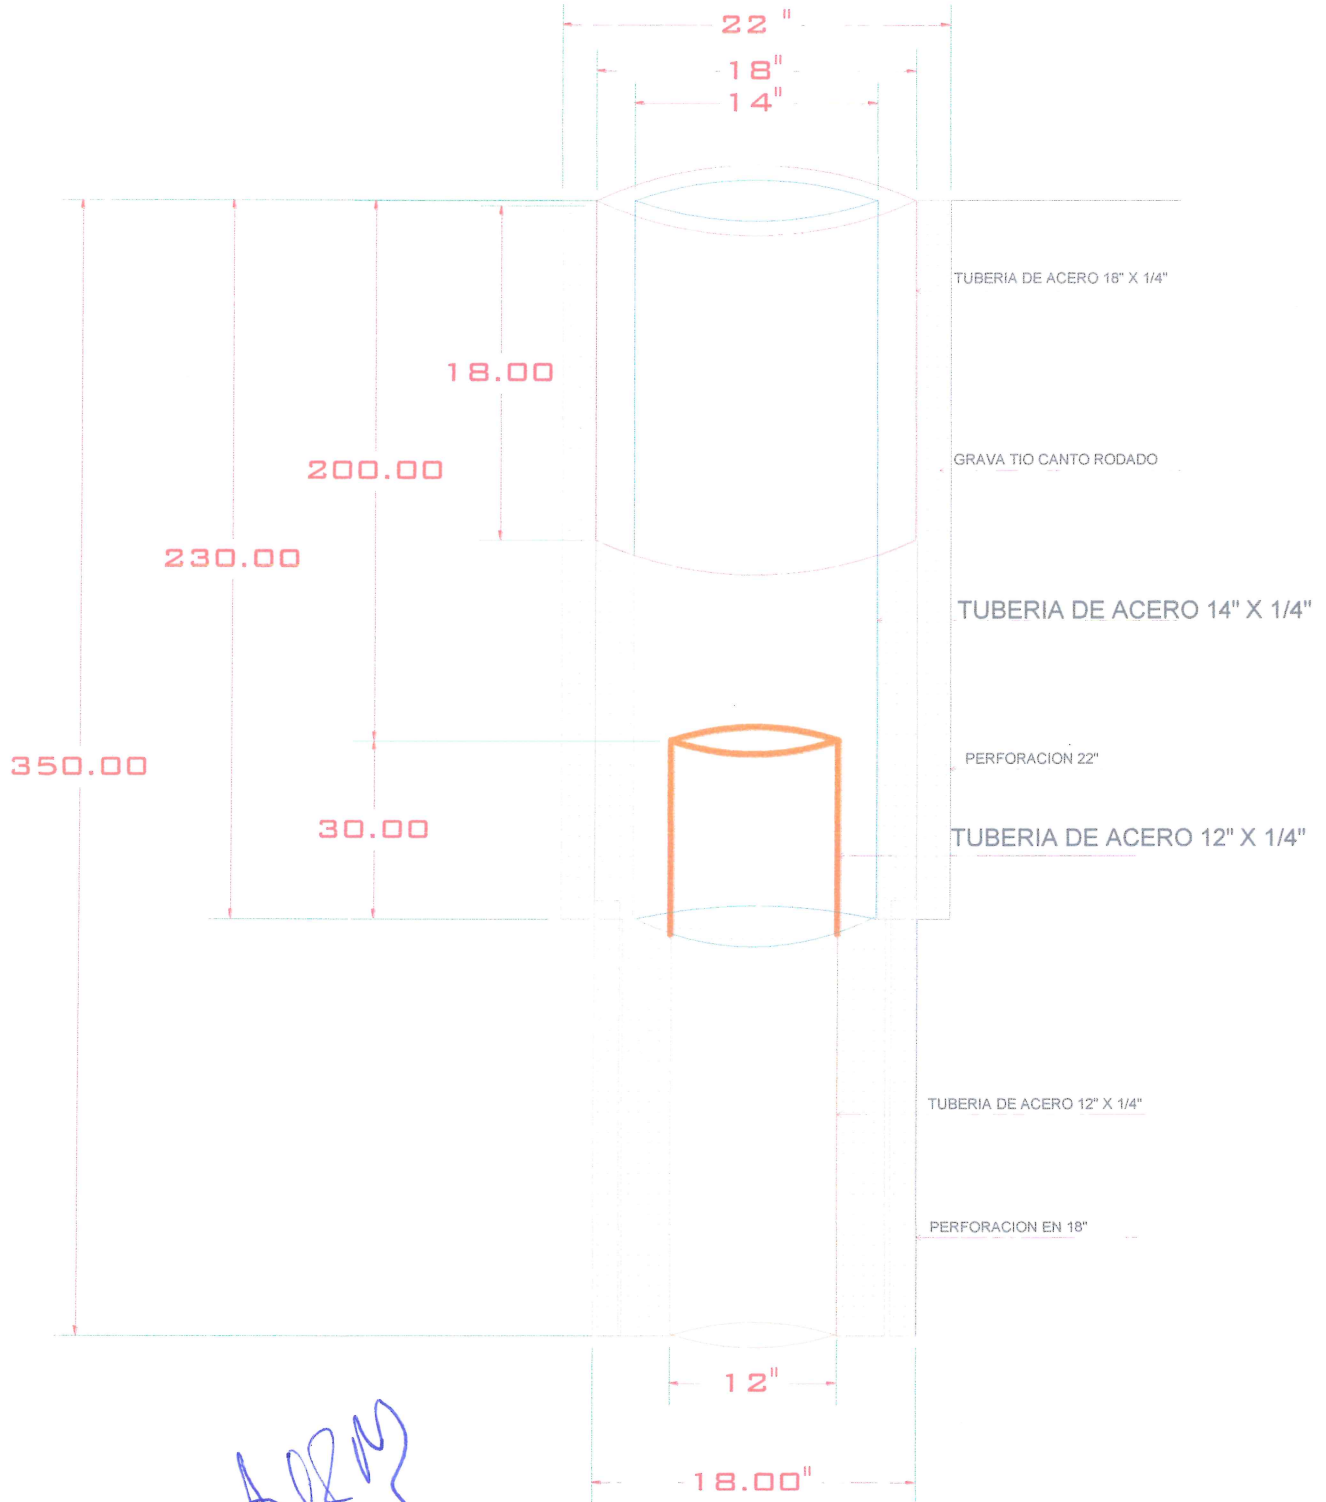

JOCOTEPEC, JALISCO, A 30 DE MAYO DEL 2024

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE

ME REFIERO AL CONTRATO CSS-OP-CC-012/2024, DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.", CORRESPONDIENTE A LA COTRATISTA: C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES, LE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DEL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 18"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR EL VOLUMEN DE CEMENTO EN EL ESPACIO ANULAR DE EL ADEME DE 18" Y LA PERFORACION DE 22", Y GARANTIZAR LA PROTECCION SANITARIA DEL POZO, SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 12"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, LA FINALIDAD DE ESTA COLOCACION ES GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL POZO YA QUE EL AGUA SE ENCONTRO A UNA MAYOR PROFUNDIDAD, CABE MENCIONAR QUE ESTOS TRABAJOS SE COBRARAN COMO UN PRECIO FUERA DE CATÁLOGO,

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASION PARA SALUDARLO Y QUEDO EN ESPERA DE SU AUTORIZACION CORRESPONDIENE.

ATENTAMENTE


C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES
CONTRATISTA



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

30 MAYO 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.



Jocotepec, Jal., a 04 de junio de 2024.

ING. VÍCTOR SAÚL RAMOS MORALES
CONTRATISTA

Asunto: Autorización de conceptos fuera de catalogo.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar contestación a su oficio del 30 de mayo de 2024 y autorizarle **LOS CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO**, esto una vez revisado y analizado junto al supervisor el Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro de la obra; **"PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.** Los conceptos autorizados son los mencionados a continuación:

1. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 18" X ¼" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN Y**
2. **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 12" X ¼" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN.**

Agradezco de antemano su colaboración y me despido enviándole un saludo.

Atentamente

"2024 año del bicentenario del nacimiento del federalismo mexicano, así como de la libertad y la soberanía de los Estados"

IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



JOCOTEPEC, JALISCO, A 30 DE MAYO DEL 2024

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE

ME REFIERO AL CONTRATO CSS-OP-CC-012/2024, DE LA OBRA: "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.", CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA: C. VICTOR SAÚL RAMOS MORALES., LE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO, QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASION PARA SALUDARLO Y QUEDO EN ESPERA DE SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE




C. VICTOR SAÚL RAMOS MORALES
CONTRATISTA



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

03 JUN. 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.



JOCOTEPEC, JALISCO, A 30 DE MAYO DEL 2024

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE

ME REFIERO AL CONTRATO CSS-OP-CC-012/2024, DE LA OBRA: “PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.” CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA: VICTOR SAUL RAMOS MORALES, LA SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR VOLÚMENES EXCEDENTES CON EL FIN DE GARANTIZAR CALIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, VOLÚMENES QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN.

VOLUMENES EXCEDENTES					
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTES
A PERFORACIÓN SISTEMA DE INYECCIÓN DE TUBERÍA					
JOCO-005	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE GRAVA INCLUYE, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	M3	18.39	\$ 4,600.00	\$ 84,577.44
B PRECIOS FUERA DE CATALOGO					
EXT-001	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 18"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUÍFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	M	18.00	\$ 4,008.15	\$ 72,146.70
EXT-002	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 12"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUÍFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	M	150.00	\$ 2,636.08	\$ 395,412.00
				SUMA	\$ 552,136.14
				IVA	\$ 88,341.78
				TOTAL	\$ 640,477.92

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASION PARA SALUDARLO Y QUEDO EN ESPERA DE SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE

C. VICTOR SAUL RAMOS MORALES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

04 JUN. 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.



Jocotepec, Jal., a 04 de junio de 2024.

ING. VÍCTOR SAÚL RAMOS MORALES
CONTRATISTA

Asunto: Autorización de volúmenes excedentes.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar contestación a su oficio del 30 de mayo de 2024 y autorizarle **LOS VOLÚMENES EXCEDENTES**, esto una vez revisado y analizado junto al supervisor el Ing. **Luis Rigoberto Olmedo Navarro** de la obra; **"PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.** El volúmenes excedente autorizado es el siguiente:

Nº	Concepto	Unidad	Cant	\$ P.U.	\$ Importe
JOCO-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	M3	18.39	\$ 4,600.00	\$ 84,594.00

Agradezco de antemano su colaboración y me despido enviándole un saludo.

Handwritten signature and date: 4 de junio 2024

Atentamente

"2024 año del bicentenario del nacimiento del federalismo mexicano, así como de la libertad y la soberanía de los Estados"

IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

