

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000.00 AL KM 0+240.00 (DE VICENTE GUERRERO A CALLE XOCOTEPEC)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.

INVERSION: \$878,449.55 AVANCE GRAL DE OBRA: 22.45%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$197,227.80 PERIODO DEL 09/11/20 AL 14/11/20

| METAS AUTORIZADAS: | | | | INFORMACION FISICO-FINACIERA: | | | | | | |
|--------------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--|
| | CONCEPTO | UNI DAD | VOLUMEN | P.U. | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: | |
| 1 | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN | M2 | 3843.22 | \$ 210.00 | 807,075.53 | 939.18 | 24.44% | \$ 197,227.80 | \$ 609,847.73 | |
| 2 | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML | 480.00 | \$ 82.00 | 39,360.00 | - | 0.00% | \$ - | \$ 39,360.00 | |
| 3 | DIESEL | LTS | 1,629.21 | \$ 19.65 | 32,014.02 | | | | \$ 32,014.02 | |
| | | | | | 878,449.55 | | 12.22% | 197,227.80 | 681,221.75 | |

| DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES | |
|---|---|
| AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO= | 0+000.00 AL KM 0+0043.00 FRAC. "LAS PALMAS" |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000.00 AL KM 0+240.00 (DE VICENTE GUERRERO A CALLE XOCOTEPEC)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.


INVERSION: \$878,449.55 AVANCE GRAL DE OBRA: 16.99%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$346,467.56 PERIODO DEL 16/11/20 AL 21/11/20

| METAS AUTORIZADAS: | | | | INFORMACION FISICO-FINACIERA: | | | | | | |
|--------------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--|
| | CONCEPTO | UNI DAD | VOLUMEN | P.U. | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: | |
| 1 | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN | M2 | 3843.22 | \$ 210.00 | 807,075.53 | 662.84 | 17.25% | \$ 336,424.20 | \$ 470,651.33 | |
| 2 | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML | 480.00 | \$ 82.00 | 39,360.00 | 122.48 | 25.52% | \$ 10,043.36 | \$ 29,316.64 | |
| 3 | DIESEL | LTS | 1,629.21 | \$ 19.65 | 32,014.02 | | | | \$ 32,014.02 | |
| | | | | | 878,450 | | 21.38% | 346,467.56 | 531,981.99 | |

| DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES | |
|---|---|
| AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO= | 0+043.28 AL KM 0+083.28 (DE VICENTE GUERRERO A CALLE XOCOTEPEC) |
| AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO= | 0+000.00 AL KM 0+0043.00 FRAC. "LAS PALMAS" |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

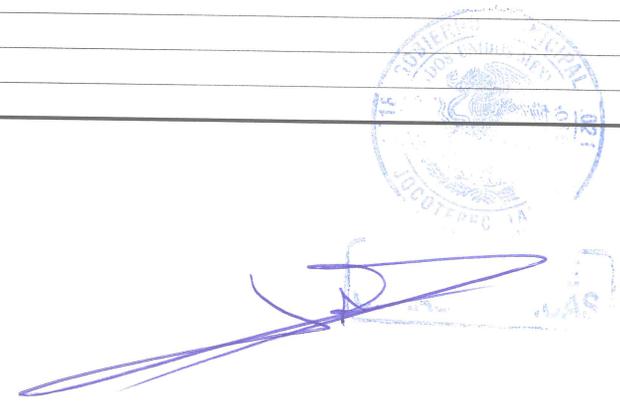MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000.00 AL KM 0+240.00 (DE VICENTE GUERRERO A CALLE XOCOTEPEC)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 3

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.

INVERSION: \$878,449.55 AVANCE GRAL DE OBRA: 19.35%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$516,414.36 PERIODO DEL 23/12/20 AL 28/11/20

| METAS AUTORIZADAS: | | | | INFORMACION FISICO-FINACIERA: | | | | | |
|--------------------|---|---------|----------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | CONCEPTO | UNI DAD | VOLUMEN | P.U. | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: |
| 1 | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN | M2 | 3843.22 | \$ 210.00 | 807,075.53 | 735.08 | 19.13% | \$ 490,791.00 | \$ 316,284.53 |
| 2 | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML | 480.00 | \$ 82.00 | 39,360.00 | 190.00 | 39.58% | \$ 25,623.36 | \$ 13,736.64 |
| 3 | DIESEL | LTS | 1,629.21 | \$ 19.65 | 32,014.02 | | | | \$ 32,014.02 |
| | | | | | 878,450 | | 29.36% | 516,414.36 | 362,035.19 |

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO= 0+083.28 AL KM 0+0130.28 (DE VICENTE GUERRERO A CALLE XOCOTEPEC)

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO= 0+043.28 AL KM 0+180.00 FRAC. "LAS PALMAS"

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000.00 AL KM 0+240.00 (DE VICENTE GUERRERO A CALLE XOCOTEPEC)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 4

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.

INVERSION: \$878,449.55 AVANCE GRAL DE OBRA: 18.63%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC


AVANCE FINAN GRAL: \$680,101.48 PERIODO DEL 30/11/20 AL 05/12/20

| METAS AUTORIZADAS: | | | | INFORMACION FISICO-FINANCIERA: | | | | | | |
|--------------------|---|---------|----------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--|
| | CONCEPTO | UNI DAD | VOLUMEN | P.U. | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: | |
| 1 | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN | M2 | 3843.22 | \$ 210.00 | 807,075.53 | 705.60 | 18.36% | \$ 638,967.00 | \$ 168,108.53 | |
| 2 | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML | 480.00 | \$ 82.00 | 39,360.00 | 189.16 | 39.41% | \$ 41,134.48 | -\$ 1,774.48 | |
| 3 | DIESEL | LTS | 1,629.21 | \$ 19.65 | 32,014.02 | | | | \$ 32,014.02 | |
| | | | | | 878,450 | | 28.88% | 680,101.48 | 198,348.07 | |

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO= 0+0130.28 AL KM 0+0178.28 (DE VICENTE GUERRERO A CALLE XOCOTEPEC)

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO= 0+180.00 AL KM 0+225.00 FRAC. "LAS PALMAS"



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000.00 AL KM 0+240.00 (DE VICENTE GUERRERO A CALLE XOCOTEPEC)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 5

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.

INVERSION: \$878,449.55 AVANCE GRAL DE OBRA: 18.97%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$846,712.90 PERIODO DEL 07/12/20 AL 12/12/20

| METAS AUTORIZADAS: | | | | INFORMACION FISICO-FINANCIERA: | | | | | |
|--------------------|---|---------|----------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | CONCEPTO | UNI DAD | VOLUMEN | P.U. | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: |
| 1 | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN | M2 | 3843.22 | \$ 210.00 | 807,075.53 | 640.94 | 16.68% | \$ 773,564.40 | \$ 33,511.13 |
| 2 | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML | 480.00 | \$ 82.00 | 39,360.00 | | 0.00% | \$ 41,134.48 | -\$ 1,774.48 |
| 3 | DIESEL | LTS | 1,629.21 | \$ 19.65 | 32,014.02 | | | 32,014.02 | \$ 32,014.02 |
| | | | | | 878,450 | | 8.34% | 846,712.90 | 63,750.67 |

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO= 0+0178.28 AL KM 0+0225.00 (DE VICENTE GUERRERO A CALLE XOCOTEPEC)

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000.00 AL KM 0+240.00 (DE VICENTE GUERRERO A CALLE XOCOTEPEC)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 6

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.

INVERSION: \$878,449.55 AVANCE GRAL DE OBRA: 3.81%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$880,224.70 PERIODO DEL 14/12/20 AL 19/12/20

| METAS AUTORIZADAS: | | | | INFORMACION FISICO-FINANCIERA: | | | | | |
|--------------------|---|---------|----------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | CONCEPTO | UNI DAD | VOLUMEN | P.U. | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: |
| 1 | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN | M2 | 3843.22 | \$ 210.00 | 807,075.53 | 159.58 | 4.15% | \$ 807,076.20 | -\$ 0.67 |
| 2 | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML | 480.00 | \$ 82.00 | 39,360.00 | | 0.00% | \$ 41,134.48 | -\$ 1,774.48 |
| 3 | DIESEL | LTS | 1,629.21 | \$ 19.65 | 32,014.02 | | | 32,014.02 | |
| | | | | | 878,450 | | 2.08% | 880,224.70 | -1,775.15 |

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO= 0+225.00 AL KM 0+237.280 (DE VICENTE GUERRERO A CALLE XOCOTEPEC)

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=
