





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 2 (FINIQUITO)

No. DE CONTRATO: GMJ 005C 0P/2020

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2020

OBRA : OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTOBAL COLON. NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

UBICACIÓN : UBICACIÓN: CALLE LIBERTAD NEXTIPAC JOCOTEPEC, JALISCO.


CONTRATISTA : CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2020



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
<b>PRELIMINARES</b>												
1	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	74.20	74.20	0.00	74.20	0.00	\$12.71	943.08	0.00	943.08	\$ -
<b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES</b>										0.00		
<b>EXCAVACIONES</b>												
2	EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SUPOSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	57.134	57.13	0.000	57.134	0.00	\$92.13	5,263.76	0.00	5,263.39	\$ -
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS AMAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	51.94	51.94	0.00	51.94	0.00	\$13.07	678.86	0.00	678.86	\$ -
<b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EXCAVACIONES</b>										0.00		
<b>CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES</b>												
4	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	51.94	51.94	0.00	51.94	0.00	\$81.49	4,232.59	0.00	4,232.59	\$ -
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	74.20	74.20	0.00	74.20	0.00	\$271.43	20,140.11	0.00	20,140.11	\$ -
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	25.97	25.97	0.00	25.97	0.00	\$217.63	5,651.85	0.00	5,651.85	\$ -
<b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES</b>										0.00		
<b>INSTALACION DE TUBERIA</b>												
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	74.20	74.20	0.00	74.20	0.00	\$ 550.12	40,818.90	0.00	40,818.90	\$ -
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	15.00	13.00	2.00	15.00	0.00	\$ 1,354.19	20,312.85	2,708.38	17,604.47	\$ -



**ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA**

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	1.00	1.00	1.00	-1.00	\$ 6,645.43	6,645.43	6,645.43	6,645.43	-\$ 6,645.43	
10	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 1,068.17	2,136.34	0.00	2,136.34	\$ -	
<b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE INSTALACION DE TUBERIA</b>											9,353.81		
<b>COMPLEMENTARIOS</b>													
11	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	\$ 9.93	1,473.61	1,473.61	0.00	\$ -	
<b>SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS</b>											1,473.61		
								<b>TOTAL</b>	<b>108,297.38</b>	<b>10,827.42</b>	<b>5,942.25</b>	<b>-\$ 6,645.43</b>	

Humberto Morales Cruz.  
GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.  
CONTRATISTA

Cesar Alonso  
ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO J.  
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





ING. HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
	LOCALIDAD:	NEXTIPAC	CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTOBAL COLON. NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO		DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2020	2 (FINQUITO)
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 005C 0P/2020		FECHA:	PAGINA: 8-10
			27 DE MAYO DEL 2020	

NÚMEROS GENERADORES						
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			TOTAL	ONSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO		
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.				2.00	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:					2.00	PZA

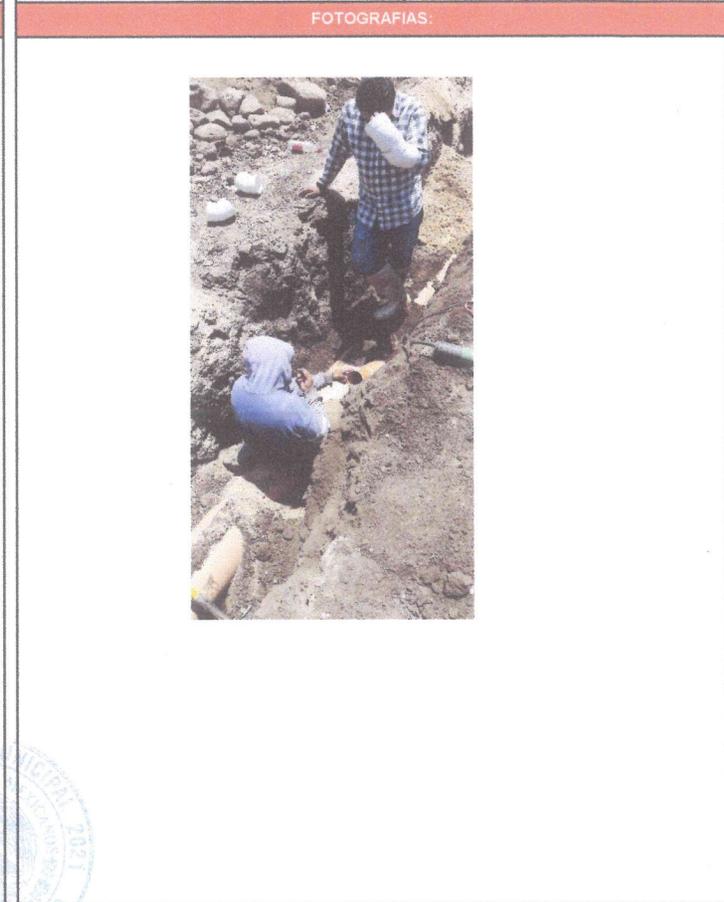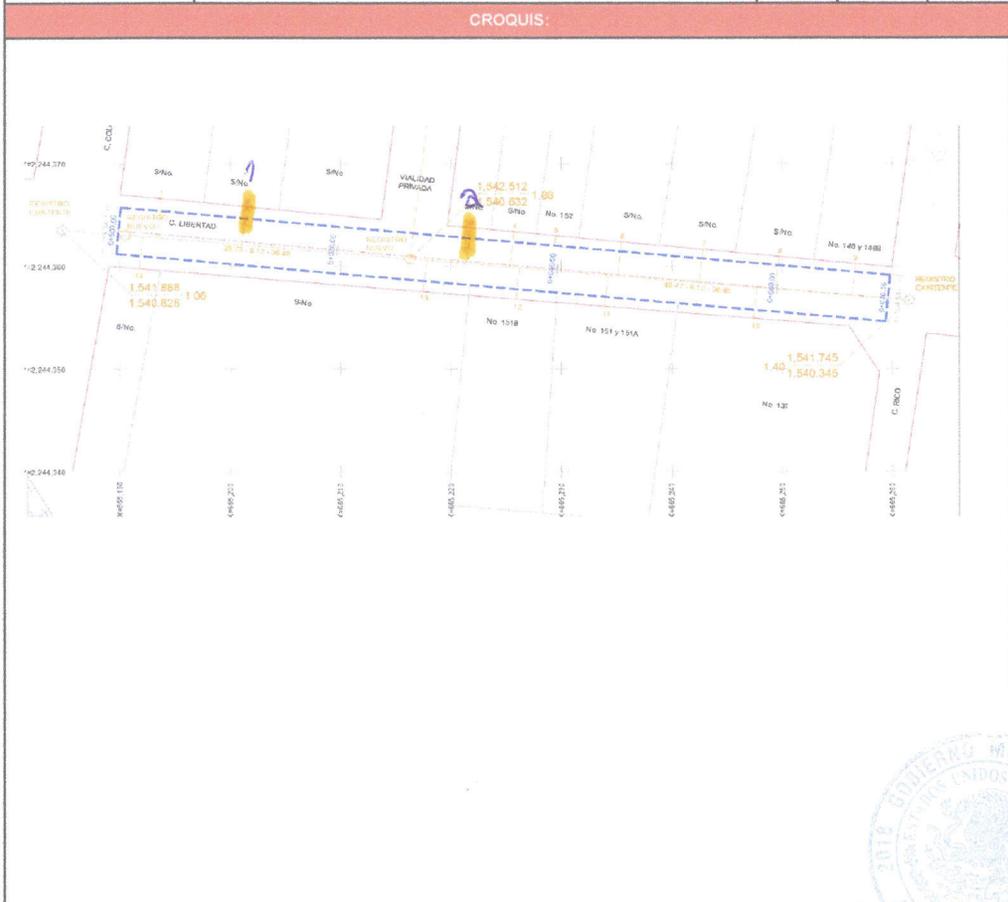

RESIDENTE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO





SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: ARG. CESAR ANTONIO ALONSO J.





	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
	LOCALIDAD:	NEXTIPAC
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTOBAL COLON. NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 005C 0P/2020

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2020		2 (FINIQUITO)
FECHA:	27 DE MAYO DEL 2020	PAGINA: 11-11

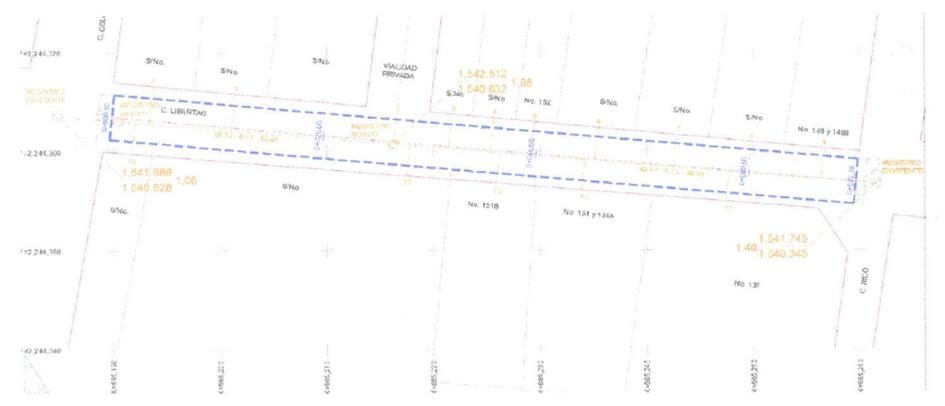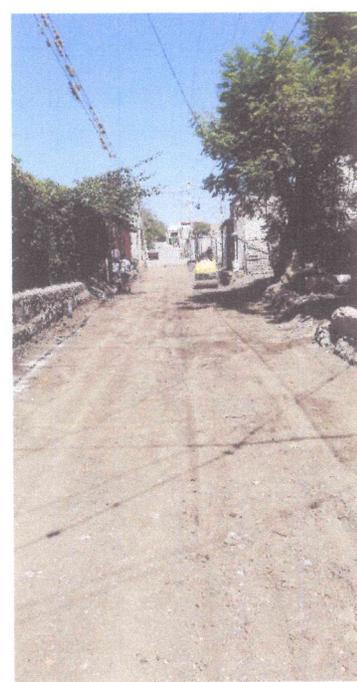NÚMEROS GENERADORES										
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		CRUCERO	CRUCERO							
11	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1	2		28.73	2	1		57.46	
		2	3		45.47	2	1		90.94	
					TOTAL DE ESTE CONCEPTO:			148.40	M2	
CROQUIS:					FOTOGRAFIAS:					
										

RESIDENETE DE OBRA:  RAFAEL ASENSIO.



SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:  ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO J.
