





| | | |
|--|--|---|
|  <p>H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</p> | <p>No. DE CONTRATO: GMJ 003C OP/2020</p> <p>CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.</p> <p>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RICO A CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO</p> <p>UBICACIÓN: CALLE LIBERTAD NEXTIPAC JOCOTEPEC, JALISCO.</p> | <p>ESTIMACIÓN No. 2 FINIQUITO</p> <p>FECHA: 01 JUNIO DEL 2020</p> <p>PERÍODO DE TRABAJO: DEL 16 ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2020</p>  |
|--|--|---|

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

| HOJA No. | PARTIDAS | | | | IMPORTES | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---|--|
| 1 | PRELIMINARES | | | | \$ | - |
| 2 | EXCAVACIONES | | | | \$ | - |
| 3 | CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES | | | | \$ | - |
| 4 | INSTALACION DE TUBERIA | | | | \$ | 84,222.95 |
| 5 | COMPLEMENTARIOS | | | | \$ | 3,044.26 |
| 6 | TRABAJOS FUERA DE CATALOGO | | | | \$ | 7,512.55 |
| | | | | | MONTO DE ESTIMACIÓN | \$ 94,779.76 |
| | | | | | MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO % | \$ 22,224.01 |
| | | | | | SUBTOTAL | \$ 72,555.75 |
| | | | | | I. V. A. 16% | \$ 11,608.92 |
| | | | | | SUMA | \$ 84,164.67 |
| | | | | | MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) | \$ - |
| | | | | | MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) | \$ 473.90 |
| | | | | | NETO A PAGAR | \$ 83,690.77 |
| ESTADO CONTABLE | | IMPORTE | I. V. A. | TOTAL: | | |
| ASIGNACIÓN | \$ | 214,593.07 | \$ 34,334.89 | \$ 248,927.96 | | |
| IMPORTE DE ESTIMACIÓN | \$ | 94,779.76 | \$ 15,164.76 | \$ 109,944.52 | RESIDENTE DE OBRA | CONTRATISTA |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ | 125,697.02 | \$ 20,111.52 | \$ 145,808.54 |  |  GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
| ACUMULADO A LA FECHA | \$ | 220,476.78 | \$ 35,276.28 | \$ 255,753.06 | | |
| SALDO EXEDENTE | -\$ | 5,883.71 | -\$ 941.39 | -\$ 6,825.10 | C. RAFAEL ASCENCIO | |
| 25% ANTICIPO | | | | | SUPERVISOR DE OBRA | |
| ANTICIPO % | \$ | 53,648.27 | \$ 8,583.72 | \$ 62,231.99 | | |
| AMORTIZACIÓN | \$ | 22,224.01 | \$ 3,555.84 | \$ 25,779.85 | | |
| AMORTIZACIÓN ACUM. ANT. | \$ | 31,424.26 | \$ 5,027.88 | \$ 36,452.14 | | |
| AMORTIZACIÓN A LA FECHA | \$ | 53,648.27 | \$ 8,583.72 | \$ 62,231.99 | | |
| FALTANTE POR AMORTIZAR | \$ | - | \$ - | \$ - | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO J. | ING. HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 2 FINIQUITO

No. DE CONTRATO: GMJ 003C 0P/2020

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 16 ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2020
OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RICO A CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO




UBICACIÓN : UBICACIÓN: CALLE LIBERTAD NEXTIPAC JOCOTEPEC, JALISCO.


CONTRATISTA : CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.

FECHA: 01 JUNIO DEL 2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



| ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| No. | CONCEPTO | U | CANTIDADES | | | | | PRECIO UNITARIO | IMPORTES | | | |
| | | | PRESUPUESTO BASE | ACUMULADA ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA | SALDO | | PRESUPUESTO BASE | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR | SALDO |
| PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA | M2 | 317.99 | 327.34 | 0.00 | 0.00 | -9.35 | \$ 8.70 | 2,766.51 | 0.00 | 2,847.86 | -\$ 81.35 |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| EXCAVACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2 | EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION | M3 | 174.90 | 168.37 | 0.000 | 0.000 | 6.53 | \$168.16 | 29,411.18 | 0.00 | 28,313.10 | \$ 1,098.08 |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EXCAVACIONES | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES | | | | | | | | | | | | |
| 3 | COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION | M2 | 317.99 | 327.34 | 0.00 | 0.00 | -9.35 | \$22.06 | 7,014.86 | 0.00 | 7,221.12 | -\$ 206.26 |
| 4 | FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION | M3 | 63.60 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | \$650.97 | 41,401.69 | 0.00 | 39,871.91 | \$ 1,529.78 |
| 5 | FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION | M3 | 63.60 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | \$774.58 | 49,263.29 | 0.00 | 47,443.03 | \$ 1,820.26 |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| SUPERFICIE DE RODAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 6 | EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE. INCLUYE: TEPETATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 233.80 | 0.00 | 243.17 | 0.00 | -9.37 | \$ 159.68 | 37,333.18 | 38,829.39 | 0.00 | -\$ 1,496.20 |
| 7 | FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO HIDRAULICO DE F _{cc} =250KG/CM2 DE 20CM DE ESPESOR CON A M 1.5" TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | M2 | 84.19 | 0.00 | 84.19 | 0.00 | 0.00 | \$ 539.18 | 45,393.56 | 45,393.56 | 0.00 | \$ - |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO | | | | | | | | | | 84,222.95 | | |
| COMPLEMENTARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 8 | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 216.00 | 0.00 | 327.34 | 0.00 | -111.34 | \$ 9.30 | 2,008.80 | 3,044.26 | 0.00 | -\$ 1,035.46 |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS | | | | | | | | | | 3,044.26 | | |
| TRABAJOS FUERA DE CATLOGO | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | -5.00 | \$ 1,112.41 | 0.00 | 5,562.05 | 0.00 | -\$ 5,562.05 |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | \$ 1,950.50 | 0.00 | 1,950.50 | 0.00 | -\$ 1,950.50 |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE TRABAJOS FUERA DE CATLOGO | | | | | | | | | | 7,512.55 | | |



| | | |
|---|--|-------------------|
|  | MUNICIPIO : | JOCOTEPEC JALISCO |
| | LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA |
| | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | |
| | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RICO A CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | |
| No. DE CONTRATO: | No. DE CONTRATO: GMJ 003C 0P/2020 | |


| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: | | NÚMEROS GENERADORES |
| CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV. | | |
| PERIODO DE ESTIMACIÓN: | | No. DE ESTIMACION: |
| DEL 16 ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2020 | | 2 FINIQUITO |
| FECHA: | 01 JUNIO DEL 2020 | PAGINA: 6 |

| NÚMEROS GENERADORES | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|-------|--------|---------------|-------|------------|--------|---------------|
| CLAVE | CONCEPTO | CADENAMIENTO | | | ARROYO | ANCHO HUELLAS | A1+A2 | SUPERFICIE | TOTAL | ONSERVACIONES |
| | | ESTACION | DISTANCIA /2 | ANCHO | | | | | | |
| 6 | EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE, INCLUYE: TEPETATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION. | 0+000.000 | 0.00 | 3.73 | 4.93 | 1.20 | 3.73 | 0 | 0.00 | |
| | | 0+010.000 | 5.00 | 3.36 | 4.56 | 1.20 | 7.09 | 35.45 | 35.45 | |
| | | 0+020.000 | 5.00 | 3.73 | 4.93 | 1.20 | 7.09 | 35.45 | 35.45 | |
| | | 0+030.000 | 5.00 | 3.23 | 4.43 | 1.20 | 6.96 | 34.8 | 34.80 | |
| | | 0+040.000 | 5.00 | 3.07 | 4.27 | 1.20 | 6.30 | 31.5 | 31.50 | |
| | | 0+050.000 | 5.00 | 3.20 | 4.40 | 1.20 | 6.27 | 31.35 | 31.35 | |
| | | 0+060.000 | 5.00 | 3.85 | 5.05 | 1.20 | 7.05 | 35.25 | 35.25 | |
| | | 0+070.160 | 5.08 | 3.90 | 5.10 | 1.20 | 7.75 | 39.37 | 39.37 | |
| TOTAL DE ESTE CONCEPTO: | | | | | | | | | 243.17 | M2 |

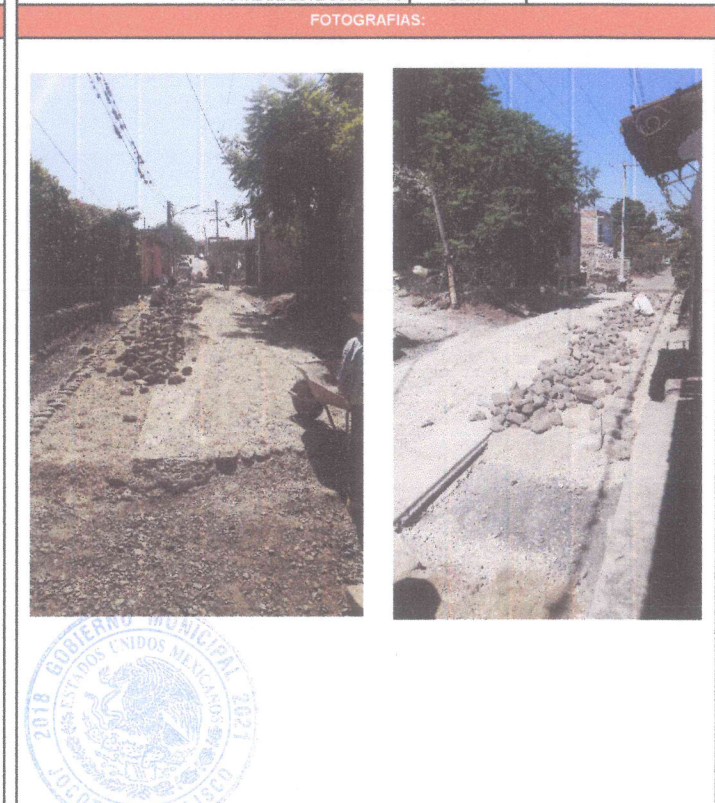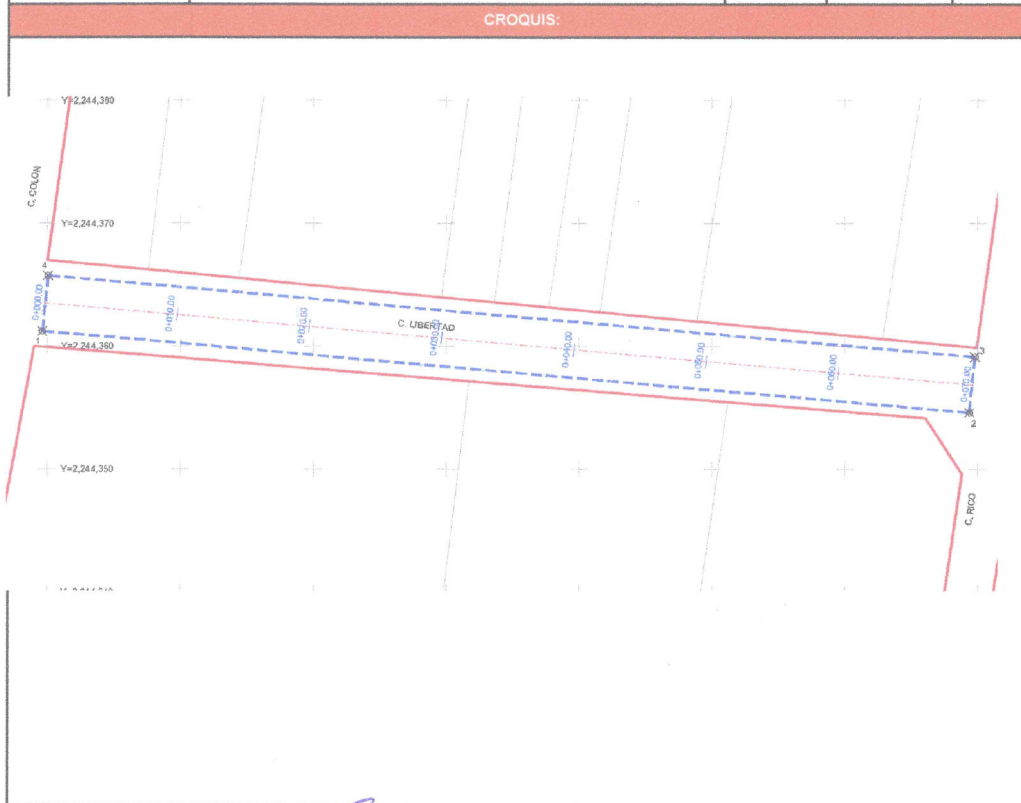

RESIDENETE DE OBRA: R.
 RAFAEL ASENCIO .

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: Cesar Alonso
 ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO J.






| | |
|--------------------------------------|--|
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC JALISCO |
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RICO A CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |
| No. DE CONTRATO: | No. DE CONTRATO: GMJ 003C 0P/2020 |

| | |
|--|---------------------|
| RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: | NÚMEROS GENERADORES |
| CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV. | |
| PERIODO DE ESTIMACIÓN: | No. DE ESTIMACION: |
| DEL 16 ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2020 | 2 FINIQUITO |
| FECHA: | PAGINA: 7 |
| 01 JUNIO DEL 2020 | |


| NÚMEROS GENERADORES | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|-------|------|------|-------|------------|-------|---------------|--|
| CLAVE | CONCEPTO | CADENAMIENTO | | | ALTO | AREA | A1+A2 | SUPERFICIE | TOTAL | ONSERVACIONES | |
| | | ESTACION | DISTANCIA /2 | ANCHO | | | | | | | |
| 7 | FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO HIDRAULICO DE Fc=250KG/CM2 DE 20CM DE ESPESOR CON A M 1.5" TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | 0+000.000 | 0+070.160 | 0.60 | | | 0.60 | 70.16 | 42.10 | | |
| | | 0+000.000 | 0+070.160 | 0.60 | | | 0.60 | 70.16 | 42.10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ESTE CONCEPTO: | | | | | | | | | 84.20 | M2 | |

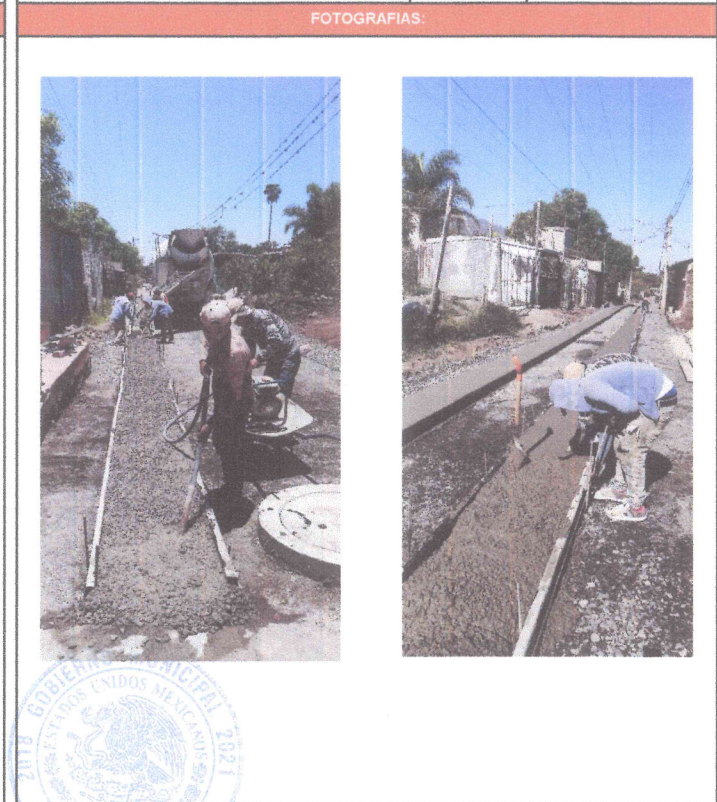



RESIDENETE DE OBRA: R.
 RAFAEL ASENCIO .



SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: Cesar Alonso
 ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO J.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

| | | | | |
|---|--|-------------------|--|---------------------|
|  | MUNICIPIO: | JOCOTEPEC JALISCO | RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: | NÚMEROS GENERADORES |
| | LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA | CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV. | |
| | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | | PERIODO DE ESTIMACIÓN: | No. DE ESTIMACION: |
| | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RICO A CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | | DEL 16 ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2020 | 2 FINIQUITO |
| No. DE CONTRATO: | No. DE CONTRATO: GMJ 003C 0P/2020 | | FECHA: | PAGINA: 8 |
| | | | 01 JUNIO DEL 2020 | |

| NÚMEROS GENERADORES | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|-------|------|-------|------------|-------|---------------|
| CLAVE | CONCEPTO | CADENAMIENTO | | | AREA | A1+A2 | SUPERFICIE | TOTAL | ONSERVACIONES |
| | | ESTACION | DISTANCIA /2 | ANCHO | | | | | |
| 8 | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 0+000.000 | 0.00 | 4.93 | | 4.93 | 0 | 0.00 | |
| | | 0+010.000 | 5.00 | 4.56 | | 9.49 | 47.45 | 47.45 | |
| | | 0+020.000 | 5.00 | 4.93 | | 9.49 | 47.45 | 47.45 | |
| | | 0+030.000 | 5.00 | 4.43 | | 9.36 | 46.8 | 46.80 | |
| | | 0+040.000 | 5.00 | 4.27 | | 8.70 | 43.5 | 43.50 | |
| | | 0+050.000 | 5.00 | 4.40 | | 8.67 | 43.35 | 43.35 | |
| | | 0+060.000 | 5.00 | 5.05 | | 9.45 | 47.25 | 47.25 | |
| | | 0+070.160 | 5.08 | 5.10 | | 10.15 | 51.562 | 51.56 | |
| | | TOTAL DE ESTE CONCEPTO: | | | | | | | |

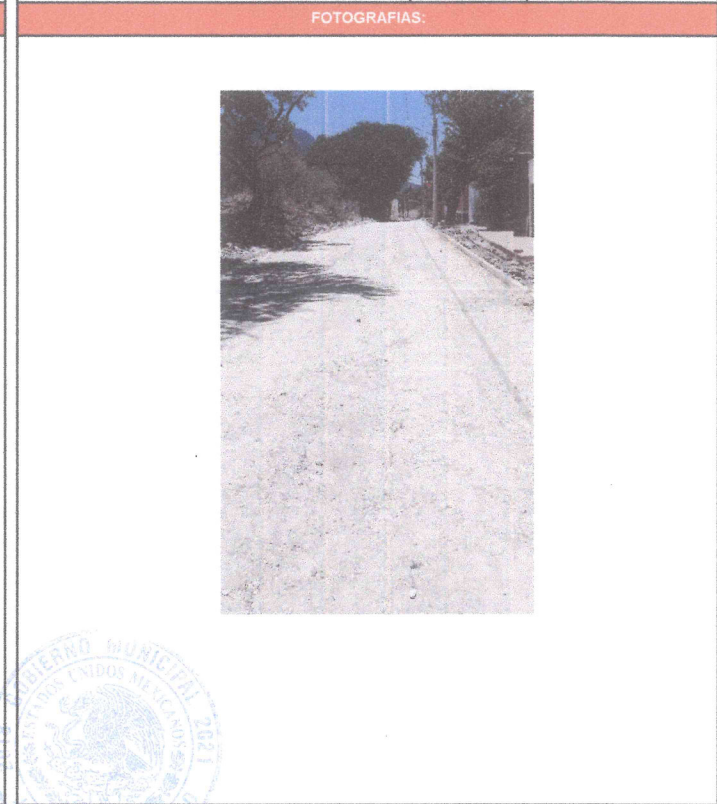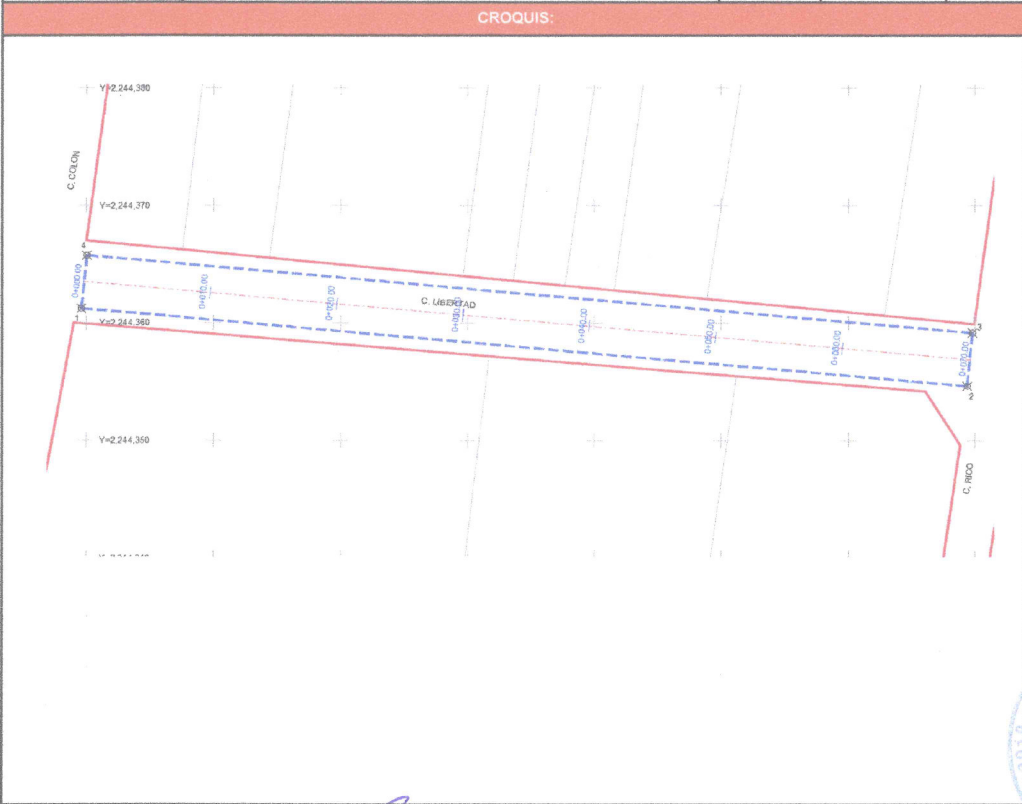


RESIDENETE DE OBRA: R.
RAFAEL ASENCIO .





SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: Cesar Alonso
ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO J.



| | | | | |
|---|--|-------------------|--|---------------------|
|  | MUNICIPIO: | JOCOTEPEC JALISCO | RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: | NÚMEROS GENERADORES |
| | LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA | CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV. | |
| | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | | PERIODO DE ESTIMACIÓN: | No. DE ESTIMACION: |
| | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RICO A CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | | DEL 16 ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2020 | 2 FINIQUITO |
| No. DE CONTRATO: | No. DE CONTRATO: GMJ 003C 0P/2020 | FECHA: | 01 JUNIO DEL 2020 | PAGINA: 10 |

| NÚMEROS GENERADORES | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|-------|------|------|-------|------------|-------|---------------|--|
| CLAVE | CONCEPTO | CADENAMIENTO | | | ALTO | AREA | A1+A2 | SUPERFICIE | TOTAL | ONSERVACIONES | |
| | | ESTACION | DISTANCIA /2 | ANCHO | | | | | | | |
| 5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO INCLUYE; HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA | | | | | | | | 1.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ESTE CONCEPTO: | | | | | | | | 1.00 | PZA | | |

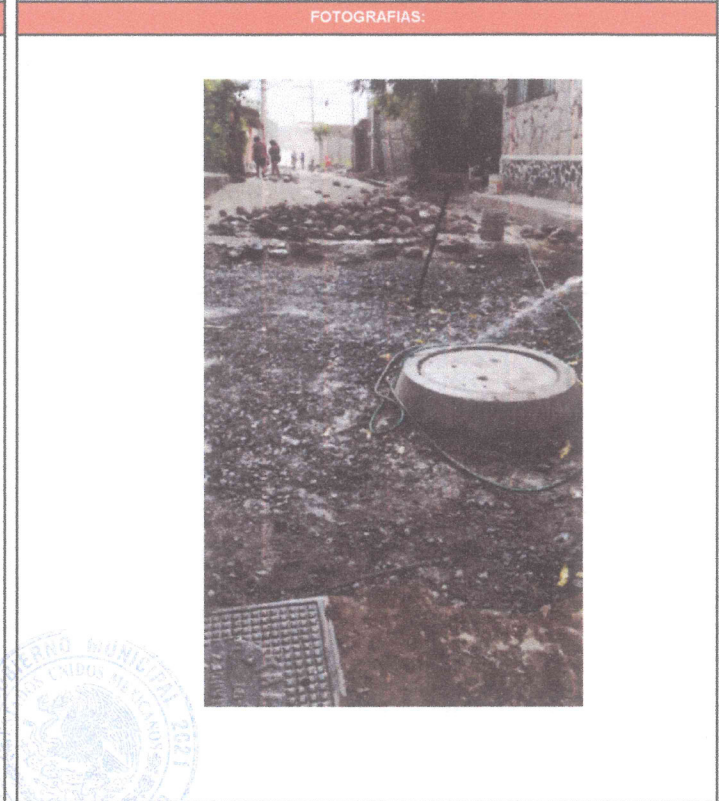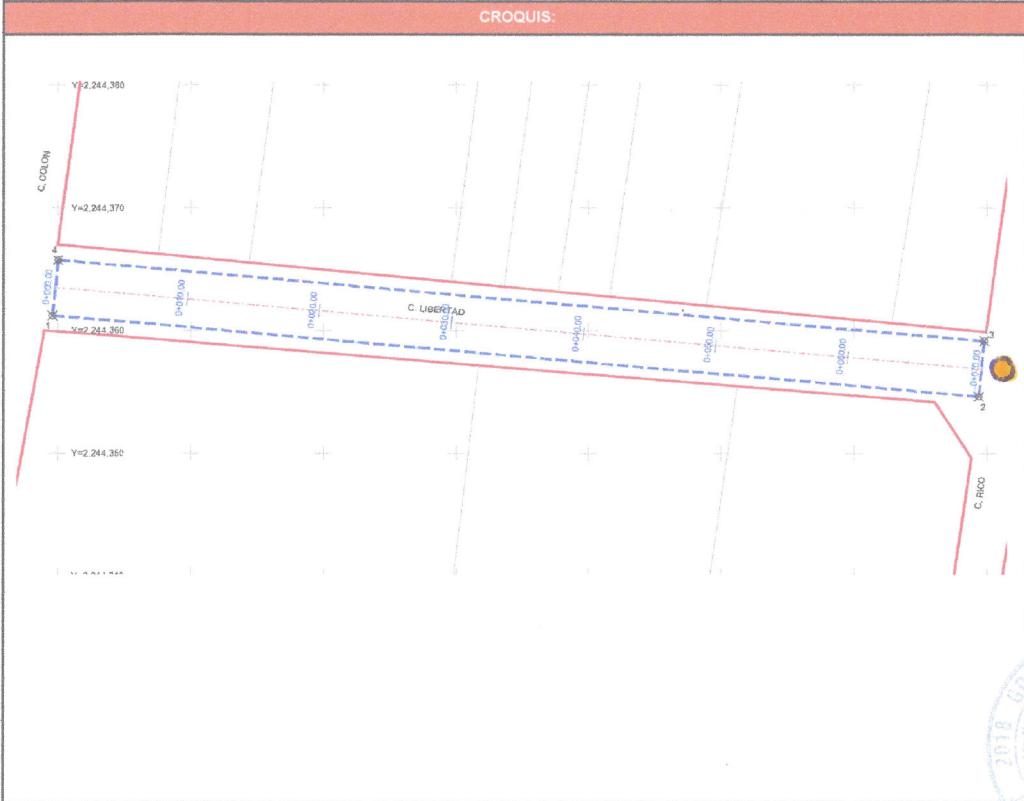

RESIDENETE DE OBRA: R.
RAFAEL ASENCIO .



SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: Cesar Antonio Alonso
ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO J.

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| GCE131114MX9 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | MJJ850101KP8 | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| C8EE7530-591B-496D- 9BF9-1E671F862CD0 | 2020-06-03T13:40:29 | 2020-06- 03T13:40:31 | MAS0810247C0 |

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| \$84,164.67 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir
