



Jocotepec
Gobierno Municipal

Administración-2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO NUMERO: 552/2020

Jocotepec, Jal., a 17 de julio de 2020.

L.C.P. FRANCISCO DELGADILLO LIMÓN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Pago estimación No. 03 finiquito (EMPEDRADO)

POR ESTE CONDUCTO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA REALICE LOS TRÁMITES DE PAGO A NOMBRE DE; GRUPO CONSTRUCTOR EDVI, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$188,587.61 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN NO.03 Y FINIQUITO, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO QUE DESCRIBO:

NOMBRE DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. NO. DE CONTRATO: GMJ 013C 0P/2020
PROGRAMA:	RAMO 33 2020
CODIFICACIÓN CONTABLE:	6251-1-25.1-050-257
SE REALIZÓ EN:	BIENES DE DOMINIO PUBLICO

Anexo:

- 1- Presupuesto, proyecto y programa de obra
- 2- Estimación 03 (finiquito Factura A-2846 y verificación)
- 3- Copia de minuta de terminación de la obra, acta de entrega recepción y acta de extensión de derechos y obligaciones asumidas
- 4- Copia de fianza de vicios ocultos
- 5- Copia de formato D32 opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales

Número de factura	Fecha de factura	Monto total de factura	Sub-total de factura	Retención del 5 al millar para la contraloría	Neto a pagar
A-2846	14/07/2020	\$189,404.01	\$163,279.32	\$816.40	\$188,587.61

Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido enviándole un saludo.

ATENTAMENTE:
"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC LO HACE SU GENTE"

ING. HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



c.p. Archivo
D.O.P./i.k.p.g.

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV

Lugar de Expedición: 45067
 Laurel No. 25
 Mariano Otero Zapopan Jalisco, México
 R.F.C. GCE131114MX9
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL
 4D2B9D1E-E52C-4A07-92A6-7912D5AC0C2C

Cliente : MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. PALACIO MUNICIPAL No. S/N Jocotepec Centro C.P. 45800 Jocotepec, Jocotepec Jalisco, México R.F.C.: MJJ850101KP8 Teléfono: Uso CFDI : I01 - Construcciones	FECHA
	14/7/2020 14:59:27
	Factura
	A - 2846

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave	Clave	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	SERVICIOA	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION PAGO DE EST. 03 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA-VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC,, JALISCO No. CONTRATO GMJ013COP/2020 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$816.40 NETO A PAGAR \$188,587.61 PAGO DE EST. 03 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC,, JALISCO No. CONTRATO GMJ013COP/2020 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$816.40 NETO A PAGAR \$188,587.61	163,279.32	0.00	002 - IVA - 26,124.69	163,279.32

Importe con letra
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 163,279.32
Impuestos Traslados: 26,124.69
TOTAL: 189,404.01

FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
METODO DE PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA : MXN - Peso Mexicano
 Cuenta de Pago : PPD

Tipo de relación :
CFDI Relacionado :

Cadena original del complemento de certificación del SAT: [1;1]4D2B9D1E-E52C-4A07-92A6-7912D5AC0C2C[2]020-07-14T14:59:35[MAS0810247C0]GwN Q0NN15AqsECDp82MaNcVnfFowjNV+Acc9AVe8tdHJ2sUoADQLHYLY4JJUSSx1+57D8m4U6R09Tu qDWEkklVonaht7mpI6EpxVH5H9Lz2d9e2L4eEHm+7UT3vMvPI4eJYneLUDCHDgLXRE9FvBzmBunr1 4WNZLjSmCh+ZccbpUozZELV3uW1QvI9vHhK9764smw6LdEAJynz3sRQEZ[7wCRKEZQDd8X xDCZ52e84w8gFHWTR2]gk3Rpsu22wcyxThFvTOW2kQ8S71CZF81HKIC36tepKuOm3DAFR7YzYp E4U41dAREDSgk2vHg==[00001000000404486074]	Serie del Certificado del emisor: 00001000000408858973
Sello digital CFDI: fGwNQN15AqsECDp82MaNcVnfFowjNV+Acc9AVe8tdHJ2sUoADQLHYLY4JJUSSx1+57D8m4U6R09Tu W6kklVonaht7mpI6EpxVH5H9Lz2d9e2L4eEHm+7UT3vMvPI4eJYneLUDCHDgLXRE9FvBzmBunr1 mCZ52e84w8gFHWTR2]gk3Rpsu22wcyxThFvTOW2kQ8S71CZF81HKIC36tepKuOm3DAFR7YzYpE4U41dAREDSgk2vHg==	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Sello del SAT: qHHTLbdsQWd9EN+Yw61hQH2pmDDVVL+FD0gK/Hf68DGe28NdgPTv48F1uZJCvKsv3AJWC8Nge1S perXEg9w2AV3RzeY7b90MLUVYVpT1fPZMhp7HoJYDINErx4Wk0SHfobkfb5aopkHrAdiNCQmI DdbXx1gGwABASpUq98MhQuV+zzmleBFKQC2vS7H+3d9AGIAmLJm9CJG9jSSyeeLmQpWfA31f OKEDvHqYpJQKNDzdkSw6233YwH83bVpTmJMT9QxZdkV6C9eZU8SLRnRL9EEbedsP4nbwzZ bvJENkF89gky6PtUJMHw==	Fecha y hora de certificación: Julio 14 2020 - 14:59:35



DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL
 EL Julio 14 2020 LA CANTIDAD DE \$ 189,404.01 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 01/100
 M.N. VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION.
 ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS
 Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER
 PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS DE NO VERIFICARSE EL
 PAGO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES AL _____ % MENSUAL.

Firma de Conformidad
 Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCE131114MX9	GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D2B9D1E-E52C-4A07-92A6-7912D5AC0C2C	2020-07-14T14:59:27	2020-07-14T14:59:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$189,404.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 3 (FIN. EMPEDRADO)

No. DE CONTRATO: GMJ 013C 0P/2020

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2020

OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC.

UBICACIÓN : UBICACIÓN: PRIVADA VERANO, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

CONTRATISTA : CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.

FECHA: 14 DE JULIO DEL 2020



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA														
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO		
PRELIMINARES														
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	235.20	0.00	331.00	331.00	-95.80	\$8.70	2,046.24	2,879.70	0.00	-\$	833.46	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES										2,879.70				
EXCAVACIONES														
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION	M3	129.36	0.00	132.40	132.400	-3.04	\$168.16	21,753.18	22,264.38	0.00	-\$	511.20	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EXCAVACIONES										22,264.38				
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES														
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	235.20	0.00	331.00	331.00	-95.80	\$17.84	4,195.97	5,905.04	0.00	-\$	1,709.07	
4	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	47.04	0.00	66.20	66.20	-19.16	\$725.29	34,117.64	48,014.20	0.00	-\$	13,896.56	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES										53,919.24				
SUPERFICIE DE RODAMIENTO														
5	EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE. INCLUYE: TEPETATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	184.80	0.00	273.40	273.40	-88.60	\$ 150.63	27,836.42	41,182.24	0.00	-\$	13,345.82	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR DE H=30CM. INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	84.00	0.00	74.00	74.00	10.00	\$ 132.80	11,155.20	9,827.20	0.00	\$	1,328.00	
7	FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250KG/CM2 DE 20CM DE ESPESOR CON A M 1.5" TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	50.40	0.00	57.60	57.60	-7.20	\$ 523.06	26,362.22	30,128.26	0.00	-\$	3,766.03	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO										81,137.70				
COMPLEMENTARIOS														
8	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	235.20	0.00	331.00	331.00	-95.80	\$ 9.30	2,187.36	3,078.30	-31,709.80	-\$	890.94	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS										3,078.30				
TOTAL										129,654.23	163,279.32	0.00	-\$	33,625.08

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.
CONTRATISTA

ING. RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	PRIVADA VERANO, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUJELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNJIPAL DE JOCOTEPEC.
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 013C 0P/2020

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.		No. DE ESTIMACIÓN:
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		3 (FIN. EMPEDRADO)
DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2020		
FECHA:	14 DE JULIO DEL 2020	PAGINA: 1


NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			ALTO	AREA	restar emp. Existente m2	SUPERFICIE	TOTAL	OBSERVACIONES
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO						
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA	0+00.00 -0+ .10.00	10.00	4.50					45.00	
		0+00.10 -0+ .17.00	7.00	4.50					31.50	
		0+00.17 -0+ .27.00	10.00	8.45					84.50	
		0+00.27 -0+ .370.0	10.00	8.20					82.00	
		0+00.037+48.00	11.00	8.00					88.00	
				48 ML.						
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:								331.00	M2	

CROQUIS:

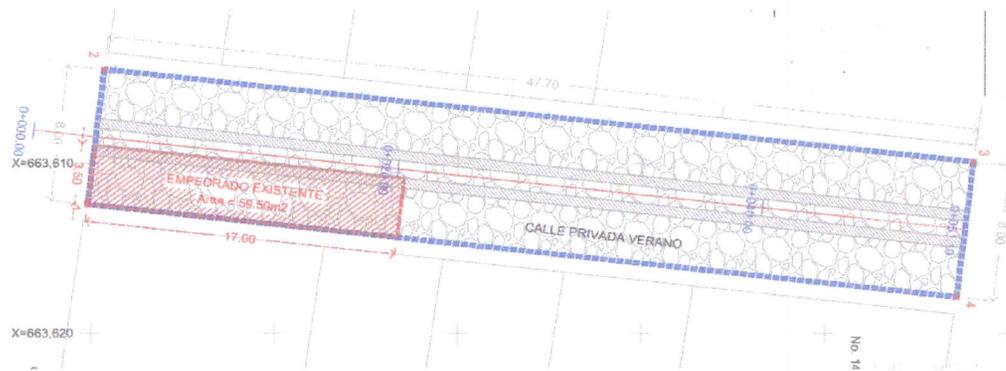

FOTOGRAFÍAS:

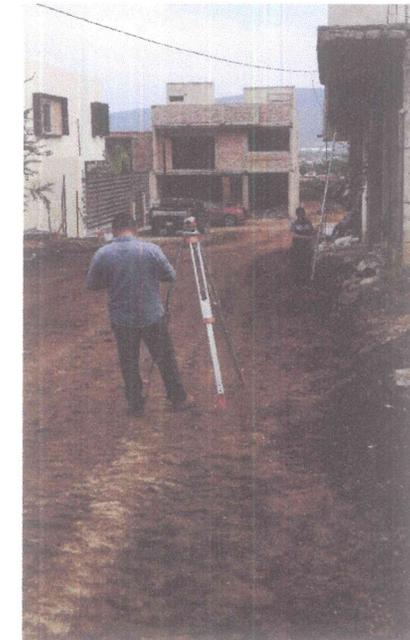

RESIDENETE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO



SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: ING. RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO






MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	PRIVADA VERANO, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC.
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 013C 0P/2020

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2020		3 (FIN. EMPEDRADO)
FECHA:	14 DE JULIO DEL 2020	PAGINA: 2

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			ALTO	AREA	restar emp. Existente m2	SUPERFICIE	TOTAL	ONSERVACIONES
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO						
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION	0+00.00 -0+ .10.00	10.00	4.50	0.4				18.00	
		0+00.10 -0+ .17.00	7.00	4.50	0.4				12.60	
		0+00.17 -0+ .27.00	10.00	8.45	0.4				33.80	
		0+00.27 -0+ .370.0	10.00	8.20	0.4				32.80	
		0+00.037+48.00	11.00	8.00	0.4				35.20	
				48 ML						
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									132.40	M3

CROQUIS:

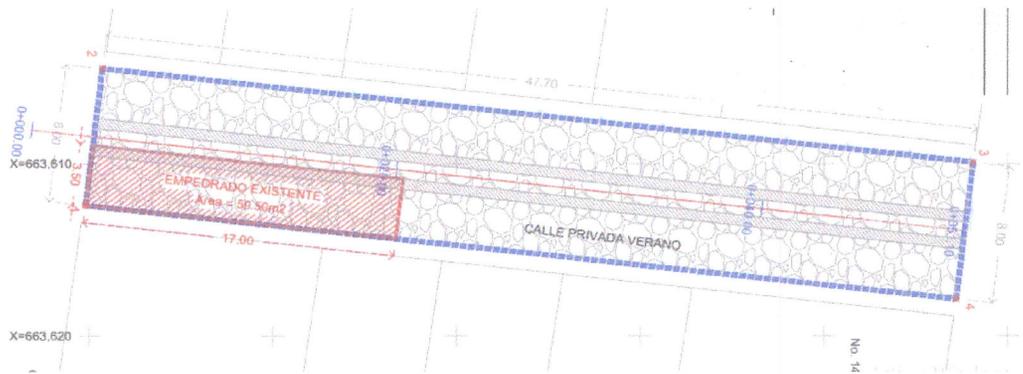

FOTOGRAFIAS:



RESIDENTE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: ING. RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO




MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	PRIVADA VERANO, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC.
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 013C 0P/2020


RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2020		3 (FINIQUITO)
FECHA:	14 DE JULIO DEL 2020	PAGINA: 3

NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			AREA	restar emp. Existente m2	SUPERFICIE	TOTAL	ONSERVACIONES
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO					
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	0+00.00 -0+ .10.00	10.00	4.50				45.00	
		0+00.10 -0+ .17.00	7.00	4.50				31.50	
		0+00.17 -0+ .27.00	10.00	8.45				84.50	
		0+00.27 -0+ .370.0	10.00	8.20				82.00	
		0+00.037+48.00	11.00	8.00				88.00	
				48 ML.					
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:								331.00	m2

CROQUIS:

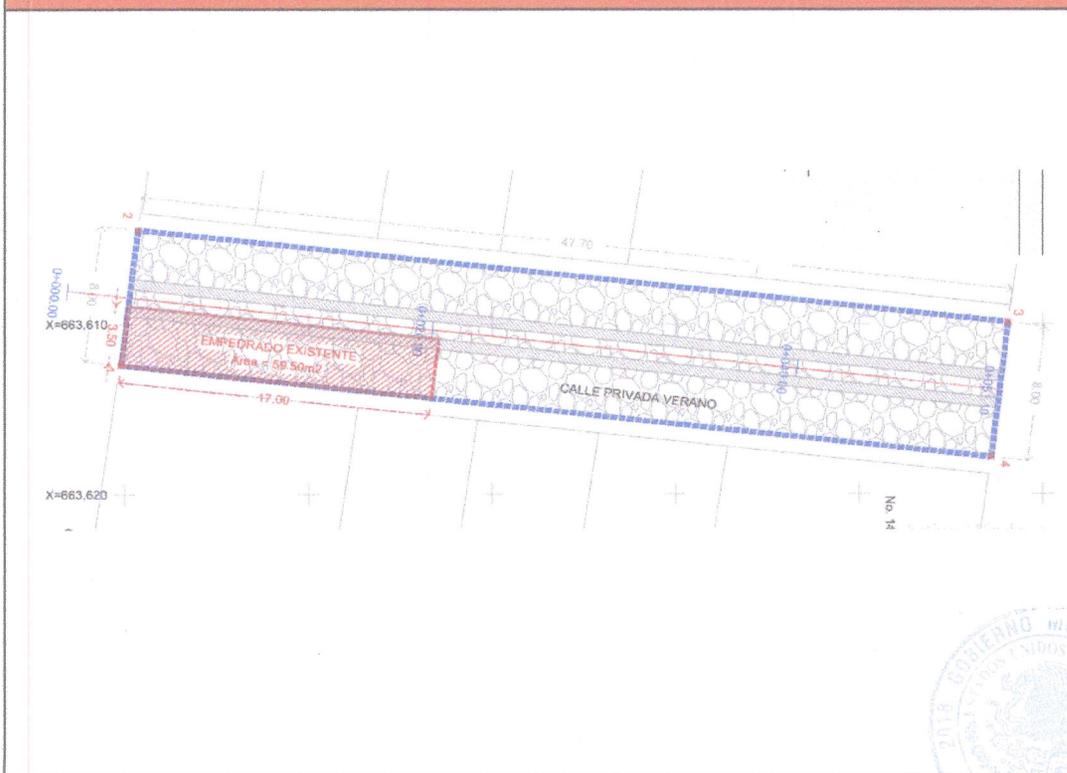

FOTOGRAFIAS:

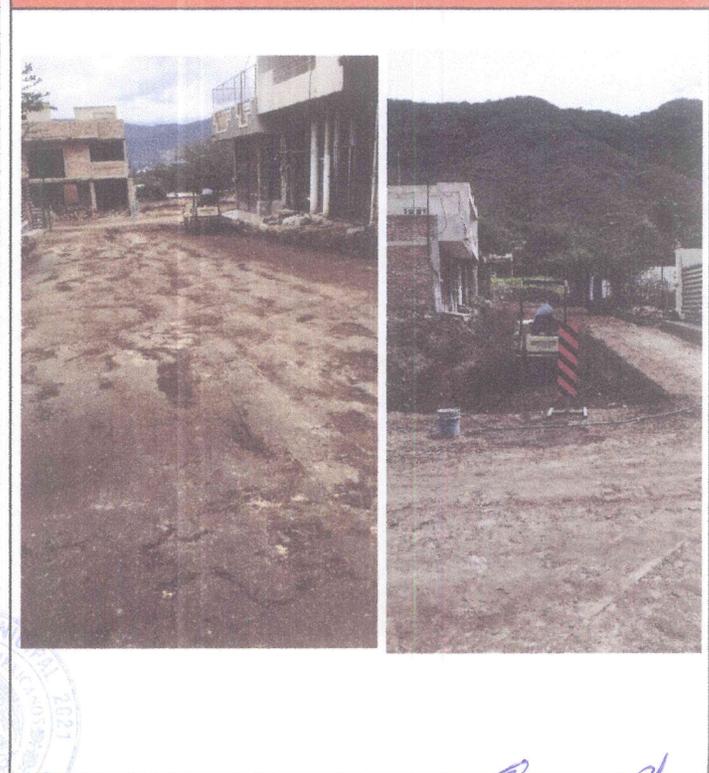

RESIDENTE DE OBRA: R.
RAFAEL ASENCIO .

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: [Signature]






MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	PRIVADA VERANO, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC.
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 013C 0P/2020

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTCR EDVI SA. DE CV.	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2020	3 (FINIQUITO)
FECHA:	PAGINA: 4
14 DE JULIO DEL 2020	

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			ALTO	AREA	restar emp. Existente m2	SUPERFICIE	TOTAL	ONSERVACIONES
		ESTACION	DISTANCIA M	ANCHO						
4	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	0+00.00 -0+ 10.00	10.00	4.50	0.20				9.00	
		0+00.10 -0+ 17.00	7.00	4.50	0.20				6.30	
		0+00.17 -0+ 27.00	10.00	8.45	0.20				16.90	
		0+00.27 -0+ 37.00	10.00	8.20	0.20				16.40	
		0+00.037+48.00	11.00	8.00	0.20				17.80	
				48 ML						
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									66.20	M3

CROQUIS:

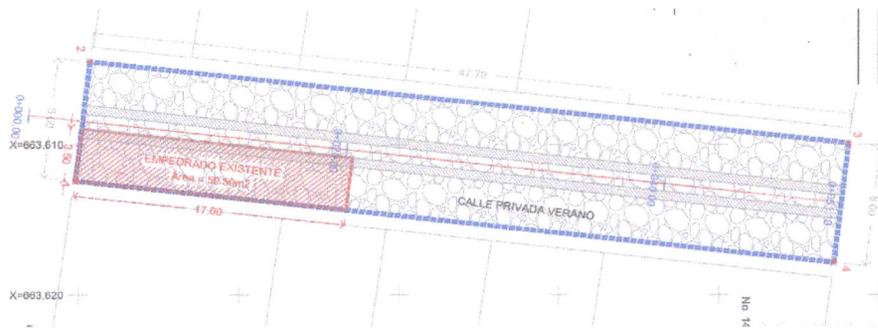

FOTOGRAFIAS:



RESIDENTE DE OBRA: R.
RAFAEL ASENCIO .



SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: ING. RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO





MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	PRIVADA VERANO, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC.	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 013C 0P/2020

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2020		3 (FINIQUITO)
FECHA:	14 DE JULIO DEL 2020	PAGINA: 5


NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			ALTO	AREA	A1+A2	SUPERFICIE	TOTAL	ONSERVACIONES	
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO							
5	EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE, INCLUYE: TEPETATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	0+00.00 -0+ .10.00	10.00	4.50					45.00		
		0+00.10 -0+ .20.00	7.00	4.50					31.50		
		0+00.20 -0+ .30.00	10.00	8.45					84.50		
		0+00.30 -0+ .40.00	10.00	8.20					82.00		
		0+00.040-0+48.00	11.00	8.00					88.00		
			48 ML.								
									HUELLAS M2	-57.60	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:								273.40	M2		

CROQUIS:

FOTOGRAFIAS:

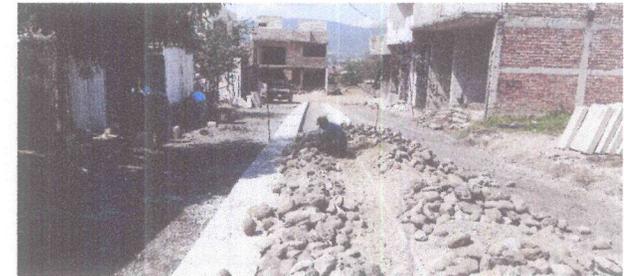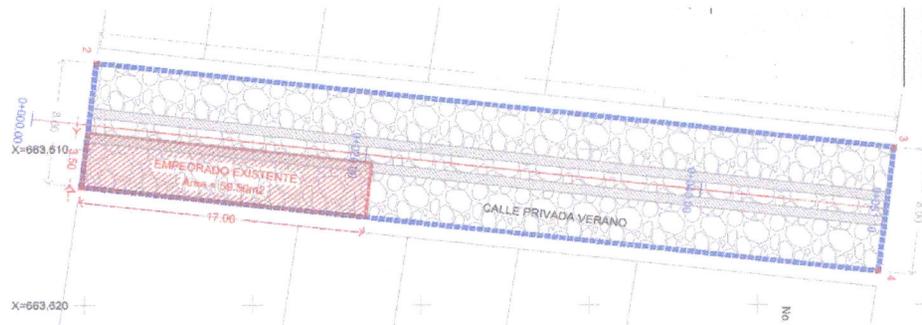

RESIDENTE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO



SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: ING. RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO




MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	PRIVADA VERANO, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC.
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 013C 0P/2020

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.	No. DE ESTIMACION:
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	3 (FINIQUITO)
DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2020	
FECHA:	PAGINA: 6
14 DE JULIO DEL 2020	

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			ML	AREA	A1+A2	SUPERFICIE	TOTAL	ONSERVACIONES	
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO							
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR DE H=30CM. INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECIÓN.	0+000.000			8				8		
					17				17		
					25				25		
					24				24		
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									74.00	ML	

CROQUIS:

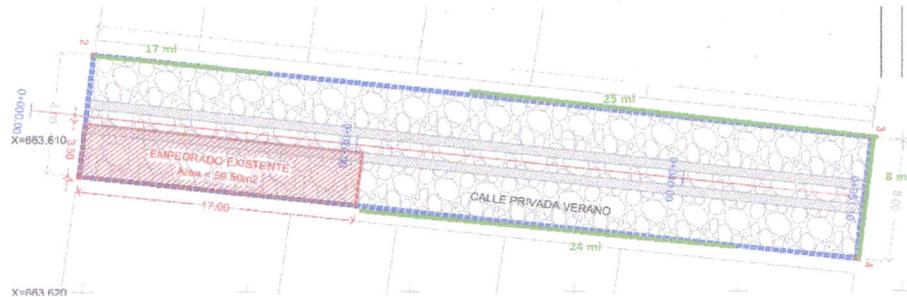

FOTOGRAFIAS:



RESIDENTE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO





SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: ING. RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO




MUNICIPIO:	JOCOTEPEC JALISCO
LOCALIDAD:	PRIVADA VERANO, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC.	
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 013C 0P/2020

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA. DE CV.		
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2020		3 (FINIQUITO)
FECHA:	14 DE JULIO DEL 2020	PAGINA: 8

NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	CADENAMIENTO			AREA	restar emp. Existente m2	SUPERFICIE	TOTAL	ONSERVACIONES
		ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO					
6	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	0+00.00 -0+ 10.00	10.00	4.50				45.00	
		0+00.10 -0+ 20.00	7.00	4.50				31.50	
		0+00.20 -0+ 30.00	10.00	8.45				84.50	
		0+00.30 -0+ 40.0	10.00	8.20				82.00	
		0+00.040-0+48.00	11.00	8.00				88.00	
					48 ML.				
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:								331.00	M2

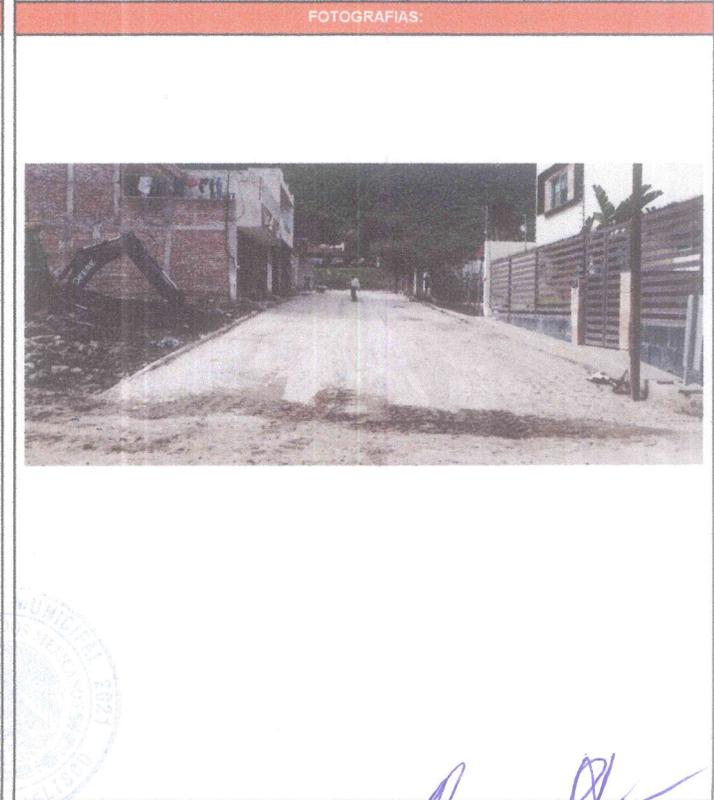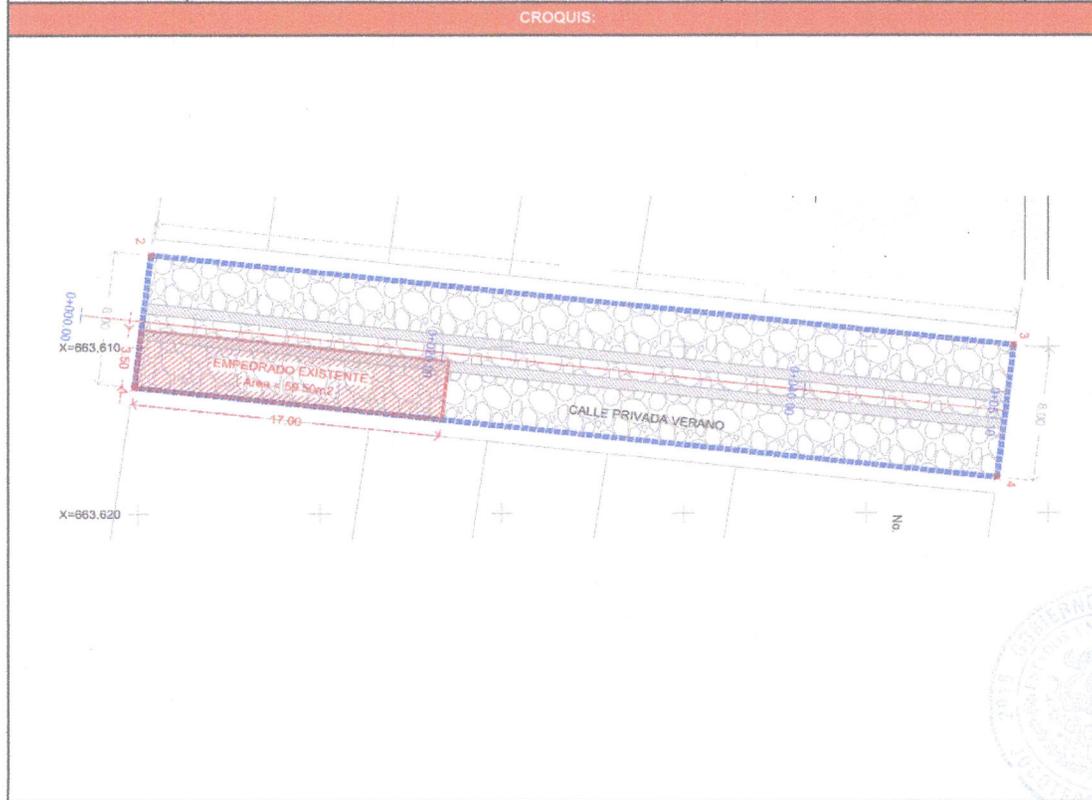

RESIDENETE DE OBRA: RAFAEL ASENCIO



SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: ING. RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

Clave de R.F.C.

20NB3925311

GCE131114MX9

Nombre, Denominación o Razón social

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 20 de mayo de 2020, a las 15:12 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||GCE131114MX9|20NB3925311|20-05-2020|N||00001088888800000031||

Sello Digital

gcKx1d2/9PrF+17JiNVytaEEMZT7ME2uu+6h0PGO75wAxsmS4ML2Gwo+UfsxLA+DkyT3NnxC9e5ScLL8cU6PXwG
n+otiwRV57gFSqWg2I9/g5al8RfQ0/CPzfpz/1wcCeLhkofQxuKlbsNf+EHlIFgPMqdBiCkL47NltnKkCuWI=



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México, Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||GCE131114MX9|20NB3925311|20-05-2020|N||00001088888800000031||

Sello Digital

gcKx1d2/9PrF+17JiNVytaEEMZT7ME2uu+6h0PGO75wAxsmS4ML2Gwo+UfsxLA+DkyT3NnxC9e5ScLL8cU6PXwG
n+otiwRV57gFSqWg2I9/g5al8RfQ0/CPzfpz/1wcCeLhkofQxuKlbsNf+EHllFgPMqdBiCkL47NltmKkCuWl=



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.
