

FECHA
17/8/2020 16:35:11

Factura
- 180

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL
7E52B934-653B-442A-99F6-8EFC46FF9B34

Emisor: GRUPO ARANGE SA DE CV	Receptor: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
La Azucena El Salto Jalisco, México	PALACIO MUNICIPAL No. S/N Jocotepec Centro C.P. 45800
R.F.C.: GAR120528C46	Jocotepec, Jalisco, México
Lugar de Expedición: 45680	R.F.C.: MJJ850101KP8 Teléfono:
Tulipanes Norte No. 10 D	Uso CFDI : 101 - Construcciones

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave	Clave	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	APOYO	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION PAGO DE ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GPE. VICTORIA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO, JALISCO No. CONTRATO GMJ009COP/2020 RETENCION DEL .005% PARA LA CONTRALORIA \$347.59 NETO A PAGAR \$40,668.34 PAGO DE ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GPE. VICTORIA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO, JALISCO No. CONTRATO GMJ009COP/2020 RETENCION DEL .005% PARA LA CONTRALORIA \$347.59 NETO A PAGAR \$40,668.34	35,358.56	0.00	002 - IVA - 5,657.37	35,358.56

Importe con letra
CUARENTA Y UN MIL QUINCE PESOS 93/100 M.N.
MONEDA : MXN - Peso Mexicano

Subtotal: 35,358.56
Impuestos Traslados: 5,657.37
TOTAL: 41,015.93

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir
METODO DE PAGO :
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de relación : -

CFDI Relacionado :

Caduna original del complemento de certificación del SAT: [1,17E52B934-653B-442A-99F6-8EFC46FF9B34]2020-08-17T16:38:15[MAS0810247C0Z1U]hrywR47a9XjMa51Aa3qjuz7c+q9Jp22erXteNA2dk5383zrzqzqzGjqr8I69CdwLs7y+MgdGfpcldYKnb8TYZVnVvdPjPirICz8a9EClAyYDnbnByD8yhndLrHnJA5G85AeJxdPZBgjedG8a9YZ+n[D]6vKz+1QlAKR6VA2TZWnA3y+SZCZEat.Na2mBAHbC0VEOLaZaHFFPFLUwqLVNpqBqY7VtbelPLUgD4jqtQwOvMwLrFkcg198rudUjP+HoCqfInG8UHLT20wz6E8RBY0FVEADYmWduypTelBkd06lpzjhj9GwaVwCR1PQV6g==[00001000000404486074]]	Serie del Certificado del emisor: 00001000000413132280
Sello digital CFDI: Z1LlRizwR47a9XjMa51Aa3qjuz7c+q9Jp22erXteNA2dk5383zrzqzqzGjqr8I69CdwLs7y+MgdGfpcldYKnb8TYZVnVvdPjPirICz8a9EClAyYDnbnByD8yhndLrHnJA5G85AeJxdPZBgjedG8a9YZ+n[D]6vKz+1QlAKR6VA2TZWnA3y+SZCZEat.Na2mBAHbC0VEOLaZaHFFPFLUwqLVNpqBqY7VtbelPLUgD4jqtQwOvMwLrFkcg198rudUjP+HoCqfInG8UHLT20wz6E8RBY0FVEADYmWduypTelBkd06lpzjhj9GwaVwCR1PQV6g==	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Sello del SAT: [G]IH7JmR80APINdwdkHCEGukAwPp1EptqYsoIM6imiU2znYlyNOMbn2QA+ImXISeXcK0mWf9EOWu4kaRk46Bjpa4jpyTjCvF0oz1cV82npJhYUJyU1W47w8z74BtY9Wtm1gLmSaH0EnLav1LThr8l07SRf8Bendf1DUjB+9SIBREFS+6yCTDZw0c08U9116mYzLk8n5ErfDapZCYLpK1Yuk8xhLn3XcYWfkdE8b1EvCbWzY27Elvq8B3PZ5H7UQb8nrc:5a0LqZpK35JEDbCJa0RT1reCk9BkFCP1qNqbaqNsPt+b0qhkoXzpqQ=	Fecha y hora de certificación: Agosto 17 2020 - 16:38:15




DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE GRUPO ARANGE SA DE CV EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL Agosto 17 2020 LA CANTIDAD DE \$ 41,015.93 CUARENTA Y UN MIL QUINCE PESOS 93/100 M.N. VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION.

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS DE NO VERIFICARSE EL PAGO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES AL _____ % MENSUAL.


Firma de Conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAR120528C46	GRUPO ARANGE SA DE CV	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E52B934-653B-442A-99F6-8EFC46FF9B34	2020-08-17T16:36:11	2020-08-17T16:36:15	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$41,015.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir




Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

 <p>Jocotepec Ayuntamiento Municipal 2010 - 2021</p> <p>H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</p>	<p>No. DE CONTRATO: GMJ 009C 0P/2020</p> <p>CONTRATISTA: GRUPO ARANGE SA. DE CV.</p> <p>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GPE. VICTORIA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO.</p> <p>UBICACIÓN: AV. DE LOS MAETROS CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.</p>	<p>ESTIMACIÓN No. 2 FINIQUITO</p> <p>FECHA: 14 DE AGOSTO DEL 2020</p> <p>PERÍODO DE TRABAJO: DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2020</p> 
---	---	---

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES	
1	PRELIMINARES				\$	-
2	EXCAVACIONES				\$	7,590.74
3	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				\$	23,677.36
4	SUPERFICIE DE RODAMIENTO				\$	19,174.37
5	COMPLEMENTARIOS				\$	4,630.57
6					\$	14,445.00
					MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 69,518.04
					MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$ 34,159.48
					SUBTOTAL	\$ 35,358.56
					I. V. A. 16%	\$ 5,657.37
					SUMA	\$ 41,015.93
					MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
					MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 347.59
					NETO A PAGAR	\$ 40,668.34
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:		
ASIGNACIÓN	\$	273,275.86	\$	43,724.14	\$	317,000.00
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$	69,518.04	\$	11,122.89	\$	80,640.93
ACUMULADO ANTERIOR	\$	203,315.96	\$	32,530.55	\$	235,846.51
ACUMULADO A LA FECHA	\$	272,834.00	\$	43,653.44	\$	316,487.44
SALDO	\$	441.86	\$	70.70	\$	512.56
ANTICIPO						
ANTICIPO %	\$	68,318.97	\$	10,931.04	\$	79,250.01
AMORTIZACIÓN	\$	34,159.48	\$	5,465.52	\$	39,625.00
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$	34,159.48	\$	5,465.52	\$	39,625.00
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$	68,318.96	\$	10,931.03	\$	79,249.99
FALTANTE POR AMORTIZAR	-\$	0.01	\$	-	-\$	0.01
					RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
					 C. JUAN LARIOS DE LA TORRE	 GRUPO ARANGE SA. DE CV.
					SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
					 ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO	 ING. HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



PERÍODO DE TRABAJO: DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2020
OBRA : OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
NORMAL EN AV. DE LOS MAESTROS
ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GPE.

UBICACIÓN : UBICACIÓN: AV. DE LOS MAESTROS CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
CONTRATISTA : CONTRATISTA: GRUPO ARANGE SA. DE CV.
FECHA: 14 DE AGOSTO DEL 2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PRELIMINARES												
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	M2	488.63	456.00	0.00	456.00	32.63	\$8.70	4,251.08	0.00	3,967.20	\$ 283.88
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES									0.00			
EXCAVACIONES												
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION	M3	268.75	209.00	45.14	254.14	14.61	\$168.16	45,193.00	7,590.74	35,145.44	\$ 2,456.82
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EXCAVACIONES									7,590.74			
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES												
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	488.63	380.00	82.08	462.08	26.55	\$22.06	10,779.18	1,810.68	8,382.80	\$ 585.69
4	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	97.73	76.00	16.42	92.42	5.31	\$584.98	57,170.10	9,605.37	44,456.48	\$ 3,106.24
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	97.73	76.00	16.42	92.42	5.31	\$746.73	72,977.92	12,261.31	56,751.48	\$ 3,965.14
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES									23,677.36			
SUPERFICIE DE RODAMIENTO												
6	EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE, INCLUYE: TEPETATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	488.63	342.00	120.08	462.08	26.55	\$ 159.68	78,024.44	19,174.37	54,610.56	\$ 4,239.50
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO									19,174.37			
COMPLEMENTARIOS												
7	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	488.63	0.00	462.08	462.08	26.55	\$ 9.40	4,593.12	4,343.55	0.00	\$ 249.57
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA(OBRA EN CONSTRUCCION) PARA DESVIAR EL TRAFICO. DE LA CALLE EN CONSTRUCCION.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 287.02	287.02	287.02	0.00	\$
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS									4,630.57			
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO												
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOZA DE CONCRETO DE 10 CM. FC=150, INCLUYE BASE DE 10CM DE MATERIAL DE BANCO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	0.00	0.00	27.00	27.00	-27.00	\$ 535.00	0.00	14,445.00	0.00	-\$ 14,445.00
SUBTOTAL DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO									14,445.00			
TOTAL									273,275.66	69,518.04	203,315.96	\$ 441.84


Arnulfo Avila B.
GRUPO ARANGE SA. DE CV.
CONTRATISTA

[Firma]
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[Firma]
ING. HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
	LOCALIDAD:	UBICACIÓN: AV. DE LOS MAESTROS CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	CONTRATISTA: GRUPO ARANGE SA. DE CV.	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GPE.	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 009C 0P/2020	DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2020	2 FINIQUITO
			FECHA:	PAGINA: 2
			14 DE AGOSTO DEL 2020	

NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		CADENAMIENTO							
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION	0+050.00	0+060.80	10.8	7.6	0.55		45.14	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:								45.14	M3

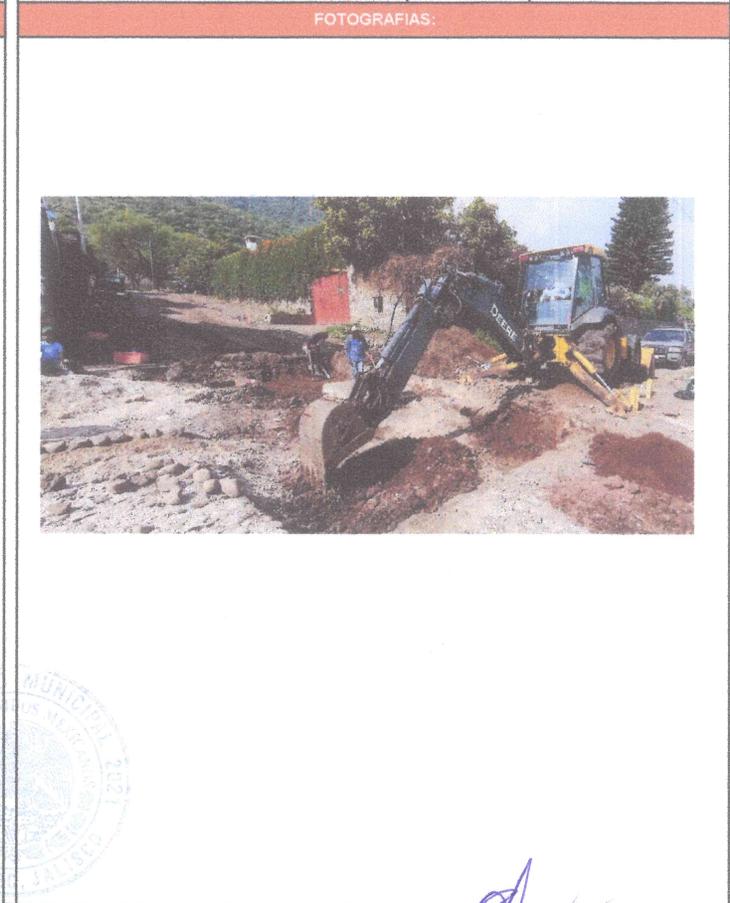


RESIDENETE DE OBRA:  _____
 C. JUAN LARIOS DE LA TORRE



SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:  _____
 ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO


	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:				NÚMEROS GENERADORES
	LOCALIDAD:	UBICACIÓN: AV. DE LOS MAESTROS CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	CONTRATISTA: GRUPO ARANGE SA. DE CV.				
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		PERIODO DE ESTIMACIÓN:				No. DE ESTIMACION:
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 009C 0P/2020	DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2020				2 FINIQUITO
		FECHA:				PÁGINA: 3	
		14 DE AGOSTO DEL 2020					

NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		CADENAMIENTO							
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	0+050.00	0+060.80	10.8	7.6			82.08	
								TOTAL DE ESTE CONCEPTO: 82.08	

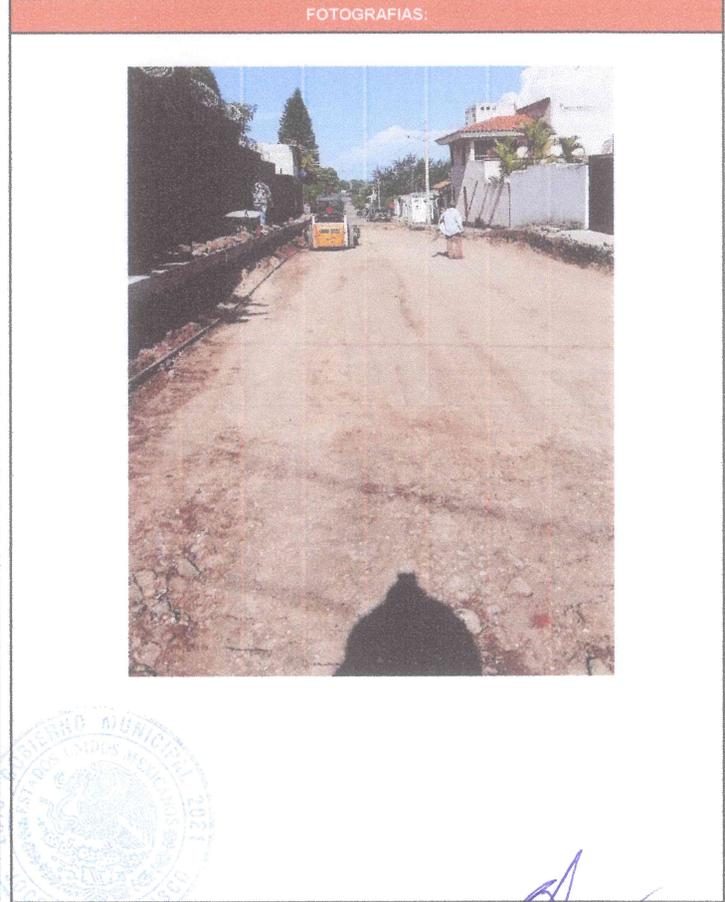


RESIDENETE DE OBRA: C. JUAN LARIOS DE LA TORRE

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO



	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
	LOCALIDAD:	JUBICACIÓN: AV. DE LOS MAESTROS CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	CONTRATISTA: GRUPO ARANGE SA. DE CV.	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GPE.	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 009C 0P/2020	DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2020	2 FINIQUITO
			FECHA:	PAGINA: 4
			14 DE AGOSTO DEL 2020	

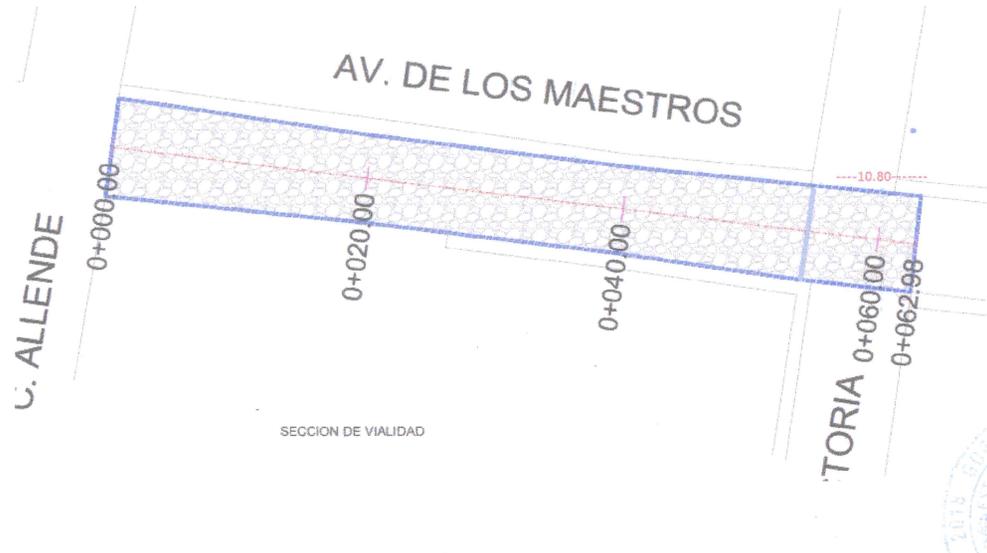NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		CADENAMIENTO							
4	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	0+050.00	0+060.80	10.8	7.6	0.2		16.42	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:								16.42	M3
CROQUIS:					FOTOGRAFIAS:				
					 				

RESIDENETE DE OBRA: 
 C. JUAN LARIOS DE LA TORRE




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: 
 ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO

	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
	LOCALIDAD:	UBICACIÓN: AV. DE LOS MAESTROS CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	CONTRATISTA: GRUPO ARANGE SA. DE CV.	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GPE.	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 009C 0P/2020	DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2020	2 FINIQUITO
		FECHA:	14 DE AGOSTO DEL 2020	PAGINA: 5

NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		CADENAMIENTO							
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	0+050.00	0+060.80	10.8	7.6	0.2		16.42	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:								16.42	M3

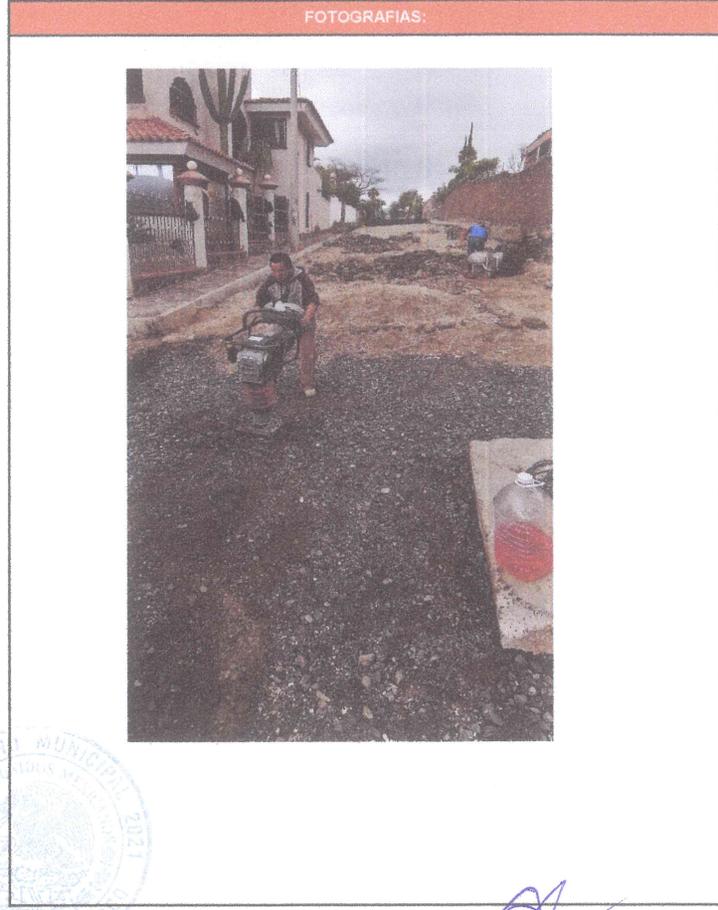


RESIDENETE DE OBRA: C. JUAN LARIOS DE LA TORRE




SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO

	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
	LOCALIDAD:	UBICACIÓN: AV. DE LOS MAESTROS CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	CONTRATISTA: GRUPO ARANGE SA. DE CV.		
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GPE.		DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2020		2 FINIQUITO
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 009C 0P/2020		FECHA:	14 DE AGOSTO DEL 2020	PAGINA: 6

NÚMEROS GENERADORES										
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES	
		CADENAMIENTO								
6	EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE, INCLUYE: TEPETATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	0+045.00	0+060.80	15.8	7.6			120.08		
								0.00		
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:								120.08	M2	

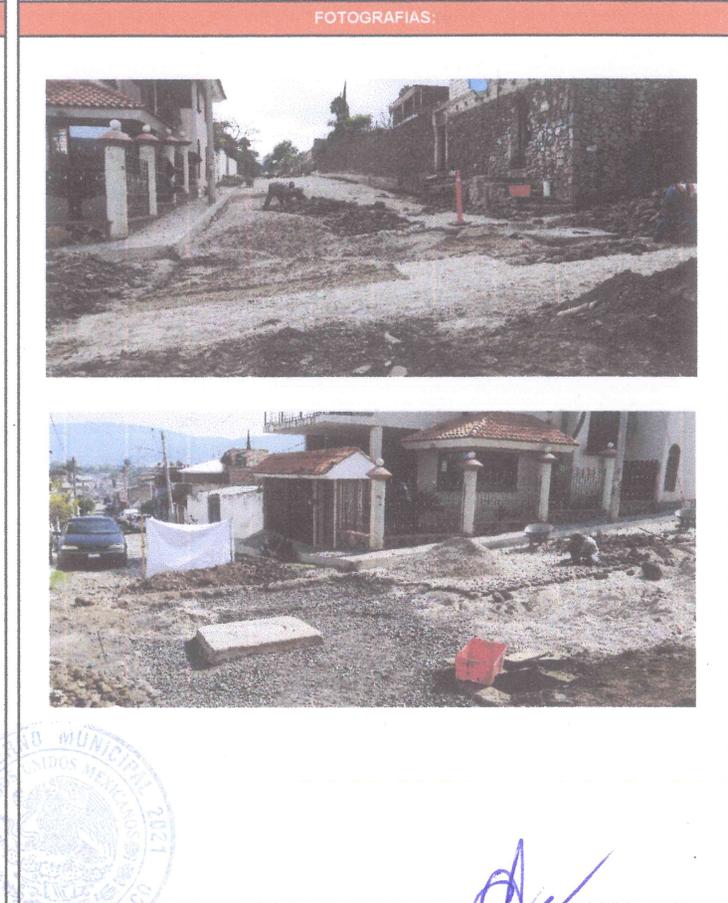


RESIDENETE DE OBRA: _____
C. JUAN LARIOS DE LA TORRE




SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: _____
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO

	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
	LOCALIDAD:	UBICACIÓN: AV. DE LOS MAESTROS CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	CONTRATISTA: GRUPO ARANGE SA. DE CV.	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GPE.	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 009C 0P/2020	DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2020	2 FINIQUITO
		FECHA:	14 DE AGOSTO DEL 2020	PAGINA: 7

NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		0+000	0+060.80						
7	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.			60.8	7.6			462.08	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:								462.08	M2

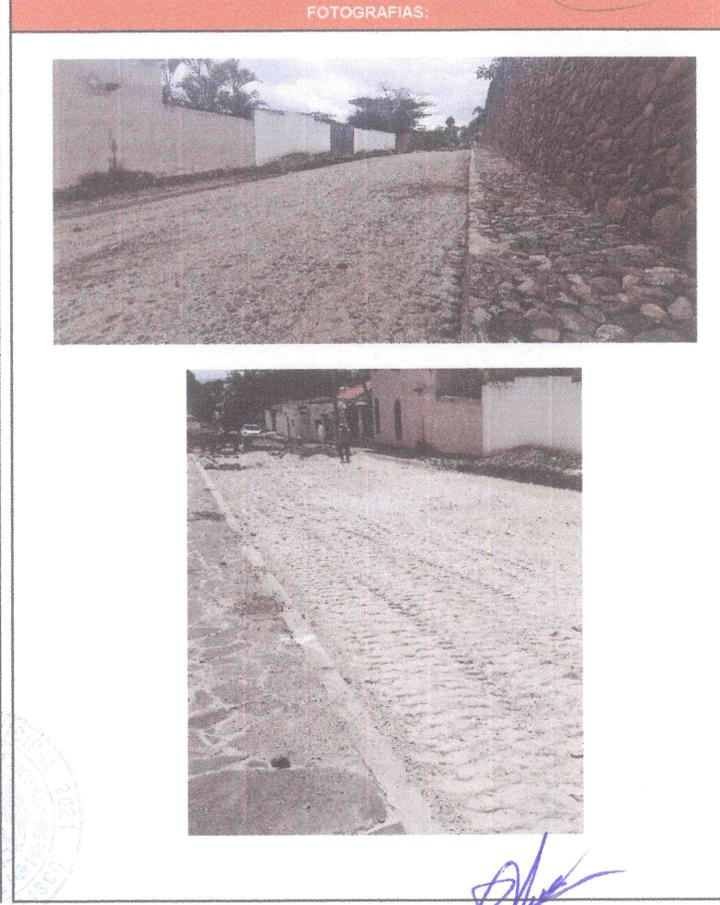


RESIDENETE DE OBRA: 
 C. JUAN LARIOS DE LA TORRE




SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: 
 ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO

	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
	LOCALIDAD:	UBICACIÓN: AV. DE LOS MAESTROS CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	CONTRATISTA: GRUPO ARANGE SA. DE CV.	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
	OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GPE		DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2020	2 FINIQUITO
No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 009C 0P/2020		FECHA:	PAGINA: 8
			14 DE AGOSTO DEL 2020	

NÚMEROS GENERADORES										
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		CADENAMIENTO								
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMATIVA(OBRA EN CONSTRUCCION) PARA DESVIAR EL TRAFICO. DE LA CALLE EN CONSTRUCCION.							1		
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									1.00	pza

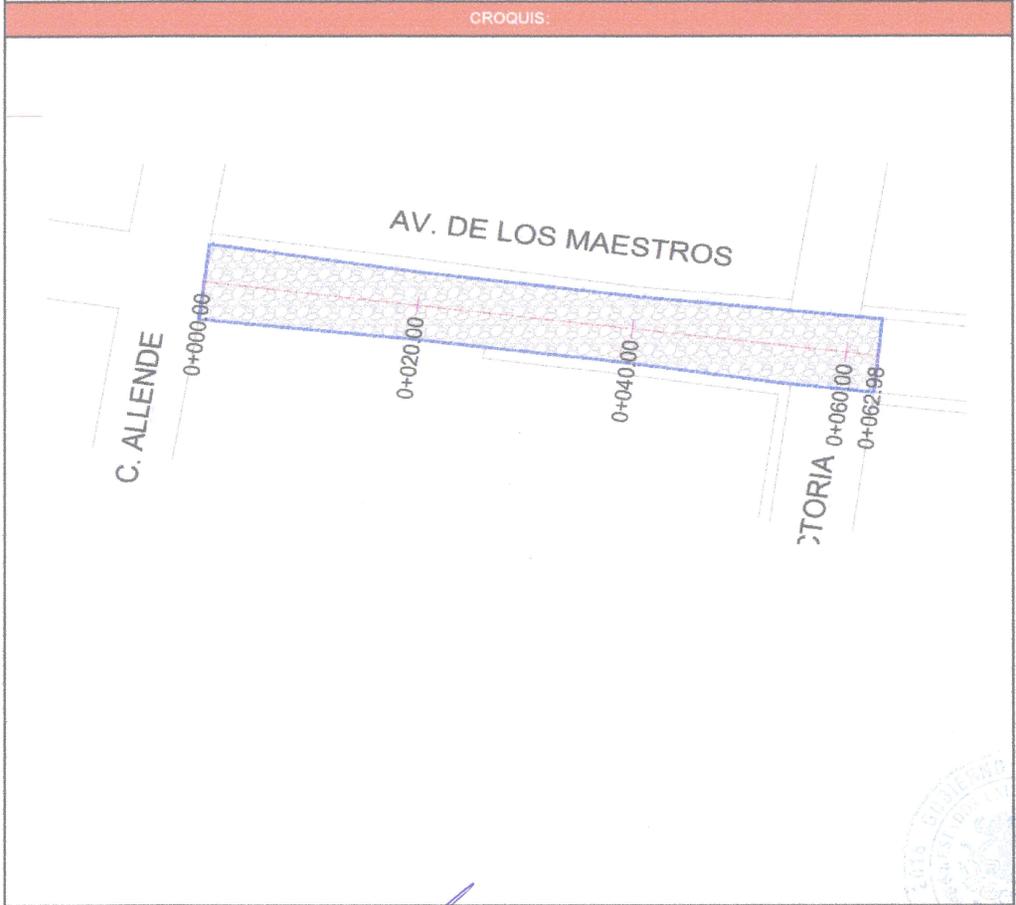


RESIDENETE DE OBRA: C. JUAN LARIOS DE LA TORRE




SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO

 <p>Jocotepec Municipio 1918 - 2021</p>	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES No. DE ESTIMACION: 2 FINIQUITO	
	LOCALIDAD:	UBICACIÓN: AV. DE LOS MAESTROS CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO	CONTRATISTA: GRUPO ARANGE SA. DE CV.		
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GPE.	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONTRATO: GMJ 009C 0P/2020	DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2020	FECHA:	14 DE AGOSTO DEL 2020

NÚMEROS GENERADORES										
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	ONSERVACIONES
		CADENAMIENTO								
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOZA DE CONCRETO DE 10 CM. FC=150, INCLUYE BASE DE 10CM DE MATERIAL DE BANCO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				13	1.00			27.00	
					14	1.00				
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									27.00	M2

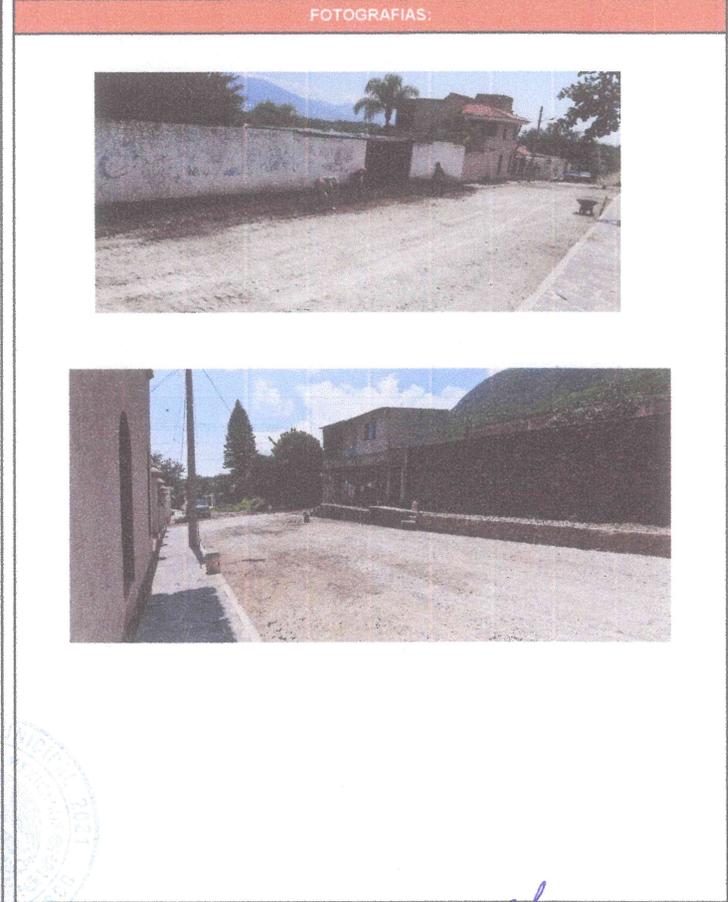

RESIDENTE DE OBRA:  _____
 C. JUAN LARIOS DE LA TORRE



SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:  _____
 ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

20NB7975951

Clave de R.F.C.

GAR120528C46

Nombre, Denominación o Razón social

GRUPO ARANGE SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 30 de junio de 2020, a las 12:53 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||GAR120528C46|20NB7975951|30-06-2020|P||00001088888800000031||



Sello Digital

CEGOC/fgFme6LFD0TXISNnkLclp/iO6y6+87I+4DrjDCQzaVav3Cawae02Cybi9t1G4Kw5MPOiK1mc0DKVW0QH3
OSzYuvoshnK7g0qBdks8Oyyq+yF2rcaD1DPoJ1RGG78chyApa8Dj3/HGXsXzpVSJLdB1KwxYWJVVDaHy9Qw=



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y EFICIENCIA PÚBLICA



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||GAR120528C46|20NB7975951|30-06-2020|P||00001088888800000031||

Sello Digital

CEGOC/fgFme6LFDoTXISNnkLclp/iO6y6+87I+4DrjDCQzaVav3Cawae02Cybi9t1G4Kw5MPOiK1mc0DKVW0QH3
OSzYuvoshnK7g0qBdks8Oyyq+yF2rcaD1DPoJ1RGG78chyApa8Dj3/HGXsXzpVSJLdB1KwxYWJVVDaHy9Qw=



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.
