



ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E  
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION: V SURESTE  
PROGRAMA: FONDEREG  
EJERCICIO: 2018  
NOMBRE DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO  
EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A  
LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE  
JOCOTEPEC.

MUNICIPIO: JOCOTEPEC  
NOMBRE DE LA ACCION:

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

MONTO ASIGNADO: \$ 2'724,218.37

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MOVILIDAD, PEATONAL, ALUMBRADO PUBLICO Y  
COLOCACION DE BANCAS Y BOTES PARA BASURA.

Fecha de Inicio: 11 DE JUNIO DE 2018      Fecha de Termino Real: XXX  
Metas Proyectadas: 3338.90 M2      Metas Alcanzadas: XXX  
Beneficiarios Directos: 4,000      Beneficiarios Indirectos: 4,000

AVANCE	MAYO		JUNIO		JULIO		GOSTO		SEPTBRE		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Fisico	0%			70%							70.0%
Financiero	0%			70%							70.0%

DESCRIPCIÓN DE AVANCE FISICO:

FABRICACION DE BASES Y MACHUELOS, ASI COMO 100% DE LA COLOCACION DE ADOQUIN Y FABRICACION  
DE BASES PARA LAMPARAS.

DESCRIPCIÓN DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:

PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION N°1

Situación de la Obra:    No Iniciada (    )      Terminada sin Operar: (    )  
                                  En Proceso (    X    )      Terminada y Operando: (    )  
                                  Suspendida (    )

OBSERVACIONES:

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO MUNICIPAL

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO

Nombre: ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

Coordinador Regional

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha del reporte a 2 de AGOSTO de 2018

*Recibido  
Plan D.  
20-08-18*



**SUB SECRETARIA DE PLANEACION  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2018**

REGION

**CEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA**

PROGRAMA: FONDEREG  
 EJERCICIO: Fondereg 2018  
 NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC.


MUNICIPIO: JOCOTEPEC LOCALIDAD: JOCOTEPEC  
 NOMBRE DE LA ACCION:

MONTO ASIGNADO: \$ 2'724,218.37


ANTES




INICIO

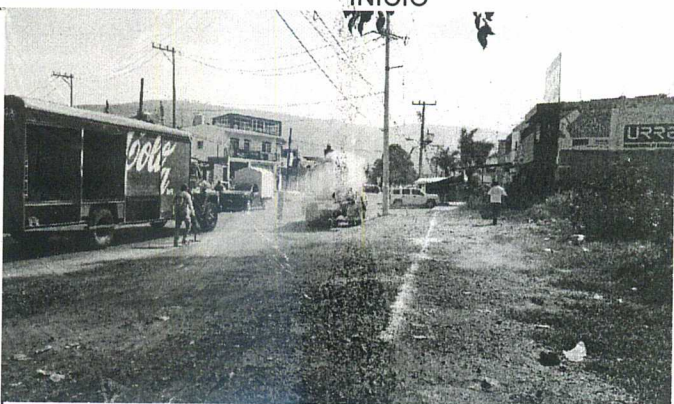

PROCESO

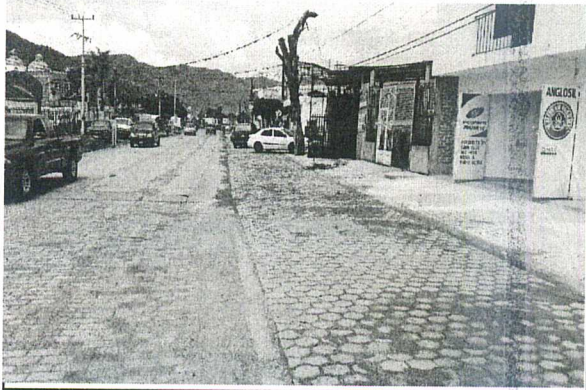

FINAL



GOBIERNO DEL ESTADO  
 REGIÓN No. V SURESTE

*[Signature]*

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO  
 COORDINADOR REGIONAL

GOBIERNO MUNICIPAL

*[Signature]*

Nombre: ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

Cargo Director de Obras Públicas



SELLO MPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fecha de reporte a 2 de AGOSTO de 2018
