



Folio: A 380

No. de serie de certificado del CSD: 00001000000409585936

Información del cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO Fecha: 17-09-2020 19:31:10
RFC: MJJ850101KP8 Uso CFDI: 101-Construcciones
Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO JOCOTEPEC 45800 JOCOTEPEC JALISCO MEX

Información del emisor:

Razón social: OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO Lugar de expedición: 45594
RFC: GOTO750322EC5 Régimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Dirección: TIERRA DEL TRIUNFO 178 TERRALTA SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45594 JALISCO MÉXICO

Información del pago:

Método: PUE-Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Condiciones:
Forma: 03-Transferencia electrónica de fondos Tipo de cambio

Table with 9 columns: Código, Clave producto o servicio, Cantidad, Unidad, Clave unidad, Descripción, Precio unitario, Descuento, Importe. Row 1: PAVIM, 22101614, 1, No Aplica, ZZ-Mutualmente definido, Pago de Estimacion No. 1 (UNO), relativo a la obra; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHEMOC 4TA ETAPA. EN LA DELEGACION DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 1,006.90 MONTO EFECTIVO PARA PAGO; \$ 232,594.41, \$201,380.44, \$0.00, \$201,380.44

Observaciones:

Cantidad con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS 31/100 M.N.

Código QR:



Folio fiscal: a4ede772-29e7-4917-98d6-b1dfb8aa70f5
Número de serie del certificado SAT: 00001000000408254801
Fecha de certificación: 17-09-2020 19:36:11

Subtotal: \$201,380.44
002-IVA Traslado 0.160000 %: \$32,220.8704
Total: \$233,601.31

Sello CFDI:

Cjn2PbV70OHUFGJza3ZDephty++yH1TghmOpVBPkR7NhcU5+74GBkSg0FUZ
RyV8Maj3XEU1LatYDX11a8HxglR9VatRkRv5mq+CrckzqJvdsOz+6AyeyHEQOq4
gpBvWV0YpD6hmfQjMDccCuiXkmQ8Ppch8FpZDJHlc1grfY00NxzU75HuxQ+B
cLhjuC2x5KaNemaUw7RwkdAgjmGw6+ap9f8a5AhSjBzdZaacHJVnz14vaB2J0yb
qk73+ZS+ow14aUpN6Bmg3VWpKz660KQaz+oPzmSVbm8+06zQuP68m4FInRQ
UeGH+D7wQ=

Sello SAT:

VtdccF9XwewUlenZf7q+2GE D x3UZyAg2W12EHm81T3xe7duNvL5cnBLW6Ji
uTGCOZ2zmsq22r6yfaS5SubYQIFBodg9kLXNHA8uyy8g54F+NuR2n5nDGL
OPALV6MMwbOkoe1L2upxFrFSQWNGstzic7umIHbHyDJYH0PllF5ObrwXwBri
ZIEI0yeIS8Ogh6U78cs+9cY0eSOYVpB8SgW7ODK95x9g5zgmJkkrad+Vzv5Pbz
QzifGrIVRIGTXTKBbzZTtnsqA7iyYbXh4gJZqH0AkkFqX6sDnLbQe4U5BZ4B
YMLJ7ZEaxQ=

Cadena original SAT:

||1.1|e4ede772-29e7-4917-98d6-b1dfb8aa70f5|2020-09-17T19:36:11||LSC01306189R5|C
jn2PbV70OHUFGJza3ZDephty++yH1TghmOpVBPkR7NhcU5+74GBkSg0FUZR
yV8Maj3XEU1LatYDX11a8HxglR9VatRkRv5mq+CrckzqJvdsOz+6AyeyHEQOq4
gpBvWV0YpD6hmfQjMDccCuiXkmQ8Ppch8FpZDJHlc1grfY00NxzU75HuxQ+Bcl
hjuC2x5KaNemaUw7RwkdAgjmGw6+ap9f8a5AhSjBzdZaacHJVnz14vaB2J0ybqk
73+ZS+ow14aUpN6Bmg3VWpKz660KQaz+oPzmSVbm8+06zQuP68m4FInRQU
eGH+D7wQ=|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SW

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOTO750322EC5	OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A4EDE772-29E7-4917-98D6-B1DFB8AA70F5	2020-09-17T19:31:10	2020-09-17T19:36:11	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$233,601.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Enlaces

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

20NB4634821

Clave de R.F.C.

GOTO750322EC5

Nombre, Denominación o Razón social

OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 27 de mayo de 2020, a las 13:17 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||GOTO750322EC5|20NB4634821|27-05-2020|P||00001088888800000031||

Sello Digital

IzY+qR+TVfRpa5+hAjsfmzxJRYjQ8BXkguf32E2r4RigfueKQUDGoMziNqgl1A6FE2fA3V8h8JG1TALEfTZBVy+GYJP
3a9DT5a6hntfJFS/0AZxG9jpFyYx9N0326abUt1h+61zshYVlzB2ckwhfyvI+GjGHmitr38rj0LdSxA=



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

- 3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
- 4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
- 5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
- 6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||GOTO750322EC5|20NB4634821|27-05-2020|P||00001088888800000031||

Sello Digital

IzY+qR+TVfRpa5+hAjsfmzxJRYjQ8BXkguf32E2r4RigfueKQUDGoMziNqgI1A6FE2fA3V8h8JG1TALEfTZBVy+GYJP
3a9DT5a6hntfJFS/0AZxG9jpFyYx9N0326abUt1h+61zshYVlzB2ckwhfvvyl+GjGHmitr38rj0LdSxA=



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL
 TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.
 R.F.C. GOTO750322 EC5 REGISTRO SIOP JALISCO 3428



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

PERÍODO: 25 AL 31 DE MAYO DE 2020

OBRA : CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHTEMOC 4TA ETAPA.


UBICACIÓN : CHANTEPEC

CONTRATISTA : ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PRELIMINARES												
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	322.4000	0.0000	322.4000	322.40	0.0000	\$7.75	\$2,498.60	\$2,498.60	\$0.00	\$0.00
										\$2,498.60		
EXCAVACIONES.												
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION	M3	202.70505	0.0000	193.4400	193.44	9.2650	\$173.03	\$35,074.05	\$33,470.92	\$0.00	\$1,603.13
										\$33,470.92		
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES												
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	322.4000	0.0000	322.4000	322.40	0.0000	\$17.20	\$5,545.28	\$5,545.28	\$0.00	\$0.00
4	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	64.4800	0.0000	64.4800	64.48	0.0000	\$630.37	\$40,646.26	\$40,646.26	\$0.00	\$0.00
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	64.4800	0.0000	64.4800	64.48	0.0000	\$706.00	\$45,522.88	\$45,522.88	\$0.00	\$0.00
										\$91,714.42		
SUPERFICIE DE RODAMIENTO												
6	EMPEDRADO ECOLOGICO ELABORADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	249.6000	0.0000	254.8000	254.80	-5.2000	\$123.28	\$30,770.69	\$31,411.74	\$0.00	-\$641.06
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	104.0000	0.0000	104.0000	104.00	0.0000	\$131.85	\$13,712.40	\$13,712.40	\$0.00	\$0.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE ADOQUIN ROMADO TIPO TRAFICO PESADO DE 60 CMS DE ANCHO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	62.4000	0.0000	54.0800	54.08	8.3200	\$481.06	\$30,018.14	\$26,015.72	\$0.00	\$4,002.42
										\$71,139.87		






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
 PERÍODO: 25 AL 31 DE MAYO DE 2020
 OBRA : CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHEMOC 4TA ETAPA.
 UBICACIÓN : CHANTEPEC
 CONTRATISTA : ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
 FECHA: 01 DE JUNIO DE 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
COMPLEMENTARIOS													
9	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	322.4000	0.0000	322.4000	322.40	0.0000	\$7.93	\$2,556.63	\$2,556.63	\$0.00	\$0.00	
								SUMA	\$ 206,344.93	\$ 201,380.44	\$ -	\$ 4,964.49	
								IVA	\$ 33,015.19	\$ 32,220.87	\$ -	\$ 794.32	
								TOTAL	\$ 239,360.12	\$ 233,601.31	\$ -	\$ 5,758.81	

 _____ ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO REPRESENTANTE LEGAL	 _____ LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	 _____ ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
--	--	---



ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL
 TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.

R.F.C. GOTO750322 EC5


REGISTRO SIOP JALISCO 3428

EMPRESA:	ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO	FECHA:	01 DE JUNIO DE 2020
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHTÉMOC 4TA ETAPA.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	25 AL 31 DE MAYO DE 2020

NUMEROS GENERADORES						
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION					
UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	0+160.00 a 0+212.00	52.0000	6.20000	0.6000	1.0000	193.44
					SUMA	193.44

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

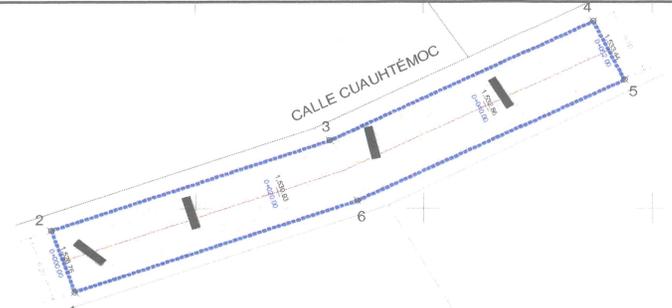


 ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
 EL CONTRATISTA


 LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



