



Jocotepec, Jal., a 27 de enero del 2022

L.C.P. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **SERGIO CABRERA.**, por la cantidad de: **\$345,634.10 (Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 10/100 M.N.)** por concepto del pago de **Estimación 01 y Finiquito** del programa **CUENTA CORRIENTE** correspondiente al siguiente proyecto

**OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

**Partida Contable: 6231-2-11.1-050-327**

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL FACTURA	TOTAL FACTURA	RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
2514	27/01/2022	\$299,250.30	\$ 347,130.35	\$1,496.25	\$345,634.10

Anexo:

1. Aprobación de Cabildo
2. Adjudicación y Contrato de Obra GMJ 007C-OP/2021
3. Oficio de inicio de obra
4. Fianza de cumplimiento
5. Proyecto
6. Presupuesto
7. Calendario
8. Factura
9. Verificación de factura
10. Estimación 1 y finiquito
11. Formato D32 (SAT) opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales
12. Actas de término

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes




**HACIENDA MUNICIPAL**  
2021 - 2024

28 ENE. 2022

**RECIBIDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE

"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, LO HACE SU GENTE"

  
C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

RFC emisor: CASE780113C89  
 Nombre emisor: SERGIO CABRERA  
 Folio: 2514  
 RFC receptor: MJJ850101KP8  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO  
 Uso CFDI: Construcciones

Folio fiscal: 589EEF4F-06A0-41C5-8EA3-D8BBC9B66A24  
 No. de serie del CSD: 00001000000504501682  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45425 2022-01-27 10:33:28  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72141001		1	E48	SERVICIO	299250.30	299250.30				
Descripción	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS EN : CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$1,496.25 MONTO EFECTIVO PARA PAGO \$345,634.10				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	299250.30	Tasa	16.0000%	47880.05

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** \$ 299,250.30  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 47,880.05  
**Total** \$ 347,130.35

**Sello digital del CFDI:**

qK1AVwJ6wMbuKEV7S+9R1HmTfksuuVUoZu2QDBwW5Q4Di56wGoCS/nkeuNOji49dZ79gl1h+sBHY1S7DsmGeXzVEsTjX4JfCV7Sj9afkhe1e9dk6U7jWjfvmcw9iH66UYkwqFHT2DGXq2L7GEjSbOyPieQiBdoUL5nSloahfM4KGlz445lvb6469PafVkrupRjySV/+ft9QGufelVwCTnbq6061jYTPAne1cUfjvKvNowEoWYyaiT8QuQoeQWK/Vog+G5uq78aBiZqiryTd8/xPccHs4lcmGp1OPRl4+71MLX8tsB2CBDKLPqiY3+pdPvLYBOfc7Ks0/9buA==

**Sello digital del SAT:**

YHLITERJdbi+poWSbbFI2+aA10vPXWJbQKJD0A3xz8NR3zs36SKUJqKriPLkDJ/rfRTU+JnJRFwNvg1lt/d6QnqFYh6CFU8ndndCnFYOR8td0dgpigd8TnRGS5Ki0FeXk9fsz8fC0PG/+XvpaYX0G4dRj86cZ95sVXBvTiFQi1vX6oykV+HY39pfj0pJ6L/Ckxiyusy4Zlx44R5m604cjdY0VxaDfwaV2BnYtSjxsHHc7E3N3PjCJHInGASeFT3NG5tGdW65hr2OqkOwspUozguoL6XudYvbm16oOxvRvTm+2jKE3DMicHP7iyRtrA2YaqN/1yp1CbYc67Q0f7otg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|589EEF4F-06A0-41C5-8EA3-D8BBC9B66A24|2022-01-27T10:50:29|SAT970701INN3|qK1AVwJ6wMbuKEV7S+9R1HmTfksuuVUoZu2QDBwW5Q4Di56wGoCS/nkeuNOji49dZ79gl1h+sBHY1S7DsmGeXzVEsTjX4JfCV7Sj9afkhe1e9dk6U7jWjfvmcw9iH66UYkwqFHT2DGXq2L7GEjSbOyPieQiBdoUL5nSloahfM4KGlz445lvb6469PafVkrupRjySV/+ft9QGufelVwCTnbq6061jYTPAne1cUfjvKvNowEoWYyaiT8QuQoeQWK/Vog+G5uq78aBiZqiryTd8/xPccHs4lcmGp1OPRl4+71MLX8tsB2CBDKLPqiY3+pdPvLYBOfc7Ks0/9buA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3 Fecha y hora de certificación: 2022-01-27 10:50:29  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CASE780113C89	SERGIO CABRERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
589EEF4F-06A0-41C5-8EA3-D8BBC9B66A24	2022-01-27T10:33:28	2022-01-27T10:50:29	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$347,130.35	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



# SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.  
R.F.C. CASE780113C89 REGISTRO SIOP JALISCO C-0680

H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

No. DE CONTRATO: GMJ 007C-OP/2021

HOJA DE RELACIÓN HOJA No. 1 DE 1

CONTRATISTA: ING. SERGIO CABRERA

ESTIMACIÓN No. 1 UNO Y FINIQUITO

PERÍODO DE TRABAJO:

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"

DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DEL:

FECHA:

26 DE ENERO DE 2022

UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.

## RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES	
	LINEA DE DRENAJE LINEA DE AGUA POTALE TOMAS DOMICILIARIAS				\$	196,069.55
					\$	103,180.75
					MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 299,250.30
					MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$ -
					SUBTOTAL	\$ 299,250.30
					I.V.A. 16%	\$ 47,880.05
					SUMA	\$ 347,130.35
					MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 1,496.25
					NETO A PAGAR	\$ 345,634.10
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL			
ASIGNACIÓN	\$ 310,358.20	\$ 49,657.32	\$ 360,015.52			
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 299,250.30	\$ 47,880.05	\$ 347,130.35			
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -			
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 299,250.30	\$ 47,880.05	\$ 347,130.35			
SALDO POR EJERCER	\$ 11,107.90	\$ 1,777.26	\$ 12,885.16			
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				SERGIO CABRERA		
ANTICIPO %	\$ -	\$ -	EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO			
AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ -	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ -	\$ -	J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ			
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ -	\$ -	IMEEDA KARINA PEREZ GONZALEZ			
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -				

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**SERGIO CABRERA**

HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.  
R.F.C. CASE780113C89 REGISTRO SIOP JALISCO C-0680

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**

ESTIMACIÓN No. 1 UNO Y FINIQUITO  
PERÍODO: DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022  
OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

UBICACIÓN: UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.  
CONTRATISTA: SERGIO CABRERA  
FECHA: 26 DE ENERO DE 2022

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
<b>CALLE RIBERA DEL LAGO</b>												
	<b>LINEA DE AGUA POTALE</b>											
AP 001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	324.42	0.00	324.42	324.42	0.00	\$9.47	\$3,072.26	\$3,072.26	\$0.00	\$0.00
AP 002	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO	M3	227.09	0.00	227.09	227.09	0.00	\$83.96	\$19,066.48	\$19,066.81	\$0.00	\$0.00
AP 003	CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERIAS. DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90 % INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	13.63	0.00	13.63	13.63	0.00	\$716.09	\$9,760.31	\$9,760.31	\$0.00	\$0.00
AP 004	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	324.42	0.00	324.42	324.42	0.00	\$179.39	\$58,197.70	\$58,197.70	\$0.00	\$0.00
AP 005	RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANJALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. AL 90% INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	41.44	0.00	41.44	41.44	0.00	\$620.59	\$25,717.25	\$25,720.14	\$0.00	\$0.00
AP 006	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	158.97	0.00	158.97	158.97	0.00	\$680.38	\$108,160.01	\$108,160.01	\$0.00	\$0.00
AP 007	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.	M3	227.09	0.00	227.09	227.09	0.00	\$47.04	\$10,682.31	\$10,682.31	\$0.00	\$0.00
	<b>LINEA DE AGUA POTALE</b>								<b>\$234,656.32</b>	<b>\$196,069.55</b>		
	<b>TOMAS DOMICILIARIAS</b>											
AP 008	EXCAVACIÓN PARA TOMAS DOMICILIARIAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	37.25	0.00	37.66	37.66	-0.41	\$83.96	\$3,127.51	\$3,161.64	\$0.00	-\$34.13
AP 009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	29.00	0.00	29.00	29.00	-	\$1,087.89	\$31,548.81	\$31,548.81	\$0.00	\$0.00
AP 010	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	37.25	0.00	37.66	37.66	-0.41	\$175.42	\$6,534.40	\$6,605.70	\$0.00	-\$71.31
AP 011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS DE 50X50CM. (COMERCIAL DE 110 KG.) ESTÁNDAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	\$2,854.42	\$5,708.84	\$2,854.42	\$0.00	\$2,854.42
AP 012	CONSTRUCCION DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 5 DE 130 X90X97 CM. (MEDIDAS INTERIORES) INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	\$8,185.01	\$16,370.02	\$8,185.01	\$0.00	\$8,185.01
AP 013	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	648.84	0.00	648.84	648.84	-	\$19.13	\$12,412.31	\$12,412.31	\$0.00	\$0.00
	<b>TOMAS DOMICILIARIAS</b>								<b>\$75,701.88</b>	<b>\$103,180.75</b>	<b>\$0.00</b>	
									<b>\$ 310,358.20</b>	<b>\$ 299,250.30</b>	<b>\$</b>	
									<b>\$ 49,657.32</b>	<b>\$ 47,880.05</b>	<b>\$</b>	
									<b>\$ 360,015.52</b>	<b>\$ 347,130.35</b>	<b>\$</b>	

SERGIO CABRERA  
REPRESENTANTE LEGAL

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

IMECDA KARINA PEREZ GONZALEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**



**SERGIO CABRERA**

HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-0680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	26 DE ENERO DE 2022
OBRA:	OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"		

LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.	ESTIMACIÓN No.	1 UNO Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

AP 001	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA						LINEA DE AGUA POTABLE	
UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL	
M2	0+000.00	0+324.42	324.42	1.00			324.42	
						SUMA	324.42	

*[Signature]*  
 SERGIO CABRERA  
 EL CONTRATISTA

*[Signature]*  
 J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AP 001

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

FOTOGRAFÍA



SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA



J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 001

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CROQUIS

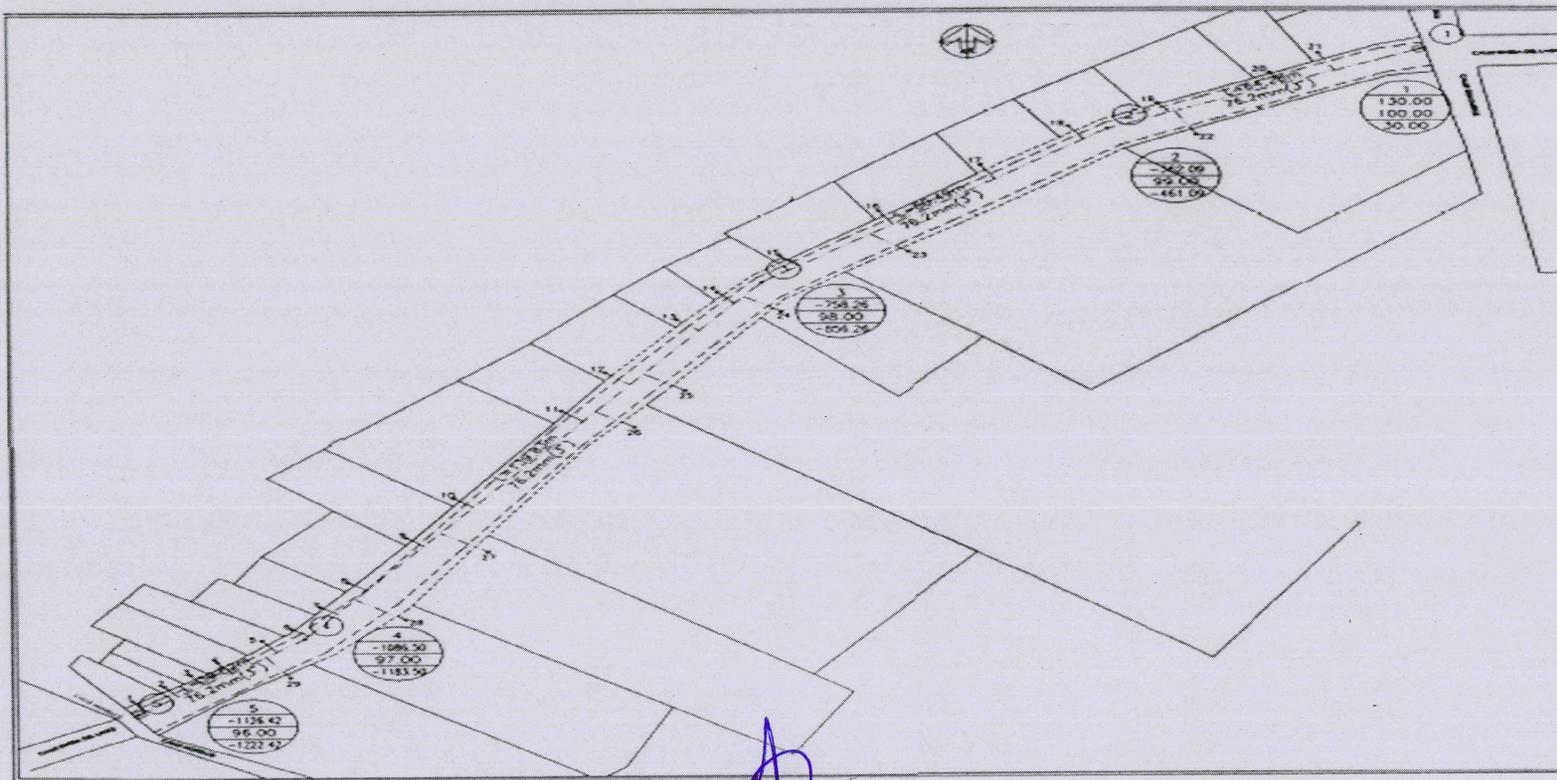

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE BARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



### SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-0680


EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	26 DE ENERO DE 2022
OBRA:	OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"		

LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.	ESTIMACIÓN No.	1 UNO Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

--	--	--	--

AP 002	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A - 2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO	LINEA DE AGUA POTABLE
--------	---	-----------------------

UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL
M3	0+000.00	0+324.42	324.42	0.70	1.00	227.09
					SUMA	227.09

  
 SERGIO CABRERA  
 EL CONTRATISTA


  
 J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



AP 002

EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A - 2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO

FOTOGRAFÍA

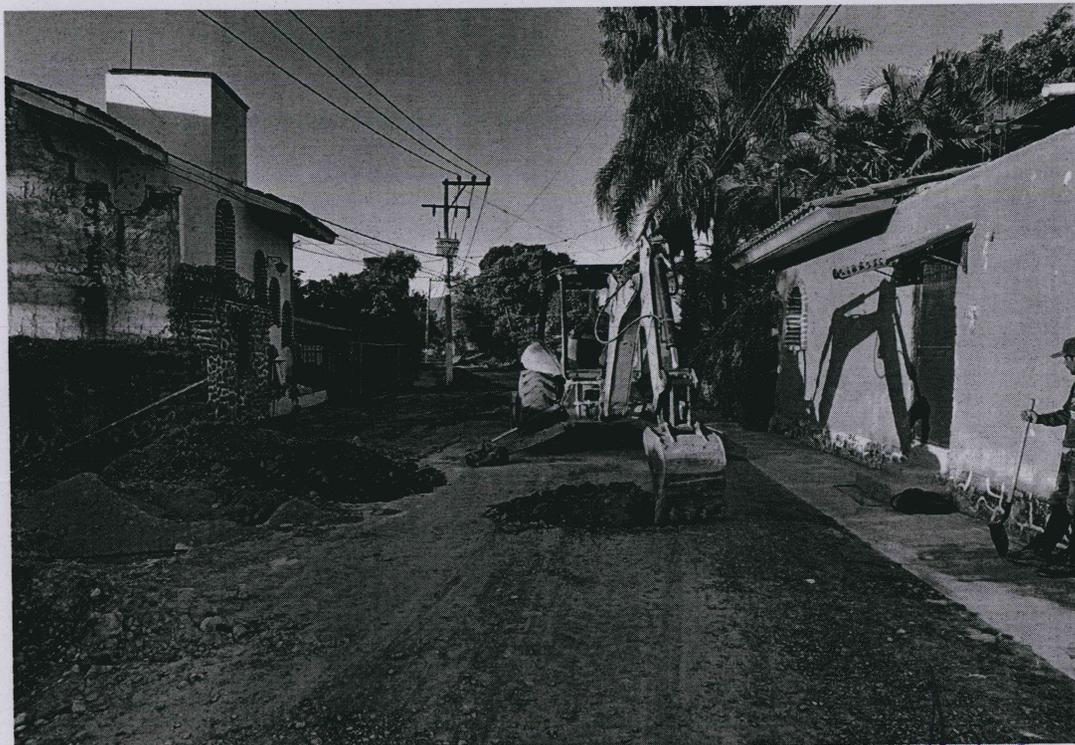

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 002

EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A - 2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO

CROQUIS

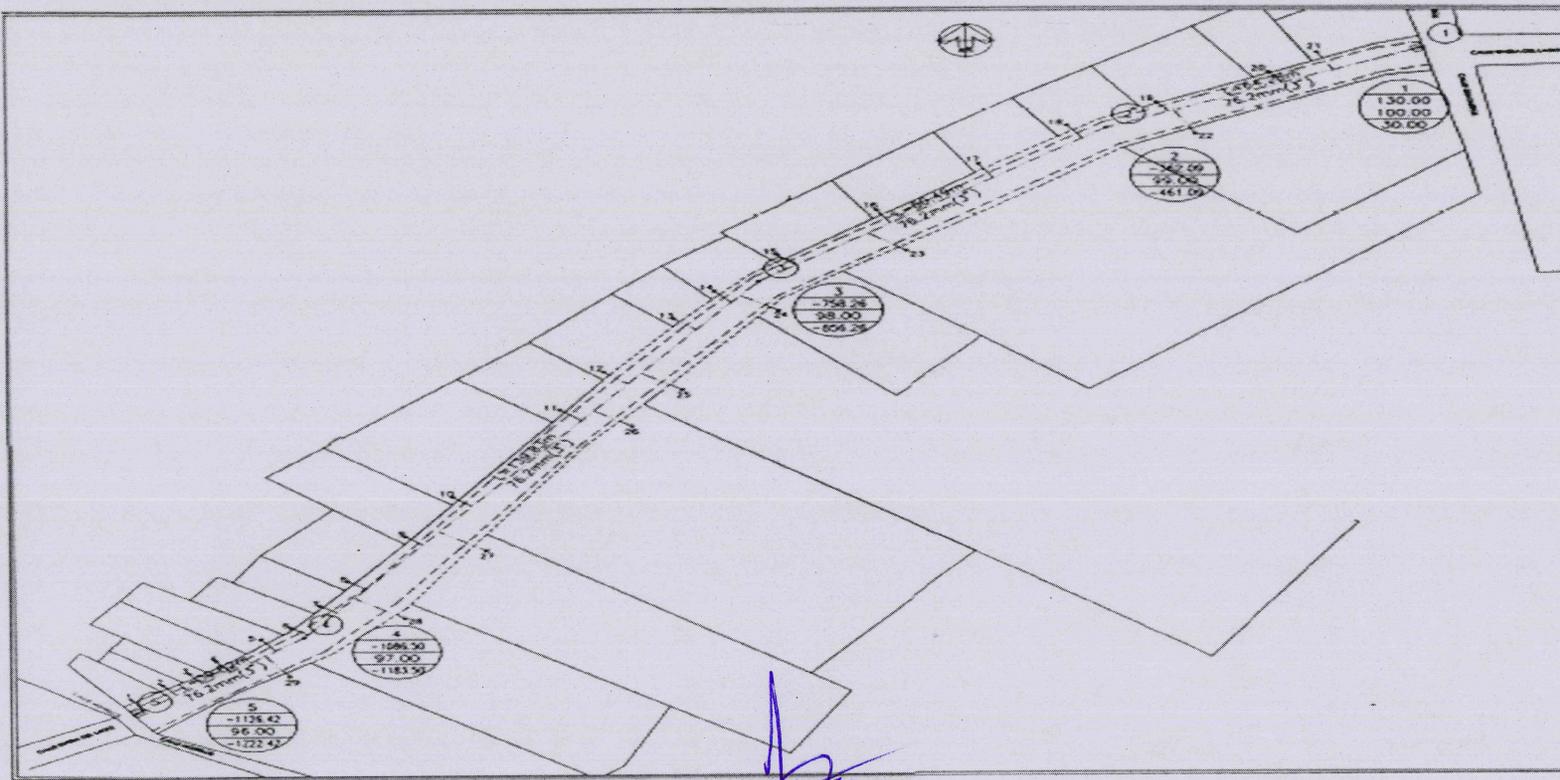

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



# SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-0680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	26 DE ENERO DE 2022
OBRA:	OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"		

LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.	ESTIMACIÓN No.	1 UNO Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL		
AP 003	CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERIAS. DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90 % INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						<b>LINEA DE AGUA POTABLE</b>
M3	0+000.00	0+324.42	324.42	0.70	0.06	13.63	
						SUMA	13.63
<p>SERGIO CABRERA EL CONTRATISTA</p> <p>J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO</p>							




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AP 003

CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERIAS. DE 10 CM DE ESPESOR  
COMPACTADO AL 90 % INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,  
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA

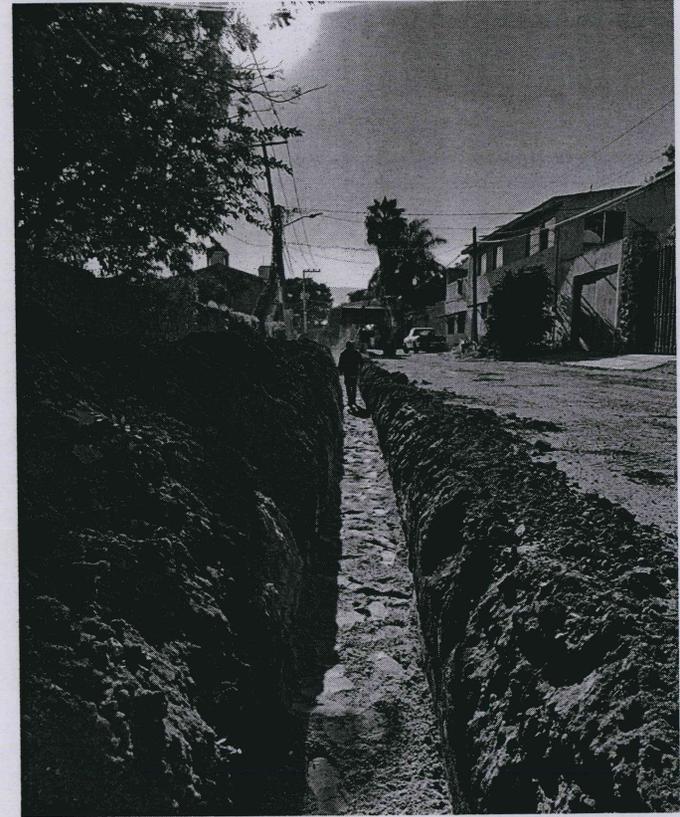

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 003

CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERIAS. DE 10 CM DE ESPESOR  
COMPACTADO AL 90 % INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,  
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

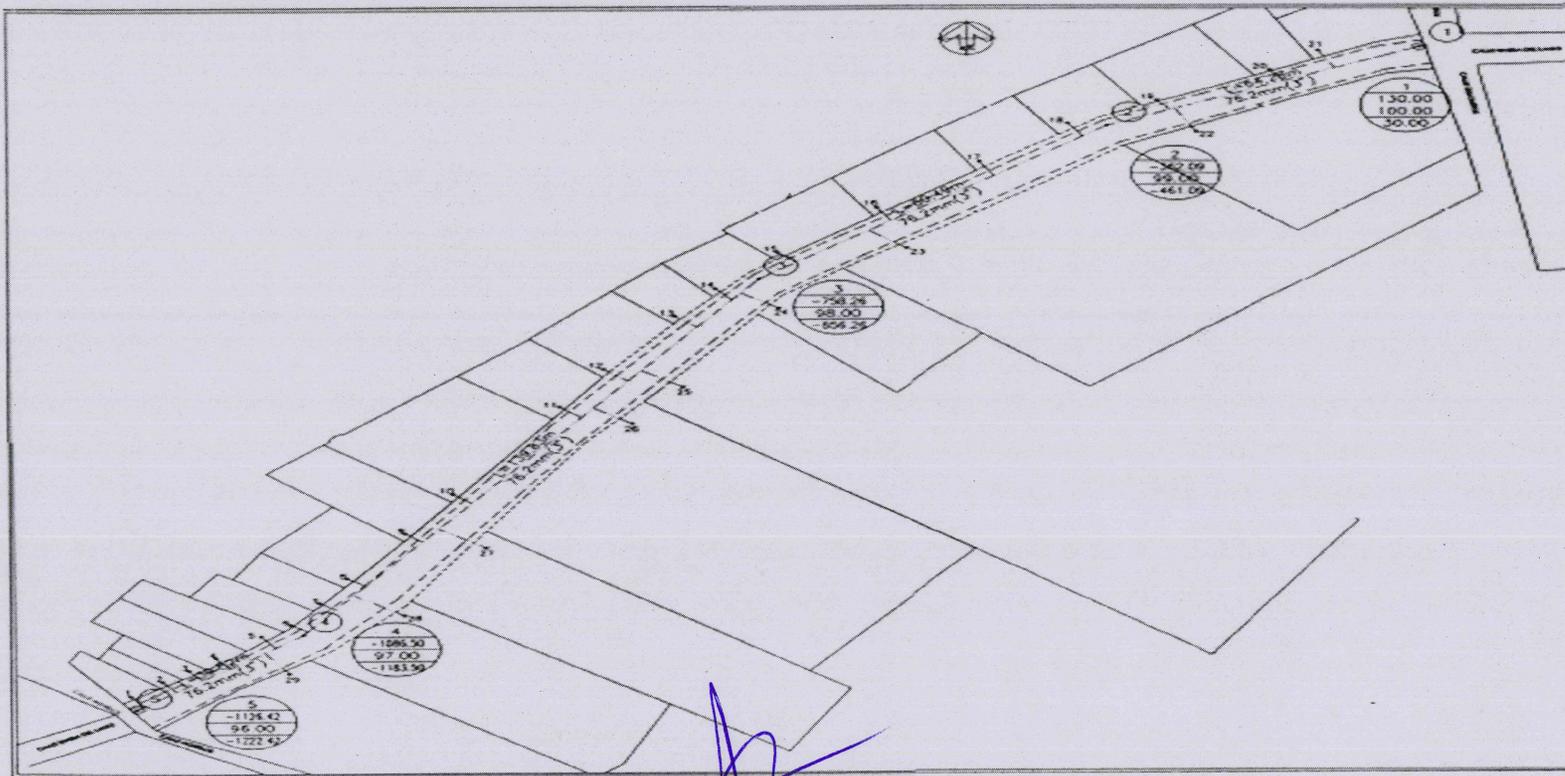

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



**SERGIO CABRERA**

HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-0680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	26 DE ENERO DE 2022
OBRA:	OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"		

LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.	ESTIMACIÓN No. 1 UNO Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO: DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

AP 004	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						LINEA DE AGUA POTABLE
UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	
M	0+000.00	0+324.42	324.42			324.42	
					SUMA	324.42	

SERGIO CABRERA  
 EL CONTRATISTA


J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



AP 004

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C.  
HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO,  
ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE  
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA

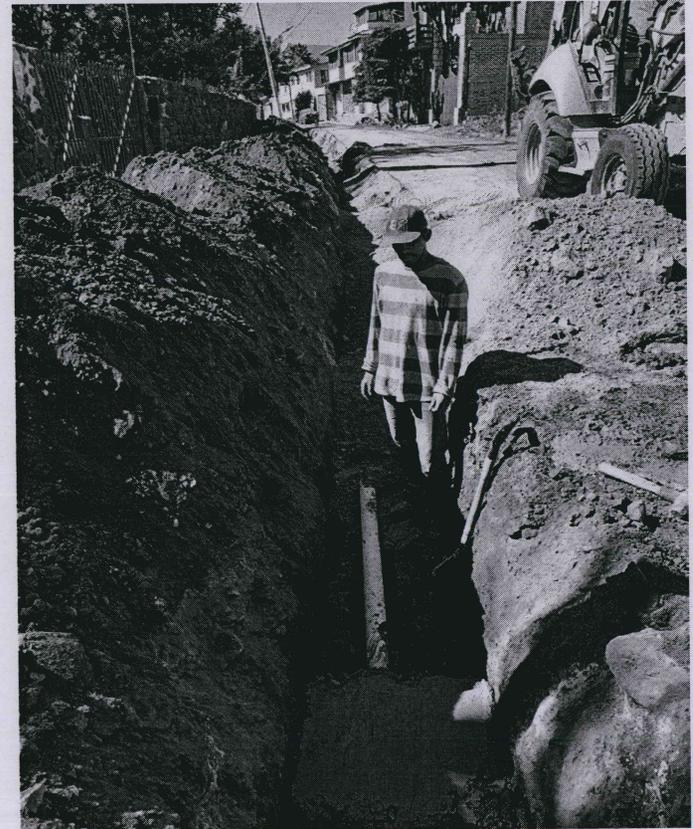

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 004

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C.  
HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO,  
ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE  
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

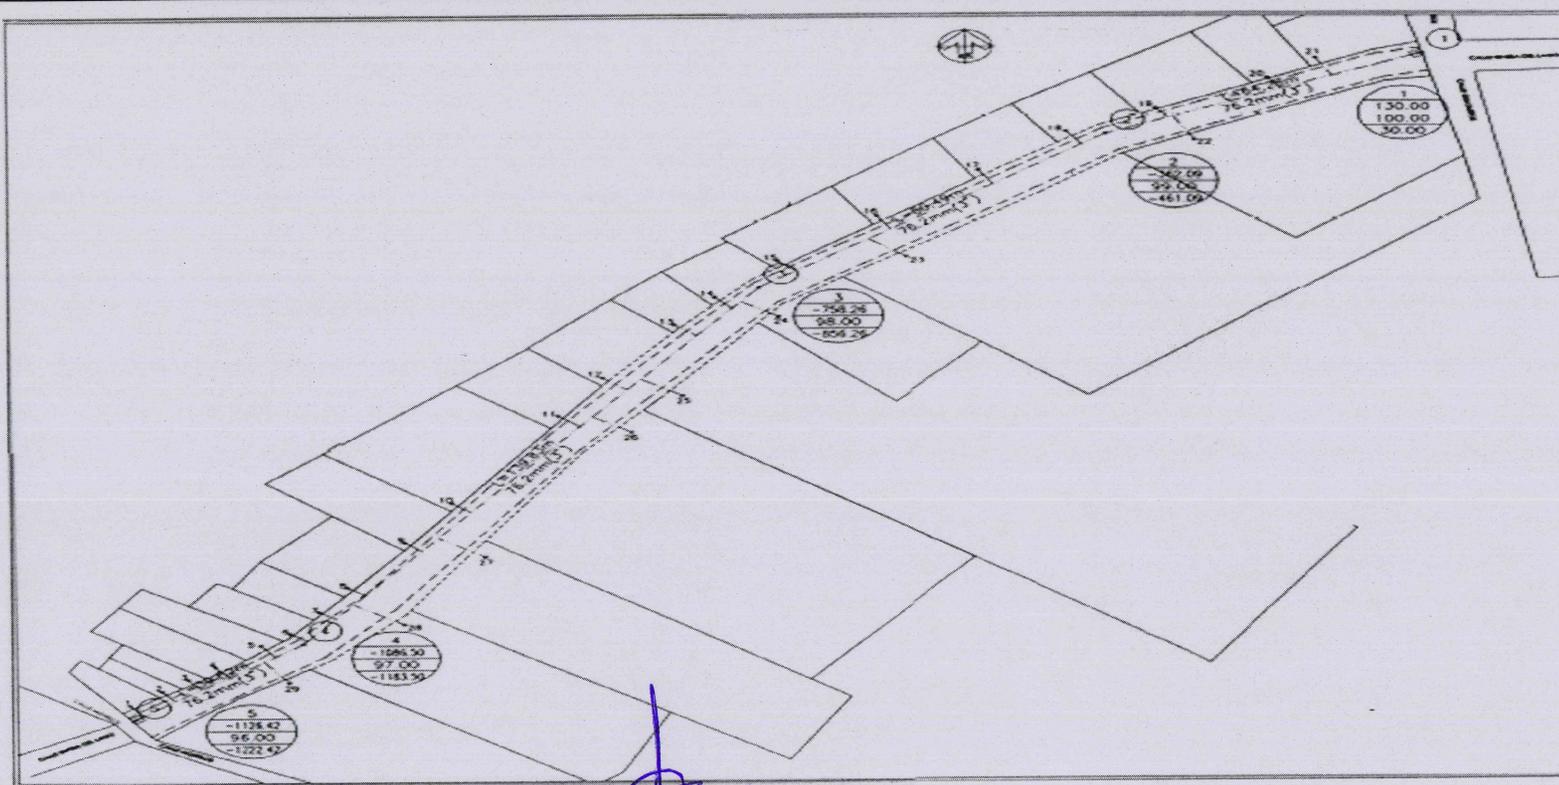

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



### SERGIO CABRERA


HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.  
R.F.C. CASE780113C89      REGISTRO SIOP JALISCO C-0680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	26 DE ENERO DE 2022
OBRA:	OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"		

LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.	ESTIMACIÓN No.	1 UNO Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZAS	TOTAL
AP 005	RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. AL 90% INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.						
M3	0+000.00	0+324.42	324.42	0.70	0.1825	1.00	41.44
						SUMA	41.44

LINEA DE AGUA POTABLE

  
SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

  
J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 005

RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. AL 90% INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

FOTOGRAFÍA



SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 005

RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. AL 90% INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

CROQUIS

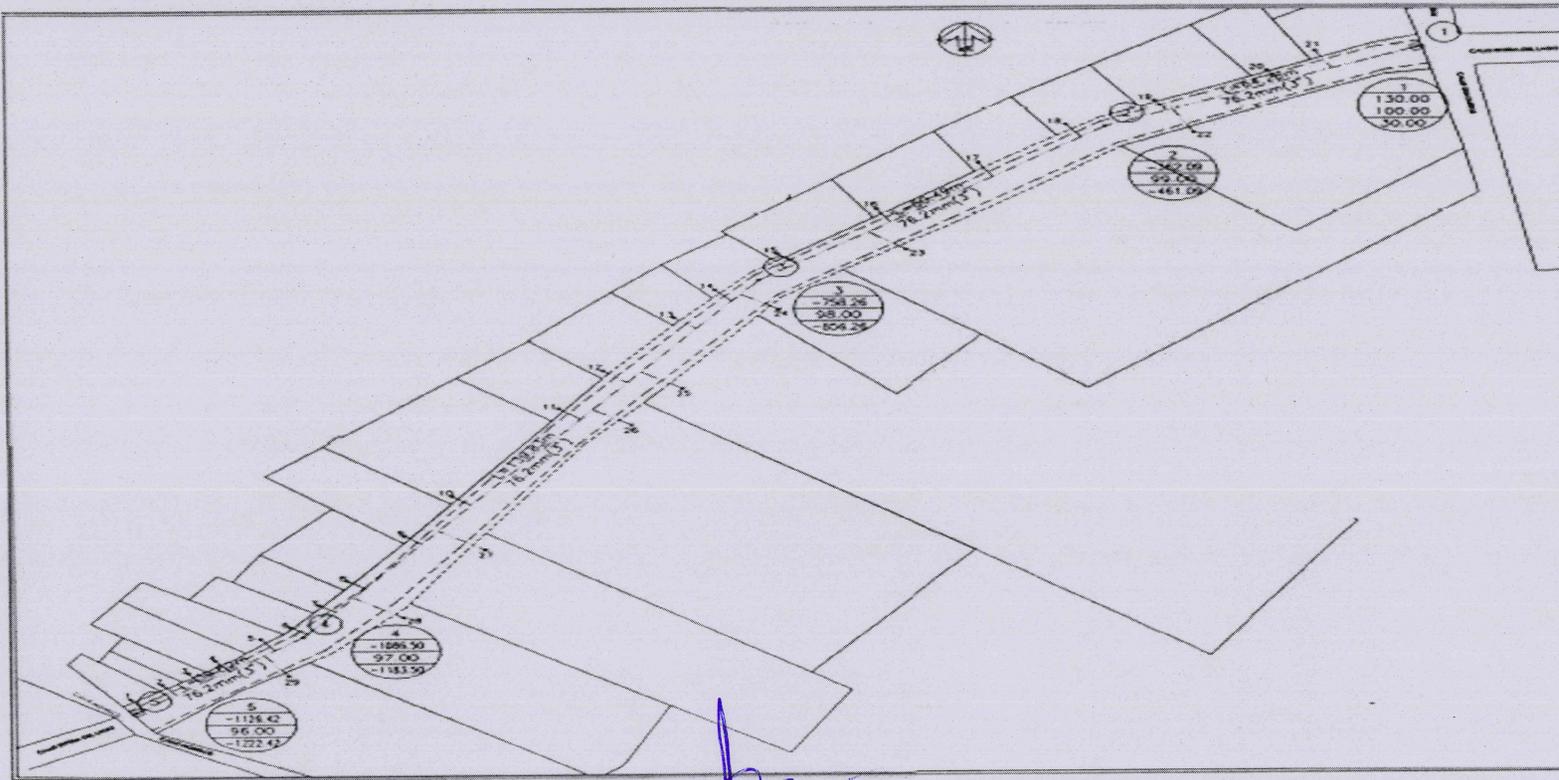

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



# SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89


REGISTRO SIOP JALISCO C-0680


EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	26 DE ENERO DE 2022
OBRA:	OBRA:"REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"		

LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.	ESTIMACIÓN No.	1 UNO Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZAS	TOTAL	LINEA DE AGUA POTABLE
AP 006	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA , EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.							
M2	0+000.00	0+324.42	324.42	0.70	0.70	1.00	158.97	
						SUMA	158.97	

  
SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA


  
J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

AP 006

RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO  
COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA , EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE:  
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

FOTOGRAFÍA

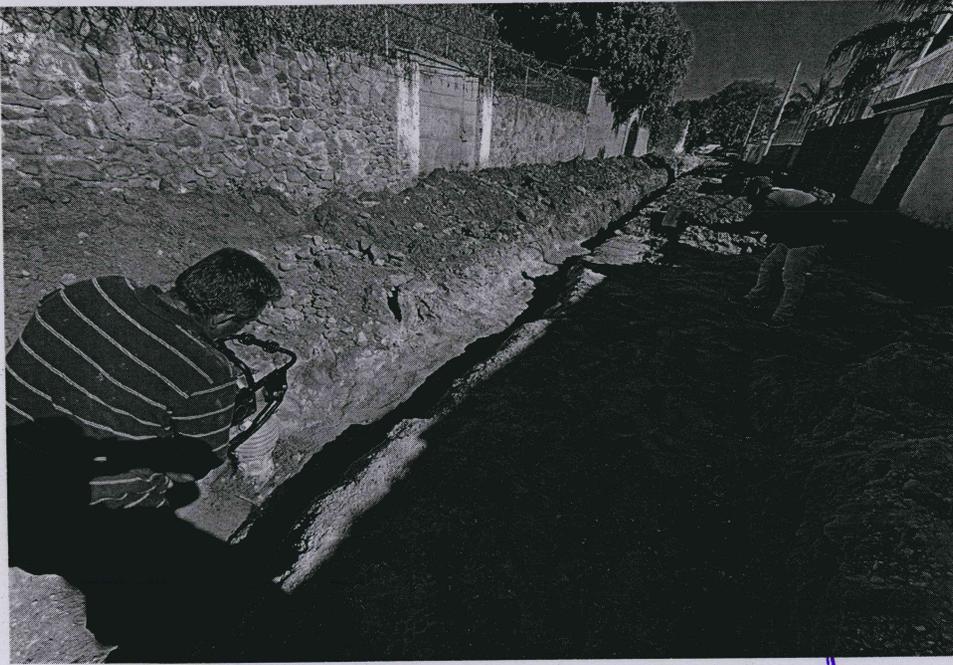

SERGIO GABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 006

RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO  
COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA , EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE:  
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

CROQUIS

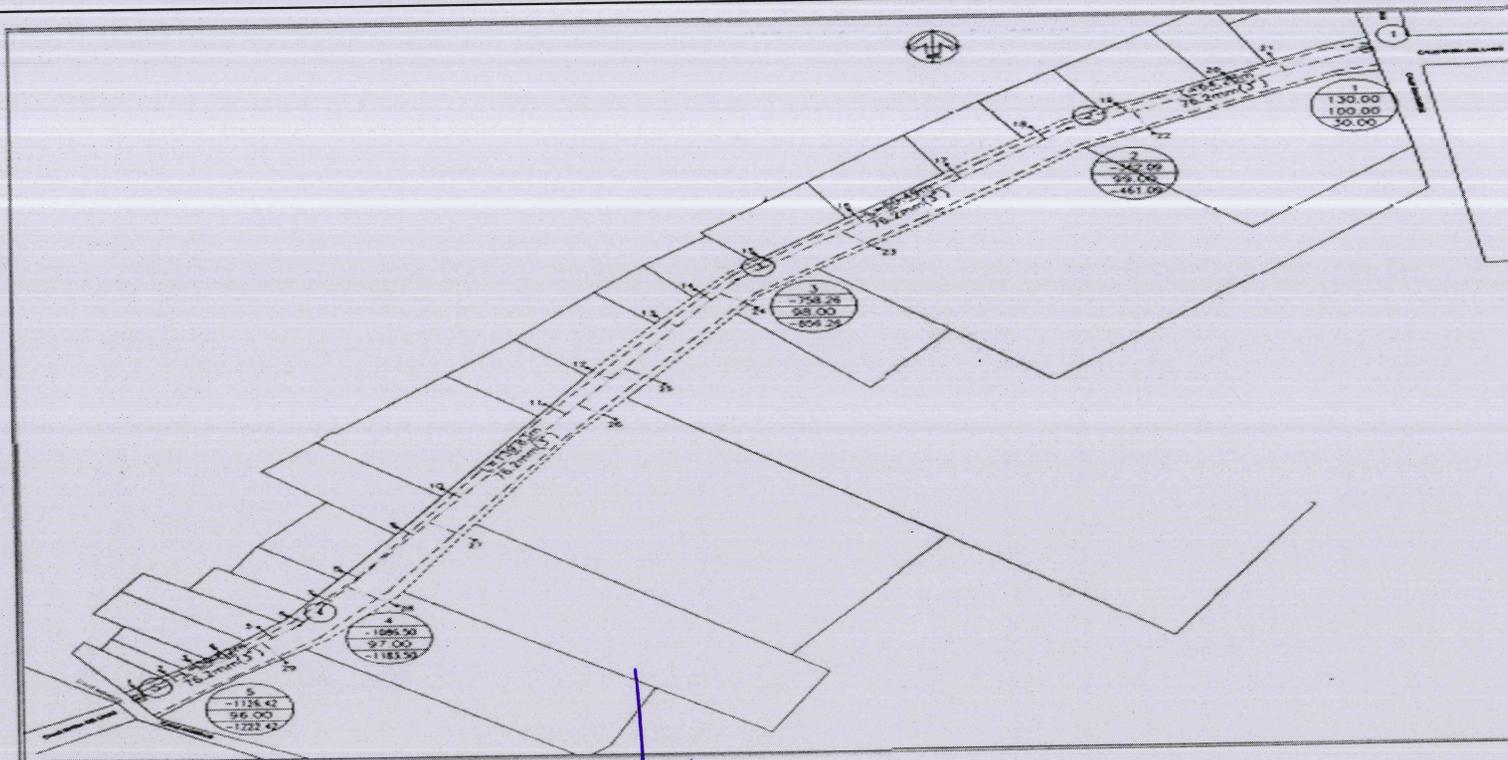

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



**SERGIO CABRERA**

HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-0680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	26 DE ENERO DE 2022
OBRA:	OBRA:"REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"		


LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.	ESTIMACIÓN No.	1 UNO Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
AP 007	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.					
M3	0+000.00	0+324.42	324.42	0.70	1.00	227.09
					SUMA	227.09

**LINEA DE AGUA POTABLE**




  
 SERGIO CABRERA  
 EL CONTRATISTA



  
 J GUADALUPE BARRA RAMIREZ  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

AP 007

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.

FOTOGRAFÍA

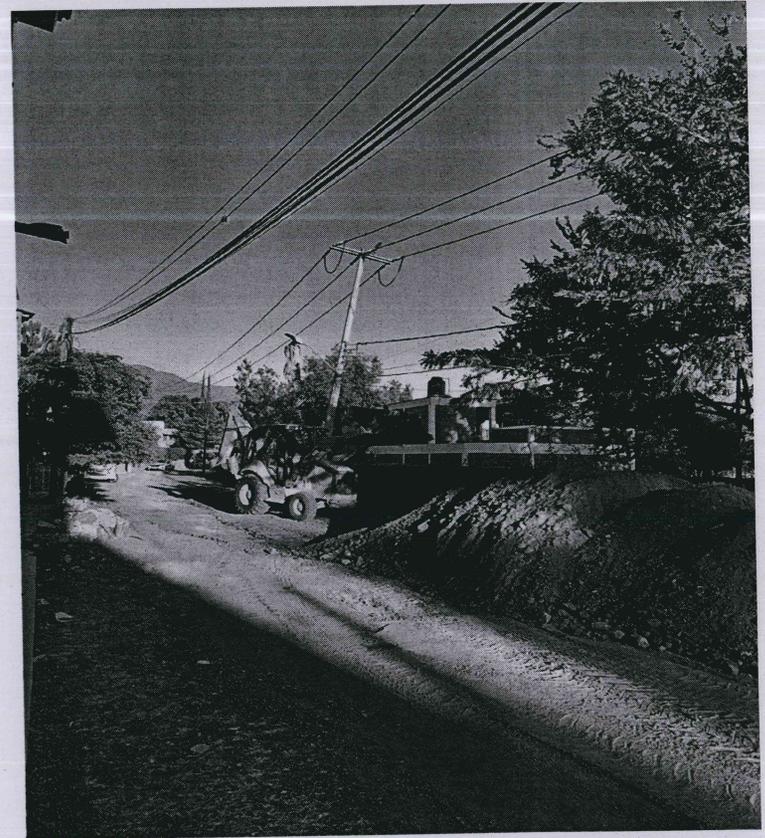

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 007

CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.

CROQUIS

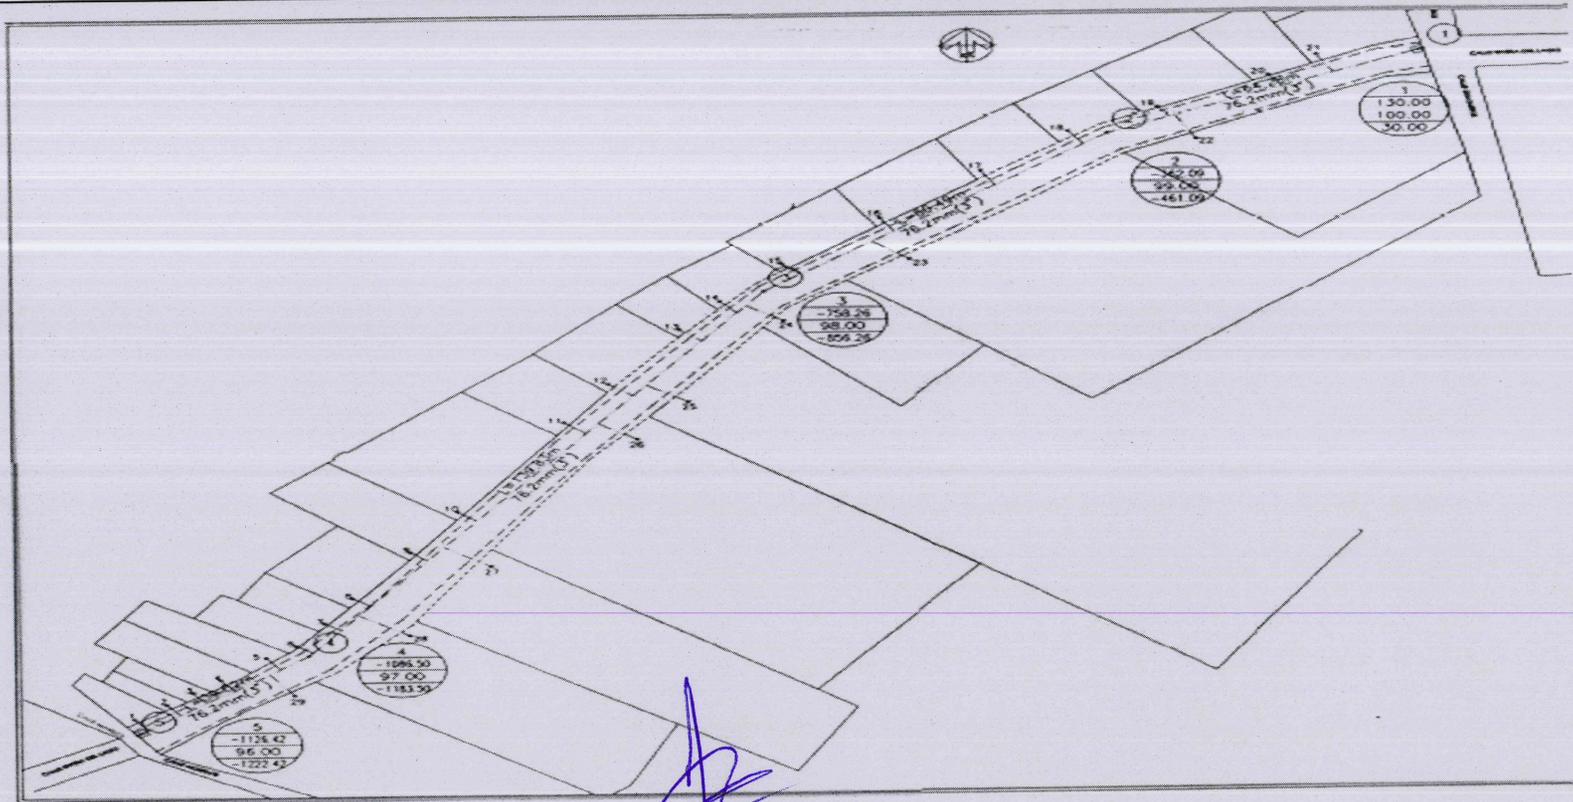

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



AP 008

EXCAVACIÓN PARA TOMAS DOMICILIARIAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA



SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 008

EXCAVACIÓN PARA TOMAS DOMICILIARIAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

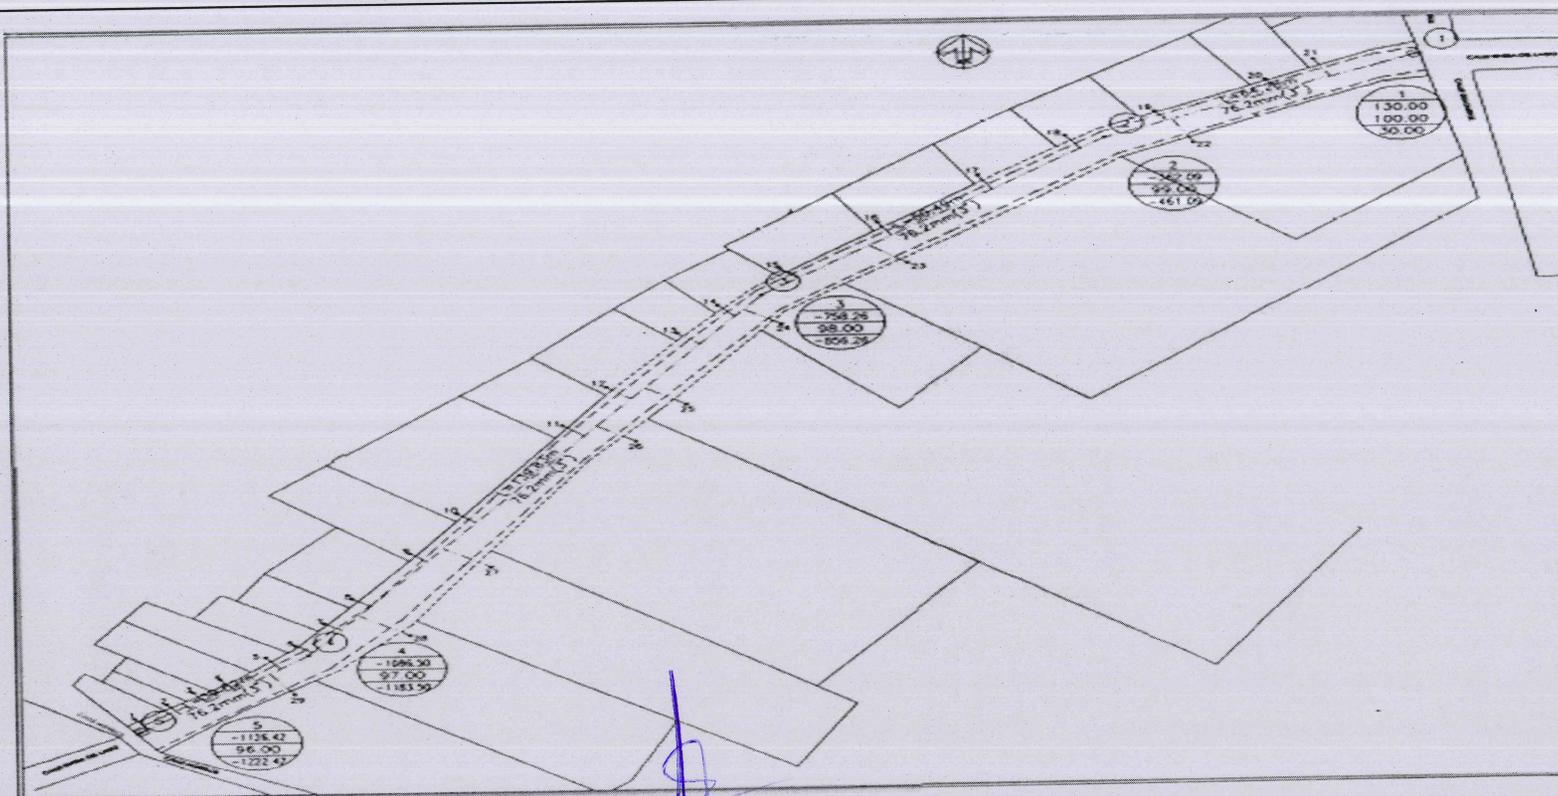

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



AP 009

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE  
1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y  
MANO DE OBRA

FOTOGRAFÍA

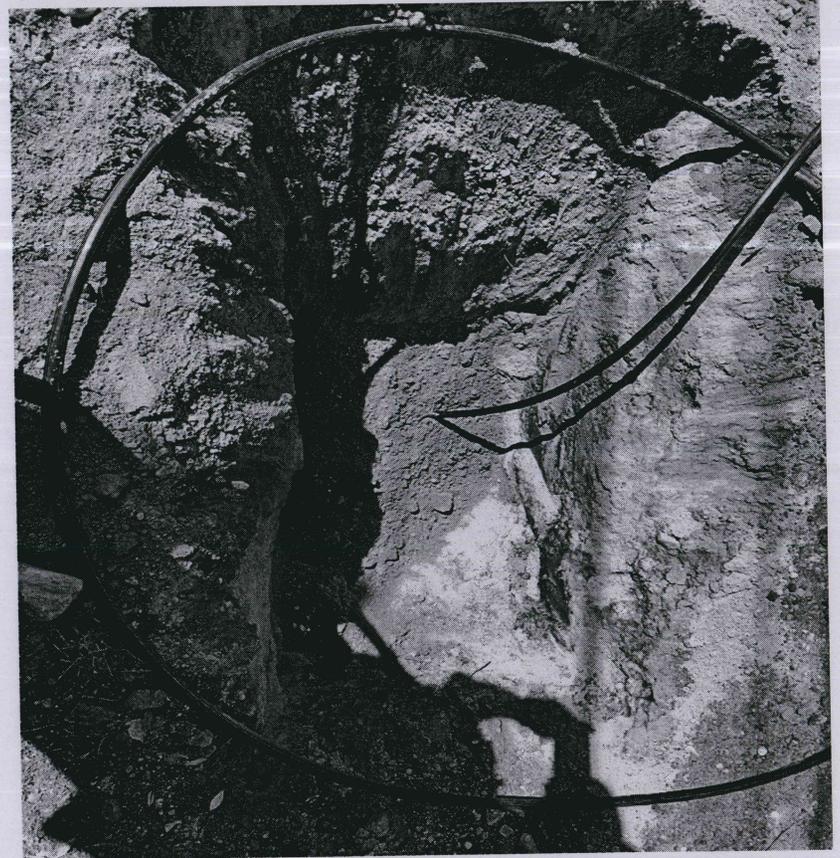

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 009

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE  
1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y  
MANO DE OBRA

CROQUIS

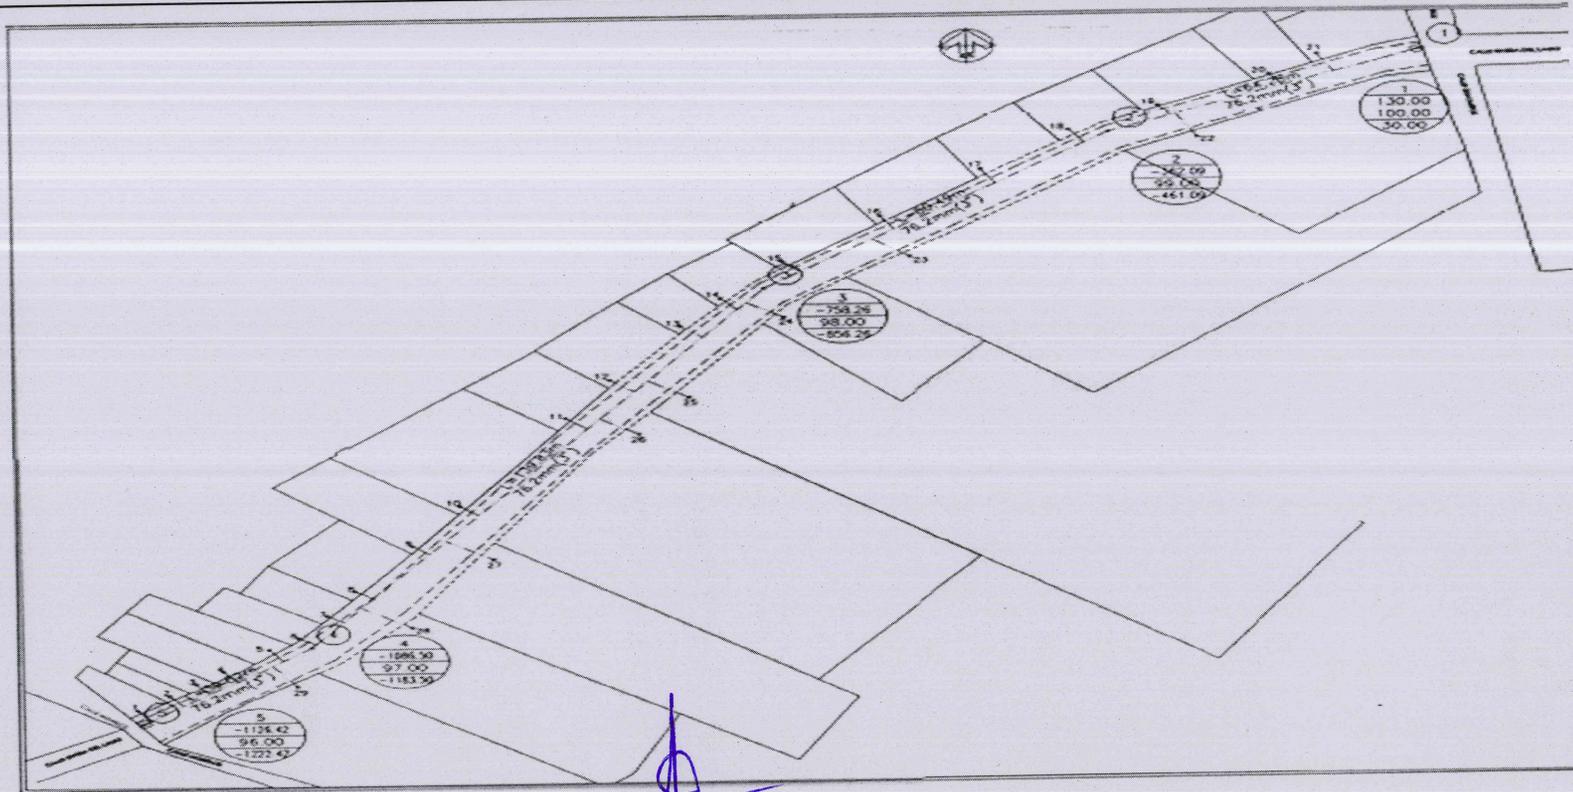

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



### SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-0680

EMPRESA:

SERGIO CABRERA

FECHA:

26 DE ENERO DE 2022

OBRA:

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"

LOCALIDAD:

UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.

ESTIMACIÓN No. 1 UNO Y FINIQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

AP 010

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION

LINEA DE AGUA POTABLE

UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZAS	TOTAL
PZA	0+000.00	0+003.50	3.5000	0.70	0.53	29.00	37.66
						SUMA	37.66

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 010

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR  
MAXIMO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90%  
PROCTOR; INCLUYE MATERIAL  
MANO DE OBRA Y SUPERVISION

FOTOGRAFÍA



SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 010

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR  
MAXIMO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90%  
PROCTOR; INCLUYE MATERIAL  
MANO DE OBRA Y SUPERVISION

CROQUIS

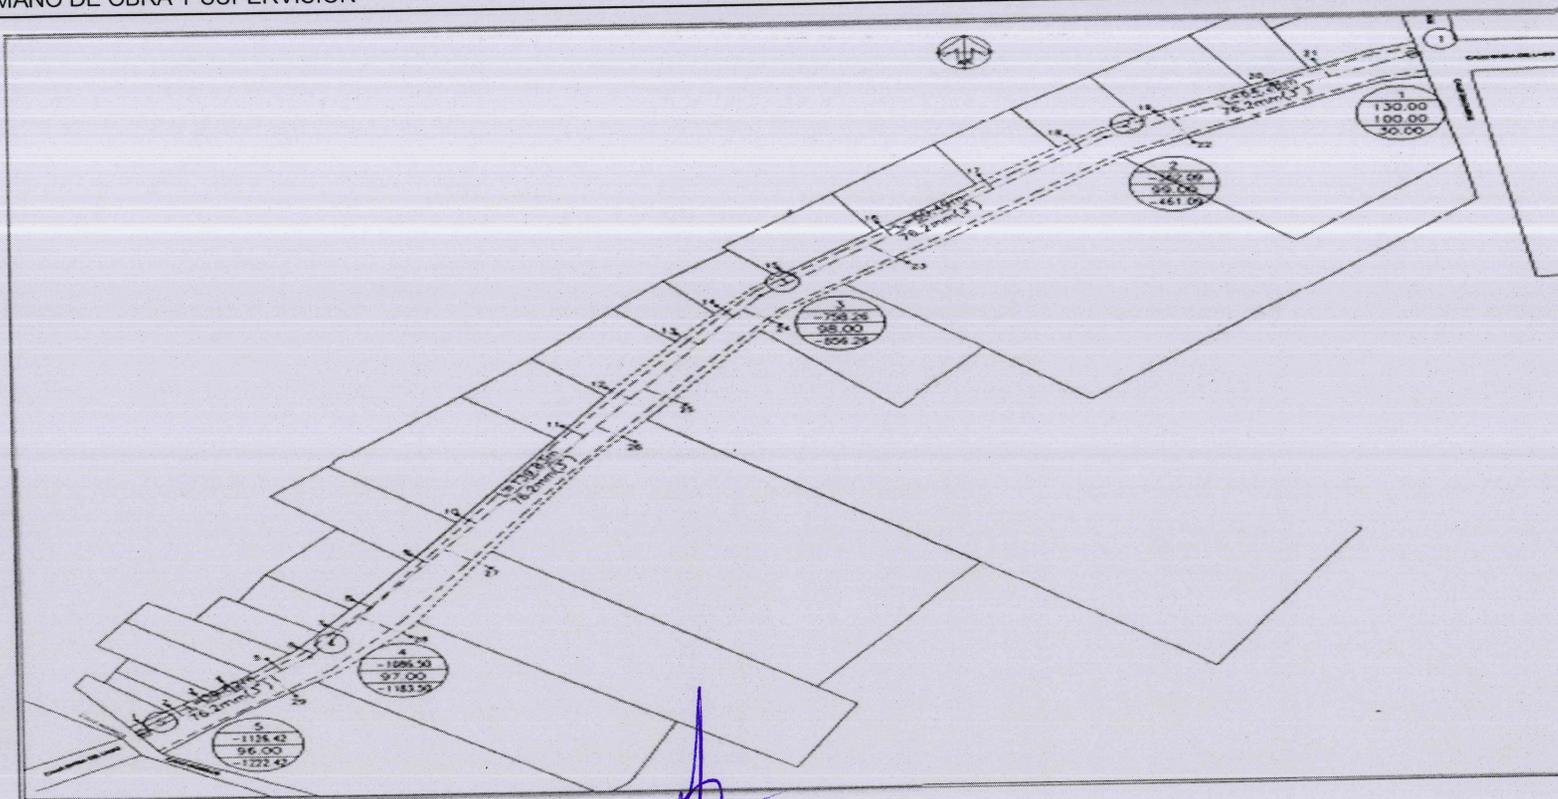

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



# SERGIO CABRERA



HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-0680

EMPRESA:	SERGIO CABRERA	FECHA:	26 DE ENERO DE 2022
OBRA:	OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"		

LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.	ESTIMACIÓN No.	1 UNO Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

AP 011							SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS DE 50X50CM. (COMERCIAL DE 110 KG.) ESTÁNDAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.		LINEA DE AGUA POTABLE		
UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZAS	TOTAL				
PZA	ESQUINA	GUAYABITOS				1.00	1.00				
						SUMA	1.00				
 SERGIO CABRERA EL CONTRATISTA							 J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO				




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AP 011

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS DE 50X50CM. (COMERCIAL DE 110 KG.) ESTÁNDAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.

FOTOGRAFÍA

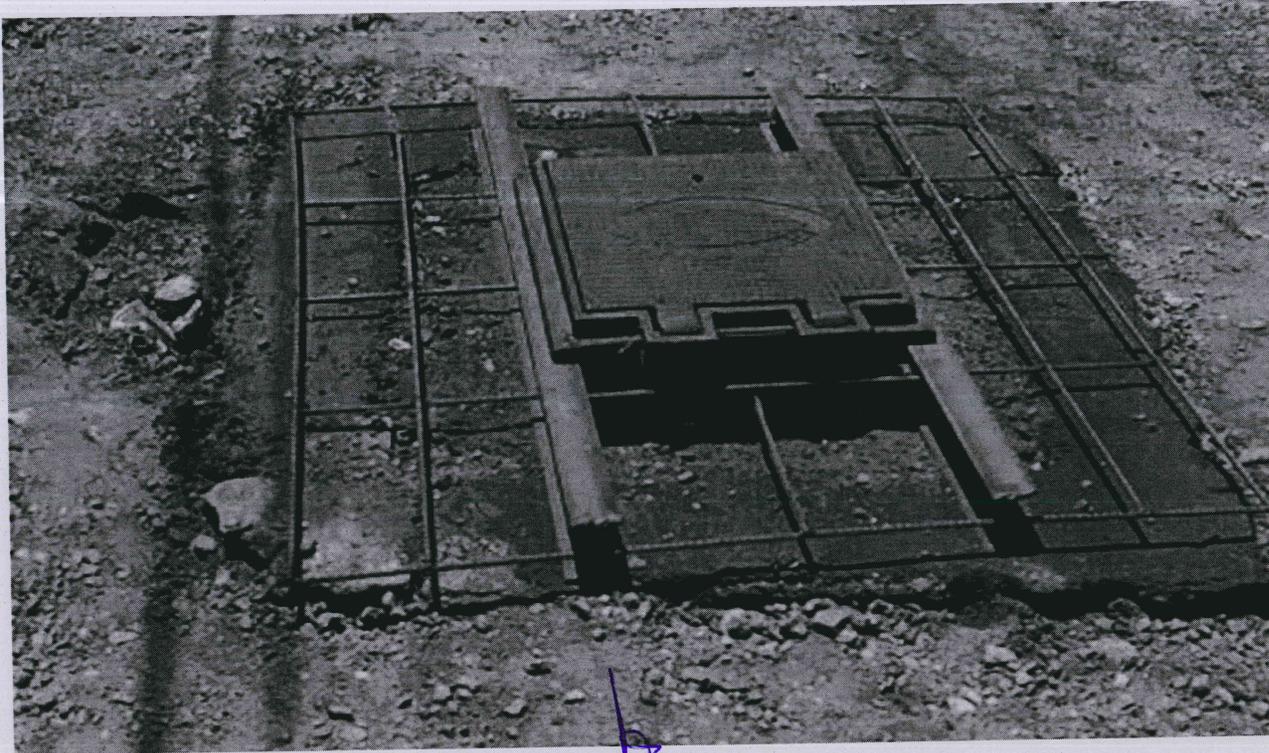

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 011

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS DE 50X50CM. (COMERCIAL DE 110 KG.) ESTÁNDAR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS Y MANO DE OBRA.

CROQUIS

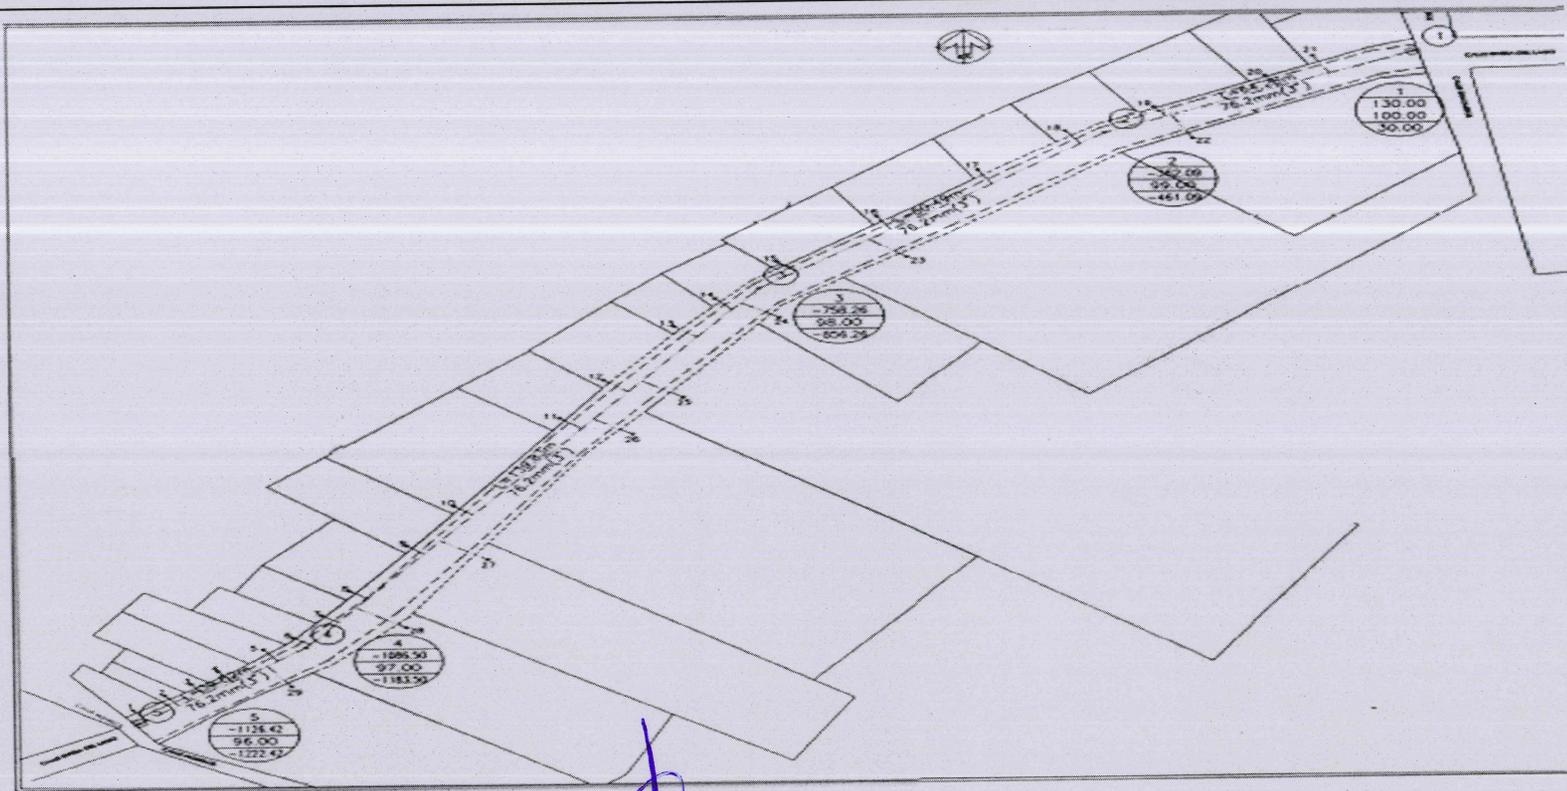

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



**SERGIO CABRERA**

HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-0680

EMPRESA:

SERGIO CABRERA

FECHA:

26 DE ENERO DE 2022

OBRA:

OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"

LOCALIDAD:

UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.

ESTIMACIÓN No. 1 UNO Y FINIQUITO

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO:

DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

AP 012

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X90X97 CM. (MEDIDAS INTERIORES) INCLUYE: HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

LINEA DE AGUA POTABLE

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZAS	TOTAL
PZA	ESQUINA GUAYABITOS				1.00	1.00
					SUMA	1.00

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AP 012

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X90X97 CM. (MEDIDAS INTERIORES) INCLUYE: HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

FOTOGRAFÍA



SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 012

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 DE 130 X90X97  
INTERIORES) INCLUYE: HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA

CM. (MEDIDAS

CROQUIS

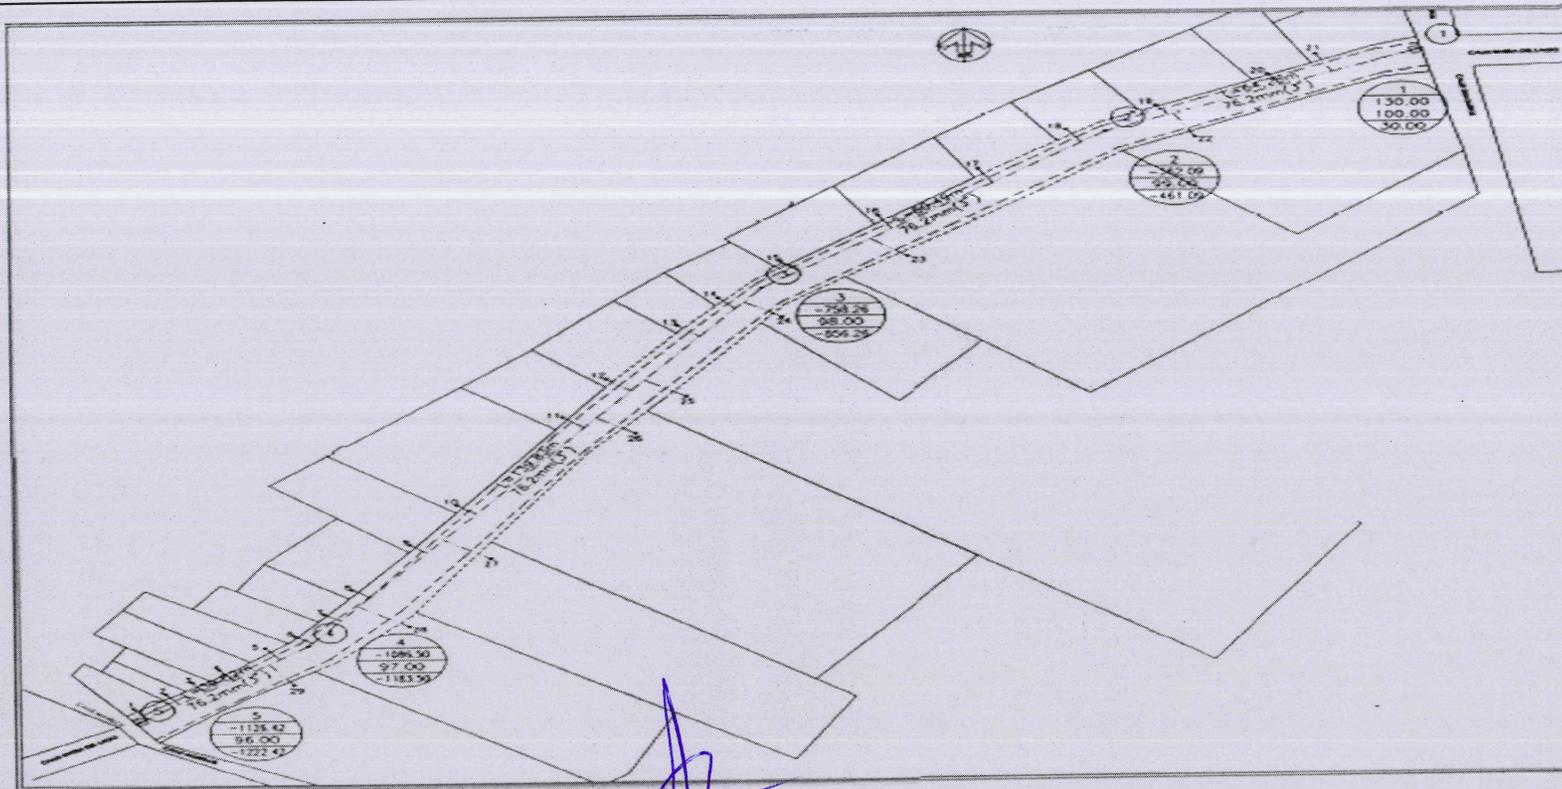

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



# SERGIO CABRERA

HACIENDA DE LA SABILA 120, HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

R.F.C. CASE780113C89

REGISTRO SIOP JALISCO C-0680

EMPRESA: SERGIO CABRERA      FECHA: 26 DE ENERO DE 2022

OBRA: OBRA: "REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS"


LOCALIDAD: UBICACIÓN: CHANTEPEC, MPIO DE JOCOTEPEC, JAL.      ESTIMACIÓN No. 1 UNO Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO      PERIODO: DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 08 DE ENERO DE 2022

AP 013 LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

## LINEA DE AGUA POTABLE

UNIDAD	CADENAMIENTO		LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZAS	TOTAL
PZA	0+000.00	0+324.42	324.42	2.00		1.00	648.84
						SUMA	648.84

  
 SERGIO CABRERA  
 EL CONTRATISTA

  
 J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AP 013

LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FOTOGRAFÍA

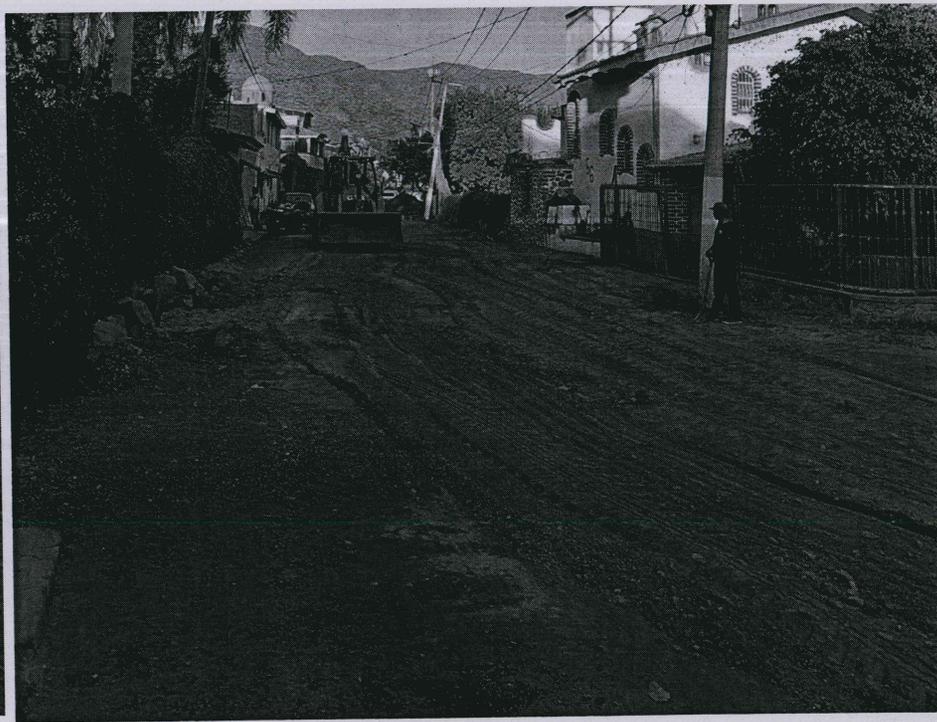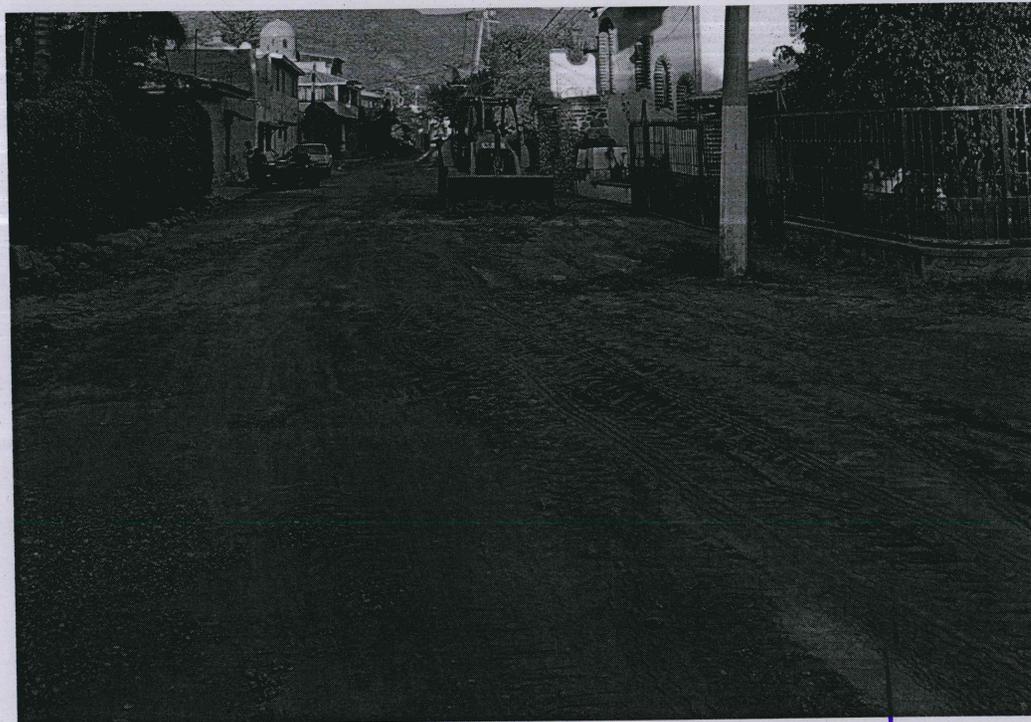

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

AP 013

LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CROQUIS

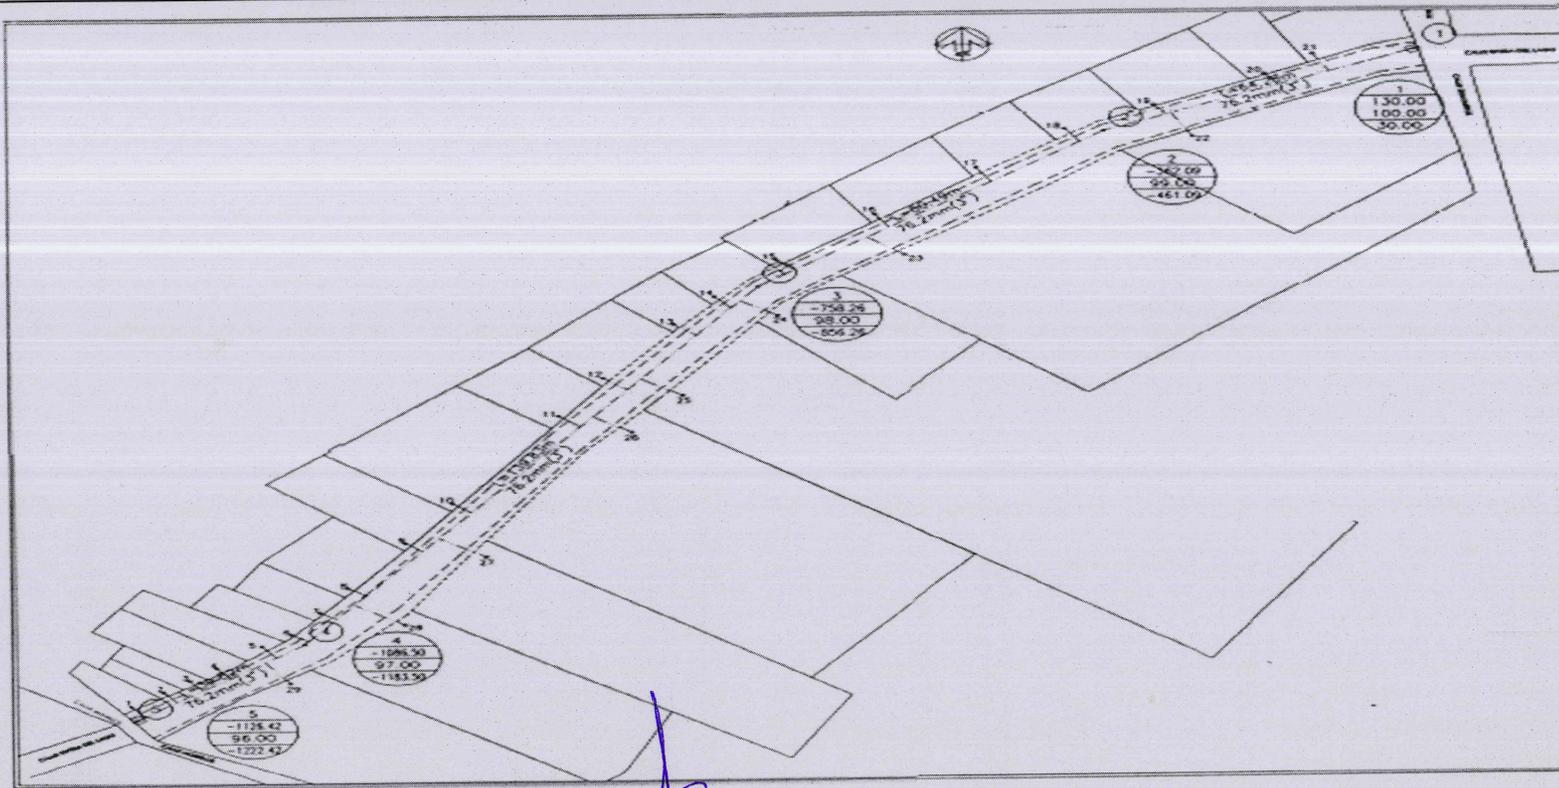

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

J GUADALUPE IBARRA RAMIREZ  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

**Notas**

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

**Cadena Original**

||CASE780113C89|22NA2588529|26-01-2022|P||0000108888800000031||

**Sello Digital**

HV9QLJmv91pQI476o5U/dkFUFWNr4gSF6YRvKLjB7qGvaWbjMjs5tVxy7yVBs0CXbNkjjSwLe41HdVQytRo/LSAU  
QumtZK6BnroDdJjNo8ZAwZ9CofBIOIsQ/IDxsqQjOtbAPA1NU5qNWS7CbslhGQSH0QtI3/0KPySzfF8DK8=



**Contacto:**

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
22NA2588529	CASE780113C89

Nombre, Denominación o Razón social
SERGIO CABRERA

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 26 de enero de 2022, a las 14:20 horas</p>

Notas
<p>1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.</p> <p>2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.</p> <p>3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.</p>

**Cadena Original**

||CASE780113C89|22NA2588529|26-01-2022|P||0000108888800000031||

**Sello Digital**

HV9QLJmv91pQI476o5U/dkFUFWNr4gSF6YRvKLjB7qGvaWbjMjs5tTvxy7yVBs0CXbNkjjSwLe41HdVQytRo/LSAU  
QumtZK6BnroDdJjNo8ZAwZ9CofBIOIsQ/IDxsqQjOtbAPA1NU5qNWS7CbslhGQSH0QtI3/0KPySzfF8DK8=



**GOBIERNO DE MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



**Contacto:**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.
