



Dirección de Obras Públicas  
 Administración 2021-2024  
 Número de Oficio 0642/2024

LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMÉNEZ  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de: **\$290,298.94** (Doscientos Noventa Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 94/100 M.N.) por concepto de **ESTIMACIÓN 05 Y FINIQUITO**, del programa **CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto -

**OBRA:** "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6151-2-11.1-050-406  
 Contrato: GMJ 006C- OP/2024

Nº	FECHA	FACTURA	SUBTOTAL	TOTAL	RETENCIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
192	20/06/2024	\$251,896.92	\$292,200.43	\$1,901.48	\$290,298.94	

Anexo:

1. Factura y xml
2. Verificación CFDI
3. Estimación 05 y Finiquito
4. Fianza Vicios Ocultos
5. Minuta Termino de Obra
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE

JOCOTEPEC, JAL., A 20 DE JUNIO DEL 2024  
 "2024, TÚ DECIDES MEJORAR"



C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ  
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**RECIBIDO**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 JOCOTEPEC, JAL.

25 JUN. 2024  
 02:56 PM  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 2021 - 2024



# TERRACERIAS PAVIMENTOS DE LA RIBIERA S.A. DE CV

**TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA**  
 RFC: TPR1806058CO  
 Domicilio: MORELOS No. 67 No. Int E, Jicotepec Centro, C.P. 45800, Jicotepec, Jalisco, México  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 45800  
 Régimen Fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir  
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: 192  
 Fecha: 20/6/2024 13:18:06

**Datos del cliente**

Cliente: MUNICIPIO DE JICOTEPEC JALISCO  
 R.F.C.: MJ1850101KP8  
 Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. 5/N, Jicotepec Centro, C.P. 45800, Jicotepec, Jalisco, México  
 Uso CFDI: 101 - Construcciones.

**Régimen Fiscal:**

603 - Personas Morales con fines no lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad SAT	Clave	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor	Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	-------	------------	-------	-------------------	------------------------	-------	----------	------------	-----------	---------

**PAGO DE ESTIMACION**

No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO OBRA:

"REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILIPAN-GUADALUARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESTAN, MUNICIPIO DE JICOTEPEC, JALISCO.

1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - 72141103 - Unidad de Servicio de pavimentación de calles y carreteras					251,896.92	0.00		40,303.51	251,896.92
------	--------------------	---	--	--	--	--	------------	------	--	-----------	------------

CONTRATO GMJ-006C-OP/2024 CLA8E

INTERBANCARIA: 014359655069857247

BANCO: SANTANDER

DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)

\$1,901.48

MONTO PARA EFECTO DE PAGO: \$290,298.94

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 43/100 M.N.

Subtotal  
 Impuestos Trasladados

251,896.92  
 40,303.51  
 292,200.43



*[Handwritten signature]*



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**


Serie del Certificado del emisor: 00001000000516193795  
 Folio fiscal: 1377F057-7D48-4CD0-91EC-66165F18911D  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Junio 20, 2024 - 13:18:07  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
 A4U0smE0o0pTQnpGzU5g8c3zVfE69+4dW24k4vT8xYd5Yqk/gE75Pz2fEdIH0M6MmWj0u43/Wrt+Sbx  
 hK0R2veF+CUhNIA0A/DkUBR3t32LPArtTpdWYzZ5F09P/OAM+P2uKp00WffBzAZOMhMCRk7NDECJvH5t  
 00B3QC+nHemFw9DhJ5cFAY/hYNDb+siVicaYgYa/nY6tS/W9NEGfCeVYTXu4HilvddrC0ndymI0XrDXKw0vF  
 3Y195vzN5C8S83v4G10smfCveIvBKf+Qd3R5pUyU09eSwyTatDRkKntJp9gpeZxkrFInu2H4u4G1+ThA==  
 Sello del SAT  
 bYX08t75w+3L0s6Q4wI/LxRR1nVclce6oe2gIvTQWjilUplrPzhtedY6tZGlyLFhqwFgurt/8pXR  
 +8xdl+1e82BQ5b/2vWbATU0cYQuI13N0LlCqT73p1/BiBaU+YHytUgFUp0RiYgThEfwkKQD  
 kREZYxGVtSMRj8E3XhN2ImZA+Vw4gInHTdIR200P/hgF+KR28015UmkZ10ZHZ10GdnTf3CF0wv1Bw4  
 0dM17kV//waky/Xvok0By+BM5UH6jM1AWPcp77ZEVPCWzBz8H4Rj+0156Y1trf9wGpFASWhbIAXqP

TWR37HwrtW7NA6Zz7TKpDg==

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT


||1.1|137f057-7d48-4cd0-91ec-66165f18911d|2024-06-20T13:18:07|MAS0810247C0|AAUO  
SmE0odptQnpGzU5q83vdfEG9+sDw24Kk4Tix8y5qk/GET5Pe21f8dIHONM6MMw0uXk4j3/Wr+s  
bkhORZvef+CUnIiAOA/DKubRst323LPART1pdWyzZF5FC09P/OAM+dpFkapooWfBazOMhMCvK7ND  
EcuVhstooB3Gc+nHemFW9DhJ5SCfAY/HyNB+sIvIcaYga/ny6r5W9NefCeYTKu4HllvdrcOn4  
ydmIOxrDXKkwoVf3Yiu95vZn5B8S3v4PCIOsmFcvetlBKF+Qd3R5pUvUo9e5wyfaTdrRknJTp9gepzvX  
rfInuZH4aU4iCi+Tha==|00001000000505142236||



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS



&#xA;DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$1,901.48&#xA;MONTO PARA EFECTO DE PAGO: \$290,298.94" ValorUnitario="251896.92" Importe="251896.92" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="251896.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="40303.51"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40303.51"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="40303.51" Base="251896.92"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1" UUID="1377F057-7D4B-4CD0-91EC-66165F18911D" FechaTimbrado="2024-06-20T13:18:07" RfcProvCertif="MAS0810247C0" SelloCFD="A4UOSmE0odptYQnpGzU5q8C3tVdFEG9+sdW24Kx4VTix8yd5YqK/gE75Pe2IF8diHONM6MMwJ oUx4j3/Wt+Sbxhk0R2veF+CUnNiAOA/DkUbrSt323LPAtT1pdWyzZF5F09P/OAM+dP2uPKap0owffBaZOMh MCrVK7NdEcUJVhStoOB3Qc+nHemFW9DhJSsCFAY/HyNDb+s1VIicaYgYa/ny6rSW9NeGfCeYYTxu4H1Ivdd rC0n4ydmi0XrDXKNovf3Y1lu95v2n5BCSB3v4pCiOsmFcveiVBKF+Qd3R5puYUo9eSwyfaTDRRKnJTp9gepz vxrP1nu2H4aU4iCi+ThA==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236" SelloSAT="bYX08G17Sw+3LQs6Q4Wl/LxRR1nVcel6oe2glVTQwjiUuplPLrp2htedY6lt2GYLFhhqweFgu tK/8pXR+8Xdj+1Eg82BQ5b/2VnWBAT0UoCyQuI13Ny0LLCqt73p1/BlbaUt+yHYugiFupORiYjGThefewkw ikQdKREfZyxGVTSMRrJ8E3XnH2imZA+Vw4glNHTdiRz0oP/hgf+KRZ8oi5UmKZJ0ZH10GdntF3C6F0wv1Bw 40dMi7kv//waky/XVoK0By+BM5UH6jM1AWPcp77EVPCWZbZ8H4RjY+0156y1Ytrf9WgaPfASwHb1AXqfpTw vR7HwtW7NA6Zz7TkxPDg==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TPR1806058C0	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1377F057-7D4B-4CD0-91EC-66165F18911D	2024-06-20T13:18:06	2024-06-20T13:18:07	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$292,200.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

CONTRALORIA CIUDADANA  
OFICIO No. 0321/2024  
Asunto: Contestación

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

PRESENTE

Por medio del presente extiendo un cordial saludo, mismo que hago propio para dar contestación a su oficio **No. 0247/2024** de fecha 20 de Junio del presente año en donde se entrega a esta Contraloría a mi cargo para su revisión la Estimación No. 5 y finiquito del contrato **GMJ-OP-006/2024** correspondiente a la superficie de rodamiento en calle Ramón Corona, localidad San Pedro Tesistan, del programa **Cuenta Corriente, Ejercicio Fiscal 2024**, por lo que la revisión física de la obra y el cumplimiento de la misma como lo señala el contrato es responsabilidad de la dirección a su cargo, para lo cual le informo que es procedente su trámite.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JOCOTEPEC, JAL., 25 DE JUNIO DEL 2024



LIC. JAIME ALEJANDRO MENDOZA LARIOS

CONTRALORIA  
CIUDADANA

CONTRALOR CIUDADADANO.



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS  
2021 - 2024

25 JUN. 2024

*Bravo en 2:24 pm*

**RECIBIDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JOCOTEPEC, JAL.

*Tú decides mejorar*

# TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89

<b>H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</b>  <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>	<b>No. DE CONTRATO:</b> GMJ 006C- OP/2024	HOJA DE RELACIÓN	HOJA No. 1 DE 1
	<b>CONTRATISTA:</b> TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	ESTIMACIÓN No.	5 (CINCO) FINIQUITO
<b>OBRA:</b> REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	<b>UBICACIÓN:</b> CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE TRABAJO:	
		DEL:	DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2024.
		FECHA:	24 DE MARZO DE 2024

## RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES	
	DRENAJE RODAMIENTO				\$	380,296.81
					MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 380,296.81
					MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$ 128,399.89
					SUBTOTAL	\$ 251,896.92
					I.V.A. 16%	\$ 40,303.51
					SUMA	\$ 292,200.43
					MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 1,901.48
					NETO A PAGAR	\$ 290,298.94
	ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL		
	ASIGNACIÓN	\$ 1,647,741.62	\$ 263,638.66	\$ 1,911,380.28		
	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 380,296.81	\$ 60,847.49	\$ 441,144.30	EL CONTRATISTA	
	ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,219,741.96	\$ 195,158.71	\$ 1,414,900.67		
	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,600,038.77	\$ 256,006.20	\$ 1,856,044.97		
	SALDO POR EJERCER	\$ 47,702.85	\$ 7,632.46	\$ 55,335.31		
	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	
	ANTICIPO %	\$ 494,322.48	\$ 79,091.60	\$ 573,414.08	EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
	AMORTIZACIÓN	\$ 128,399.89	\$ 20,543.98	\$ 148,943.87		
	AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 365,922.59	\$ 58,547.61	\$ 424,470.20		
	AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 494,322.48	\$ 79,091.60	\$ 573,414.07		
	FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS	IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS









### TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.

HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE MARZO DE 2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		


LOCALIDAD:	SAN PEDRO TESISTAN	ESTIMACIÓN No.	5 (CINCO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2024.

CALLE RAMON CORONA		RODAMIENTO
JOCO-022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CMS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE BANCO EN PROPORCION 70% DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 30% PIEDRA DE BANCO .	FOTOGRAFÍA



*[Signature]*  
 SERGIO CABRERA  
 EL CONTRATISTA

*[Signature]*  
 C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





# TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.


HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89


EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE MARZO DE 2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		


LOCALIDAD:	SAN PEDRO TESISTAN	ESTIMACIÓN No.	5 (CINCO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2024.

CALLE RAMON CORONA		RODAMIENTO
JOCO-022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CMS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE BANCO EN PROPORCION 70% DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 30% PIEDRA DE BANCO .	CROQUIS

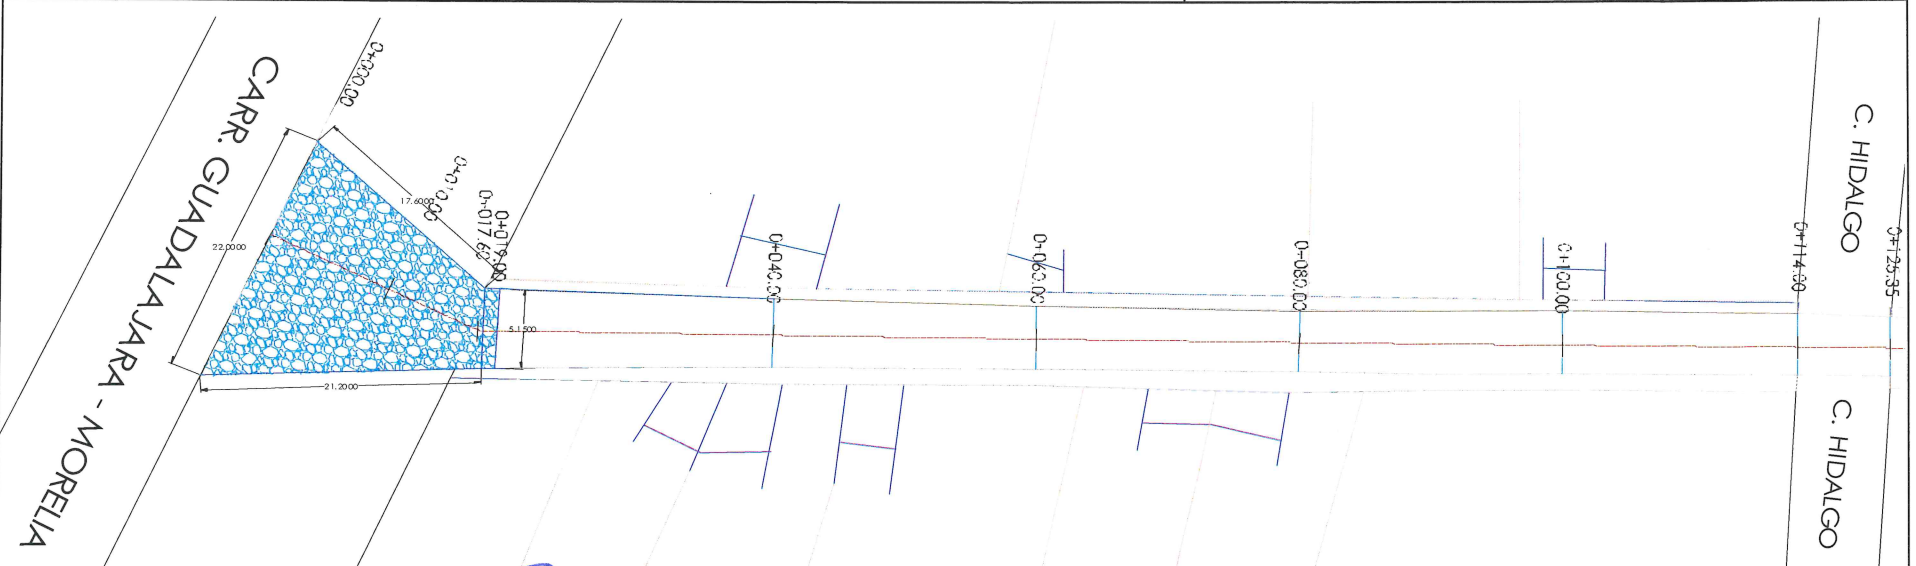

  
 SERGIO CABRERA  
 EL CONTRATISTA

  
 C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
 OBRAS PUBLICAS



# TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.


HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE MARZO DE 2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		


LOCALIDAD:	SAN PEDRO TESISTAN	ESTIMACIÓN No.	5 (CINCO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2024.

CALLE RAMON CORONA		RODAMIENTO
JOCO-022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CMS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 Y PIEDRA DE BANCO EN PROPORCION 70% DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 30% PIEDRA DE BANCO .	CROQUIS

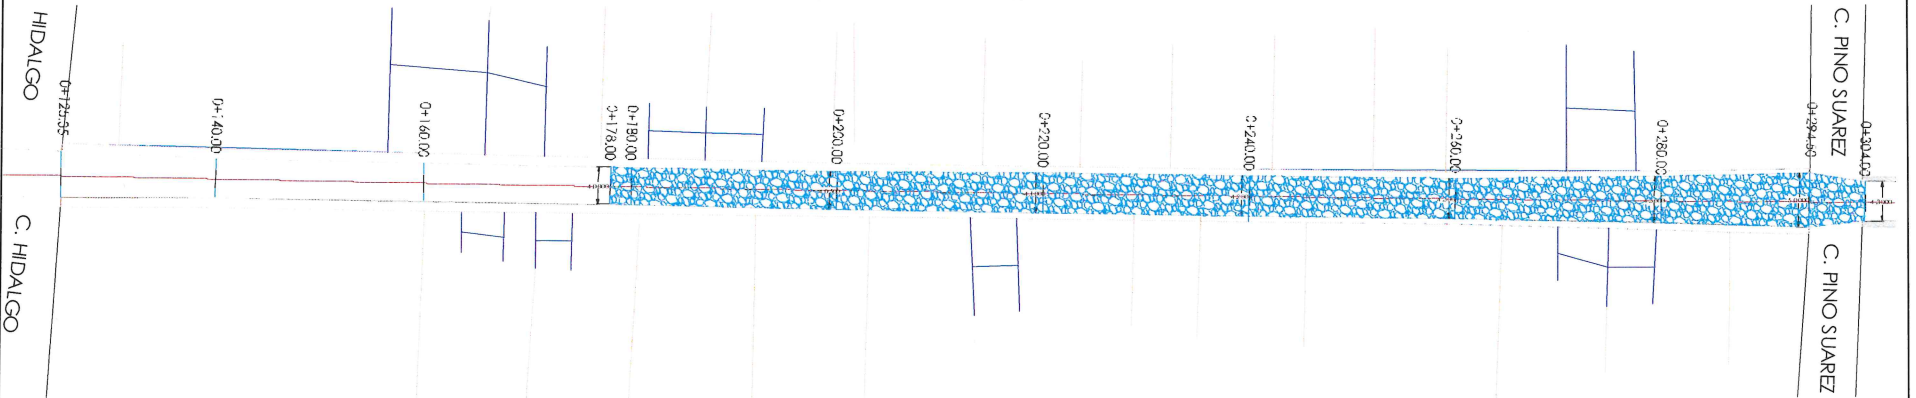

  
 SERGIO CABRERA  
 EL CONTRATISTA

  
 C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
 OBRAS PUBLICAS





**TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.**  
 HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.  
 RFC: CASE780113C89

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE MARZO DE 2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		

LOCALIDAD:	SAN PEDRO TESISTAN	ESTIMACIÓN No.	5 (CINCO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2024.

	CALLE RAMON CORONA	RODAMIENTO
JOCO-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHUELO PREFABRICADO 12X30X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FOTOGRAFÍA




*[Handwritten signature]*

SERGIO CABRERA  
EL CONTRATISTA

*[Handwritten signature]*

C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





# TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.


HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.


RFC: CASE780113C89

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE MARZO DE 2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		


LOCALIDAD:	SAN PEDRO TESISTAN	ESTIMACIÓN No.	5 (CINCO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2024.

CALLE RAMON CORONA		RODAMIENTO
JOCO-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHUELO PREFABRICADO 12X30X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS

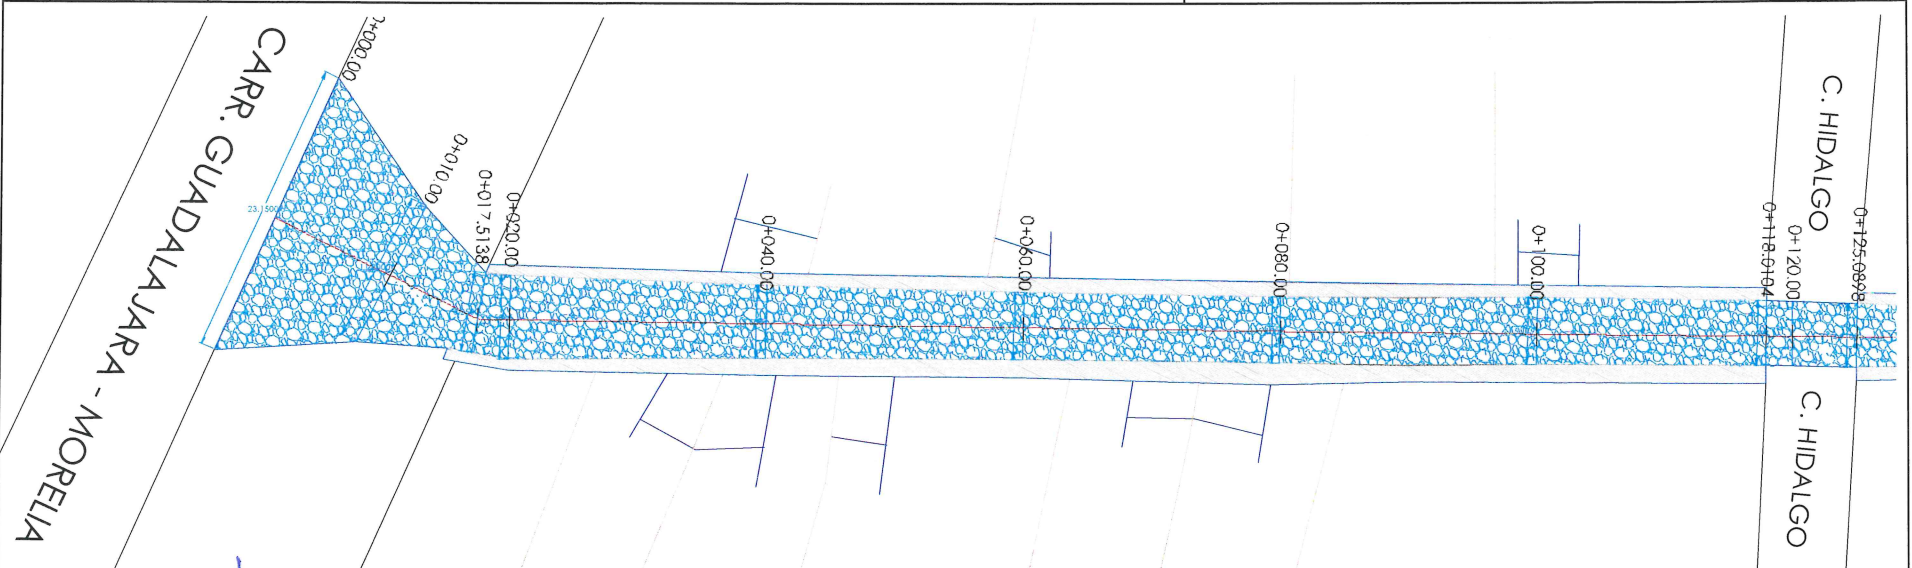

  
 SERGIO CABRERA  
 EL CONTRATISTA

  
 C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE  
 OBRAS PUBLICAS





### TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.


HACIENDA DE LA SABILA 120, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL, TONALA, JALISCO.

RFC: CASE780113C89

EMPRESA:	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.	FECHA:	24 DE MARZO DE 2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		


LOCALIDAD:	SAN PEDRO TESISTAN	ESTIMACIÓN No.	5 (CINCO) FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2024.

CALLE RAMON CORONA		RODAMIENTO
JOCO-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHUELO PREFABRICADO 12X30X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CROQUIS

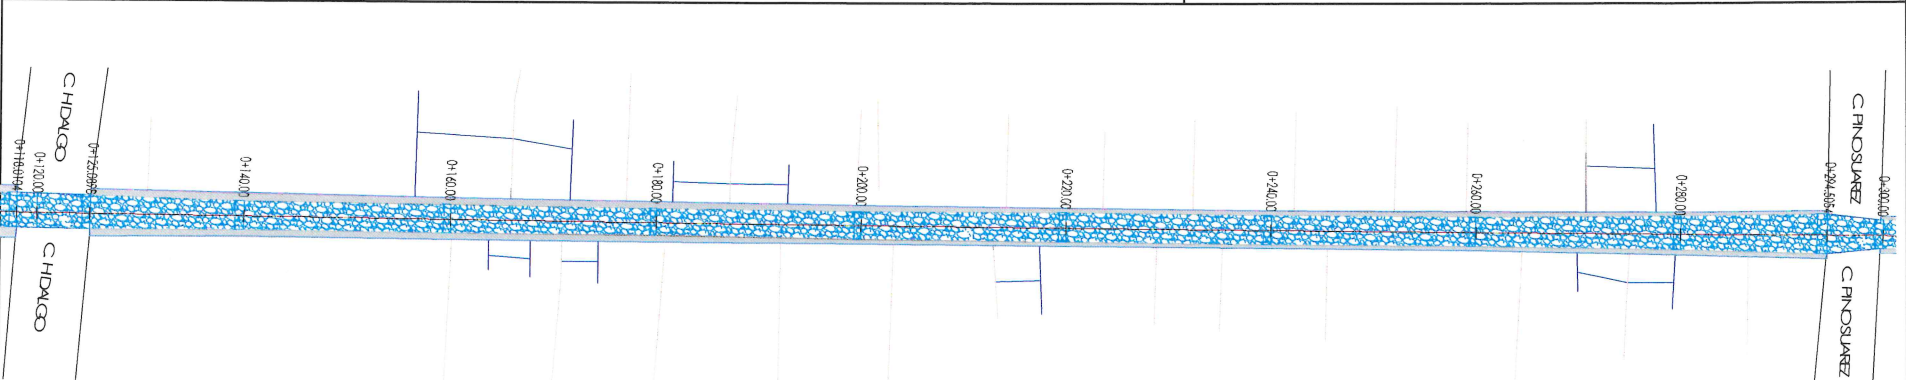

  
 SERGIO CABRERA  
 EL CONTRATISTA

  
 C. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS  
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

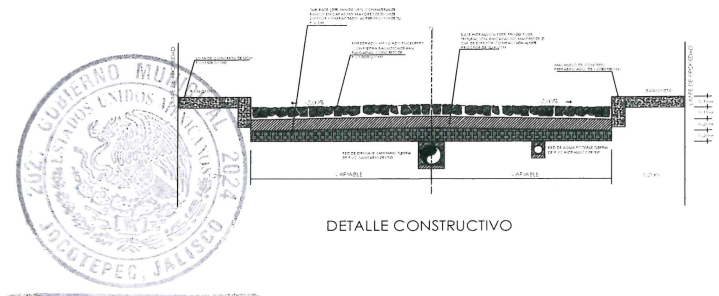

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JOCOTEPEC, JALISCO A 14 DE MARZO DE 2024.


ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA.

**C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ**  
**DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DEL**  
**MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.**  
**P R E S E N T E**

Sobre el particular y con el gusto de saludarle aprovecho la ocasión para solicitar autorización de prórroga de tiempo de 4 días a partir del 19 al 23 de Marzo del 2024, para la ejecución de los trabajos de: **REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.**, con Numero de Contrato: **GMJ 006C- OP/2024.**

Se solicita ya que debido a que los vecinos de esta calle tienen vehículos no se pueden ejecutar los frentes de trabajo programados ya que se requiere ejecutar los trabajos en secciones (carril derecho y posterior al terminado carril izquierdo) y esto nos representa un avance menor por jornada.

Sin otro particular pongo a su consideración el anterior y quedo al pendiente para cualquier aclaración o duda al respecto.



**ATENTAMENTE**  
**ING. SÉRGIO CABRERA**

---

**TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V.**



**DIRECCION DE**  
**OBRAS PUBLICAS**  
2021 - 2024

**14 MAR. 2024**

**RECIBIDO**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JOCOTEPEC, JAL.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
OFICIO 250-B/2024  
ADM. 2021-2024

Jocotepec jal. 15 de marzo de 2024

C. SERGIO CABRERA  
TERRACERÍA Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A DE C.V.

PRESENTE:

Asunto: autorización solicitud prorroga

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a su solicitud recibida el día 14 de marzo del 2024, el cual se autoriza una prórroga de 4 días a partir del 19 al 23 de marzo del 2024 para la obra: **“REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.”**

No. De contrato: **GMJ 006C-OP/2024**

Agradeciendo su colaboración, me despido enviándole un saludo.

ATENTAMENTE



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS

MELDA KARINA PÉREZ GONZALEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

*REUR*  
*15/MAR/24*
