

## BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV

R.F.C. : BCO070129512

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Expedido en el C.P. 45300

| Ciente                                                   | Tipo de comprobante               | Versión                            | UUID - Folio Fiscal                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO<br>R.F.C. : MJJ850101KP8 | I - Ingreso                       | CFDI v 3.3                         | D71E4FF5-7300-E691-41B4-83BC5D45C70F |
| Uso del CFDI                                             | Folio de Control Interno          | Número de serie del CSD del emisor | Fecha y Hora de Emisión              |
| G03 - Gastos en general                                  | Factura 278                       | 00001000000404524890               | 20 de Septiembre de 2018 12:47:04 pm |
|                                                          | Método de Pago                    | Tipo de Moneda                     |                                      |
|                                                          | PUE - Pago en una sola exhibición | MXN - Peso Mexicano                |                                      |

| Cantidad | Clave SAT Prod/Serv | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  | Clave SAT Unidad | Unidad   | Precio     | Importe    |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|
| 1        | 72151500            | ESTIMACION 1, CONTRATO GMJ 25 COP/2018, DE LA DESCRIPCION DE LA OBRA: ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA POBLACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, RETENCION 5 AL MILLAR \$ 1,950.24, NETO A PAGAR \$ 450,505.91 | E48              | SERVICIO | 390,048.41 | 390,048.41 |

| TRASLADOS  |          |             |              |           |
|------------|----------|-------------|--------------|-----------|
| Base       | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe   |
| 390,048.41 | 002- IVA | Tasa        | 0.160000     | 62,407.75 |

| Importe con Letra | SubTotal   | IVA 16 %  | TOTAL      |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| ---               | 390,048.41 | 62,407.75 | 452,456.16 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v 3.3

| Código del timbre:                                                                | Número de serie del CSD del SAT | RFC Proveedor Certificado | Fecha y Hora de Certificación        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|  | 00001000000402636111            | SAD110722MQA              | 20 de Septiembre de 2018 12:51:58 pm |
| SELLO DIGITAL DEL SAT:                                                            |                                 |                           |                                      |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:                 |                                 |                           |                                      |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI:                                                           |                                 |                           |                                      |



C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO  
BIRMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

| RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| HOJA No.                                                          | PARTIDAS |
|                                                                   | IMPORTES |


|                                    |                       | ESTIMACIÓN    |              | 1 (UNO)       |  |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--|
|                                    | ESTADO CONTABLE       | IMPORTE       | I . V . A .  | TOTAL         |  |
|                                    | ASIGNACIÓN            | \$ 390,048.41 | \$ 62,407.75 | \$ 452,456.16 |  |
|                                    | IMPORTE DE ESTIMACIÓN | \$ 390,048.41 | \$ 62,407.75 | \$ 452,456.16 |  |
|                                    | ACUMULADO ANTERIOR    | -             | -            | -             |  |
|                                    | ACUMULADO A LA FECHA  | \$ 390,048.41 | \$ 62,407.75 | \$ 452,456.16 |  |
|                                    | SALDO POR EJERCER     | \$ 0.00       | \$ 0.00      | \$ 0.00       |  |
| <b>AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO</b>   |                       |               |              |               |  |
| ANTICIPO %                         |                       | \$ -          | \$ -         | \$ -          |  |
| AMORTIZACIÓN                       |                       | \$ -          | \$ -         | \$ -          |  |
| AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.            |                       | \$ -          | \$ -         | \$ -          |  |
| AMORTIZACIÓN A LA FECHA            |                       | \$ -          | \$ -         | \$ -          |  |
| FALTANTE POR AMORTIZAR             |                       | \$ -          | \$ -         | \$ -          |  |
| <b>AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO</b>   |                       |               |              |               |  |
| C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED      |                       |               |              |               |  |
| EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO        |                       |               |              |               |  |
| ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |                       |               |              |               |  |
| ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO     |                       |               |              |               |  |
| <b>EL REPRESENTANTE LEGAL</b>      |                       |               |              |               |  |
| Pia Lorena Buenostro Ahued         |                       |               |              |               |  |
| MONTO DE ESTIMACIÓN                |                       | \$            |              | \$ 390,048.41 |  |
| MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %      |                       | \$            |              | -             |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                    |                       | \$            |              | \$ 390,048.41 |  |
| I . V . A . 16%                    |                       | \$            |              | \$ 62,407.75  |  |
| <b>SUMA</b>                        |                       | \$            |              | \$ 452,456.16 |  |
| MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)           |                       | \$            |              | -             |  |
| MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)  |                       | \$            |              | \$ 1,950.24   |  |
| <b>NETO A PAGAR</b>                |                       | \$            |              | \$ 450,505.91 |  |

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

PERÍODO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
OBRA : ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : SAN JUAN COSALA  
CONTRATISTA : BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| E S T I M A C I Ó N D E O B R A E J E C U T A D A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                    |                 |                             |          |                 |                  |                 |                               |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|
| No.                                               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U   | CANTIDADES       |                    |                 |                             | IMPORTES |                 |                  |                 |                               |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | PRESUPUESTO BASE | ACUMULADA ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL | SALDO    | PRECIO UNITARIO | PRESUPUESTO BASE | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR | SALDO |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                    |                 |                             |          |                 |                  |                 |                               |       |
| 1                                                 | TRANSICION AEREA SUBTERRANEA TRIFASICA. INCLUYE CONECTORES, CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCETA, DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, CODO PVC DE 4", CABLE DE ENERGIA XLP CAL. 1/0 25 KV AL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA INSTALACION                                                                                 | PZA | 1.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 0.0000   | \$30,809.36     | \$30,809.36      | \$0.00          | \$0.00                        |       |
| 2                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO CON BOVEDA TIPO RMTB4 DE 1.50X1.50X1.50 MTS CON TAPA 84B DE CONCRETO POLIMERICO                                                                                                                                                                                                                                        | PZA | 2.0000           | 0.0000             | 2.0000          | 2.0000                      | 0.0000   | \$11,419.52     | \$22,839.04      | \$0.00          | \$0.00                        |       |
| 3                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO CON BOVEDA TIPO RMTB-3. INCLUYE TAPA 84-B DE CONCRETO POLIMERICO RECIBIDA CON CONCRETO DE UNA RESISTENCIA DE 150 KGR/CM2. HECHO EN OBRA                                                                                                                                                                                | PZA | 1.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 0.0000   | \$8,206.76      | \$8,206.76       | \$0.00          | \$0.00                        |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                    |                 |                             |          |                 |                  |                 |                               |       |
| 4                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO 3 EN BANQUETA CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR PEDESTAL. CFE BTTMTB3. DE 1.66 X 1.16 X 0.90 MT. INCLUYE: CONCRETO PARA RECEPCION DE TAPA, ARO Y TAPA 84 B ESPECIFICACION CFE 20100-39. EXCAVACION, PERFORACION, ENBOQUILLADO DE DUCTOS Y RESANE DE REGISTRO. ADEMÁS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 0.0000   | \$10,694.65     | \$10,694.65      | \$0.00          | \$0.00                        |       |
| 5                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR CON ACERO DE REFUERZO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                        | PZA | 1.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 0.0000   | \$1,854.96      | \$1,854.96       | \$0.00          | \$0.00                        |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                    |                 |                             |          |                 |                  |                 |                               |       |
| 6                                                 | SISTEMA DE TIERRAS EN REGISTROS DE MEDIA TENSION. COMPUESTO CON CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, CARGA FUNDENTE CADWEL No. 90, VARILLA DE TIERRA 3.05 MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                         | PZA | 4.0000           | 0.0000             | 4.0000          | 4.0000                      | 0.0000   | \$614.63        | \$2,458.52       | \$0.00          | \$0.00                        |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                    |                 |                             |          |                 |                  |                 |                               |       |
| 7                                                 | EXCAVACION DE FORMA MANUAL EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II, EN SECO. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, REMOCION, TRASPALEO, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPAS, TALUDES Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                         | M   | 120.0000         | 0.0000             | 133.5000        | 133.5000                    | -13.5000 | \$82.24         | \$9,868.80       | \$10,979.04     | -\$1,110.24                   |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                    |                 |                             |          |                 |                  |                 |                               |       |
| 8                                                 | RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. COMPACTANDO CON EQUIPO LIGERO AL 90 % DE SU PVSIM. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZACION, COMPACTACION Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                             | M3  | 45.0000          | 0.0000             | 80.0100         | 80.0100                     | -35.0100 | \$89.24         | \$4,015.80       | \$7,140.09      | -\$3,124.29                   |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                    |                 |                             |          |                 |                  |                 |                               |       |
| 9                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 50 MM DIAM. INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                 | M   | 500.0000         | 0.0000             | 540.5000        | 540.5000                    | -40.5000 | \$53.60         | \$26,800.00      | \$28,970.80     | -\$2,170.80                   |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                    |                 |                             |          |                 |                  |                 |                               |       |
| 10                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA CALIBRE 1/0 CON AISLAMIENTO XLP 25 KV ALUMINIO AL 100 % INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                          | M   | 400.0000         | 0.0000             | 400.9323        | 400.9323                    | -0.9323  | \$130.83        | \$52,332.00      | \$52,453.97     | -\$121.97                     |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                    |                 |                             |          |                 |                  |                 |                               |       |
| 11                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. No. 2 DENTRO DE DUCTO DE POLIETILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 130.0000         | 0.0000             | 133.5000        | 133.5000                    | -3.5000  | \$92.36         | \$12,006.80      | \$12,330.06     | -\$323.26                     |       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                    |                 |                             |          |                 |                  |                 |                               |       |
| 12                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 45 KVA 23 KV/40-254 V., OP RADIAL, DELTA ESTRELLA. INCLUYE: TRES INSERTO BUSHING, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                    | PZA | 1.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 0.0000   | \$94,869.62     | \$94,869.62      | \$0.00          | \$0.00                        |       |

*[Handwritten signature]*  
P. 13 A



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

PERÍODO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA : ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN : SAN JUAN COSALA

CONTRATISTA : BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| E S T I M A C I Ó N D E O B R A E J E C U T A D A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |                    |                 |                             |        |                 |                  |                 |                               |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| No.                                               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U    | CANTIDADES       |                    |                 |                             |        | PRECIO UNITARIO | IMPORTES         |                 |                               |            |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | PRESUPUESTO BASE | ACUMULADA ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL | SALDO  |                 | PRESUPUESTO BASE | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR | SALDO      |
| 13                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA, CORREDERA DE TACON DE POLIURETANO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                           | PZA  | 4.0000           | 0.0000             | 4.0000          | 4.0000                      | 0.0000 | \$752.04        | \$3,008.16       | \$3,008.16      | \$0.00                        | \$0.00     |
| 14                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PAR ASISTEMA DE MEDICION INCLUYE: BASE 7X2000 , CABLE XLP CAL. No. 4, INTERRUPTOR DE 3X50 AMPERES 600 VOLTS, GABINETE NEMA 3R, ZAPATA OJILLO BIMETALICA CAL 4, VARILLA DE TIERRA, CARGA CADWELD, DUCTERIA GALVANIZADA Y DE PAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                          | PZA  | 1.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 0.0000 | \$16,643.07     | \$16,643.07      | \$16,643.07     | \$0.00                        | \$0.00     |
| 15                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSHING TIPO INSERTO 25 KV, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA  | 3.0000           | 0.0000             | 3.0000          | 3.0000                      | 0.0000 | \$2,622.61      | \$7,867.83       | \$7,867.83      | \$0.00                        | \$0.00     |
| 16                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO 25 KV 200 AMP. 1/0. OPERACIÓN CON CARGA. INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                                                        | PZA  | 3.0000           | 0.0000             | 3.0000          | 3.0000                      | 0.0000 | \$3,454.65      | \$10,363.95      | \$10,363.95     | \$0.00                        | \$0.00     |
| 17                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE ADAPTADOR DE TIERRA 1/0 25 KV, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA  | 3.0000           | 0.0000             | 3.0000          | 3.0000                      | 0.0000 | \$1,223.31      | \$3,669.93       | \$3,669.93      | \$0.00                        | \$0.00     |
| 18                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR MULTIFUNCIONAL MARCA ELSTER SOLUTIONS MEDICION DE KWH, KW Y KVARH EN HASTA 4 TARIFAS HORARIAS. MEDICION DE VOLTAJE INSTANTANEO. PANTALLA LCD DE HSTA 6 DIGITOS. FORMA 9S, (3F-4H-3E), 120-480V, 2.5 (20) AMP, 60 HZ, CLASE DE PRECISION 0.2%. BASE TIPO SOCKET, CON PUERTO OPTICO ANSI II EN EL PANEL FRONTAL, CUMPLE CON ESPECIFICACION DE CFE G0000-48-2010, VIGENTE. | PZA  | 1.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 0.0000 | \$11,053.04     | \$11,053.04      | \$11,053.04     | \$0.00                        | \$0.00     |
| 19                                                | PAGOS A CFE 1 POR APROBACION, SUPERVISION Y CONEXIÓN DE PROYECTO ELECTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZA  | 1.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 0.0000 | \$15,474.36     | \$15,474.36      | \$15,474.36     | \$0.00                        | \$0.00     |
| 20                                                | PAGOS A CFE (ND) POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE GARANTIA EN LA ELABORACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA PARA UN EQUIPO DE BOMBEO                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA  | 1.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 0.0000 | \$8,048.82      | \$8,048.82       | \$8,048.82      | \$0.00                        | \$0.00     |
| 21                                                | RESANIE, LIMPIEZA Y APLICACION DE ESPUMA DE POLIURETANO EN REGISTRO DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                  | LOTE | 4.0000           | 0.0000             | 3.0000          | 3.0000                      | 1.0000 | \$289.83        | \$1,159.32       | \$869.49        | \$0.00                        | \$289.83   |
| 22                                                | ROTULACION DE REGISTROS, DEACUERDO A NORMA DE CFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOTE | 4.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 3.0000 | \$2,186.91      | \$8,747.64       | \$2,186.91      | \$0.00                        | \$6,560.73 |
| 23                                                | PRUEBAS VLF CABLE DE ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOTE | 3.0000           | 0.0000             | 3.0000          | 3.0000                      | 0.0000 | \$3,273.48      | \$9,820.44       | \$9,820.44      | \$0.00                        | \$0.00     |
| 24                                                | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A TRANSFORMADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZA  | 1.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 0.0000 | \$6,644.92      | \$6,644.92       | \$6,644.92      | \$0.00                        | \$0.00     |
| 25                                                | PAGO A LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS (UVIE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZA  | 1.0000           | 0.0000             | 1.0000          | 1.0000                      | 0.0000 | \$10,790.62     | \$10,790.62      | \$10,790.62     | \$0.00                        | \$0.00     |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |                    |                 |                             |        | SUMA            | \$ 390,048.41    | \$ 390,048.41   | \$ -                          | \$ 0.00    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |                    |                 |                             |        | IVA             | \$ 62,407.75     | \$ 62,407.75    | \$ -                          | \$ 0.00    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |                    |                 |                             |        | TOTAL           | \$ 452,456.16    | \$ 452,456.16   | \$ -                          | \$ 0.00    |

C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512



|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CROQUIS Y OBSERVACIONES |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                   | TRANSICION AEREA SUBTERRANEA TRIFASICA, INCLUYE CONECTORES, CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCETA, DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, CODO PVC DE 4", CABLE DE ENERGIA XLP CAL. 1/0 25 KV AL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA INSTALACION |                         |

| UNIDAD | TRAMO                               | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA    | TOTAL |
|--------|-------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|
| PZA    | EN EL POSTE MARCADO CON EL No. PE-1 |       |       |      | 1.0000 | 1.00  |
|        |                                     |       |       |      |        |       |
|        |                                     |       |       |      |        |       |
|        |                                     |       |       |      |        |       |
|        |                                     |       |       |      | SUMA   | 1.00  |

Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

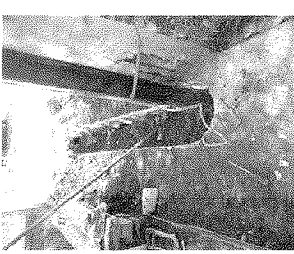C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL


BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                  |       |       |      |       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|
| 2                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO CON BOVEDA TIPO RMTB4 DE 1.50X1.50X1.50 MTS CON TAPA 84B DE CONCRETO POLIMERICO |       |       |      |       |
| UNIDAD              | TRAMO                                                                                                                            | LARGO | ANCHO | ALTO | TOTAL |
| PZA                 | REGISTRO MARCADOS CON LOS Nos. R1 Y R3                                                                                           |       |       |      | 2.00  |
|                     |                                                                                                                                  |       |       |      |       |
|                     |                                                                                                                                  |       |       |      |       |
|                     |                                                                                                                                  |       |       |      |       |
|                     |                                                                                                                                  |       |       |      |       |
|                     |                                                                                                                                  |       |       |      | SUMA  |
|                     |                                                                                                                                  |       |       |      | 2.00  |

CROQUIS Y OBSERVACIONES

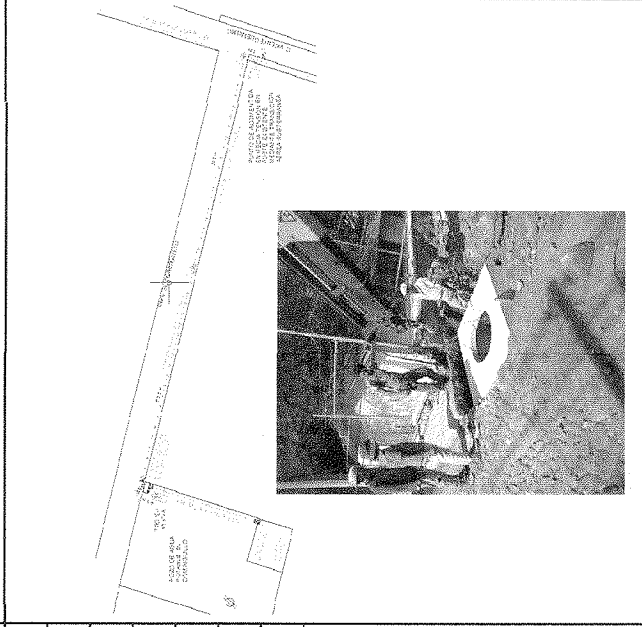

*C. Pía Lorena Buenrostro Ahued*  
C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

*Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro*  
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO






BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
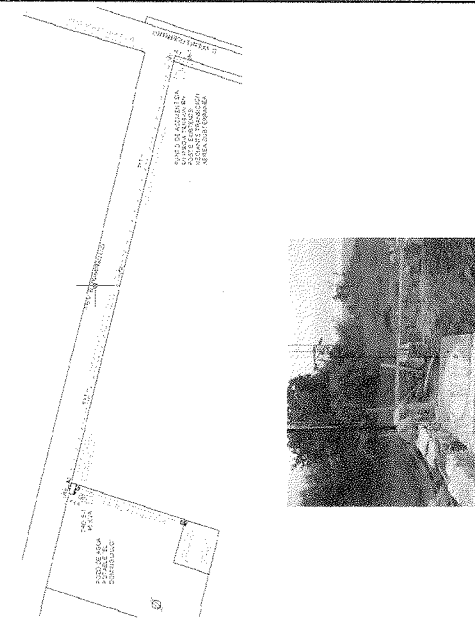
| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                                                  |       |       |      |        |       | CROQUIS Y OBSERVACIONES                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR CON ACERO DE REFUERZO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION |       |       |      |        |       |                                                                                      |
| UNIDAD              | TRAMO                                                                                                                                                            | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA    | TOTAL |    |
| PZA                 | AL PIE DEL REGISTRO R4                                                                                                                                           |       |       |      | 1.0000 | 1.00  |                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                  |       |       |      |        |       |                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                  |       |       |      | SUMA   | 1.00  |                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                  |       |       |      |        |       |                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                  |       |       |      |        |       |                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                  |       |       |      |        |       |  |

*C. Pia Lorena Buenrostro Ahued*  
C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

*Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro*  
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES     |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6                       | SISTEMA DE TIERRAS EN REGISTROS DE MEDIA TENSION, COMPUESTO CON CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, CARGA FUNDENTE CADWEL No. 90, VARILLA DE TIERRA 3.05 MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION |  |  |  |  |  |
| CROQUIS Y OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |

CROQUIS Y OBSERVACIONES

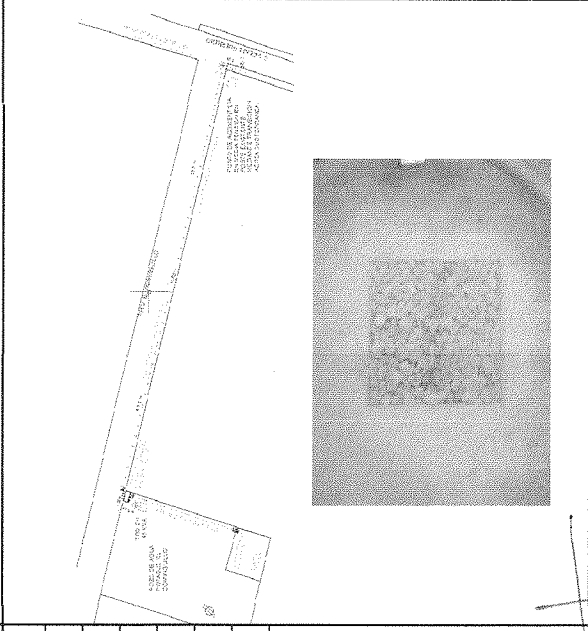

*C. Pía Lorena Buenrostro Ahued*  
C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

*Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro*  
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512


|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |


| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                                                                                                |         |       |      |        |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|--------|--------|
| 7                   | EXCAVACION DE FORMA MANUAL EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, REMOCION, TRASPALAO, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA, TALUDES Y MANO DE OBRA |         |       |      |        |        |
| UNIDAD              | TRAMO                                                                                                                                                                                                          | LARGO   | ANCHO | ALTO | PZA    | TOTAL  |
| M                   | DEL POSTE PE1 AL REGISTRO R1                                                                                                                                                                                   | 4.0000  |       |      | 1.0000 | 4.00   |
|                     | DEL REGISTRO R1 AL R2                                                                                                                                                                                          | 59.5000 |       |      | 1.0000 | 59.50  |
|                     | DEL REGISTRO R2 AL R3                                                                                                                                                                                          | 63.5000 |       |      | 1.0000 | 63.50  |
|                     | DEL REGISTRO R3 AL R4                                                                                                                                                                                          | 6.5000  |       |      | 1.0000 | 6.50   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                |         |       |      | SUMA   | 133.50 |

C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

CROQUIS Y OBSERVACIONES

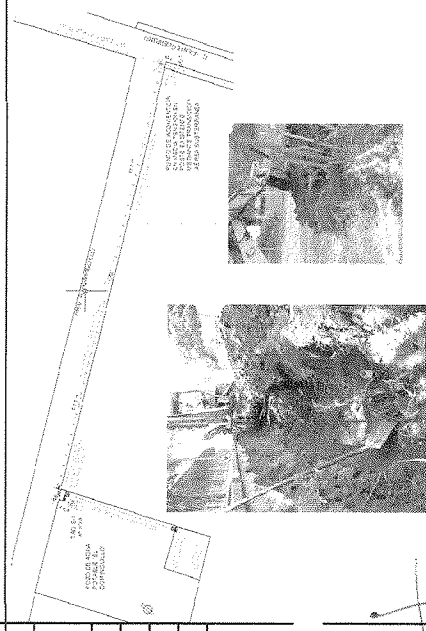

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |


|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                                                                              |         |        |        |        |       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| UNIDAD              | TRAMO                                                                                                                                                                                        | LARGO   | ANCHO  | ALTO   | PZA    | TOTAL |
| 8                   | RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTANDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90 % DE SU PVSM, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZACION, COMPACTACION Y MANO DE OBRA. |         |        |        |        |       |
|                     | DEL POSTE PE1 AL REGISTRO R1                                                                                                                                                                 | 4.0000  | 0.6000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.40  |
|                     | DEL REGISTRO R1 AL R2                                                                                                                                                                        | 59.5000 | 0.6000 | 1.0000 | 1.0000 | 35.70 |
|                     | DEL REGISTRO R2 AL R3                                                                                                                                                                        | 63.5000 | 0.6000 | 1.0000 | 1.0000 | 38.10 |
|                     | DEL REGISTRO R3 AL R4                                                                                                                                                                        | 6.5000  | 0.6000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.90  |
|                     |                                                                                                                                                                                              |         |        |        | SUMA   | 80.10 |

C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

CROQUIS Y OBSERVACIONES

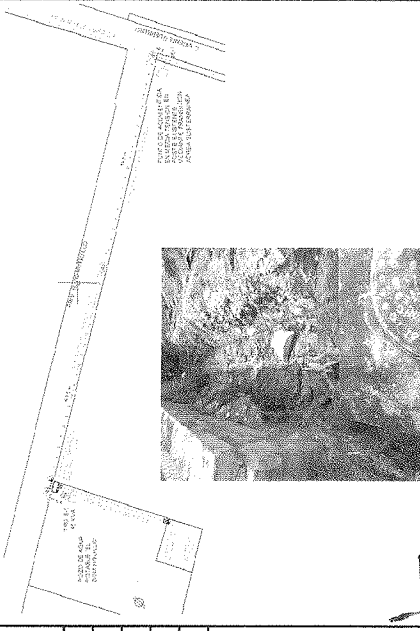

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                                         |         |       |      |        |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|--------|--------|
| UNIDAD              | TRAMO                                                                                                                                                   | LARGO   | ANCHO | ALTO | PZA    | TOTAL  |
| 9                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 50 MM DIAM, INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO |         |       |      |        |        |
|                     | DEL POSTE PE1 AL REGISTRO R1                                                                                                                            | 4.0000  |       |      | 4.0000 | 16.00  |
|                     | DEL REGISTRO R1 AL R2                                                                                                                                   | 59.5000 |       |      | 4.0000 | 238.00 |
|                     | DEL REGISTRO R2 AL R3                                                                                                                                   | 63.5000 |       |      | 4.0000 | 254.00 |
|                     | DEL REGISTRO R3 AL R4                                                                                                                                   | 6.5000  |       |      | 5.0000 | 32.50  |
|                     |                                                                                                                                                         |         |       |      | SUMA   | 540.50 |

CROQUIS Y OBSERVACIONES



*C. PIA Lorena Buenrostro Ahued*  
C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

*Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro*  
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EMPRESA: BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                            |                                                                                      | FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018                                                                                                                                     |        |
| OBRA: ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |
| LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA                                                                                                                              | ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA Y FINIQUITO)                                                 |                                                                                                                                                                     |        |
| MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO                                                                                                                           | PERIODO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018                            |                                                                                                                                                                     |        |
| <b>NUMEROS GENERADORES</b>                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |
| 11                                                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. No. 2 DENTRO DE DUCTO DE POLIETILENO |                                                                                                                                                                     |        |
| UNIDAD                                                                                                                                                  | TRAMO                                                                                | LARGO                                                                                                                                                               | ANCHO  |
| M                                                                                                                                                       | DEL POSTE PE1 AL REGISTRO                                                            | 4.0000                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                         | DEL REGISTRO R1 AL R2                                                                | 59.5000                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                         | DEL REGISTRO R2 AL R3                                                                | 63.5000                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                         | DEL REGISTRO R3 AL R4                                                                | 6.5000                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     | ALTO   |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     | PZA    |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     | TOTAL  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 4.00   |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 59.50  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 63.50  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 6.50   |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     | SUMA   |
|                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 133.50 |
| <br>C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED<br>ADMINISTRADOR GENERAL          |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |
| <br>ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO<br>EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |
| CROQUIS Y OBSERVACIONES                                                                                                                                 |                                                                                      |   |        |

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
 SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
 RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 45 KVA 23 KV/440-254 V, OP RADIAL, DELTA ESTRELLA, INCLUYE: TRES INSERTO BUSHING, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION |       |       |      |       |
| UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRAMO                                                                                                                                                                                                | LARGO | ANCHO | ALTO | TOTAL |
| PZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MARCADO CON EL No. E-1                                                                                                                                                                               |       |       |      | 1.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |       | SUMA  |      | 1.00  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">CROQUIS Y OBSERVACIONES</p>  </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p>ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO<br/>EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO</p> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |       |

  
 C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED  
 ADMINISTRADOR GENERAL

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |  |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      |  | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                                   |       |       |      |        |       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|
| 13                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA, CORREDERA DE TACON DE POLIURETANO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION |       |       |      |        |       |
| UNIDAD              | TRAMO                                                                                                                                             | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA    | TOTAL |
| PZA                 | EN LOS REGISTRO R1, R2, R3 Y R4                                                                                                                   |       |       |      | 4.0000 | 4.00  |
|                     |                                                                                                                                                   |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                                   |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                                   |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                                   |       |       |      | SUMA   | 4.00  |


*C. Pia Lorena Buenrostro Ahued*

C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

*Luis Rigoberto Olmedo Navarro*

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

**CROQUIS Y OBSERVACIONES**

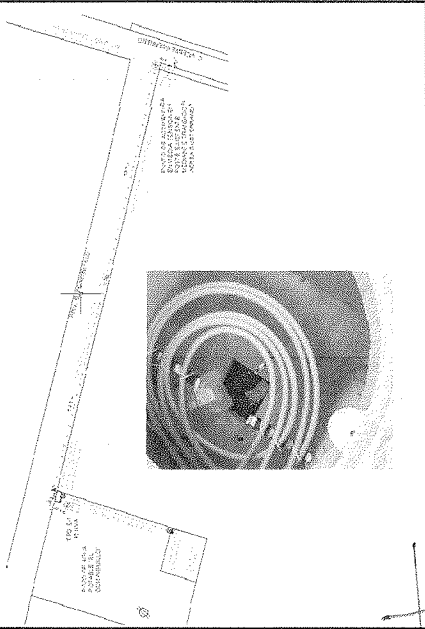



BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |


|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                    |       |       |      |        |       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|
| UNIDAD              | TRAMO                                                                                                                              | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA    | TOTAL |
| 15                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSHING TIPO INSERTO 25 KV, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION |       |       |      |        |       |
| PZA                 | EN EL TRANSFORMADOR E-1                                                                                                            |       |       |      | 3.0000 | 3.00  |
|                     |                                                                                                                                    |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                    |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                    |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                    |       |       |      | SUMA   | 3.00  |

*C. Pía Lorena Buenrostro Ahued*  
C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

*Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro*  
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

CROQUIS Y OBSERVACIONES



RFC: BCO 070129512


|                     |  |                                                                                                                                                      |  |                |  |                                                  |  |      |  |        |  |       |  |
|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--------------------------------------------------|--|------|--|--------|--|-------|--|
| EMPRESA:            |  | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                  |  |                |  |                                                  |  |      |  |        |  |       |  |
| OBRA:               |  | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO                             |  |                |  |                                                  |  |      |  |        |  |       |  |
|                     |  | FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018                                                                                                                      |  |                |  |                                                  |  |      |  |        |  |       |  |
| LOCALIDAD:          |  | SAN JUAN COSALA                                                                                                                                      |  | ESTIMACIÓN No. |  | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |  |      |  |        |  |       |  |
| MUNICIPIO:          |  | JOCOTEPEC, JALISCO                                                                                                                                   |  | PERIODO:       |  | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |  |      |  |        |  |       |  |
| NUMEROS GENERADORES |  |                                                                                                                                                      |  |                |  |                                                  |  |      |  |        |  |       |  |
| 16                  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO 25 KV 200 AMP. 1/0. OPERACIÓN CON CARGA, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |                |  |                                                  |  |      |  |        |  |       |  |
| UNIDAD              |  | TRAMO                                                                                                                                                |  | LARGO          |  | ANCHO                                            |  | ALTO |  | PZA    |  | TOTAL |  |
| PZA                 |  | EN EL TRANSFORMADOR E-1                                                                                                                              |  |                |  |                                                  |  |      |  | 3.0000 |  | 3.00  |  |
|                     |  |                                                                                                                                                      |  |                |  |                                                  |  |      |  |        |  |       |  |
|                     |  |                                                                                                                                                      |  |                |  |                                                  |  |      |  |        |  |       |  |
|                     |  |                                                                                                                                                      |  |                |  |                                                  |  |      |  |        |  |       |  |
|                     |  |                                                                                                                                                      |  |                |  |                                                  |  |      |  |        |  |       |  |
|                     |  |                                                                                                                                                      |  |                |  |                                                  |  |      |  | SUMA   |  | 3.00  |  |



C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL



ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



CROQUIS Y OBSERVACIONES


BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                                                           |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA Y FINIQUITO)                      |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                         |       |       |      |        |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|
| UNIDAD              | TRAMO                                                                                                                                   | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA    | TOTAL |
| 17                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE ADAPTADOR DE TIERRA 1/0 25 KV. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION |       |       |      |        |       |
| LOTE                | EN EL TRANSFORMADOR E-1                                                                                                                 |       |       |      | 3.0000 | 3.00  |
|                     |                                                                                                                                         |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                         |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                         |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                         |       |       |      | SUMA   | 3.00  |

CROQUIS Y OBSERVACIONES



*Por favor Buenas Noches*  
C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |        |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|
| UNIDAD              | TRAMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA    | TOTAL |
| 18                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR MULTIFUNCIONAL MARCA ELSTER SOLUTIONS MEDICION DE KWH, KW Y KVARH EN HASTA 4 TARIFAS HORARIAS, MEDICION DE VOLTAJE INSTANTANEO, PANTALLA LCD DE HSTA 6 DIGITOS, FORMA 9S, (3F-4H-3E), 120-480V, 2.5 (20) AMP, 60 HZ, CLASE DE PRECISION 0,2%, BASE TIPO SOCKET, CON PUERTO OPTICO ANSI II EN EL PANEL FRONTAL, CUMPLE CON ESPECIFICACION DE CFE G0000-48-2010, VIGENTE. |       |       |      |        |       |
| PZA                 | EN LA BASE DE MEDICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      | 1.0000 | 1.00  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      |        |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |      | SUMA   | 1.00  |

*Pia Lorena Buenrostro A*  
C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

*[Firma]*  
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

CROQUIS Y OBSERVACIONES

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |


| NUMEROS GENERADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |       |       |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGOS A CFE 1 POR APROBACION, SUPERVISION Y CONEXIÓN DE PROYECTO ELECTRICO |       |       |      |        |       |
| UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRAMO                                                                      | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA    | TOTAL |
| PZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |       |       |      | 1.0000 | 1.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |       |       |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |       |       |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |       |       |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |       |       |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |       |       |      | SUMA   | 1.00  |
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div> |                                                                            |       |       |      |        |       |

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES     |                                                                                                                                       |       |       |      |        |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|
| 20                      | PAGOS A CFE (ND) POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE GARANTIA EN LA ELABORACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIAPARA UN EQUIPO DE BOMBEO |       |       |      |        |       |
| CROQUIS Y OBSERVACIONES |                                                                                                                                       |       |       |      |        |       |
| UNIDAD                  | TRAMO                                                                                                                                 | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA    | TOTAL |
| PZA                     |                                                                                                                                       |       |       |      | 1.0000 | 1.00  |
|                         |                                                                                                                                       |       |       |      |        |       |
|                         |                                                                                                                                       |       |       |      |        |       |
|                         |                                                                                                                                       |       |       |      |        |       |
|                         |                                                                                                                                       |       |       |      | SUMA   | 1.00  |
|                         |                                                                                                                                       |       |       |      |        |       |

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CROQUIS Y OBSERVACIONES |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

  
C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL

  
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES |                                                                                                                                                           |       |       |      |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|
| 21                  | RESANE, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO EN REGISTRO DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION |       |       |      |        |
| UNIDAD              | TRAMO                                                                                                                                                     | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA    |
| LOTE                | EN LOS REGISTRO R1, R2 Y R3                                                                                                                               |       |       |      |        |
|                     |                                                                                                                                                           |       |       |      | 3.0000 |
|                     |                                                                                                                                                           |       |       |      |        |
|                     |                                                                                                                                                           |       |       |      |        |
|                     |                                                                                                                                                           |       |       |      |        |
|                     |                                                                                                                                                           |       |       |      |        |
|                     |                                                                                                                                                           |       |       |      | SUMA   |
|                     |                                                                                                                                                           |       |       |      | 3.00   |

CROQUIS Y OBSERVACIONES

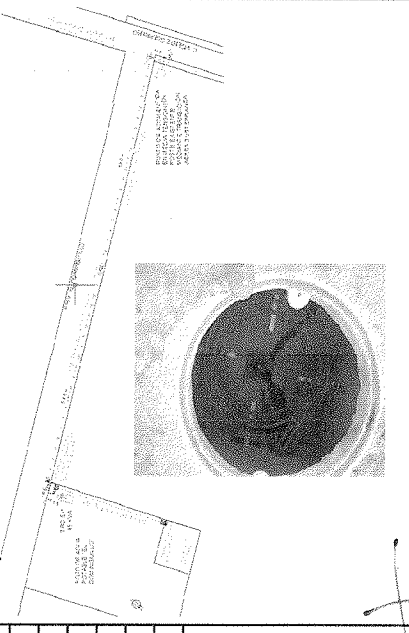

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO


C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL



BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO RPOFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                   |        |        |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRUEBAS VLF CABLE DE ENERGIA |                                                                                   |        |        |        |       |
| UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TRAMO                        | LARGO                                                                             | ANCHO  | ALTO   | PZA    | TOTAL |
| LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 1.0000                                                                            | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                   |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                   |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                   |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                   |        |        | SUMA   | 4.00  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED<br/>ADMINISTRADOR GENERAL</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO<br/>EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO</p> </div> </div> |                              |                                                                                   |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | CROQUIS Y OBSERVACIONES                                                           |        |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |        |        |        |       |


BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129 512

|          |                                                                                                                          |        |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| EMPRESA: | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                      | FECHA: | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| OBRA:    | ELECTRIFICACION DE POZO RPOFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |        |                          |

|            |                    |                |                                                  |
|------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| LOCALIDAD: | SAN JUAN COSALA    | ESTIMACIÓN No. | 1 (UNICA Y FINIQUITO)                            |
| MUNICIPIO: | JOCOTEPEC, JALISCO | PERIODO:       | 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| NUMEROS GENERADORES |                                               |       |       |      |        |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|------|--------|
| 24                  | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A TRANSFORMADOR | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA    |
| UNIDAD              | TRAMO                                         | TOTAL |       |      |        |
| PZA                 |                                               |       |       |      | 1.0000 |
|                     |                                               |       |       |      |        |
|                     |                                               |       |       |      |        |
|                     |                                               |       |       |      |        |
|                     |                                               |       |       |      |        |
|                     |                                               |       |       |      | SUMA   |
|                     |                                               |       |       |      | 1.00   |

CROQUIS Y OBSERVACIONES



*C. Pia Lorena Buenrostro A*  
C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL


*Ing. Luis Rigoberto Olmedo Navarro*  
ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
SANTA TERESA No. 17 COLONIA SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. C.P. 45300  
RFC: BCO 070129512

EMPRESA: BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.      FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
OBRA: ELECTRIFICACION DE POZO RPOFUNDO EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

LOCALIDAD: SAN JUAN COSALA      ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA Y FINIQUITO)  
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO      PERIODO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| NUMEROS GENERADORES |                                                                  |       |       |      | CROQUIS Y OBSERVACIONES |       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------------------|-------|
| 25                  | PAGO A LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS (UVIE) |       |       |      |                         |       |
| UNIDAD              | TRAMO                                                            | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA                     | TOTAL |
| PZA                 |                                                                  |       |       |      | 1.0000                  | 1.00  |
|                     |                                                                  |       |       |      |                         |       |
|                     |                                                                  |       |       |      |                         |       |
|                     |                                                                  |       |       |      |                         |       |
|                     |                                                                  |       |       |      | SUMA                    | 1.00  |



*Por favor Buenas Noches*  
C. PIA LORENA BUENOSTRO AHUED  
ADMINISTRADOR GENERAL


ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO  
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

OBRA: ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA POBLACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.


No. DE CONTRATO: GMJ 025 COP/2018

#### MEMORIA FOTOGRAFICA


TRANSICION AEREA SUBTERRANEA TRIFASICA, INCLUYE CONECTORES, CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCETA, DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, CODO PVC DE 4", CABLE DE ENERGIA XLP CAL. 1/0 25 KV AL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA INSTALACION

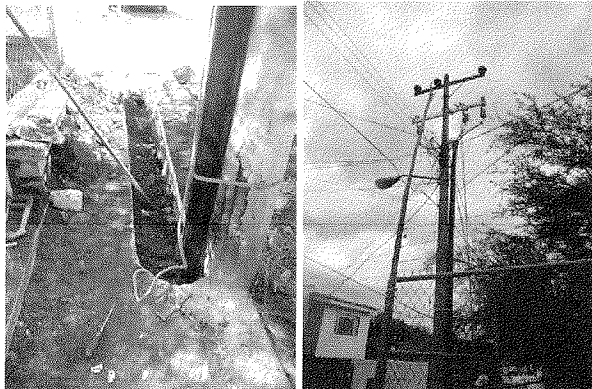

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO CON BOVEDA TIPO RMTB4 DE 1.50X1.50X1.50 MTS CON TAPA 84B DE CONCRETO POLIMERICO

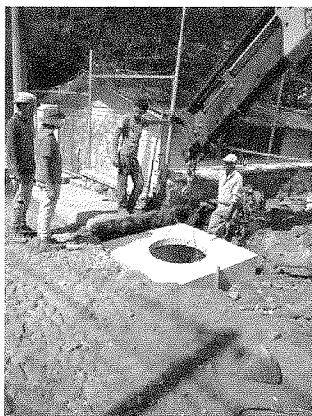


SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO CON BOVEDA TIPO RMTB-3, INCLUYE TAPA 84-B DE CONCRETO POLIMERICO RECIBIDA CON CONCRETO DE UNA RESISTENCIA DE 150 KGR/CM2, HECHO EN OBRA

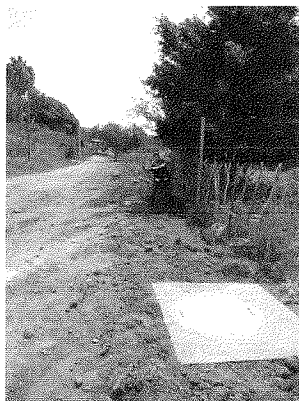

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO TIPO 3 EN BANQUETA CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR PEDESTAL, CFE BTTRMTB3, DE 1.66 X 1.16 X 0.90 MT, INCLUYE: CONCRETO PARA RECEPCION DE TAPA, ARO Y TAPA 84 B ESPECIFICACION CFE 2D100-39, EXCAVACION, PERFORACION, ENBOQUILLADO DE DUCTOS Y RESANE DE REGISTRO, ADEMAS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

OBRA: ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA POBLACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
No. DE CONTRATO: GMJ 025 COP/2018


#### MEMORIA FOTOGRAFICA

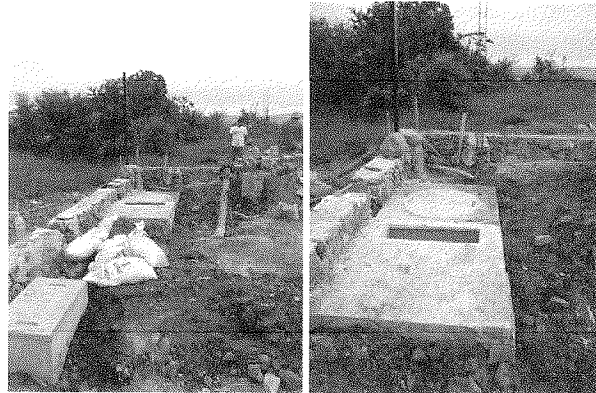

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR CON ACERO DE REFUERZO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION



SISTEMA DE TIERRAS EN REGISTROS DE MEDIA TENSION, COMPUESTO CON CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 2, CARGA FUNDENTE CADWEL No. 90, VARILLA DE TIERRA 3.05 MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION



EXCAVACION DE FORMA MANUAL EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, REMOCION, TRASPALO, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA, TALUDES Y MANO DE OBRA



P-134


OBRA: ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA POBLACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
No. DE CONTRATO: GMJ 025 COP/2018

### MEMORIA FOTOGRAFICA

RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTANDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90 % DE SU PVSM, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZACION, COMPACTACION Y MANO DE OBRA.



SUMINISTRO E ISNTALACION DE DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 50 MM DIAM, INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

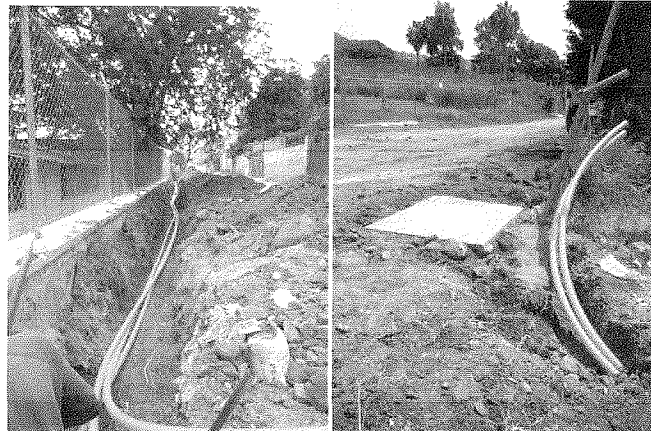

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA CALIBRE 1/0 CON AISLAMIENTO XLP 25 KV ALUMINIO AL 100 % INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION



P. J. B. D.


OBRA: ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA POBLACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
No. DE CONTRATO: GMJ 025 COP/2018

MEMORIA FOTOGRAFICA  
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. No. 2 DENTRO DE DUCTO DE POLIETILENO



SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 45 KVA 23 KV/440-254 V, OP RADIAL, DELTA ESTRELLA  
INCLUYE: TRES INSERTO BUSHING, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA, CORREDERA DE TACON DE POLIURETANO, INCLUYE MANO DE OBRA Y  
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION

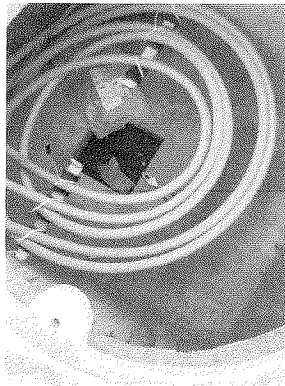

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PAR ASISTEMA DE MEDICION INCLUYE: BASE 7X200 , CABLE XLP CAL. No. 4, INTERRUPTOR DE 3X50 AMPERES 600 VOLTS, GABINETE NEMA 3R, ZAPATA OJILLO BIMETALICA CAL 4, VARILLA DE TIERRA, CARGA CADWELD, DUCTERIA GALVANIZADA Y DE PAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSHING TIPO INSERTO 25 KV, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NCESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION


SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO 25 KV 200 AMP. 1/0. OPERACIÓN CON CARGA, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DE ADAPTADOR DE TIERRA 1/0 25 KV, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARI/ PARA SU CORRECTA INSTALACION


SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR MULTIFUNSIONAL MARCA ELSTER SOLUTIONS MEDICION DE KWH, KW Y KVARH EN HASTA 4 TARIFAS HORARIAS, MEDICION DE VOLTAJE INSTANTANEO, PANTALLA LCD DE HSTA 6 DIGITOS, FORMA 9S, (3F-4H-3E), 120-480V, 2.5 (20) AMP, 60 HZ, CLASE DE PRECISION 0,2%, BASE TIPO SOCKET, CON PUERTO OPTICO ANSI II EN EL PANEL FRONTAL, CUMPLE CON ESPECIFICACION DE CFE G0000-48-2010, VIGENTE.

OBRA: ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA POBLACION DE SAN JUAN COSALA, DEL  
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
No. DE CONTRATO: GMJ 025 COP/2018

MEMORIA FOTOGRAFICA

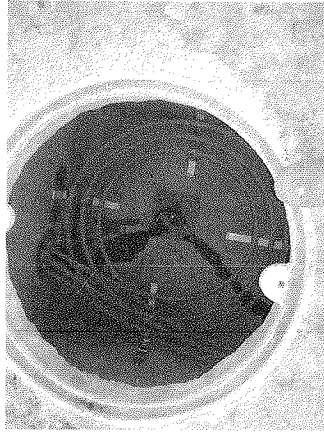

ROTULACION DE REGISTROS, DEACUERDO A NORMA DE CFE

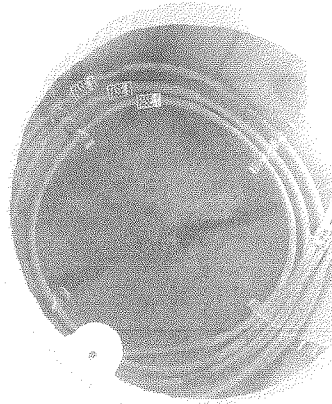

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*
