



ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E
 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION: V SURESTE
 PROGRAMA: FONDEREG
 EJERCICIO: 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO
 EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A
 LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
 JOCOTEPEC.

MUNICIPIO: JOCOTEPEC LOCALIDAD: JOCOTEPEC
 NOMBRE DE LA ACCION:

MONTO ASIGNADO: \$ 2'724,218.37

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
 RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MOVILIDAD, PEATONAL, ALUMBRADO PUBLICO Y
 COLOCACION DE BANCAS Y BOTES PARA BASURA.

Fecha de Inicio: 11 DE JUNIO DE 2018 Fecha de Termino Real: XXX
 Metas Proyectadas: 3338.90 M2 Metas Alcanzadas: XXX
 Beneficiarios Directos: 4,000 Beneficiarios Indirectos: 4,000

AVANCE	MAYO		JUNIO		JULIO		GOSTO		SEPTBRE		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Fisico	0%										0.0%
Financiero	0%										0.0%

DESCRIPCIÓN DE AVANCE FISICO:

DESCRIPCION DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:

Situación de la Obra: No Iniciada (X) Terminada sin Operar: ()
 En Proceso () Terminada y Operando: ()
 Suspendida ()

OBSERVACIONES:

GOBIERNO DEL ESTADO


GOBIERNO MUNICIPAL

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO

Nombre: ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

Coordinador Regional

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha del reporte a 3 de MAYO de 2018

*Recibido
 P. Juan O.
 29-06-18*



SUB SECRETARÍA DE PLANEACION
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

REGION

GEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRA



PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: Fondereg 2018
REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC.

NOMBRE DEL PROYECTO:
MUNICIPIO: JOCOTEPEC LOCALIDAD: JOCOTEPEC
NOMBRE DE LA ACCION:

MONTO ASIGNADO: \$ 2'724,218.37



ANTES

INICIO

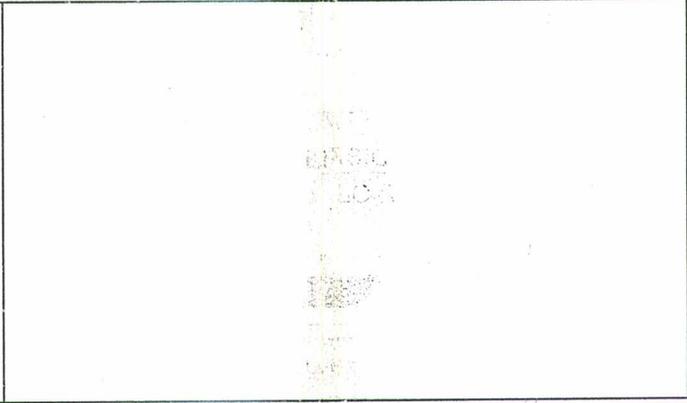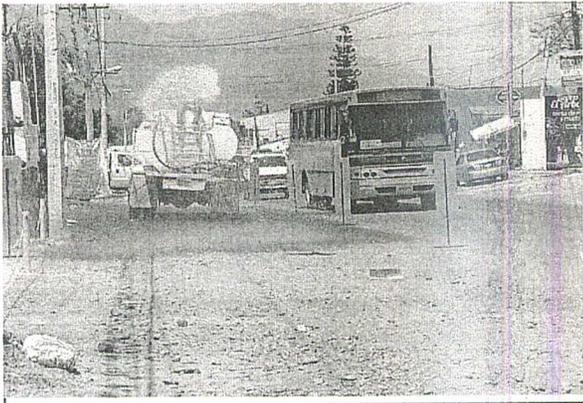

PROCESO

FINAL



GOBIERNO DEL ESTADO
REGIÓN No. V SURESTE

GOBIERNO MUNICIPAL

[Signature]

[Signature]

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO
COORDINADOR REGIONAL

Nombre: ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

Cargo Director de Obras Públicas



Fecha de reporte a 3 de MAYO de 2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
